


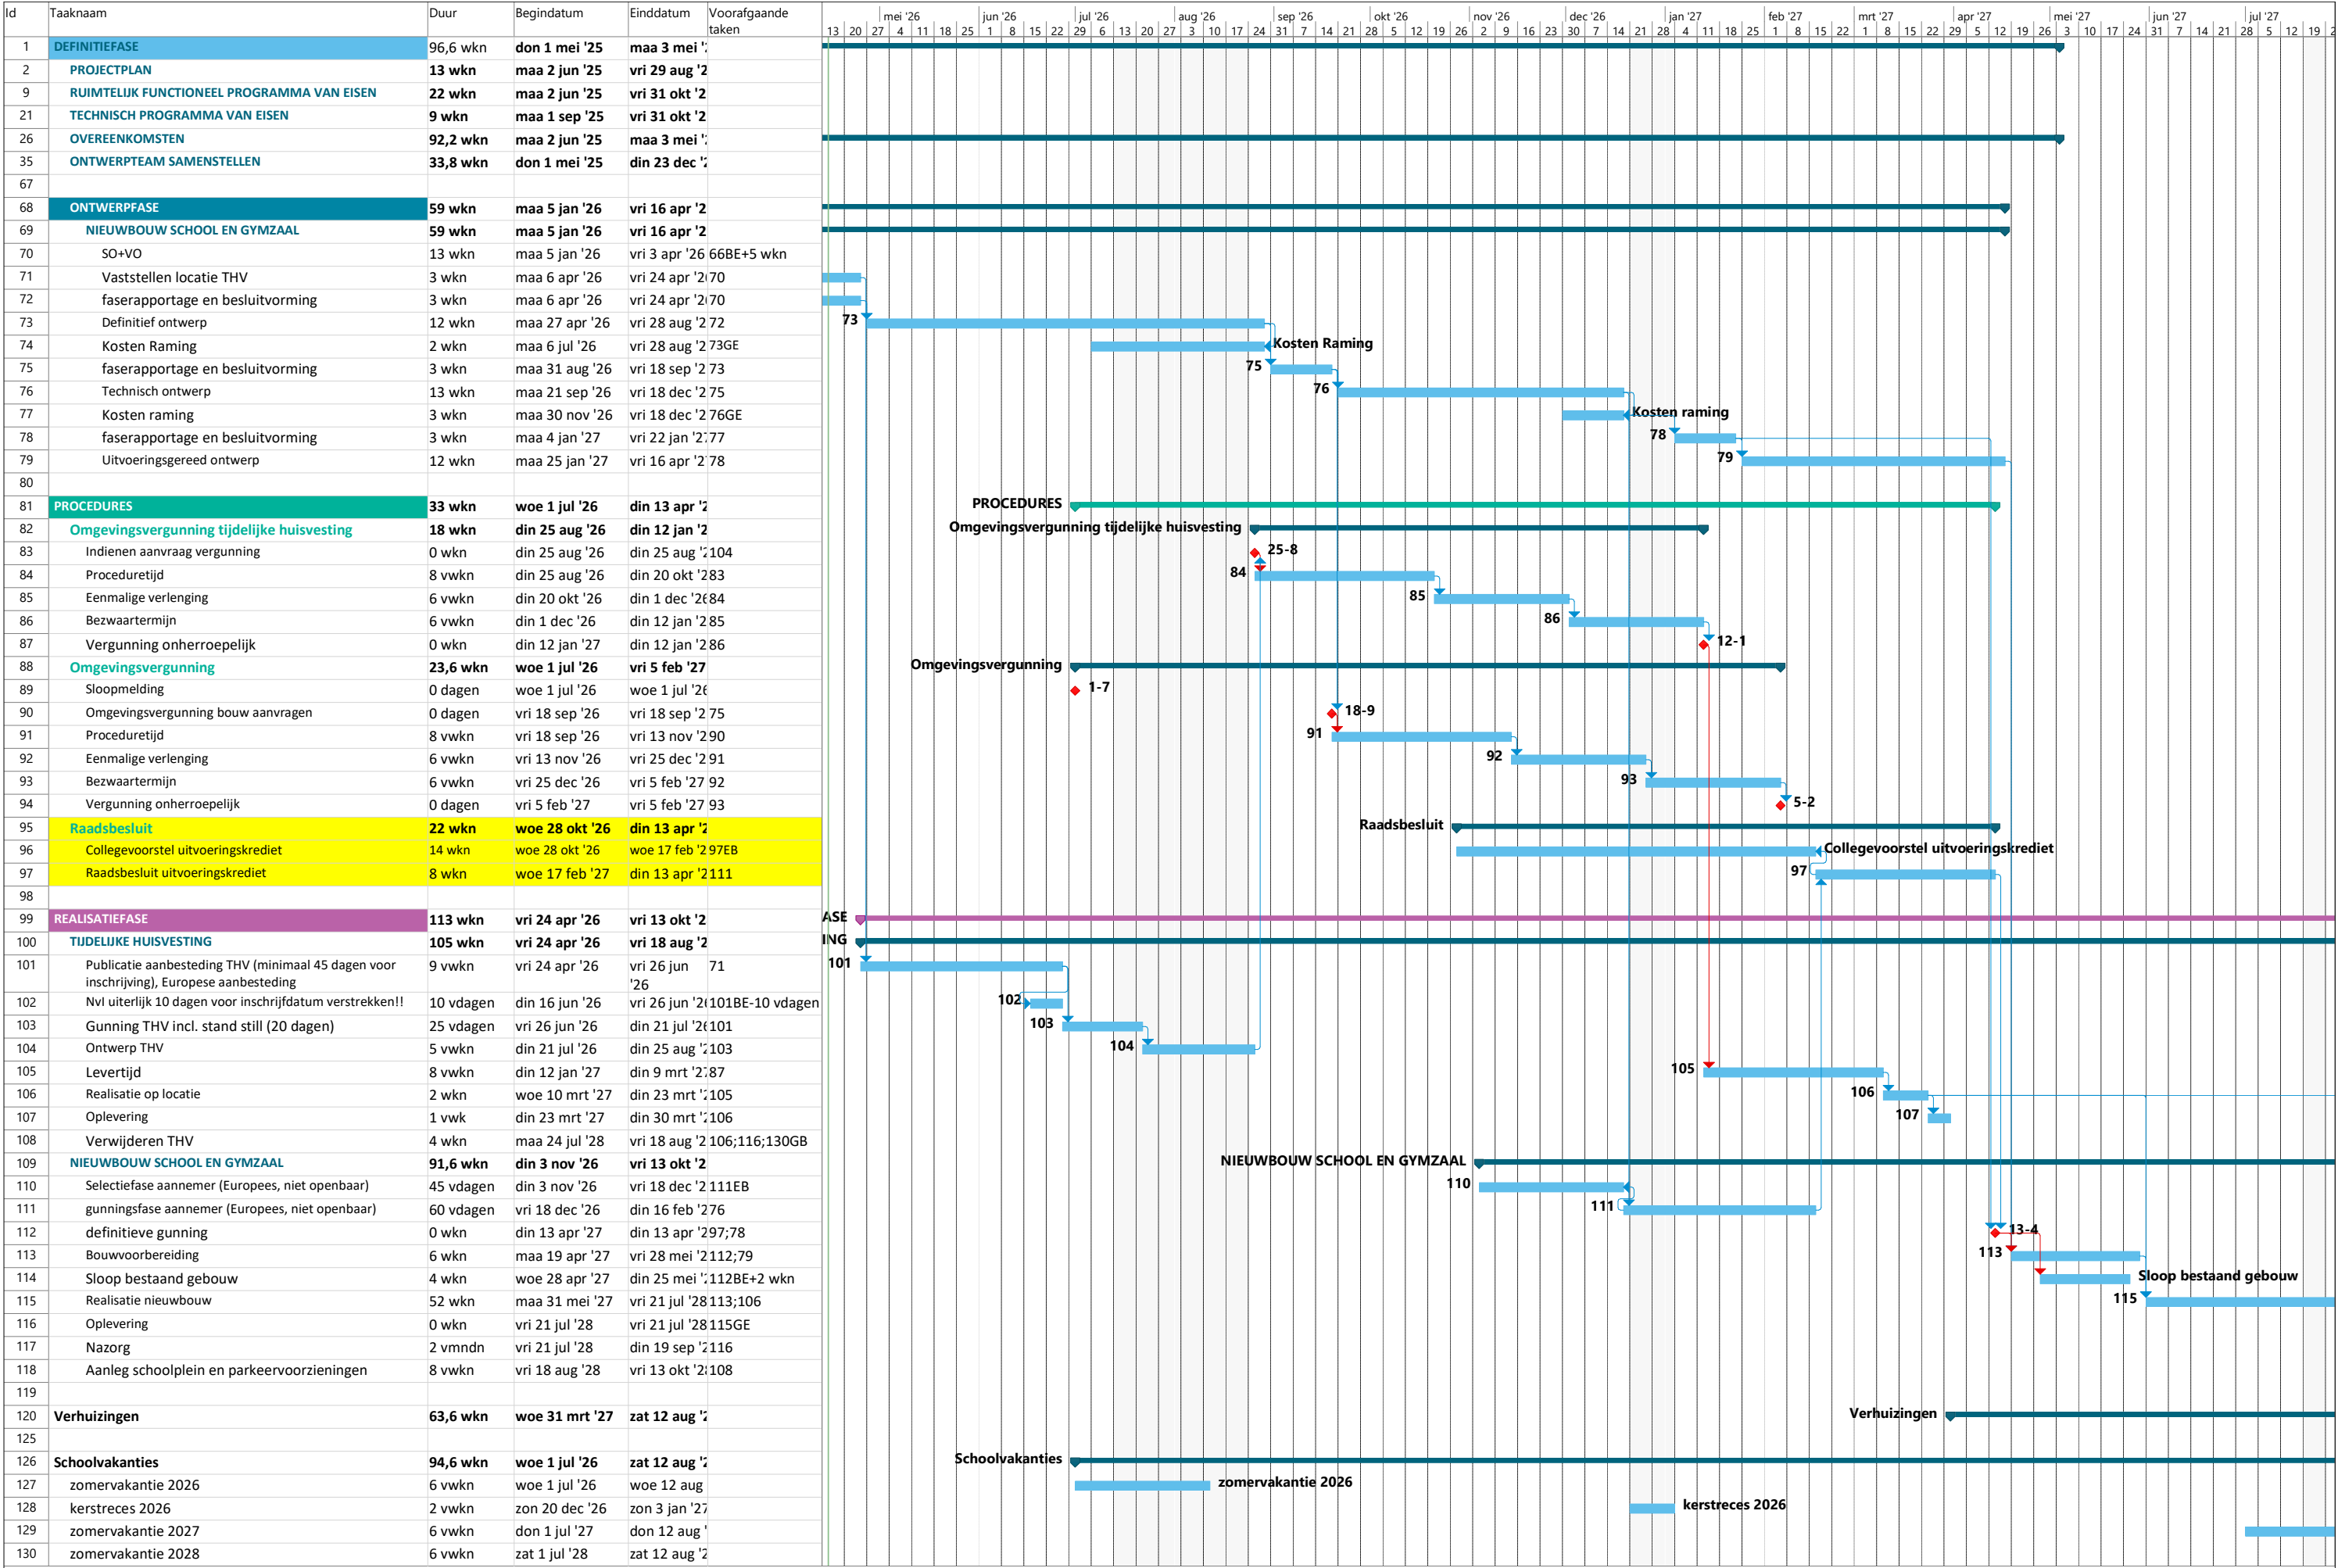

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	aug '27	sep '27	okt '27	nov '27	dec '27	jan '28	feb '28	mrt '28	apr '28	mei '28	jun '28	jul '28	aug '28	sep '28	okt '28	nov
1	DEFINITIEFASE	96,6 wkn	don 1 mei '25	maa 3 mei '26																	
2	PROJECTPLAN	13 wkn	maa 2 jun '25	vri 29 aug '25																	
9	RUIJMTELIJK FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN	22 wkn	maa 2 jun '25	vri 31 okt '25																	
21	TECHNISCH PROGRAMMA VAN EISEN	9 wkn	maa 1 sep '25	vri 31 okt '25																	
26	OVEREENKOMSTEN	92,2 wkn	maa 2 jun '25	maa 3 mei '26																	
35	ONTWERPTEAM SAMENSTELLEN	33,8 wkn	don 1 mei '25	din 23 dec '25																	
67																					
68	ONTWERPFASE	59 wkn	maa 5 jan '26	vri 16 apr '26																	
69	NIEUWBOUW SCHOOL EN GYMZAAL	59 wkn	maa 5 jan '26	vri 16 apr '26																	
70	SO+VO	13 wkn	maa 5 jan '26	vri 3 apr '26	66BE+5 wkn																
71	Vaststellen locatie THV	3 wkn	maa 6 apr '26	vri 24 apr '26	70																
72	faserapportage en besluitvorming	3 wkn	maa 6 apr '26	vri 24 apr '26	70																
73	Definitief ontwerp	12 wkn	maa 27 apr '26	vri 28 aug '26	72																
74	Kosten Raming	2 wkn	maa 6 jul '26	vri 28 aug '26	73GE																
75	faserapportage en besluitvorming	3 wkn	maa 31 aug '26	vri 18 sep '26	73																
76	Technisch ontwerp	13 wkn	maa 21 sep '26	vri 18 dec '26	75																
77	Kosten raming	3 wkn	maa 30 nov '26	vri 18 dec '26	76GE																
78	faserapportage en besluitvorming	3 wkn	maa 4 jan '27	vri 22 jan '27	77																
79	Uitvoeringsgereed ontwerp	12 wkn	maa 25 jan '27	vri 16 apr '27	78																
80																					
81	PROCEDURES	33 wkn	woe 1 jul '26	din 13 apr '27																	
82	Omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting	18 wkn	din 25 aug '26	din 12 jan '27																	
83	Indienen aanvraag vergunning	0 wkn	din 25 aug '26	din 25 aug '26	104																
84	Proceduretijd	8 vwkn	din 25 aug '26	din 20 okt '26	83																
85	Eenmalige verlenging	6 vwkn	din 20 okt '26	din 1 dec '26	84																
86	Bezwaartermijn	6 vwkn	din 1 dec '26	din 12 jan '27	85																
87	Vergunning onherroepelijk	0 wkn	din 12 jan '27	din 12 jan '27	86																
88	Omgevingsvergunning	23,6 wkn	woe 1 jul '26	vri 5 feb '27																	
89	Sloopmelding	0 dagen	woe 1 jul '26	woe 1 jul '26																	
90	Omgevingsvergunning bouw aanvragen	0 dagen	vri 18 sep '26	vri 18 sep '26	75																
91	Proceduretijd	8 vwkn	vri 18 sep '26	vri 13 nov '26	90																
92	Eenmalige verlenging	6 vwkn	vri 13 nov '26	vri 25 dec '26	91																
93	Bezwaartermijn	6 vwkn	vri 25 dec '26	vri 5 feb '27	92																
94	Vergunning onherroepelijk	0 dagen	vri 5 feb '27	vri 5 feb '27	93																
95	Raadsbesluit	22 wkn	woe 28 okt '26	din 13 apr '27																	
96	Collegevoorstel uitvoeringskrediet	14 wkn	woe 28 okt '26	woe 17 feb '27	97EB																
97	Raadsbesluit uitvoeringskrediet	8 wkn	woe 17 feb '27	din 13 apr '27	111																
98																					
99	REALISATIEFASE	113 wkn	vri 24 apr '26	vri 13 okt '27																	
100	TIJDELIJKE HUISVESTING	105 wkn	vri 24 apr '26	vri 18 aug '27																	
101	Publicatie aanbesteding THV (minimaal 45 dagen voor inschrijving), Europese aanbesteding	9 vwkn	vri 24 apr '26	vri 26 jun '26	71																
102	Nvl uiterlijk 10 dagen voor inschrijfdatum verstrekken!!	10 vdagen	din 16 jun '26	vri 26 jun '26	101BE-10 vdagen																
103	Gunning THV incl. stand still (20 dagen)	25 vdagen	vri 26 jun '26	din 21 jul '26	101																
104	Ontwerp THV	5 vwkn	din 21 jul '26	din 25 aug '26	103																
105	Levertijd	8 vwkn	din 12 jan '27	din 9 mrt '27	87																
106	Realisatie op locatie	2 wkn	woe 10 mrt '27	din 23 mrt '27	105																
107	Oplevering	1 vwkn	din 23 mrt '27	din 30 mrt '27	106																
108	Verwijderen THV	4 wkn	maa 24 jul '28	vri 18 aug '28	106;116;130GB																
109	NIEUWBOUW SCHOOL EN GYMZAAL	91,6 wkn	din 3 nov '26	vri 13 okt '27																	
110	Selectiefase aannemer (Europees, niet openbaar)	45 vdagen	din 3 nov '26	vri 18 dec '26	111EB																
111	gunningsfase aannemer (Europees, niet openbaar)	60 vdagen	vri 18 dec '26	din 16 feb '27	76																
112	definitieve gunning	0 wkn	din 13 apr '27	din 13 apr '27	78																
113	Bouwvoorbereiding	6 wkn	maa 19 apr '27	vri 28 mei '27	79																
114	Sloop bestaat gebouw	4 wkn	woe 28 apr '27	din 25 mei '27	112BE+2 wkn																
115	Realisatie nieuwbouw	52 wkn	maa 31 mei '27	vri 21 jul '28	113;106																
116	Oplevering	0 wkn	vri 21 jul '28	vri 21 jul '28	115GE																
117	Nazorg	2 vmndn	vri 21 jul '28	din 19 sep '28	116																
118	Aanleg schoolplein en parkeervoorzieningen	8 vwkn	vri 18 aug '28	vri 13 okt '28	108																
119																					
120	Verhuizingen	63,6 wkn	woe 31 mrt '27	zat 12 aug '27																	
125																					
126	Schoolvakanties	94,6 wkn	woe 1 jul '26	zat 12 aug '27																	
127	zomervakantie 2026	6 vwkn	woe 1 jul '26	woe 12 aug '26																	
128	kerstreces 2026	2 vwkn	zon 20 dec '26	zon 3 jan '27																	
129	zomervakantie 2027	6 vwkn	don 1 jul '27	don 12 aug '27																	
130	zomervakantie 2028	6 vwkn	zat 1 jul '28	zat 12 aug '28																	
