

1. Vaste gegevens over en van de koelinstallatie

Gegevens eigenaar/gebruiker

Naam :...HAN Campus.....
Bezoekadres :...Z.O-Vleugel.....
Postcode + plaats :...Nijmegen.....
Postbus :.....
Postcode postbus :.....
Telefoonnummer :.....
Naam contactpersoon :.....

Gegevens leverancier/installateur

(inbedrijfstelling installatie)

STEK-registratienummer :...0312-00.....
Naam :...De Laat Koudetechniek.....
Adres :...Wordragensestraat 1A.....
Postcode + plaats :...5324 JL Ammerzoden.....
Telefoonnummer :...073 – 599 01 23
Faxnummer :...073 – 599 29 59
Naam contactpersoon :...Peter Merkx.....
Projectnummer :...05-377.....

Gegevens installateur

(periodieke controle/reparatie van de installatie)

STEK-registratienummer :...0312-00
Naam :...De Laat Koudetechniek.....
Adres :...Wordragensestraat 1A.....
Postcode + plaats :...5324 JL Ammerzoden.....
Telefoonnummer :...073 – 599 01 23
Faxnummer :...073 – 599 29 59
Naam contactpersoon :...Peter Merkx.....
Onderhoudscontractnummer :.....

Gegevens koelinstallatie

(Bij wijzigingen aan de installatie moeten de gegevens worden aangepast)

Identificatienummer/koelinstallatie	:	073528/12	
Ontwerp gegevens	:	Ruimtetemperatuur	22 °C
	:	Verdampingstemperatuur	10 °C
	:	Verdampingsdruk	5,5 bar/KPa
	:	Condensatietemperatuur	38 °C
	:	Condensatiedruk	13,8 bar/KPa
	:	Omgevingstemperatuur	20 °C
Gebruiksdoel	:	LBK	
Totaal aandrijfvermogen compressor	:	3,7	kW
Type koudemiddel	:	R 407C	
Koudemiddel vulling	:	44	kg
Max. inhoud vloeistofvat	:	40	kg
Max. toelaatbare werkdruk HD-zijde	:	21,5	kPa of bar
Max. toelaatbare werkdruk LD-zijde	:	12,5	kPa of bar

Benodigde bewijzen/documenten

- | | |
|---|--|
| - Installatiecontrolebewijs/document | - Drukproevingsbewijs/document |
| - Lekdichtheidscontrole/document | - Vacuüm- en vulprocedurebewijs/document |
| - Druk/Keuringsbewijzen/documenten installatiedelen | - Stroomschema ¹ |
| - Bedieningsvoorschriften ² | - Document compressor ³ |

¹ Alleen noodzakelijk bij > 30 kg koudemiddel en bij installaties > 3 kg met twee of meer verdampers

² Alleen bij meer dan 300 kg koudemiddel

³ Indien geen kenplaat op de compressor

⁴ Doorhalen wat niet van toepassing is

Indien hoeveelheid koudemiddel > 1000 kg:

Bij continu toezicht	:	
Bevoegd medewerker(s)	:	
Telefoon	:	
Bij periodiek toezicht	:	
Medewerker(s)	:	
Telefoon	:	

Datum	:	
-------	---	--

Handtekening eigenaar/gebruiker

.....

Handtekening installateur



2. Registratie van het beheer¹

Totaaloverzicht uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden

Identificatie nummer

koelinstallatie: 073528/12 209522

[illegible]

S = Storing

O = Onderhoud

¹ Registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen

² Bij ieder bezoek aan de installatie moeten de uitgevoerde werkzaamheden worden omschreven en kan verwezen worden naar de individuele werkregistratie, mits deze is bijgevoegd.

Contractgever gegevens: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ruitenberglaan 26 6802 EJ Arnhem			Locatie gegevens: Hogeschool Arnhem en Nijmegen Kapittelweg 33 6525EN Nijmegen 50159267/003			Unica Building Services 026-3202323 De Overmaat 19 6831AE Arnhem F.GAS- 4.18.6476029-00-18-NLD-rev.00			
Installatie nummer			Installatie type		Koelvermogen		Totale vulling		
409522			Commerciële koeling		74 kW		88 kg		
Installatie omschrijving						Locatie			
DX koeler in lbk						D6.21			
#	Koudemiddel	Nominale vulling	Fabrikant/type Compressor/Condensor			Serienummer	GWP	Bouwjaar	
1-1	R407C	44 kg	De laat koudetechniek 2x dx systeem			Lbk 2/2 073528/13	1774	2005	
1-2	R407C	44 kg							
Etage		Ruimte	Fabrikant/type Binnenunit			Serienummer	Bouwjaar		
6e		6e Technische ruimte	.. Verdampersblok in lbk			Nvt	2005		
Werzaamheden en handelingen - uitgevoerd op 17-03-2020									
In gebruikname		Onderhoud/Controle		Storing		Reparatie		Ontmanteling	
☐		☒		☐		☐		☐	
Drukbeproeving		Vacumeren		Aftappen		Bijvullen		Lekcontrole	
☐		☐		☐		☐		☒	
Aanwezigheid documenten									
Kenplaat installatie			Ja			Kenplaat compressor			
						Ja			
Instructiekaart			Ja			Bedienings voorschriften			
						Ja			
Buitenunit(s) controle		1	2	3			1	2	3
Bevestiging; Balken / Tegels / Muursteunen		-	-	-	Muursteunen		-	-	-
Werkschakelaars		☒	-	-	E-bekabeling		☒	-	-
Condensor lamellen		☒	-	-	Ventilator (geluid/trillingen)		☒	-	-
Doorvoer		☒	-	-					
Leidingen extern		1	2	3			1	2	3
Isolatie		☒	-	-	Koppelingen		☒	-	-
Leidingen intern		1	2	3			1	2	3
Isolatie		☒	-	-	Koppelingen isolatie		☒	-	-
Verdamper(s) controle		1	2	3			1	2	3
Verdamper		☒	-	-	Ventilator geluid/trillingen		☒	-	-
C nsafvoer (aansluiting)		☒	-	-	Filter		☒	-	-
Bedienings paneel		☒	-	-	Controle condenspomp		☒	-	-
Lekcontrole - Lektestcertificaat									
Lekcontrole 1-1 uitgevoerd		Ja	Lekcontrole resultaat		☒	Volgende controle voor: 17-09-2020			
Lekcontrole 1-2 uitgevoerd		Ja	Lekcontrole resultaat		☒	Volgende controle voor: 17-09-2020			
Meters									
Temperatuurmeter		504TB50085/86				Euro Index S2600-12KD			
digitale meetset		504TB030090				Testo 557 digitale meterset			
Advies en opmerkingen									
		BU1 Aan unit allen een lektest kunnen uitvoeren, er was geen koelvraag en deze was ook niet te genereren.							
Handtekening						Lektester		Controle frequentie	
						yellow jacket		Inhoud in CO2 equivalent: 78.1 ton	
						17246874		Lekcontrole iedere 6 mnd	
Technicus: Bas Spiek		Diploma: 825280	Naam contactpersoon: Technische Dienst			Controleren voor: 04-09-2020			

BIJLAGE FOTO'S

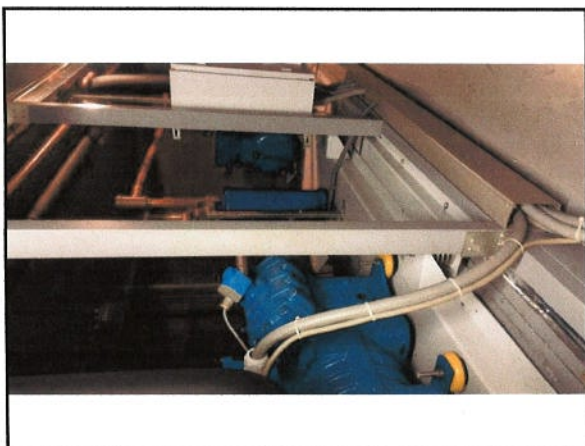


Foto
opstellin
g
compres
sor

Opdrachtgever gegevens: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ruitevarglaan 26 6802 EJ Arnhem		Locatie gegevens: Hogeschool Arnhem en Nijmegen Kapittelweg 33 6525EN Nijmegen 50159267/003		Unica Building Services 026-3202323 De overmaat 19 6831AE Arnhem F.GAS- 4.18.6476029-00-18-NLD-rev.00	
Installatie nummer		Installatie type	Koelvermogen	Totale vulling	
409522		Commerciële koeling	74 kW	88 kg	
Installatie omschrijving				Locatie	
DX koeler in lbk				D6.21	
#	Koudemiddel	Nominale vulling	Fabrikant/type Compressor/Condensor	Serienummer	GWP
1-1	R407C	44 kg	De laat koudetechniek 2x dx systeem	Lbk 2/2 073528/13	1774
1-2	R407C	44 kg			
Etage	Ruimte	Fabrikant/type Binnenunit		Serienummer BI	Bouwjaar
6e	6e Technische ruimte	.. Verdampersblok in lbk		Nvt	2005
Werkzaamheden en handelingen - uitgevoerd op 08-07-2019					
Ingebruikname	☐	Onderhoud/Controle	☒	Storing	☐
Druk/roefing	☐	Vacumeren	☐	Aftappen	☐
				Bijvullen	☐
				Lekcontrole	☒
Aanwezigheid documenten					
Kenplaat installatie		Ja		Kenplaat compressor	
				Ja	
Instructiekaart		Ja		Logboek	
				Ja	
Koeltechnisch stroomschema				Ja	
Buitenunit(s) controle	1	2	3	Buitenunit(s) controle	1
Bevestiging; Balken / Tegels / Muursteunen	☒	-	-	Muursteunen	☒
Werkschakelaars	☒	-	-	E-bekabeling	☒
Condensor lamellen	☒	-	-	Ventilator (geluid/trillingen)	☒
Doorvoer	☒	-	-		
Leidingen extern	1	2	3	Leidingen extern	1
Isolatie	☒	-	-	Koppelingen	☒
Leidingen intern	1	2	3	Leidingen intern	1
Isolatie	☒	-	-	Koppelingen isolatie	☒
Verdampers(s) controle	1	2	3	Verdampers(s) controle	1
Verdampers	☒	-	-	Ventilator geluid/trillingen	☒
Condensafvoer (aansluiting)	☒	-	-	Filter	☒
Bedieningspaneel	☒	-	-	Controle condenspomp	☒
Lekcontrole - Lektestcertificaat					
Lekcontrole #1 uitgevoerd	Ja	Lekcontrole resultaat	☒	Volgende controle voor: 08-01-2020	
Lekcontrole #2 uitgevoerd	Ja	Lekcontrole resultaat	☒	Volgende controle voor: 08-01-2020	
Meters					
Temperatuurmeter	504TB0100090		testo 6135505		
ljkas f-gassen lekdetector	18031827		yellow Jacket		
Gaslekspray					
Handtekening			Control frequentie		
			Inhoud in CO2 equivalent: 78.1 ton		
			Lekcontrole iedere 6 mnd		
Technicus: Robert Yard	Diploma: 815052	Naam contactpersoon: T. Arends			

BIJLAGE FOTO'S



Foto opstelling compressor

Werkrapport



Ordernummer: 515042
Omschrijving: Storing / Rep. werkzaamheden

Contractsoort/-nummer: /
Naam technicus: Mulder, B
Steknr. technicus/mannr.: E02169 / 5870

Opstellingsplaats:
HAN CAMPUS
Kapittelweg 33
6525 EN NIJMEGEN

Opdrachtgever:
UNICA ZWOLLE
POSTBUS 623
8000 AP ZWOLLE

Contactpersoon: A.W.M. Ardon
Locatiereferentie klant:
Locatie machine: D-VLEUGEL RUIMTE D6.21

Melder/Contactpers.: A.W.M. Ardon
Opdrachtreferentie: 29321481

Machinenummer: 409522
Machinetype: CHH R11/710
Serienummer: 25.0825.10

Koudemiddelsoort: R407C GWP factor = 1774
Koudemiddelinhoud (kg): Syst.A:44 Syst.B:44 Syst.C:
I.B.S.-datum: 01-01-2006
Softwareversie:

Gewerkte uren:	Aankomstdatum	Aankomsttijd	Vertrektijd	Totaal
	17-01-2017	07:35	12:45	5,2 uur

Verrichte werkzaamheden:

☒ %S controles volgens EH&S-FO-01

- a) Zijn gangen en paden vrij toegankelijk? Ja
- b) Zijn de uitgangen vrij? Ja
- c) Locatie van nooduitgangen en blusmiddelen bekend? Ja
- d) Is de machine veilig opgesteld? Ja
- e) Bereikbaarheid installatie veilig? Ja

Verrichte werkzaamheden (vervolg):

- 1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden
- 2) Bevindingen:
- 3) Uitgevoerde werkzaamheden: Compressor spanningsloos gemaakt, compressor ingeblokt en koudemiddel afgepompt naar verdamper. Pakking van beide cilinderkoppen-Kleppenplaten vervangen, compressor gevacumeerd en opdrukgebracht dmv afsluiters te openen. Lektest uitgevoerd conform F-gassen beleid, geen lekkages geconstateerd.
- 4) Conclusie: Pakkingen van cilinderkoppen-Kleppenplaten zijn lekdicht bevonden.
- 5) Nog uit te voeren: Geen
- 6) Order gereed: Ja
- 7) Parkeerkosten: Nee
- 8) Materiaal extern aangekocht: Nee

Verbruikte materialen:

Aantal	Artikel	Omschrijving
1,00	392-9054	PAKKINGSET FRASCOLD COMPRESSOR

Opmerking technicus:

Opmerking klant:

Handtekening klant:

Carrier Airconditioning Benelux BV

Branch office Nederland
Rijndijk 141 / Postbus 151 / 2394 ZH Hazerswoude Rijndijk
Tel: +31 (0) 71 341 71 11 Fax: +31 (0) 71 341 41 92
www.carrier.nl STEK nr. C0174
DB 26.51.69.127 IBAN NL09DEUT0265169127
BTW nr. NL001989224B01 K.v.K. 28023950

2. Registratie van het beheer (vervolg)¹

CFK Alarm (in te vullen door eigenaar/gebruiker)

Dit overzicht is uitsluitend van toepassing voor installaties met een inhoud $\geq 1000 \text{ kg}$

Identifikationsnummer

koelinstallatie:.....073528/12.....

[illegible]

¹ Registratie van beheer moet corresponderen met de aanwezige werkbonnen

3. Werkregistratie van periodiek onderhoud/reparatie/ preventieve controle (werkbbon/werkopdracht¹)

Datum	20-01-06		
Nummer werkregistratie			
Identificatienummer koelinstallatie	073528/12		
STEK-erkende onderneming	De Laat Koudetechniek		
STEK-registratienummer	60312		
Naam STEK-monteur	B. Klop		
Diplomanummer	202645		
Aard van de werkzaamheden	In Bedrijf		
Indien gebruikt			
Koudemiddel-type	407C		
Bijgevuld	44 kg	uit fles nr.	Bk op 4006
Afgetapt	kg	naar fles nr.	
Reden mutatie	LB		
Smeerolietype			
Bijgevuld	kg		
Afgetapt	kg		
Lektester type	2x1		
Nnummer			
Lektestresultaat van de hele installatie	geen lekkages		
Meet- en vulpunten			
Max. toelaatbare werkdruk LD-zijde	kPa	of	12,5 Bar
Max. toelaatbare werkdruk HD-zijde	kPa	of	21,5 Bar
Omgevingstemperatuur	20	°C	
Bijzonderheden	geen		
Handtekening STEK-monteur	Bk		

¹Bij vermelden van bovenstaande gegevens op de werkbbonen kan volstaan worden met het invoegen van deze werkbbonen. Op de werkbbon moet duidelijk worden vermeld welke werkzaamheden of corrigerende maatregelen (indien van toepassing) men heeft verricht. Dient te corresponderen met totaalijst van hoofdstuk 2.1 Indien een afschrift van de werkregistratie in het logboek wordt toegevoegd, kan onder verwijzing naar het individuele stuknr. gedetailleerde invulling in het logboek achterwege blijven.

4. Drukbeproevings-/vacumeer- en vulbewijs/document

Algemeen

Installatie/identificatienr. Koelinstallatie

:.....073528/12.....

Drukbeproeving

De complete installatie¹ is drukbeproefd bij een afpersdruk

: 25

Beproevedruk LD-gedeelte

: bar/kPa

Beproevedruk HD-gedeelte

: bar/kPa

Druktijd (tijd dat de proefdruk wordt gehandhaafd)

: 40 uren min.

Gedurende de beproeving is de installatie op lek Dichtheid en vervorming gecontroleerd. De lek Dichtheidscontrole is uitgevoerd d.m.v. een visuele controle van de drukken en m.b.v. lek opsporingsmiddelen. De installatie is lekdicht bevonden en er zijn geen vervormingen geconstateerd.

Vacumeren en vullen

De complete installatie is gevacumeerd conform de RLK '97.

Installaties met koudemiddelvulling < 10 kg

- bereikte vacuümdruk Pa/Torr/Micron3
- standtijd⁴ uren min. (minimaal 30)

Installaties met koudemiddelvulling ≥ 10 kg < 200 kg

- bereikte vacuümdruk 270 Pa/Torr/Micron3
- aantal maal gebroken met N² 1 (minimaal 1x)
- standtijd⁴ 40 uren min. (minimaal 60)

Installaties met koudemiddelvulling ≥ 200 kg

- bereikte vacuümdruk Pa/Torr/Micron3
- aantal maal gebroken met N² (minimaal 1x)
- standtijd⁴ uren min. (minimaal 120)

Tijdens het vacumeren is een druk in de/het installatie/installatiedeel van minder dan 270 Pa bereikt en deze druk kon gedurende de vereiste standtijd gehandhaafd worden.

Tijdens het vullen is de volgende

Type koudemiddel

: R407C.....

hoeveelheid koudemiddel toegevoegd:

Hoeveelheid

: 44..... kg

Totale hoeveelheid koudemiddelvulling van de installatie

: 44..... kg

Naam leverancier/installateur

: De Laat Koudetechniek

Naam Stek-monteur

: André Klop

Diplomanummer

: 302645

Datum

: 20/06/06

Handtekening

: [Handtekening]

¹ indien installatiedelen, dan de delen noemen. De tekst niet dan vervangen worden door:

De volgende installatiedelen zijn drukbeproefd bij een afpersdruk:

Onderdelen

Afpersdruk

.....

.....

² doorhalen wat niet van toepassing is

1 bar = 100 kPa

³ doorhalen wat niet van toepassing is

270 Pa = 2 Torr = 2000 Micron

⁴ tijd dat vacuüm wordt gehandhaafd

5. Lekdichtheids-/Installatiecontrole bewijs/document

Algemeen

Installatie/identificatienr. koelinstallatie :073528/12.....

Lekdichtheidscontrole

De installatie is gecontroleerd op correct functioneren en lekdichtheid na het in werking stellen van de installatie. De lekdetectie is uitgevoerd met een lekdetector waarvan de detectiegrens ten minste 5 p.p.m bedraagt.

De lekdichtheidscontrole is conform RLK '97 uitgevoerd.

De installatie bleek geheel lekdicht te zijn tijdens deze controle.

Installatiecontrole

Naam leverancier	De Laat Koudetechniek.....
Type koelinstallatie	 DX
Type koudemiddel	R407C.....
Totale hoeveelheid koudemiddelvulling van de installatie	44.....kg.
Hoogste temperatuur ⁴	 30°C
Hoogste druk ⁴	 13,0bar/kPa ¹
Laagste temperatuur ⁴	 10°C
Laagste druk ⁴	 5,5bar/kPa ¹
Afblaasdruk ontlastorgaan (alg.) ²	 /bar/kPa ¹
Afblaasdruk veiligheidsklep ²	 /bar/kPa ¹
Afblaasdruk ontlastklep ²	 /bar/kPa ¹
Nominale breek(barst)druk breekplaat ²	 /bar/kPa ¹
Aanwezigheid bedieningsvoorschrift	ja (als inhoud ≥ 300 kg) /nee ¹

Bij dit certificaat behoren:

- druk/keuringsbewijzen/documenten installatiedelen³
- drukbeproevingbewijs/document³
- lekdichtheidscontrole-bewijs/document
- vacumeer- en vulprocedurebewijs/document³

De gehele installatie is in orde bevonden conform de Regeling Lekdichtheidsvoorschriften

Koelinstallaties 1997

Naam leverancier/installateur	De Laat Koudetechniek.....
Naam STEK monteur	André Klop.....
Diplomanummer	 E026475
Controledatum	 20/10/06
Handtekening	 AKlop

¹ doorhalen wat niet van toepassing is 1 bar = 100 kPa

² voorzover aanwezig (een ontlastingsorgaan kan ook een pressostaat zijn)

³ niet van toepassing bij beperkte installatiecontrole

⁴ Dit zijn de gemeten/gecontroleerde waarden tijdens inbedrijfstelling van de koelinstallaties, b.v.;

a) de werkelijke zuig- en persdruk en overeenkomstige temperatuur

b) de maximale waarde aan de hogedrukzijde en de minimale waarde aan de lagedrukzijde die tijdens normaal bedrijf kunnen voorkomen.

c) de ingestelde waarden van de hoge- en lagedruk pressostataten.

