

Inspectierapport NEN3140

van de elektrotechnische installatie van

Fontein Heuvel

aan de **Heuvel**
te **Tilburg**

Datum inspectierapport: 6-10-2023
Rapportnummer: 20230925LB01

Ondertekening inspecteur:



Dhr. L. Baars

Inhoudsopgave

- Gegevens
- Samenvatting
- Inspectieomvang
- Controlepunten
- Bevindingen documentatie
- Bevindingen verdeelinrichtingen
- Bevindingen overige installatiedelen

Bijlage - Inspectie-interval

Gegevens

Installatie

Naam:	Fontein Heuvel
Adres:	Heuvel
Postcode en plaats:	Tilburg
Contactpersoon:	Arjen van Strien
Telefoonnummer:	0628163123
Bouwjaar:	2023
Type installatie:	Overig
Stroomstelsel:	TN
Netspanning:	230V / 400V AC 50Hz
Onderlinge beïnvloeding:	N.v.t.
Uitvoeren van onderhoud:	N.v.t.

Uitwendige invloeden:

Onderdeel:	Gehele installatie
Aanwezigheid van stof:	IP0X
Aanwezigheid van water:	IPX0

Opdrachtgever

Naam:	Rots Maatwerk Onderhoud
Adres:	Op den Berg 1
Postcode en plaats:	6971LD Brummen
Telefoonnummer:	0681931580
E-mail	wouter@rots-maatwerk.nl
Contactpersoon:	Wouter Wennink

Inspectiebedrijf

Naam:	Akerdome B.V.
Adres:	Woudsedijk 11
Postcode en plaats:	2461 CR Ter Aar
Telefoonnummer:	0172 - 748 010
Inspectieverantwoordelijke	Ronald Akerboom
E-mail	ronald@akerdome.com
Telefoon	0172 - 748 010
E-mail	
E-mail	

Inspecteur(s)

Inspecteur	Lars Baars
E-mail	Lbaars@akerdome.nl

Gebruikte meetinstrumenten

- ☒ Fluke 1664, installatietester, 5461290, 14-10-2022
- ☒ Flir E8, thermografische camera, S/N 639018313, 07-07-2022

Inspectie

Installatieverantwoordelijke:	Onbekend
Aanleiding van de inspectie:	Op aanvraag
Reden van de inspectie:	Periodieke inspectie
Rapportnummer:	20230925LB01
Datum rapport:	6-10-2023
Datum inspectie:	25-9-2023

Samenvatting

Eindoordeel: **Voldoet aan de gestelde eisen**

Classificatie	Aantal bevindingen
Onaanvaardbaar risico (R1) Een levens- of brandgevaarlijke situatie is nu aanwezig. Er dienen direct maatregelen te worden ondernomen.	0
Ernstig risico (R2) Er is een grote kans op een levensbedreigende of brandgevaarlijke situatie na voorziene gebeurtenis, of verloop van tijd.	0
Matig risico (R3) Er is een gematigde kans op een levensbedreigende of brandgevaarlijke situatie. Of er is een grote kans op lichamelijk letsel of schade van beperkte omvang.	0
Verbetering aanbevolen (V.A.) Er zijn geen of minimale veiligheidsrisico's. Echter, de kwaliteit is ondermaats. Het betreft levensduur, financieel rendement, etc.	0
Nader onderzoek (N.O.) Het is mogelijk dat er een risico aanwezig is. Dit is echter zonder aanvullende informatie niet te beoordelen.	0

Inspectieomvang

Van toepassing zijnde normen:

NEN3140:2018

Aanvullende eisen:

N.v.t.

Deze inspectie heeft betrekking op:	Gehele elektrische installatie met uitzonderingen van de vast aangesloten machines en de machines en apparaten met een stekerverbinding.
Uitsluitingen in deze inspectie:	Overige delen van de elektrische installatie, de vast aangesloten machines en de machines en apparaten met een stekerverbinding.

Deze inspectie is uitgevoerd middels:

Visuele controle en meting en beproeving

Evaluatie vorige inspectie:

Nee

Aanvullende diensten

Thermografie verdeelinrichtingen:

Nee

Thermografie PV:

Nee

I/U-curves:

Nee

Opmerkingen

De inspectieomvang wijkt niet af ten opzichte van het inspectieplan.

Bevindingen documentatie

De inspectie is uitgevoerd aan de hand van de aan ons beschikbaar gestelde tekeningen en documenten. Het betreft de volgende tekeningen en documenten:

Conclusie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Controlepunten

Visuele controle

Er is gecontroleerd in hoeverre de installatie aan de door de van toepassing zijnde normen vereiste controlepunten voldoet.

- 0 bevindingen per controlepunt: Voldoet op dit punt aan de gestelde eisen.
- 1 of meer: Voldoet op dit punt niet aan de gestelde eisen.

Controlepunten visueel	Aantal bevindingen
CV-a Gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (41);	0
CV-b Aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en de bescherming tegen thermische invloeden (42 en 527);	0
CV-c Keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies (43, 523 en 525);	0
CV-d Keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen (53);	0
CV-e Aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen (536);	0
CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden (422, 512.2 en 522);	0
CV-g Juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (514.3);	0
CV-h Verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen (536);	Niet van toepassing
CV-i Aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwborden of andere vergelijkbare informatie (514.5);	0
CV-j Aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (514);	0
CV-k Deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (526);	0
CV-l Aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van basis- en aanvullende vereffeningsleidingen (54);	0
CV-m Toegankelijkheid voor bediening, identificatie en onderhoud (513 en 514).	0

Controlepunten meting en beproeving (NEN1010)	Aantal bevindingen
CA-a Het ononderbroken zijn van geleiders (61.3.2);	0
CA-b Isolati weerstand van de elektrische installatie (61.3.3);	0
CA-c Bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (61.3.4);	Niet van toepassing
CA-d Isolati weerstand van vloeren en wanden (61.3.5);	Niet van toepassing
CA-e Automatische uitschakeling van de voeding (61.3.6);	0
CA-f Aanvullende bescherming (61.3.7);	0
CA-g Bepaling van de polariteit (61.3.8);	0
CA-h Controle op de fasevolgorde (61.3.9);	0
CA-i Functionele en operationele beproevingen (61.3.10);	0
CA-j Spanningsverlies (61.3.11).	0

Bevingingen verdeelinrichtingen

Er is middels visuele controle, metingen en beproevingen gecontroleerd of de verdeelinrichting(en) voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Verdeelinrichting:

Verdeler


Voorbeveiliging:

63 Amp.

Hoofdschakelaar:

63 Amp.

Foto verdeelinrichting

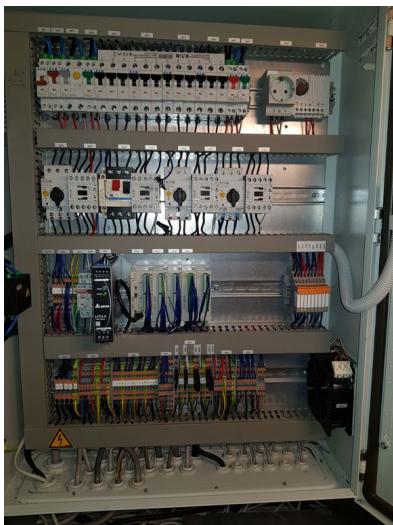

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.

Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Opmerkingen

*Gebreken zijn direct door opdrachtgever opgelost

Bevindingen overige installatiedelen

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Conclusie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Bijlage - Inspectie-interval

Factor A	A: Leeftijd van de installatie: A1 De installatie is jonger dan 10 jaar. 0
Factor B	B: Kwaliteit van de installatie: B2 Kwaliteit voldoet aan de jongste elektrotechnische normen. 2
Factor C	C: De omgeving waarin de installatie wordt gebruikt: C2 is niet schoon en droog of · bevat explosieve- en/of corrosieve gassen of · levert brandgevaar ten gevolge van stof op. · houdt het gebruik van transportmiddelen of zware materialen in. 10
Factor D	D: Personen die de installatie gebruiken: D2 niet specifiek elektrotechnisch opgeleid personeel waarbij in de opleiding aandacht is besteed aan de gevaren die verbonden zijn aan het werken met elektriciteit. 3
Factor E	E: Mate van toezicht: E2 Er wordt sporadisch toezicht gehouden door een installatieverantwoordelijke. 10
Totaal aantal punten Het totaal aantal punten is een opsomming van de punten van A t/m E. Door vervolgens figuur I.1 af te lezen, wordt het inspectie-interval bepaald.	
De inspectieinterval is vastgesteld op:	
25	
5 jaar	

Figuur I.1 — De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties

