


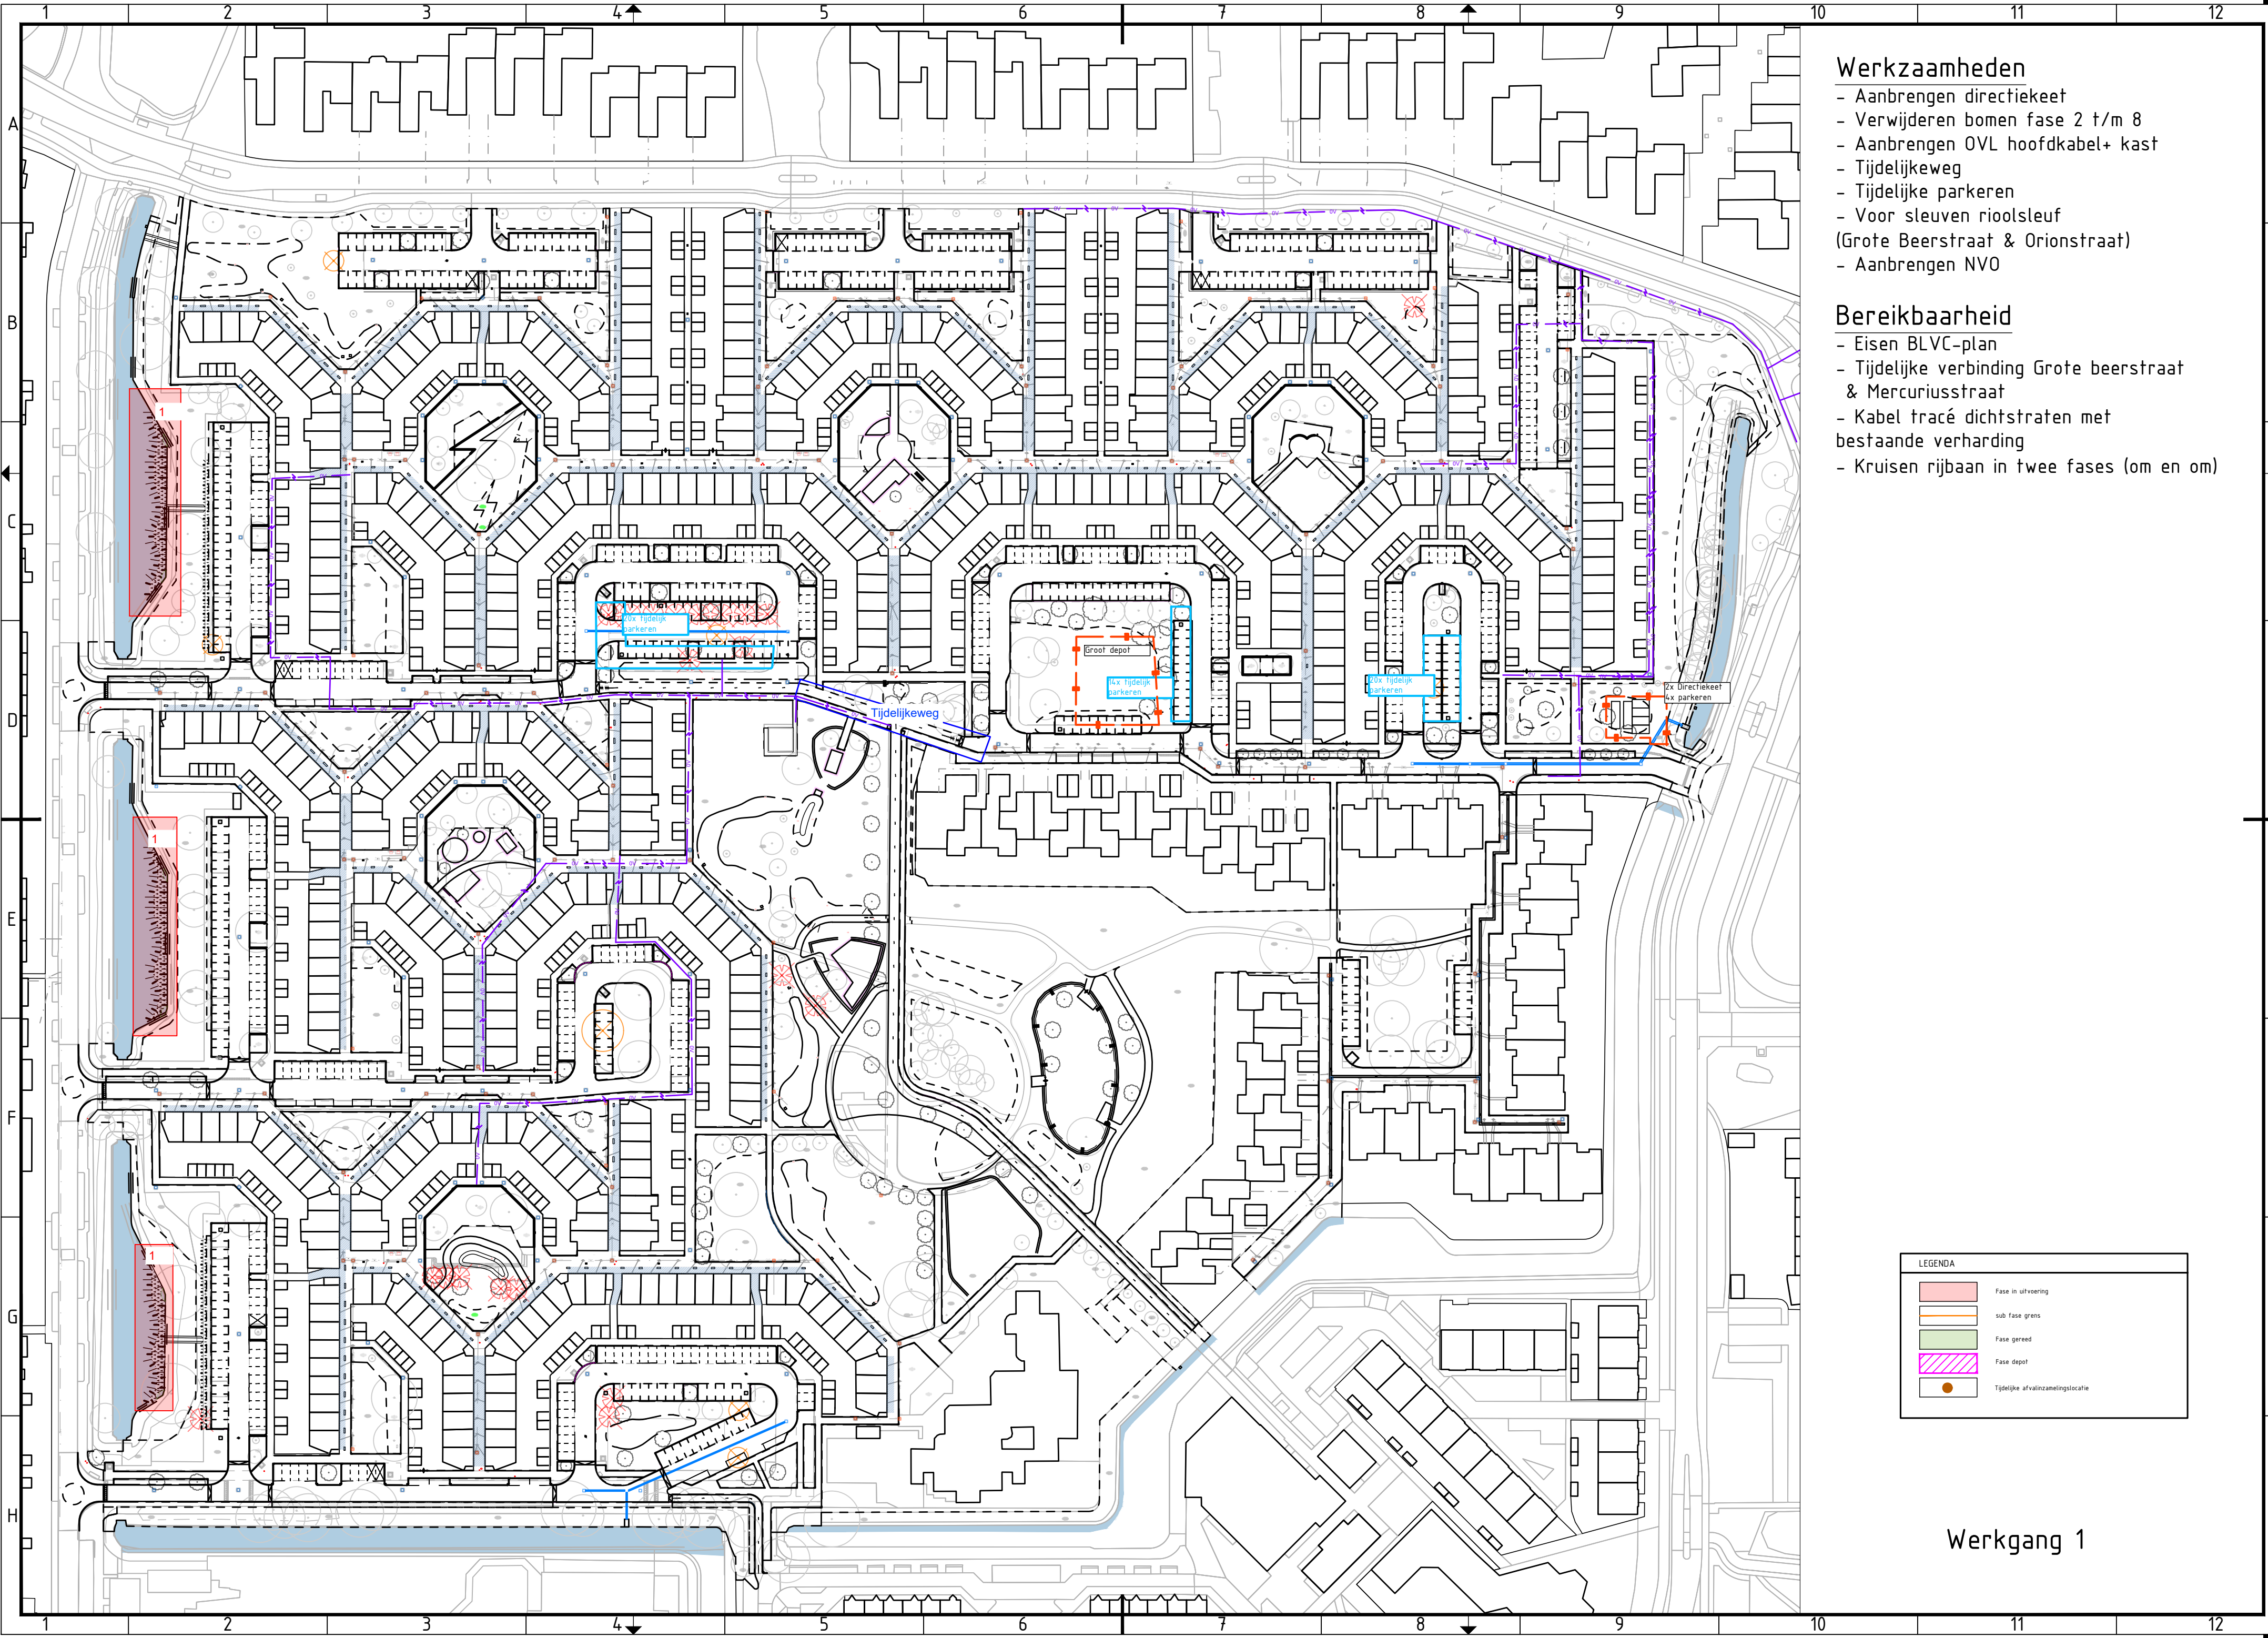


- Werkzaamheden**
- Aanbrengen directiekeet
 - Verwijderen bomen fase 2 t/m 8
 - Aanbrengen OVL hoofdkabel+ kast
 - Tijdelijkeweg
 - Tijdelijke parkeren
 - Voor sleuven rioolsleuf (Grote Beerstraat & Orionstraat)
 - Aanbrengen NVO

- Bereikbaarheid**
- Eisen BLVC-plan
 - Tijdelijke verbinding Grote beerstraat & Mercuriusstraat
 - Kabel tracé dichtstraten met bestaande verharding
 - Kruisen rijbaan in twee fases (om en om)

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 1

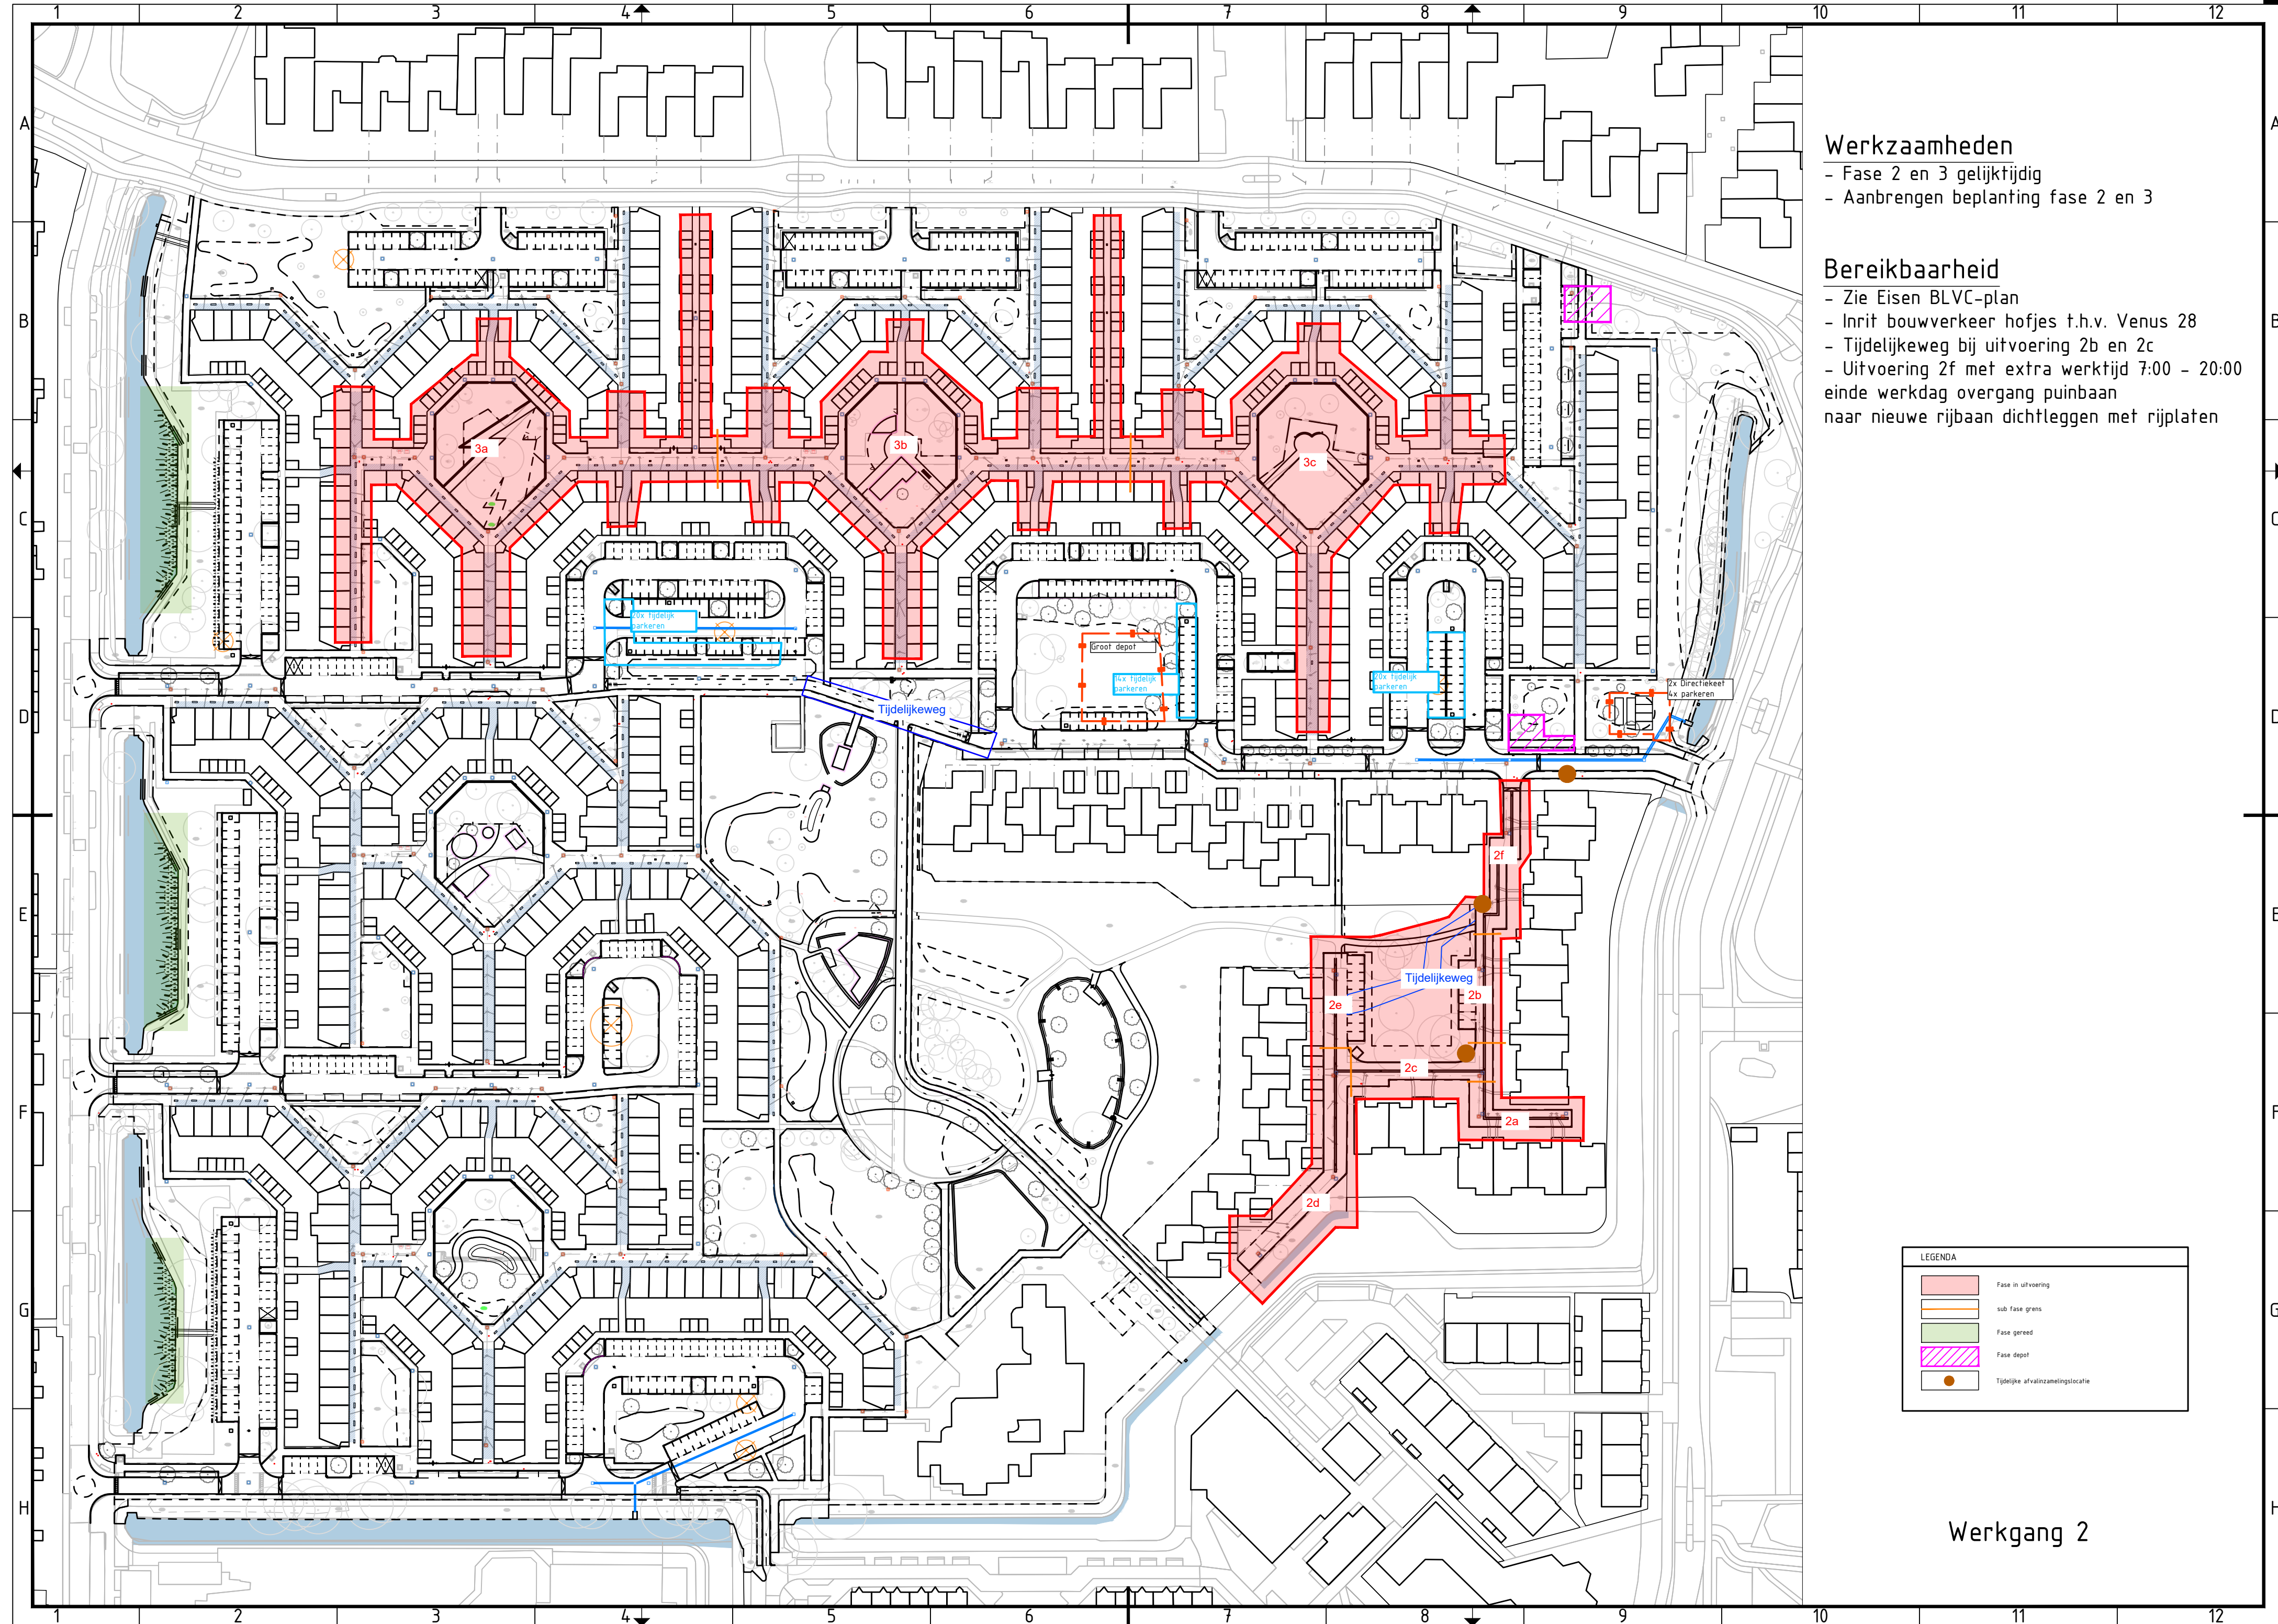

Werkzaamheden

- Fase 2 en 3 gelijktijdig
- Aanbrengen beplanting fase 2 en 3


Bereikbaarheid

- Zie Eisen BLVC-plan
 - Inrit bouwverkeer hofjes t.h.v. Venus 28
 - Tijdelijkeweg bij uitvoering 2b en 2c
 - Uitvoering 2f met extra werktijd 7:00 - 20:00
- einde werkdag overgang puinbaan
naar nieuwe rijbaan dichtleggen met rijplaten

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 2

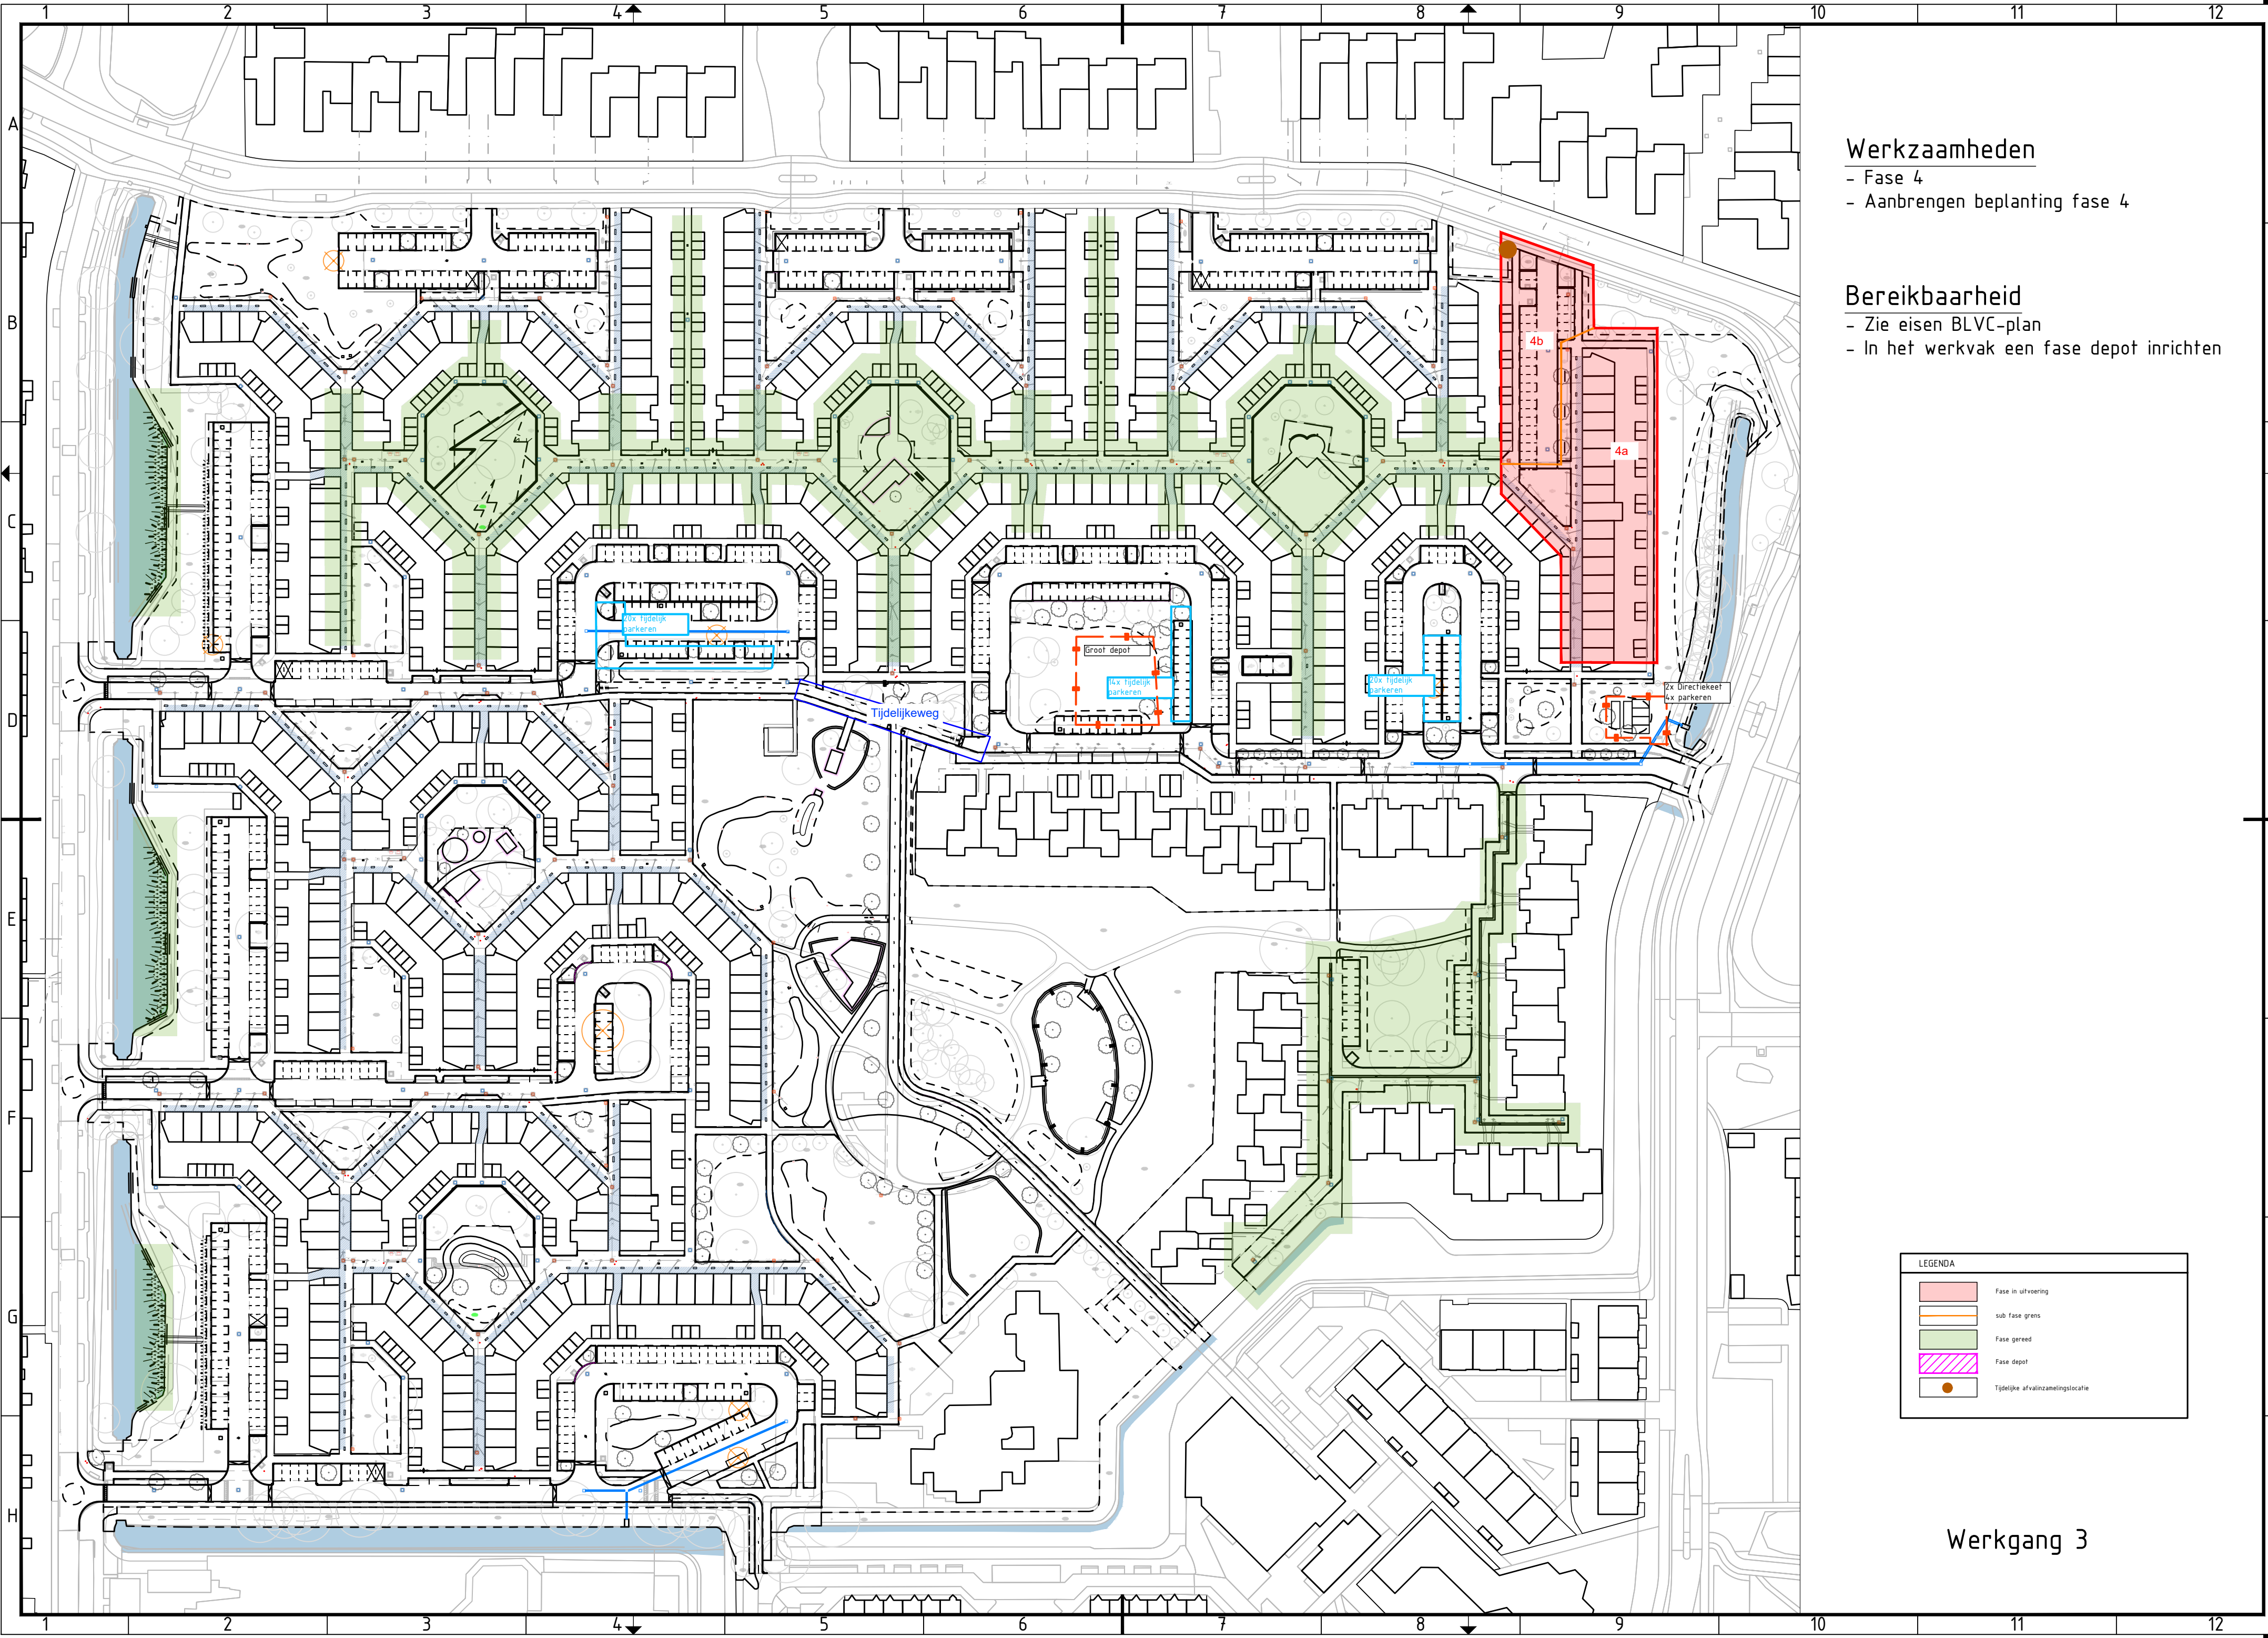


- Werkzaamheden**
- Fase 4
 - Aanbrengen beplanting fase 4

- Bereikbaarheid**
- Zie eisen BLVC-plan
 - In het werkvak een fase depot inrichten

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalverzamelingslocatie

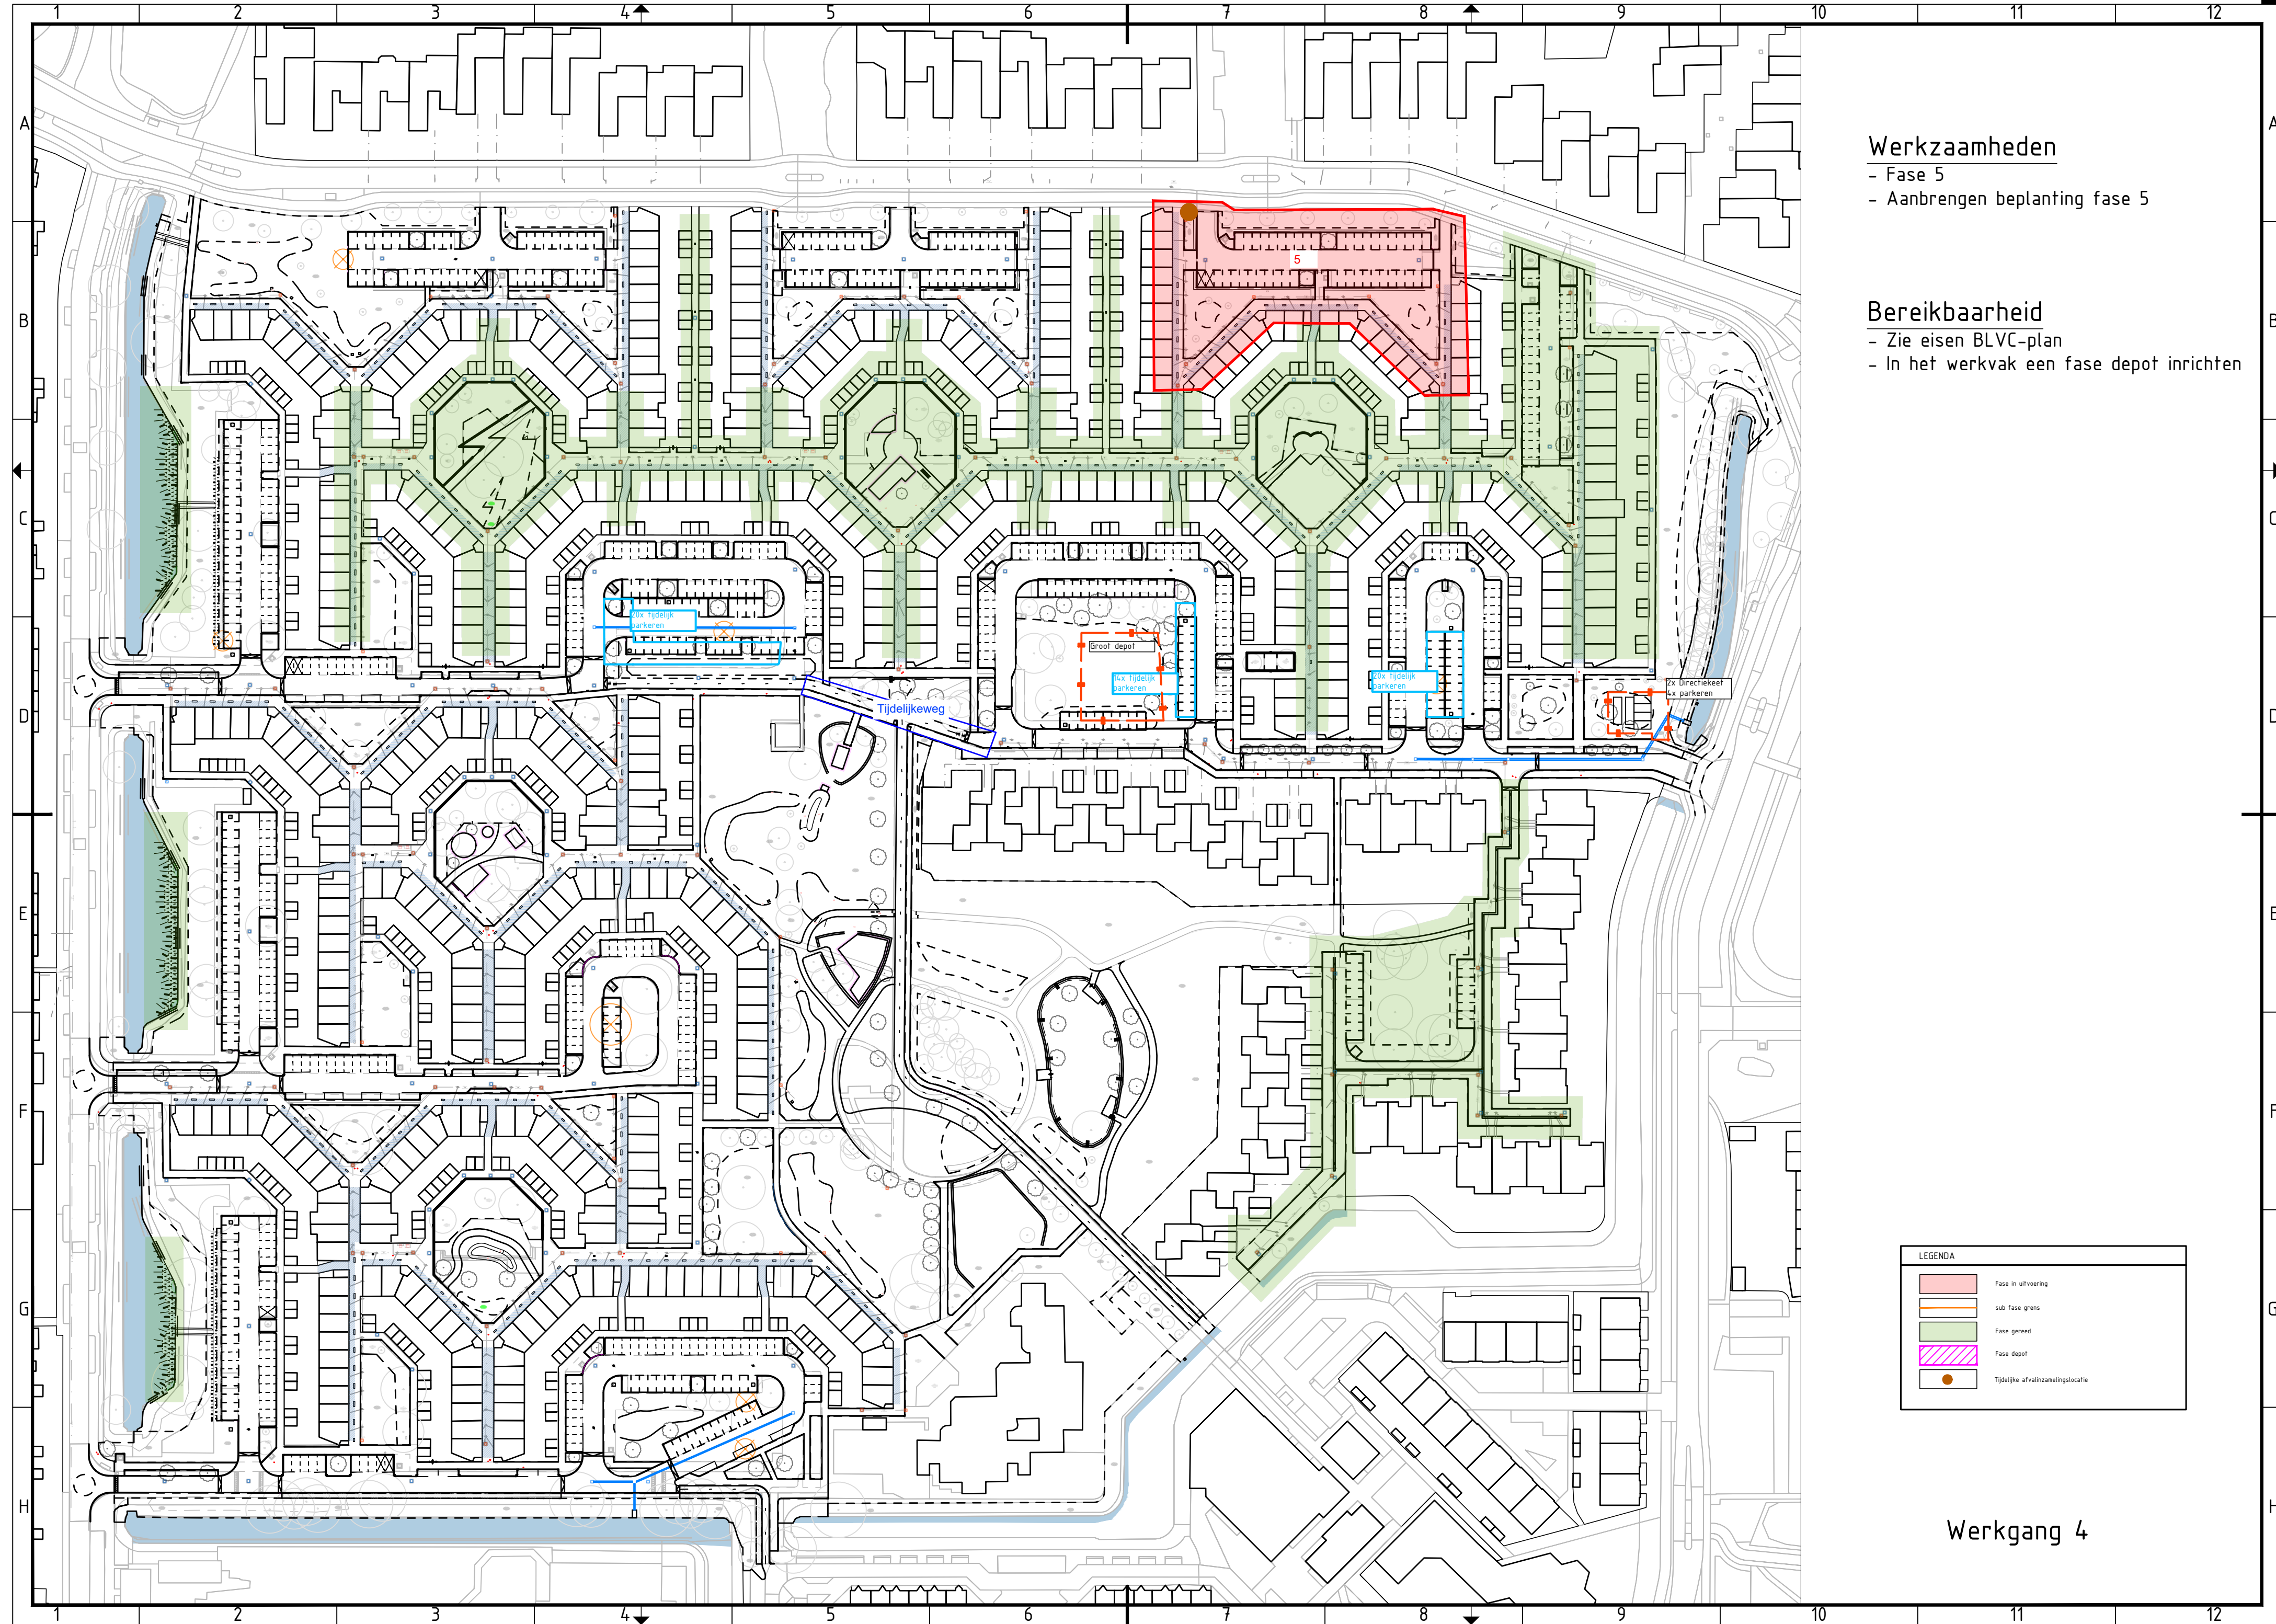

Werkzaamheden

- Fase 5
- Aanbrengen beplanting fase 5


Bereikbaarheid

- Zie eisen BLVC-plan
- In het werkvak een fase depot inrichten

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 4

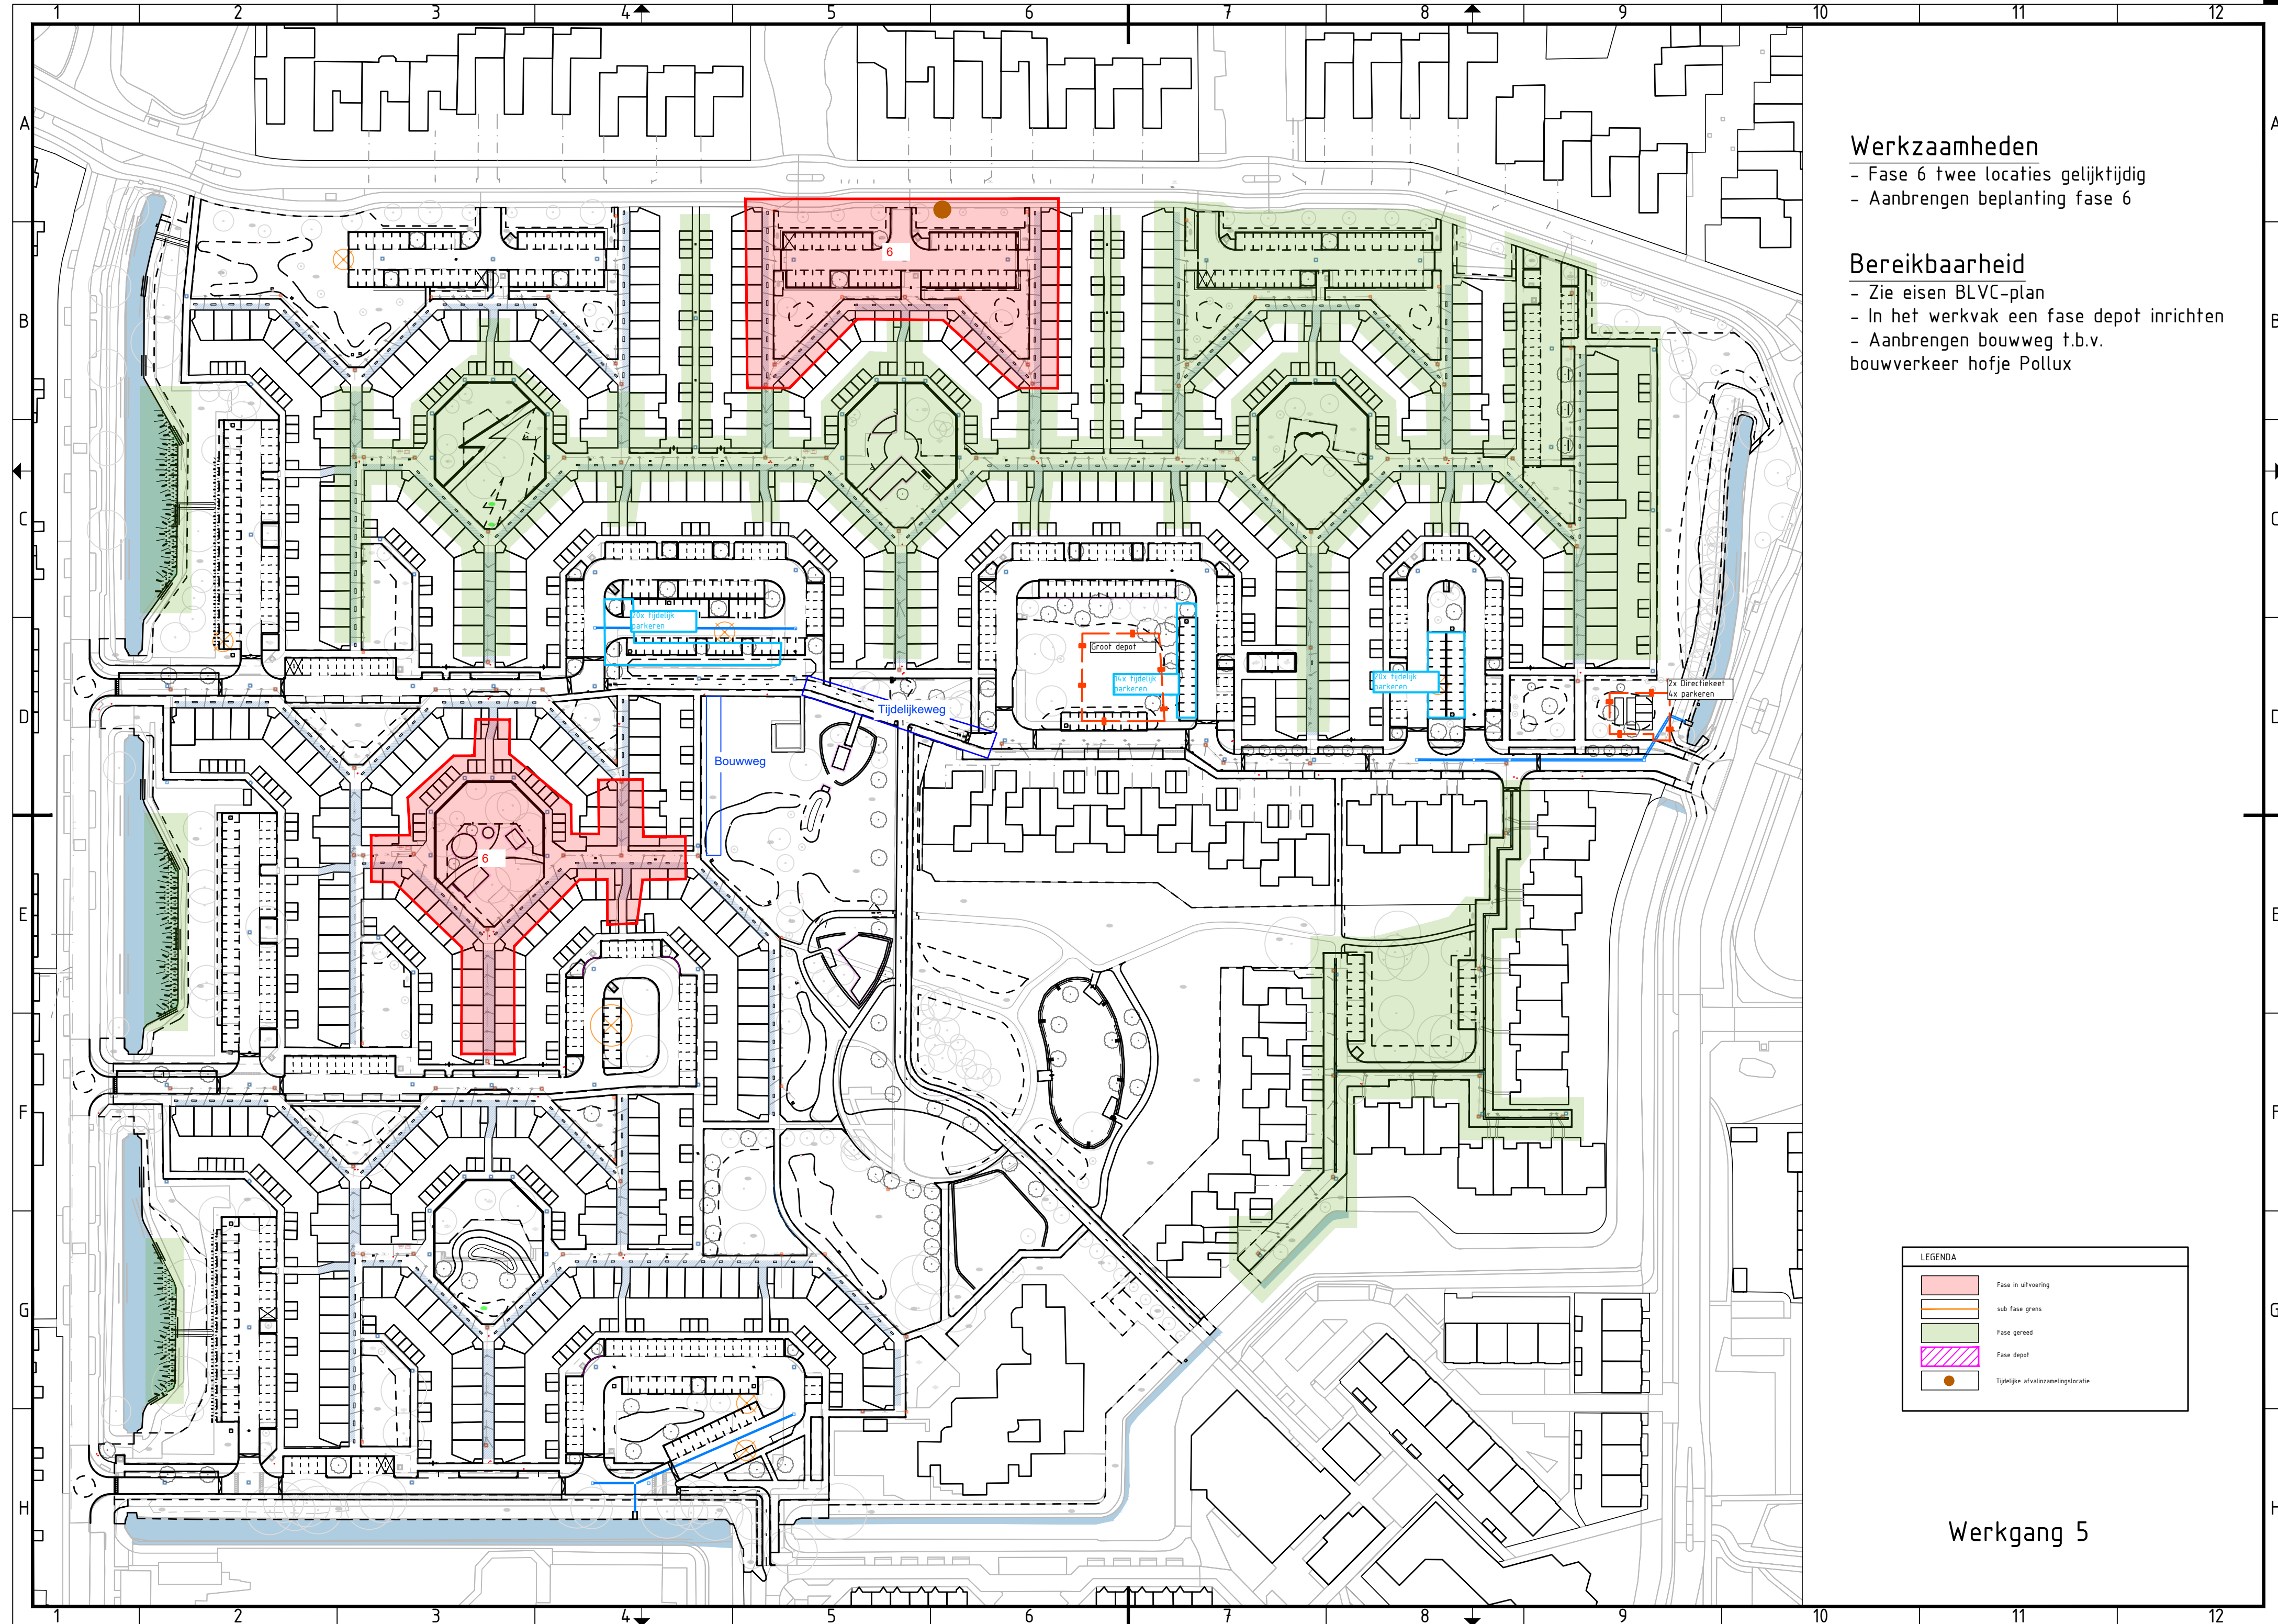

Werkzaamheden

- Fase 6 twee locaties gelijktijdig
- Aanbrengen beplanting fase 6


Bereikbaarheid


- Zie eisen BLVC-plan
- In het werkvak een fase depot inrichten
- Aanbrengen bouwweg t.b.v. bouwverkeer hofje Pollux

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 5

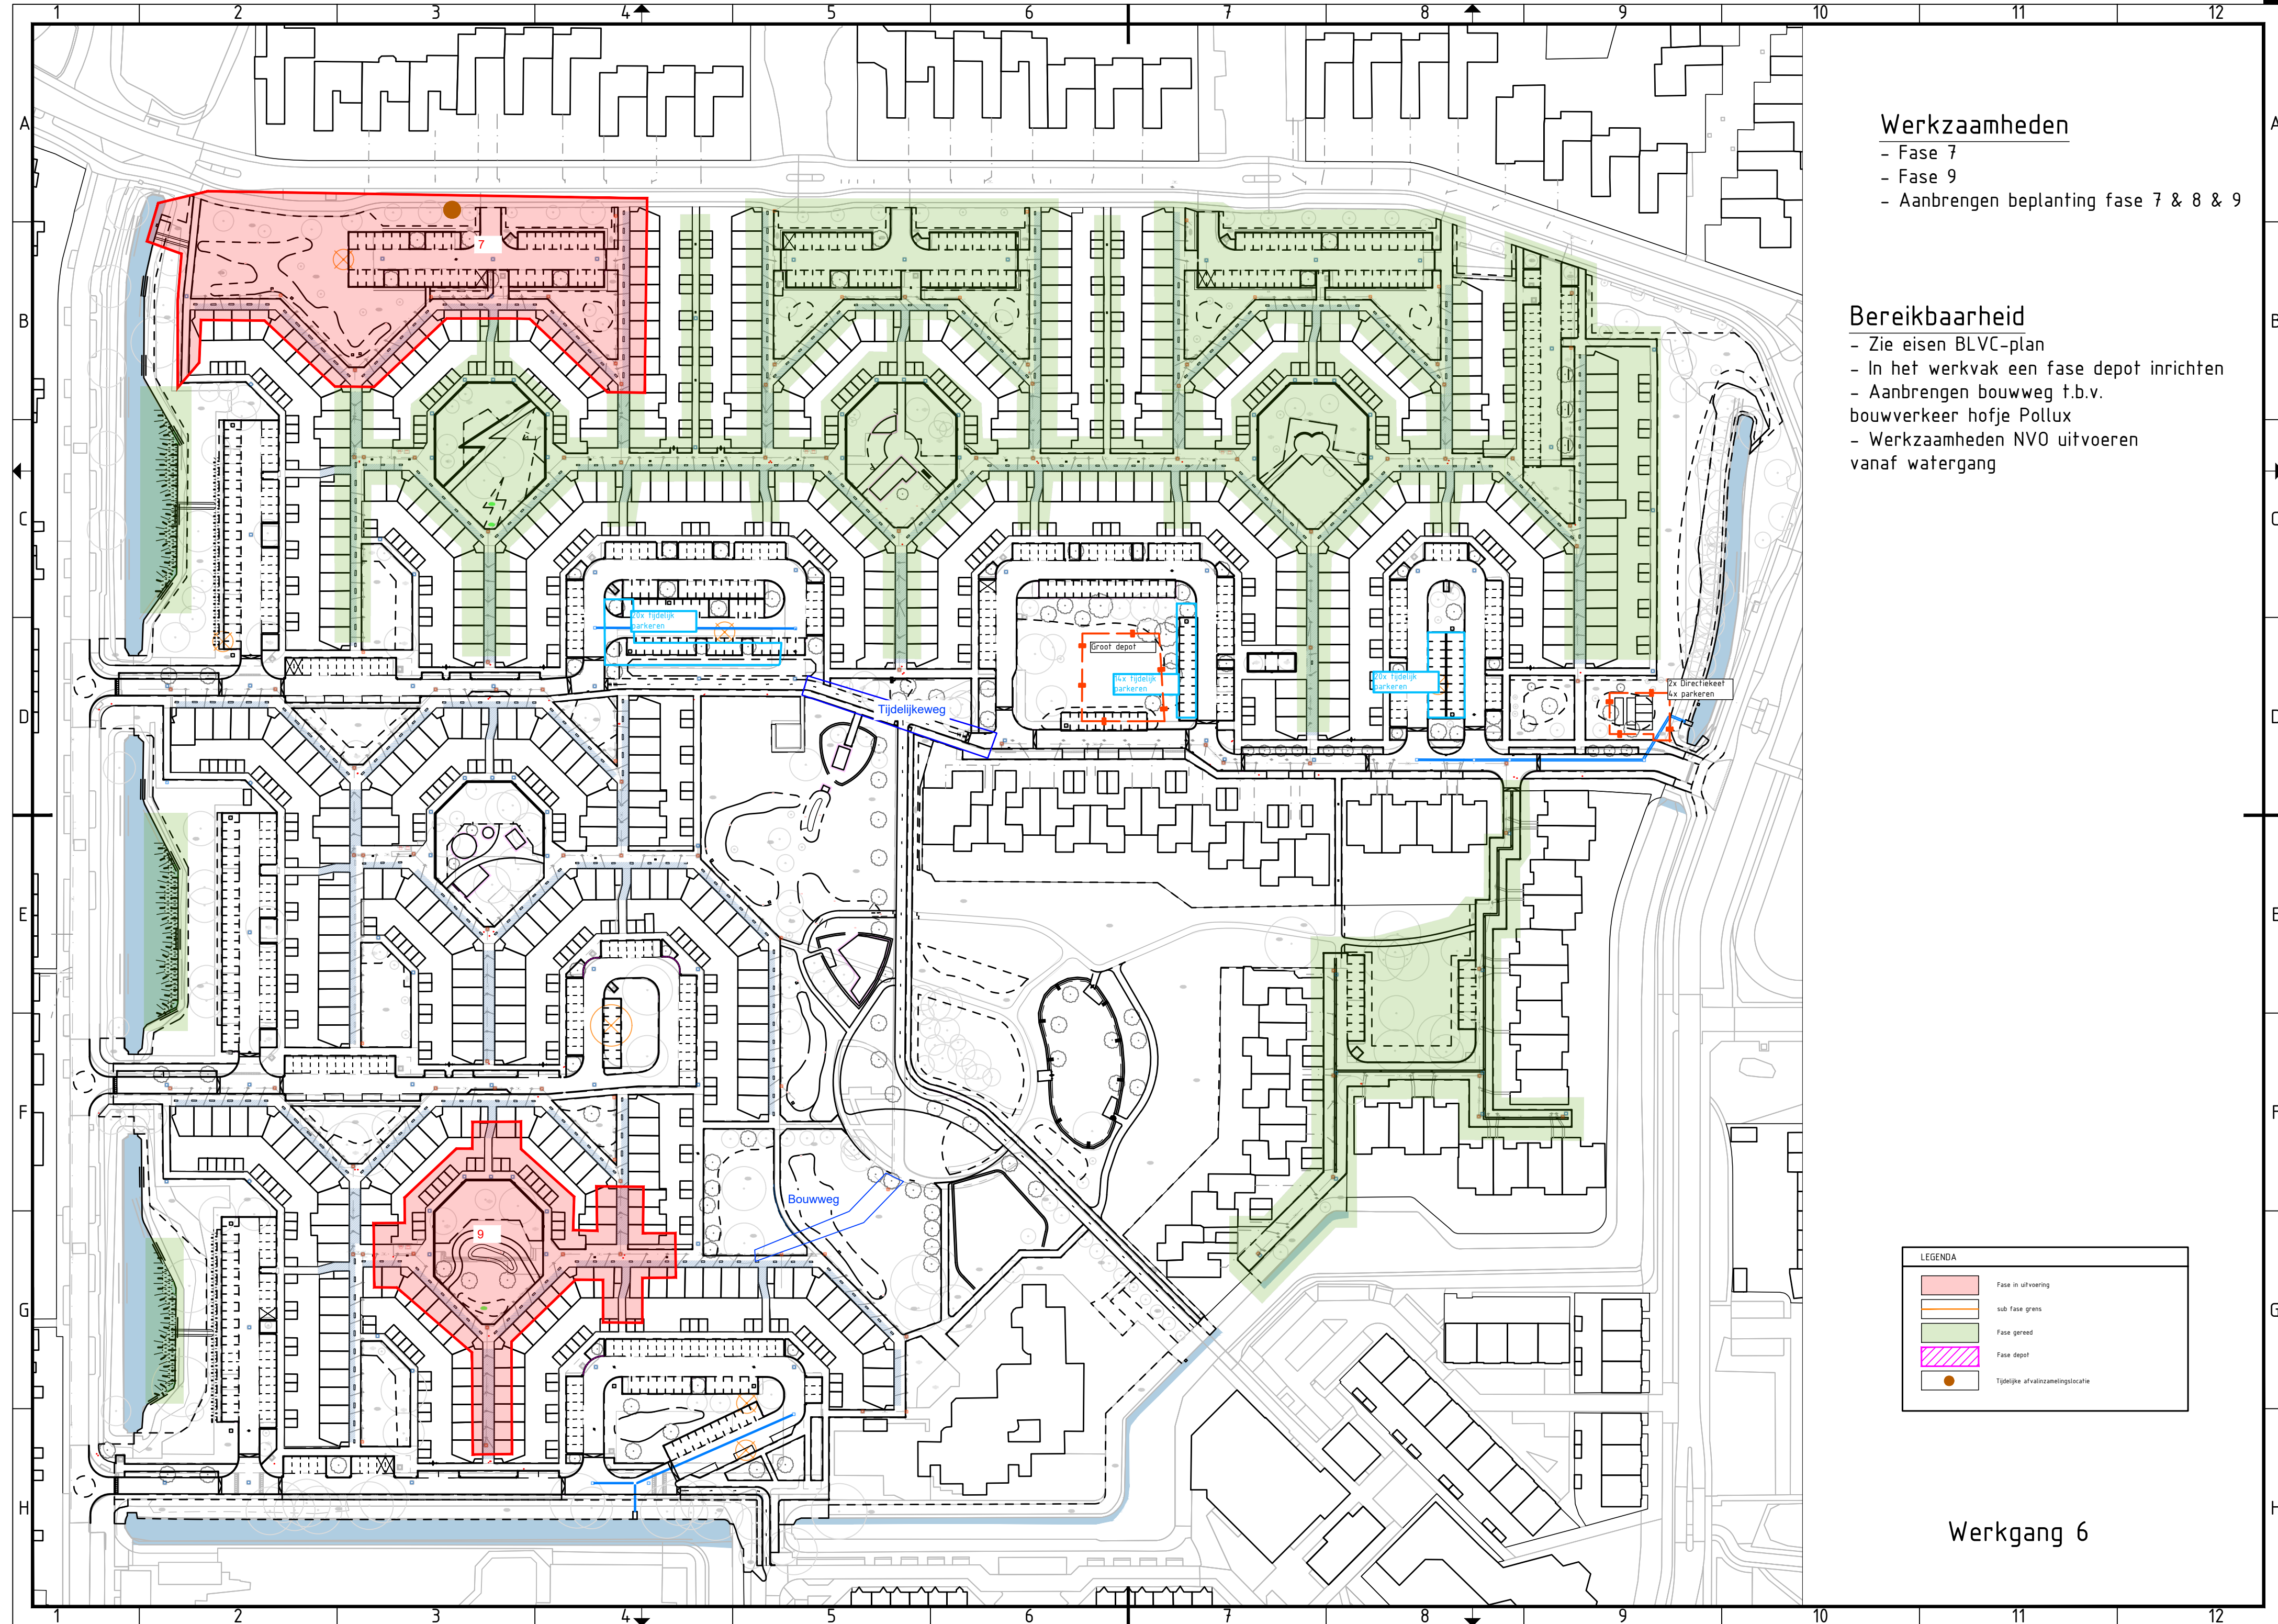

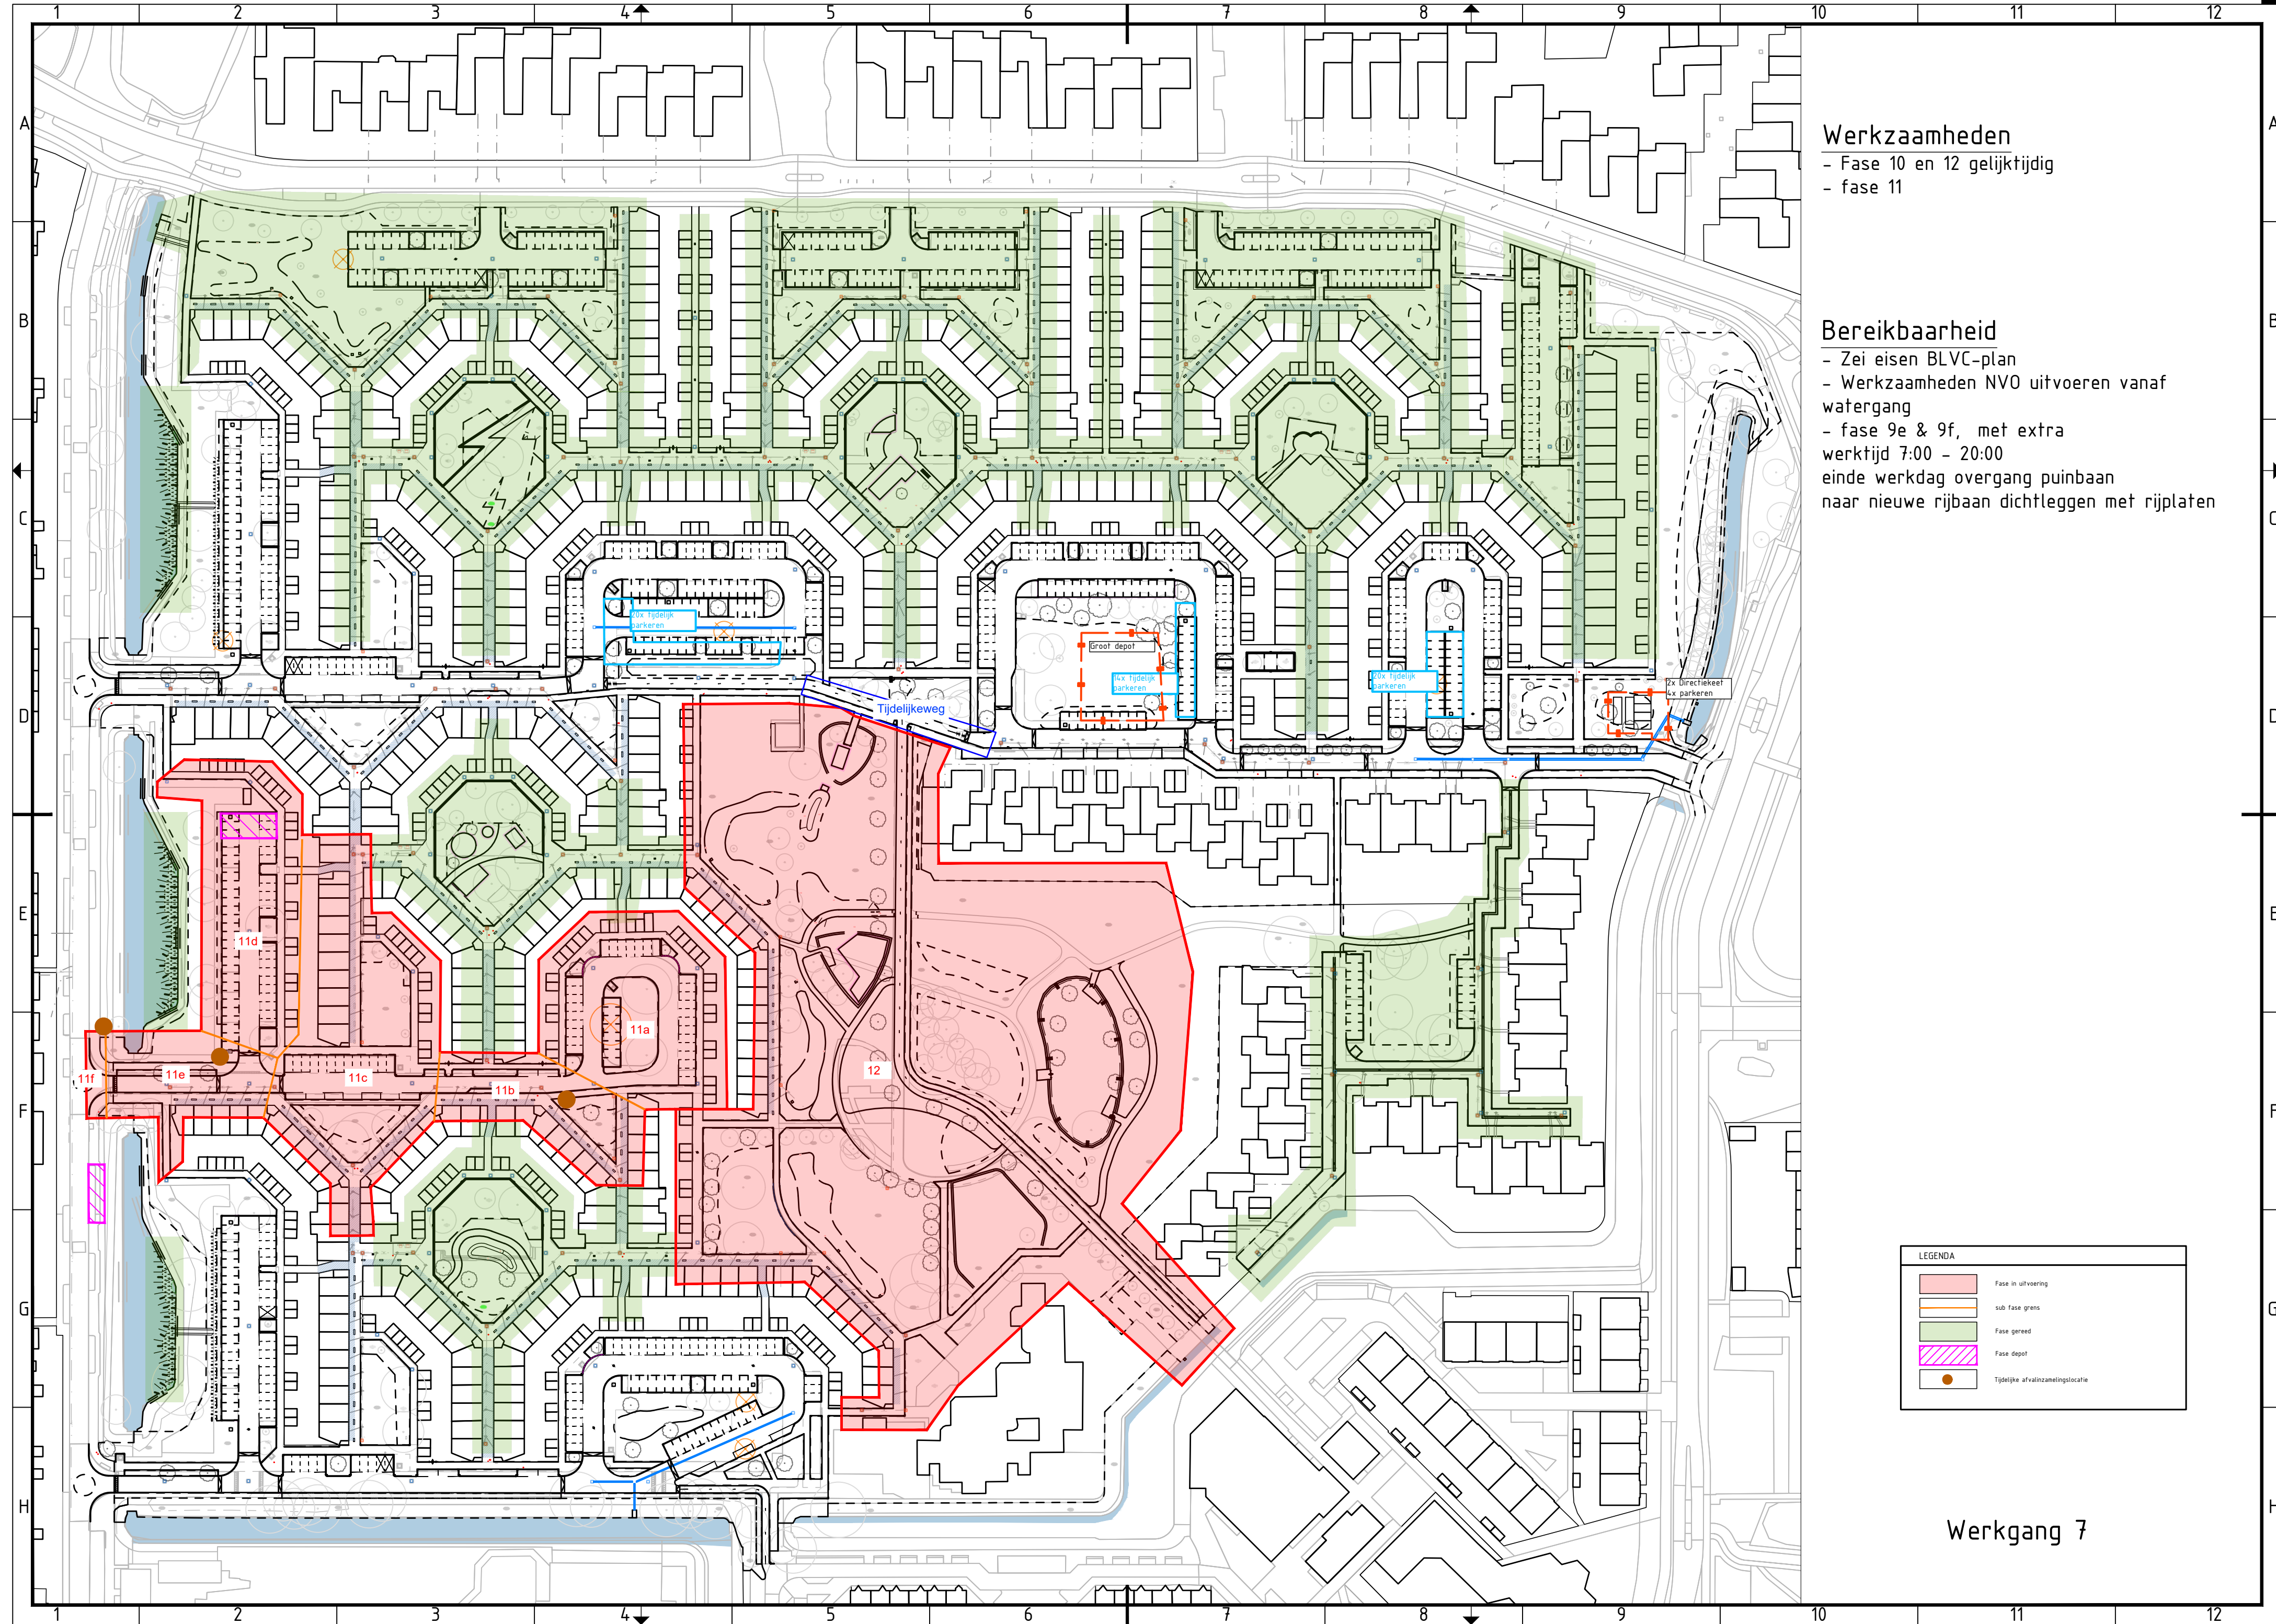

Werkzaamheden

- Fase 10 en 12 gelijktijdig
- fase 11


Bereikbaarheid

- Zei eisen BLVC-plan
- Werkzaamheden NVO uitvoeren vanaf watergang
- fase 9e & 9f, met extra werktijd 7:00 - 20:00
- einde werkdag overgang puinbaan naar nieuwe rijbaan dichtleggen met rijplaten

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 7

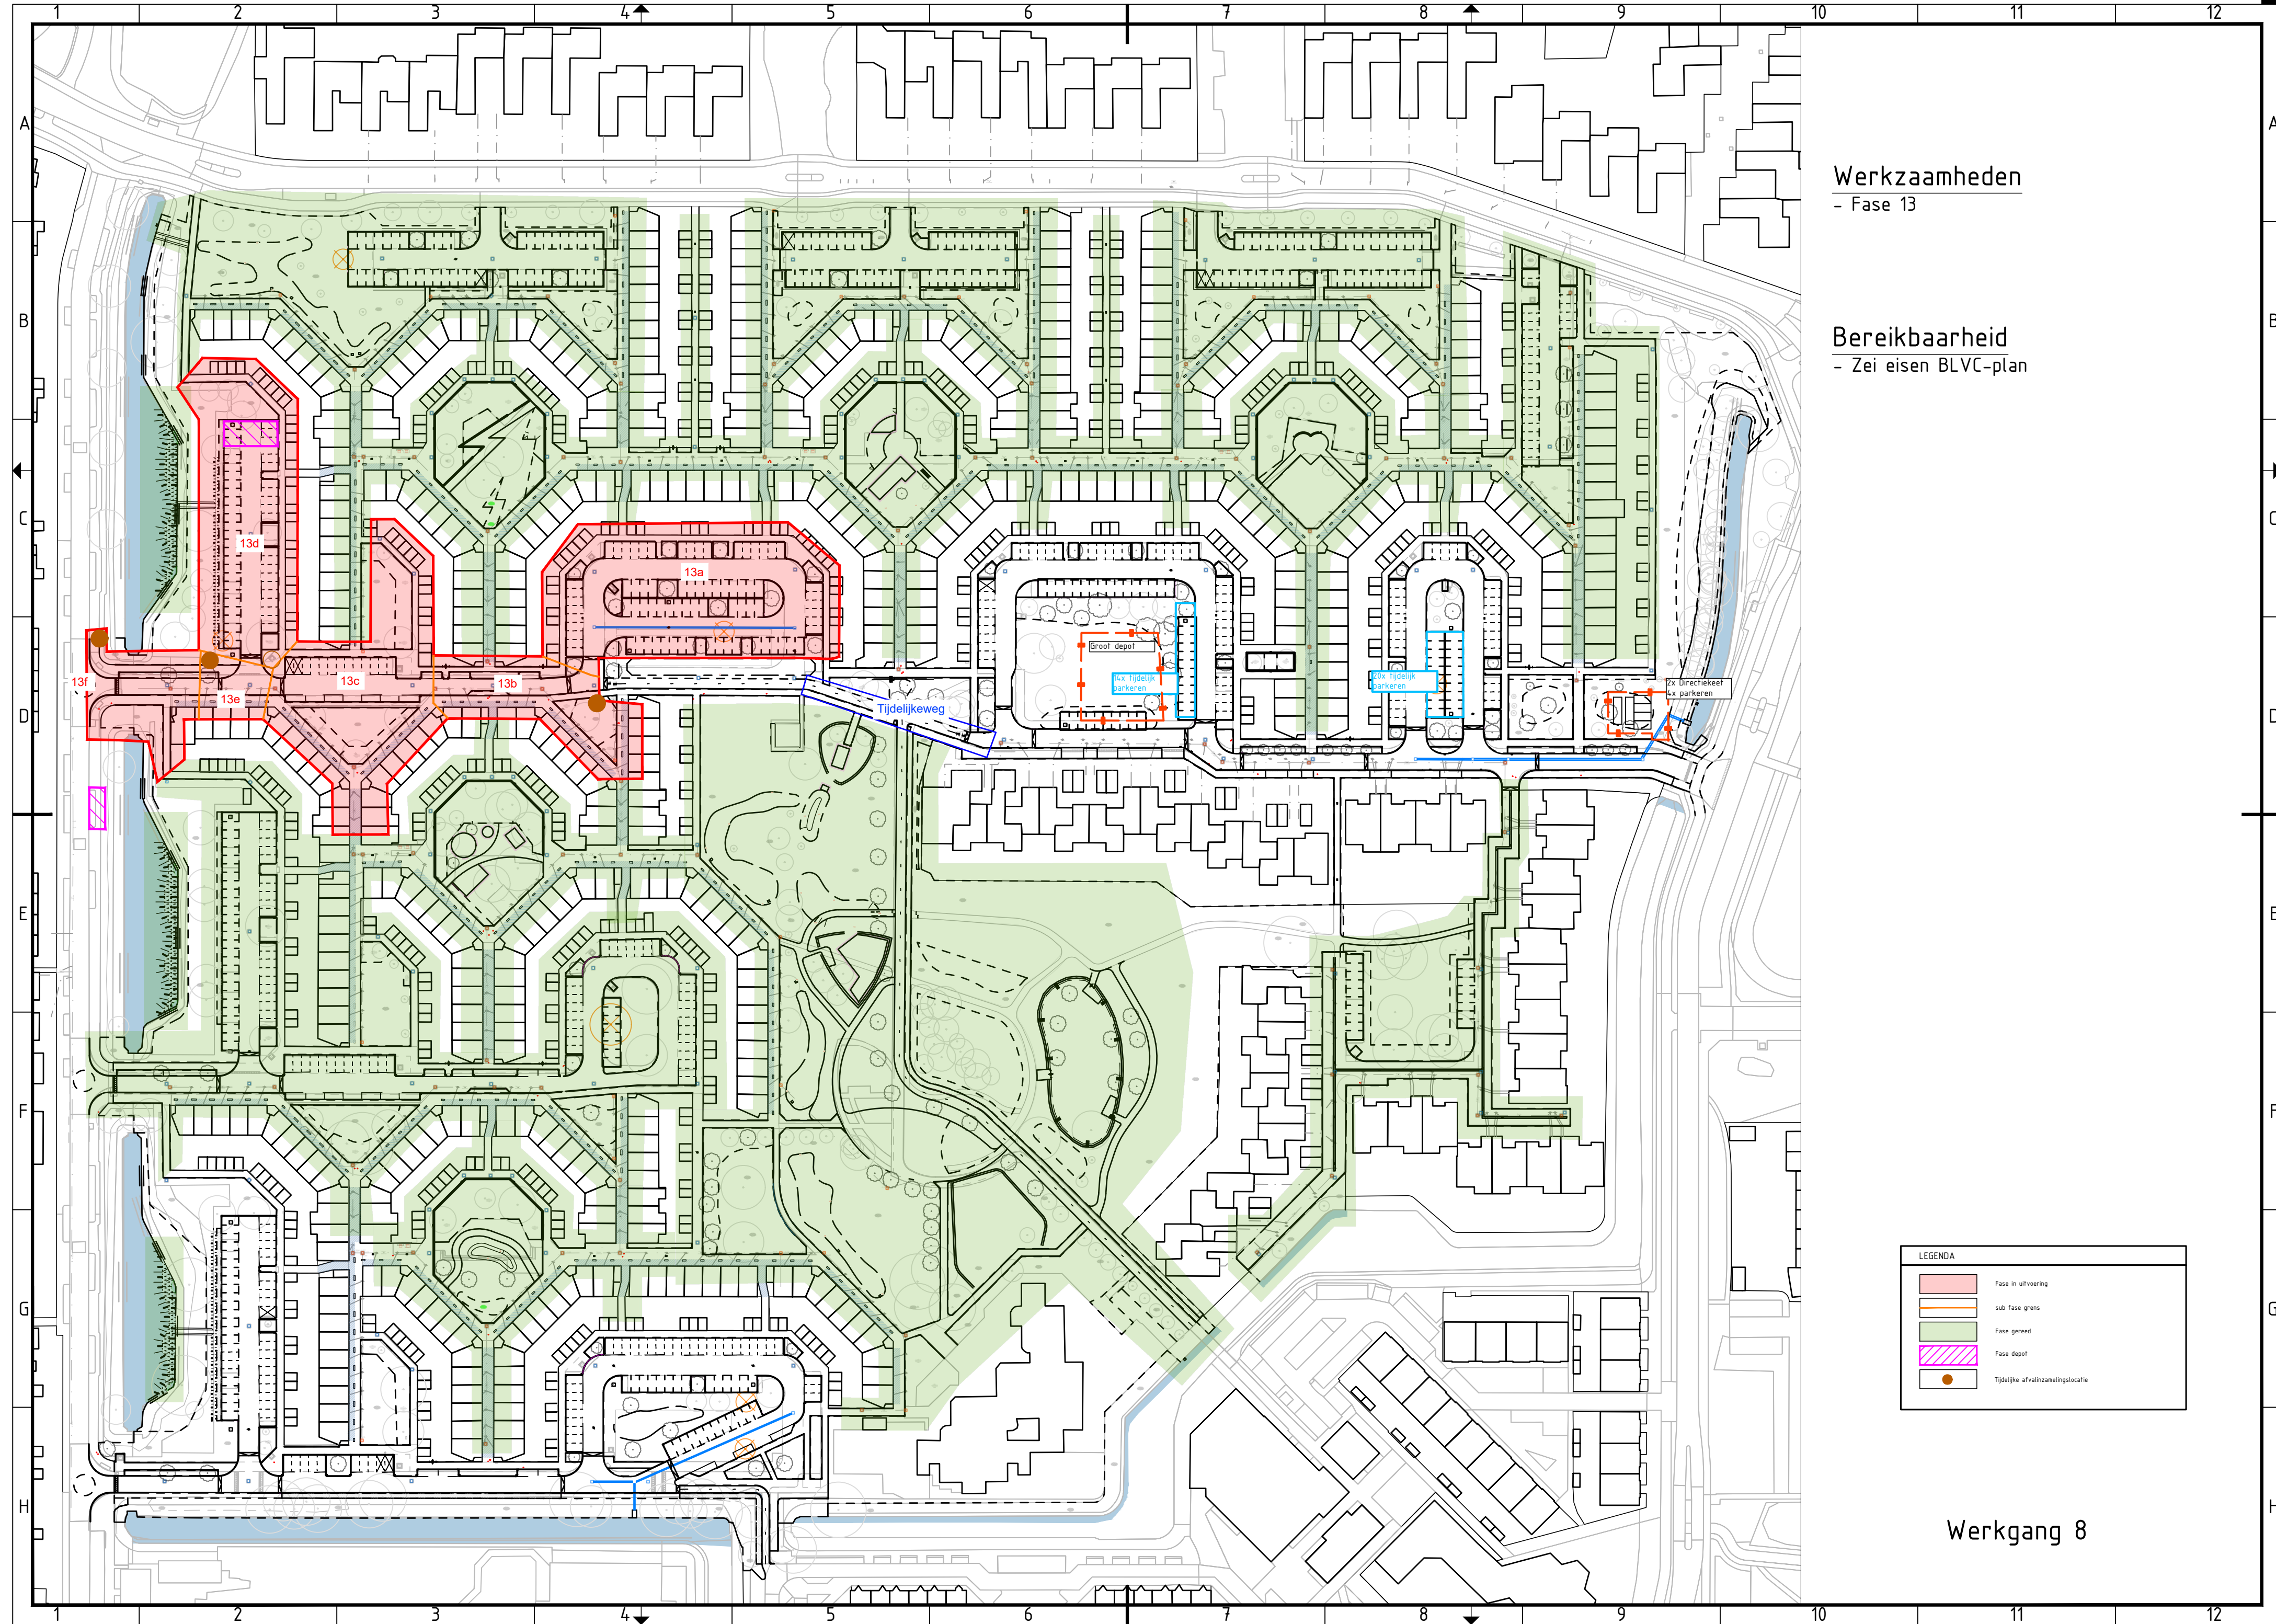


Werkzaamheden

- Fase 13

Bereikbaarheid

Werkgang 8

I
G
Shema : C:\temp\98M 98Q\BIB7N4 Medical citation Shemabibust MIDPAG DI V' shan M' Tekomah E nashon Shemobusuf BIB7N4 BUN N' C' YNNH+ Emation date

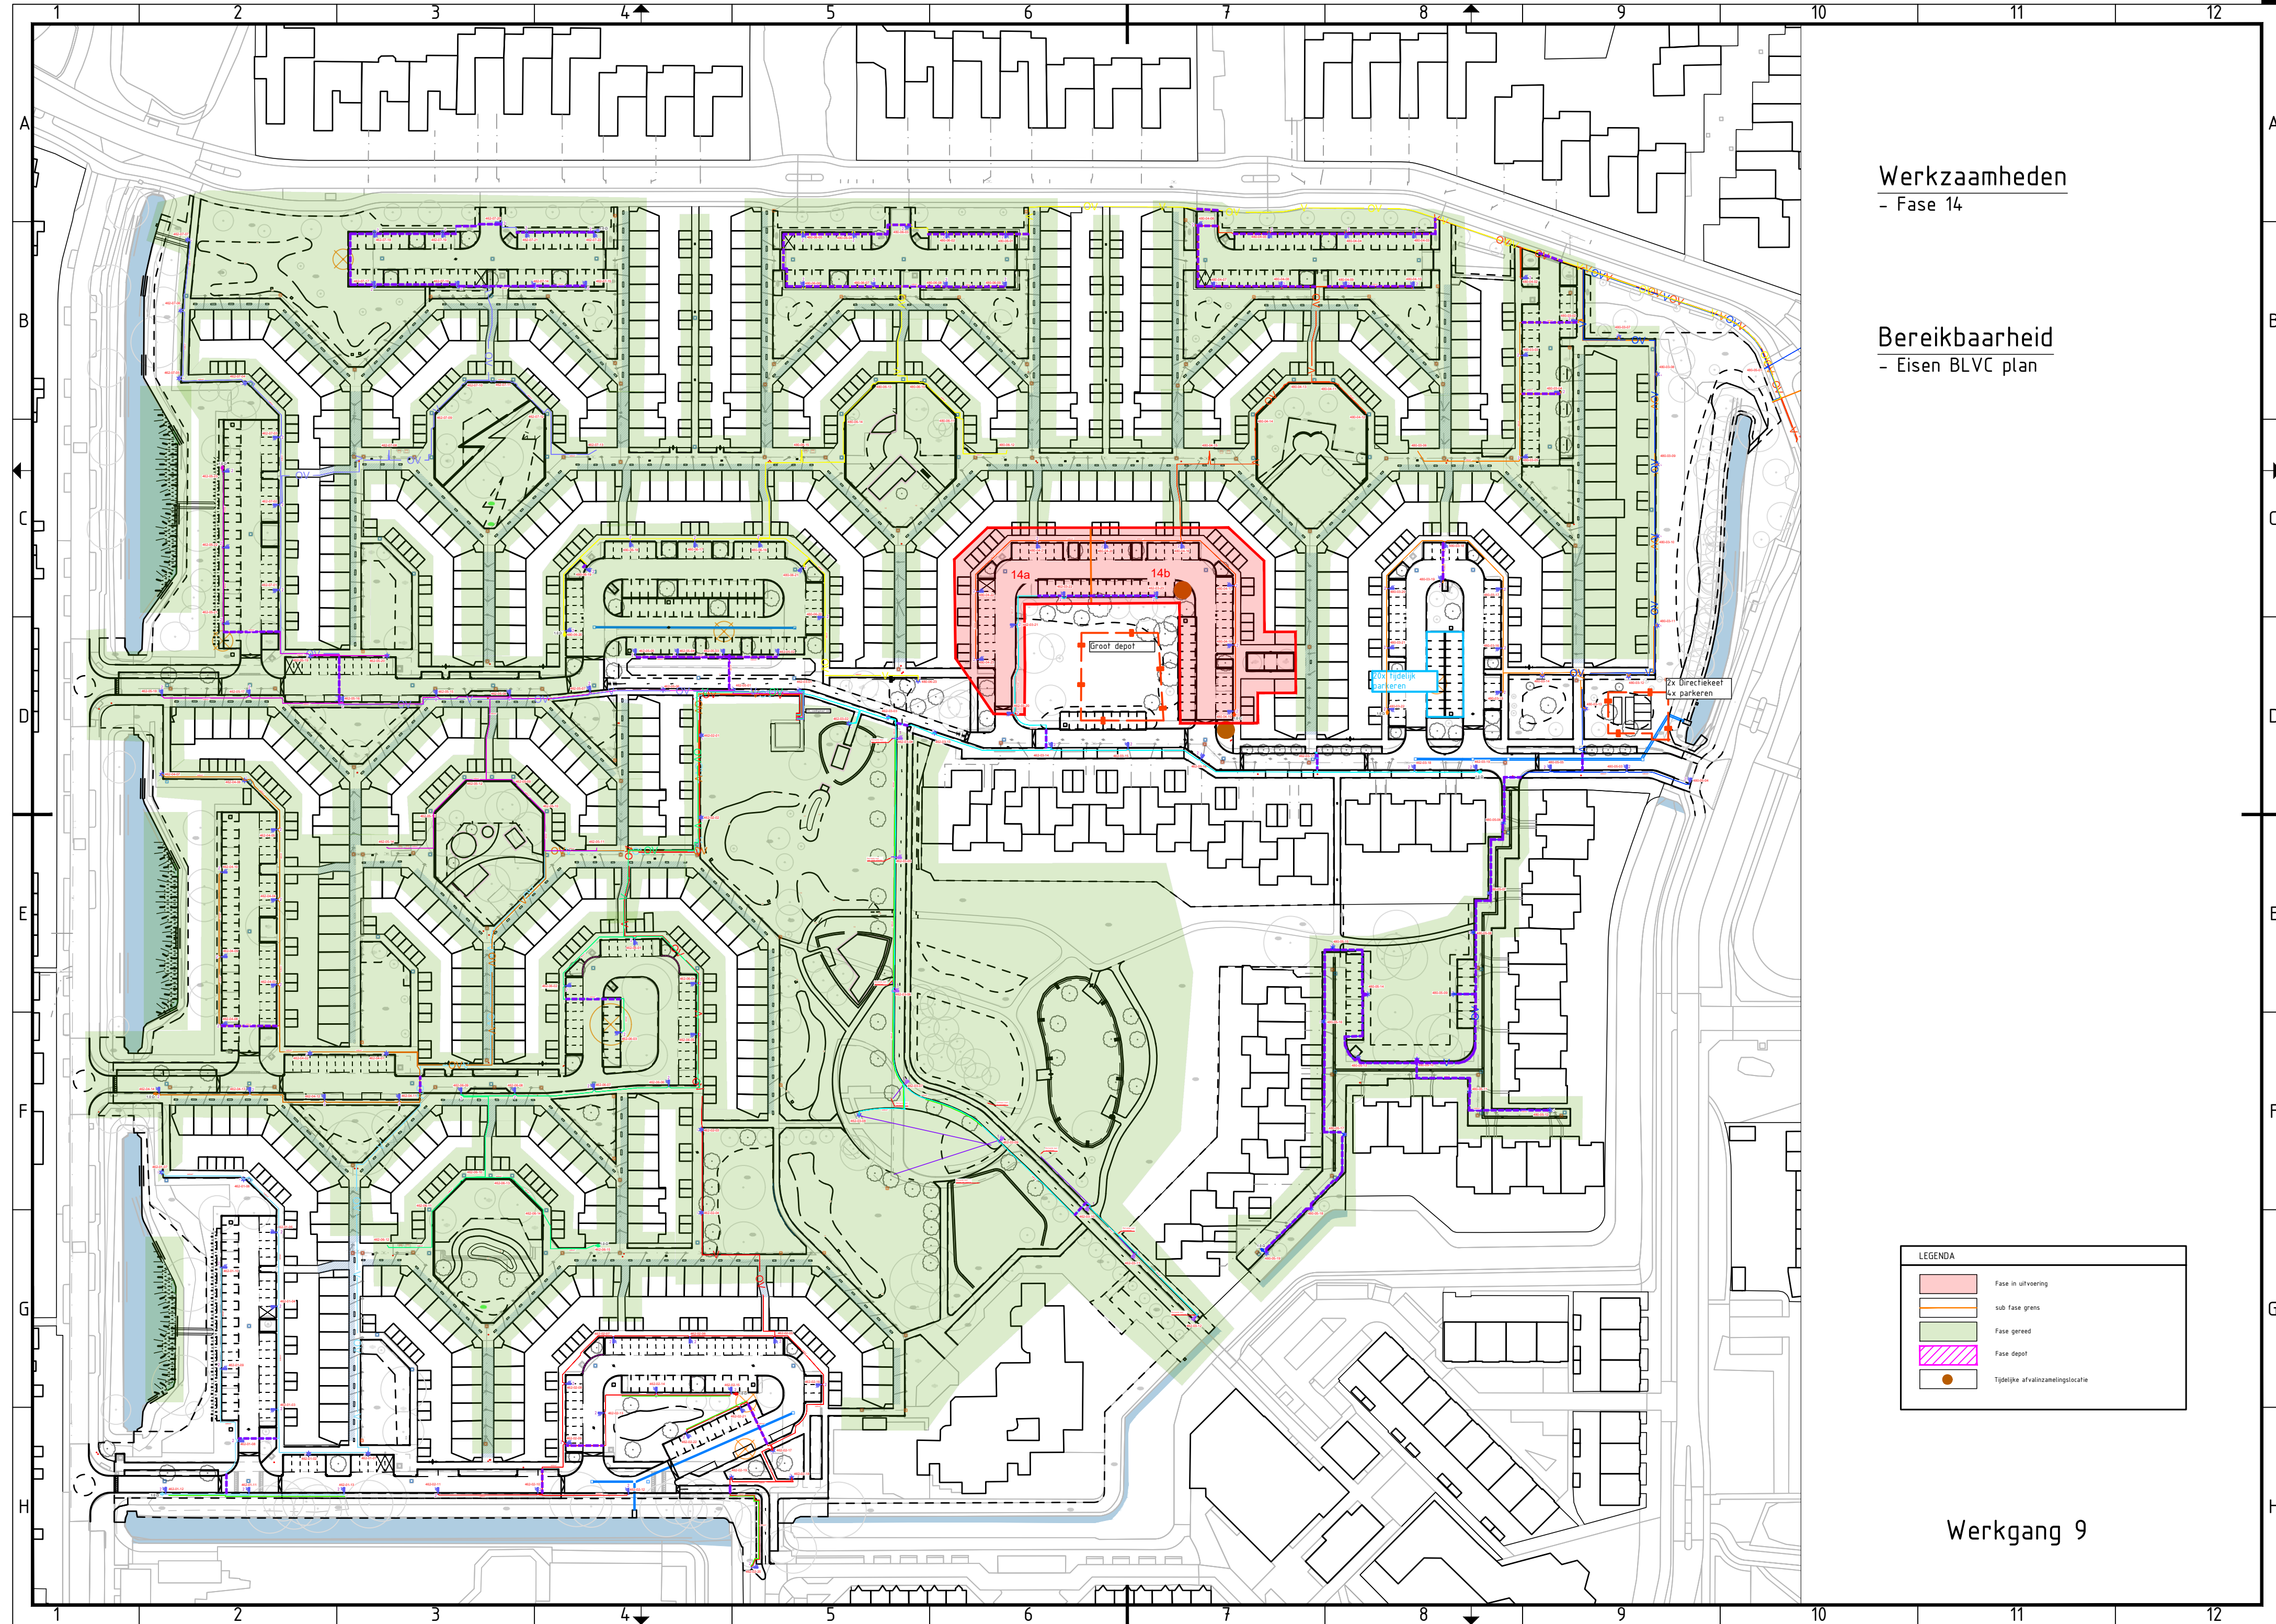

Werkzaamheden

- Fase 14


Bereikbaarheid

- Eisen BLVC plan

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot?
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 9



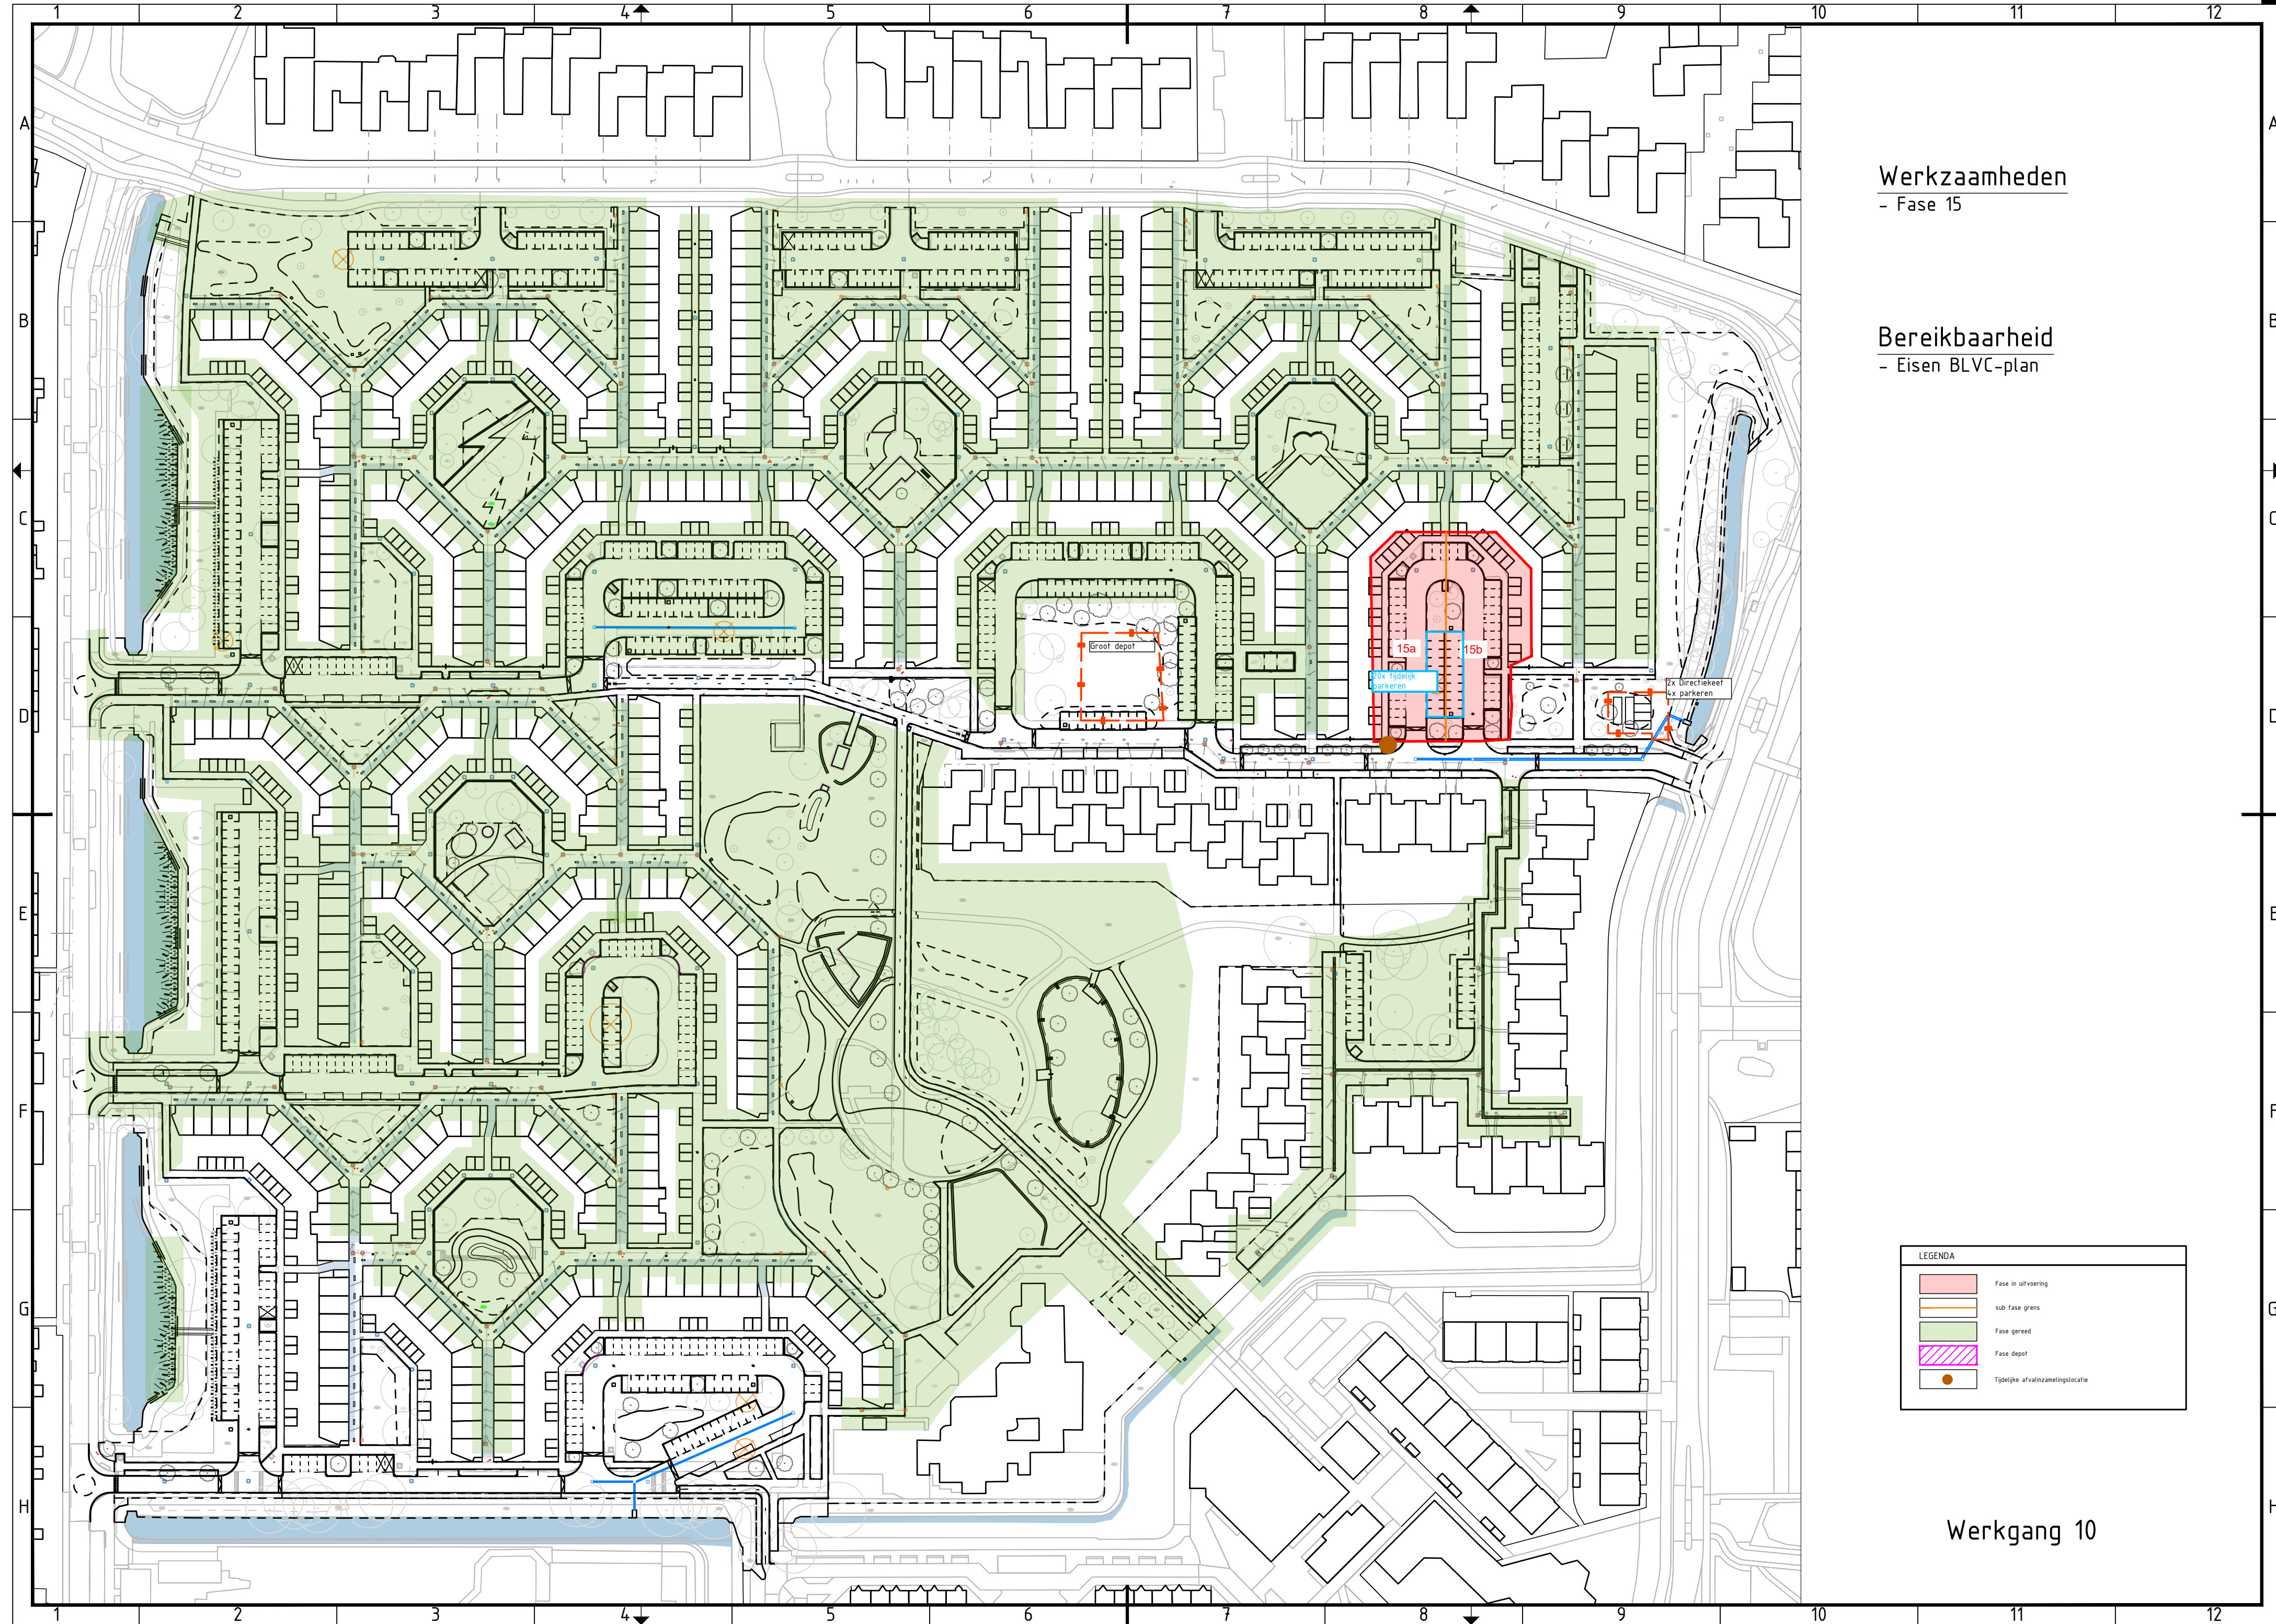


Werkzaamheden


- Fase 15

Bereikbaarheid

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 10

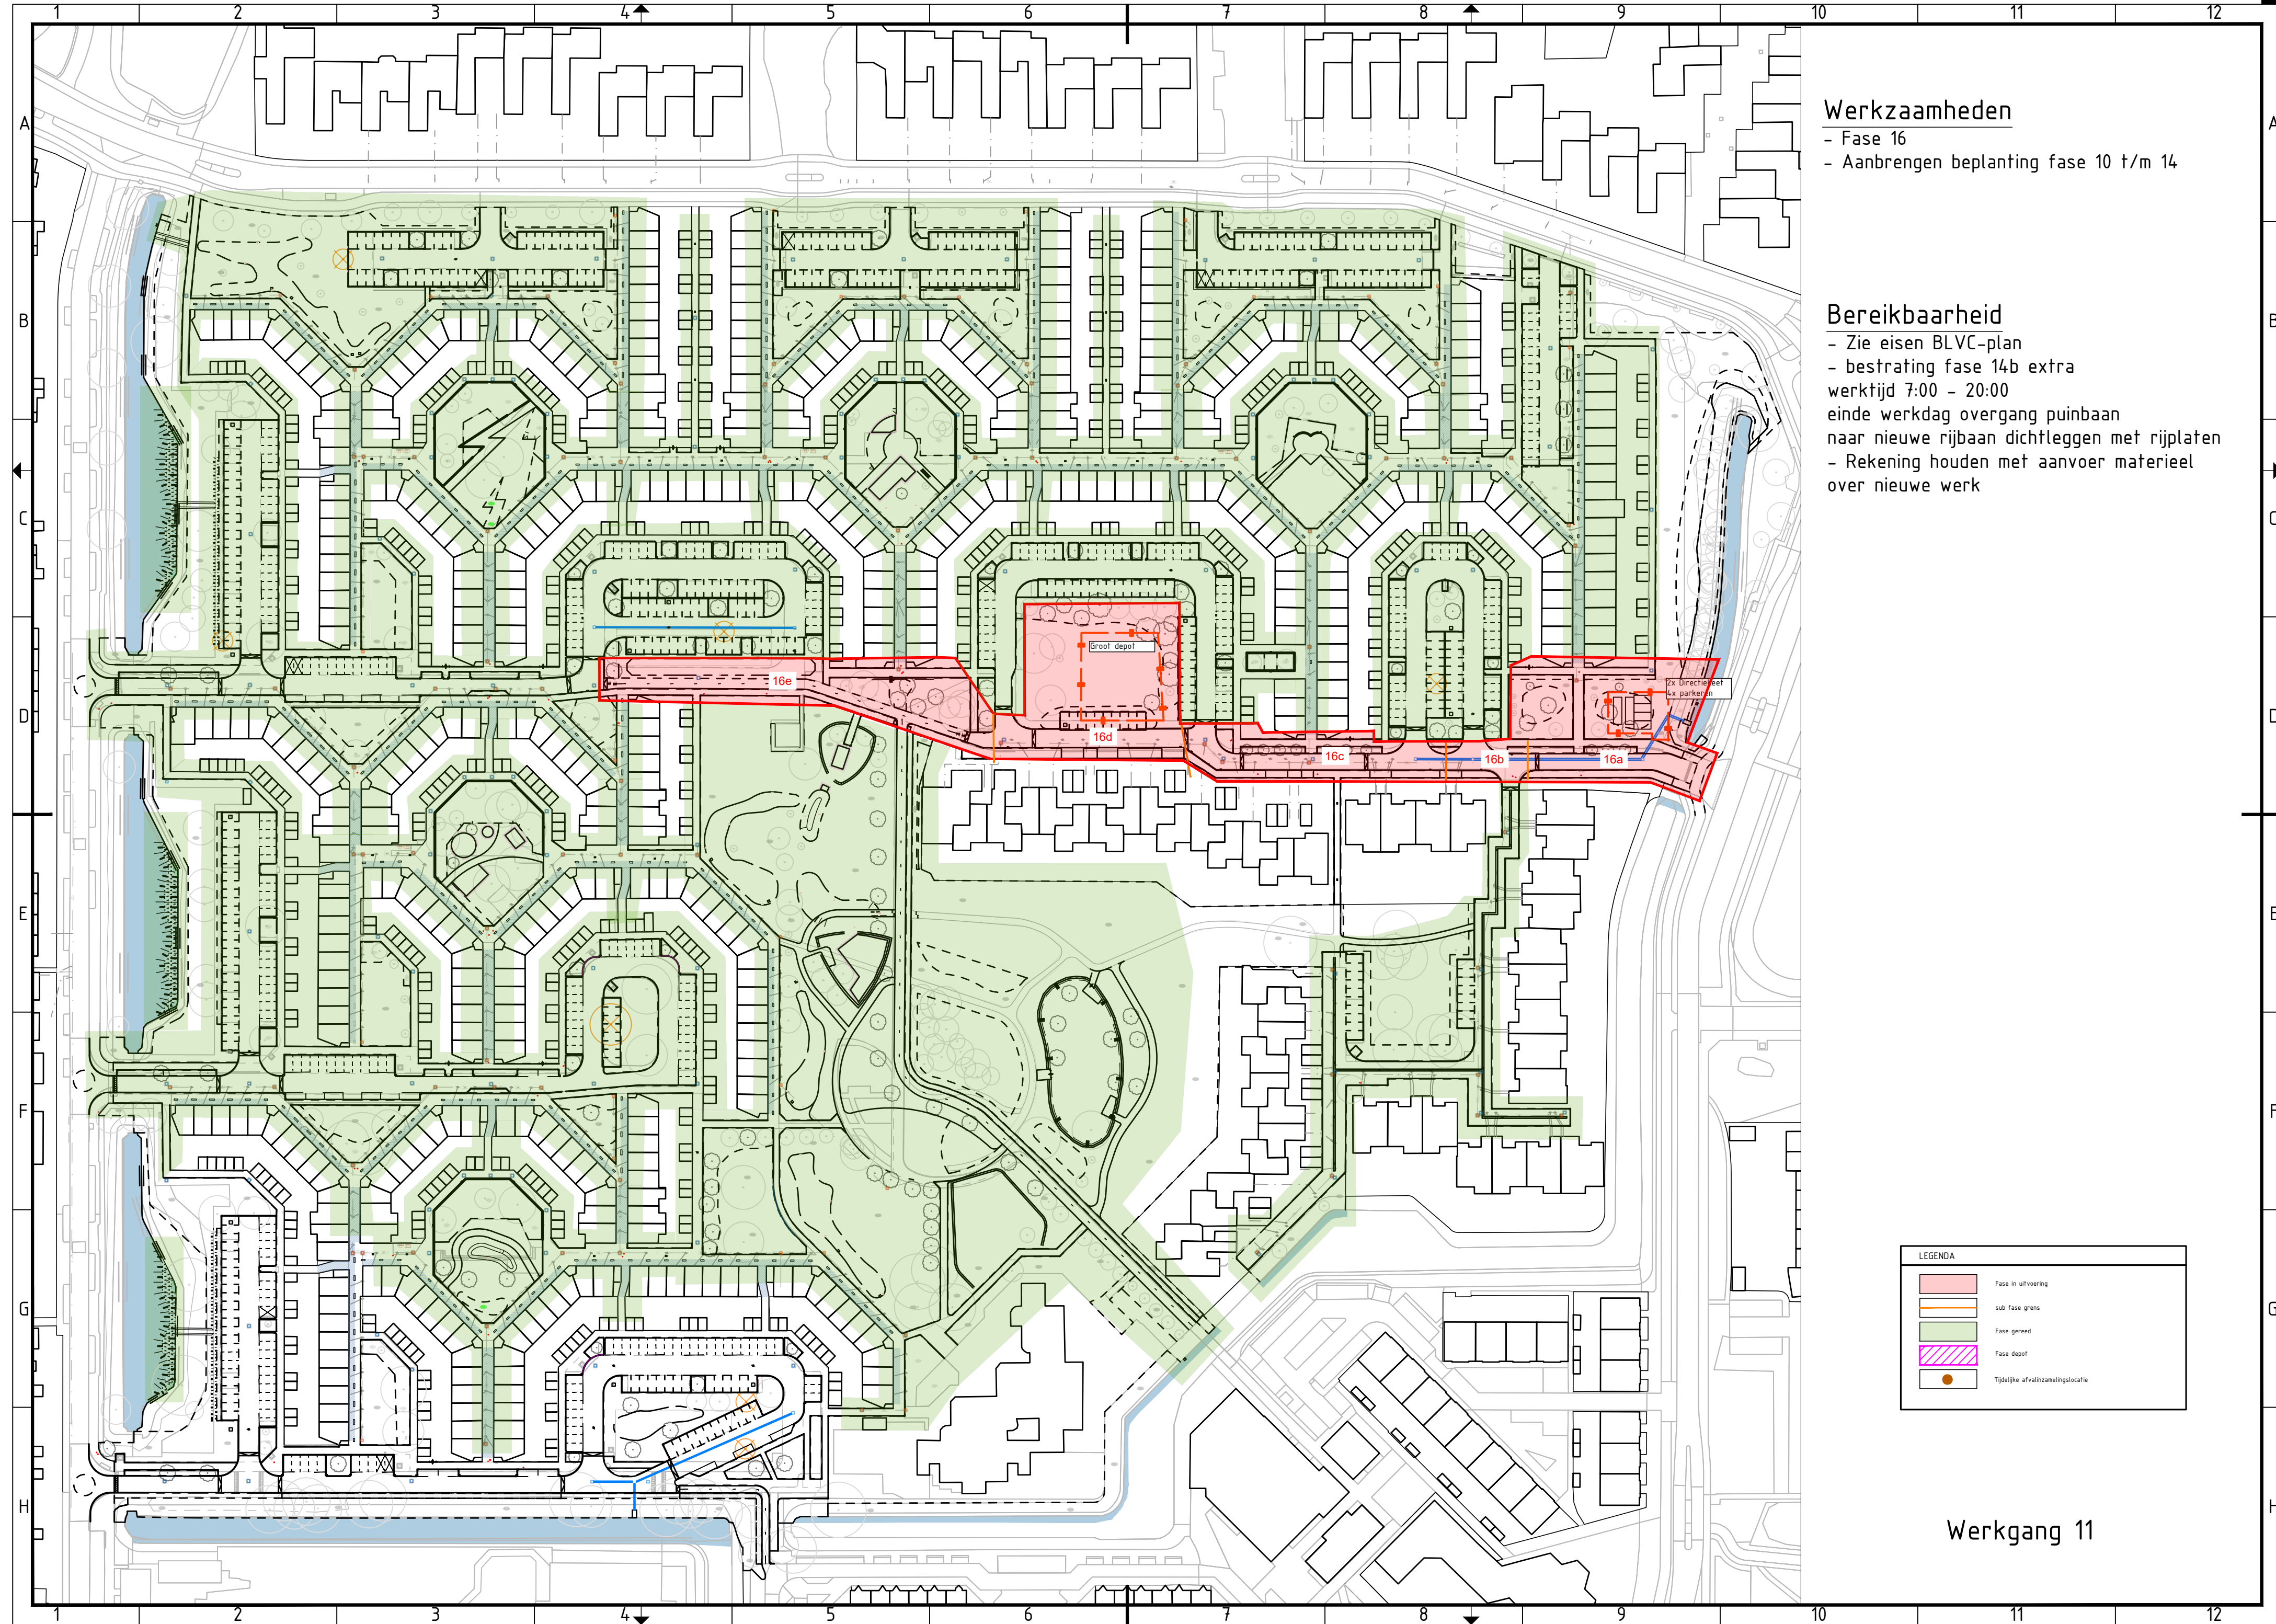

Werkzaamheden

- Fase 16
- Aanbrengen beplanting fase 10 t/m 14


Bereikbaarheid

- Zie eisen BLVC-plan
 - bestrating fase 14b extra
- werktijd 7:00 - 20:00
- einde werkdag overgang puinbaan
naar nieuwe rijbaan dichtleggen met rijplaten
- Rekening houden met aanvoer materieel
over nieuwe werk

LEGENDA

	Fase in uitvoering
	sub fase grens
	Fase gereed
	Fase depot
	Tijdelijke afvalinzamelingslocatie

Werkgang 11

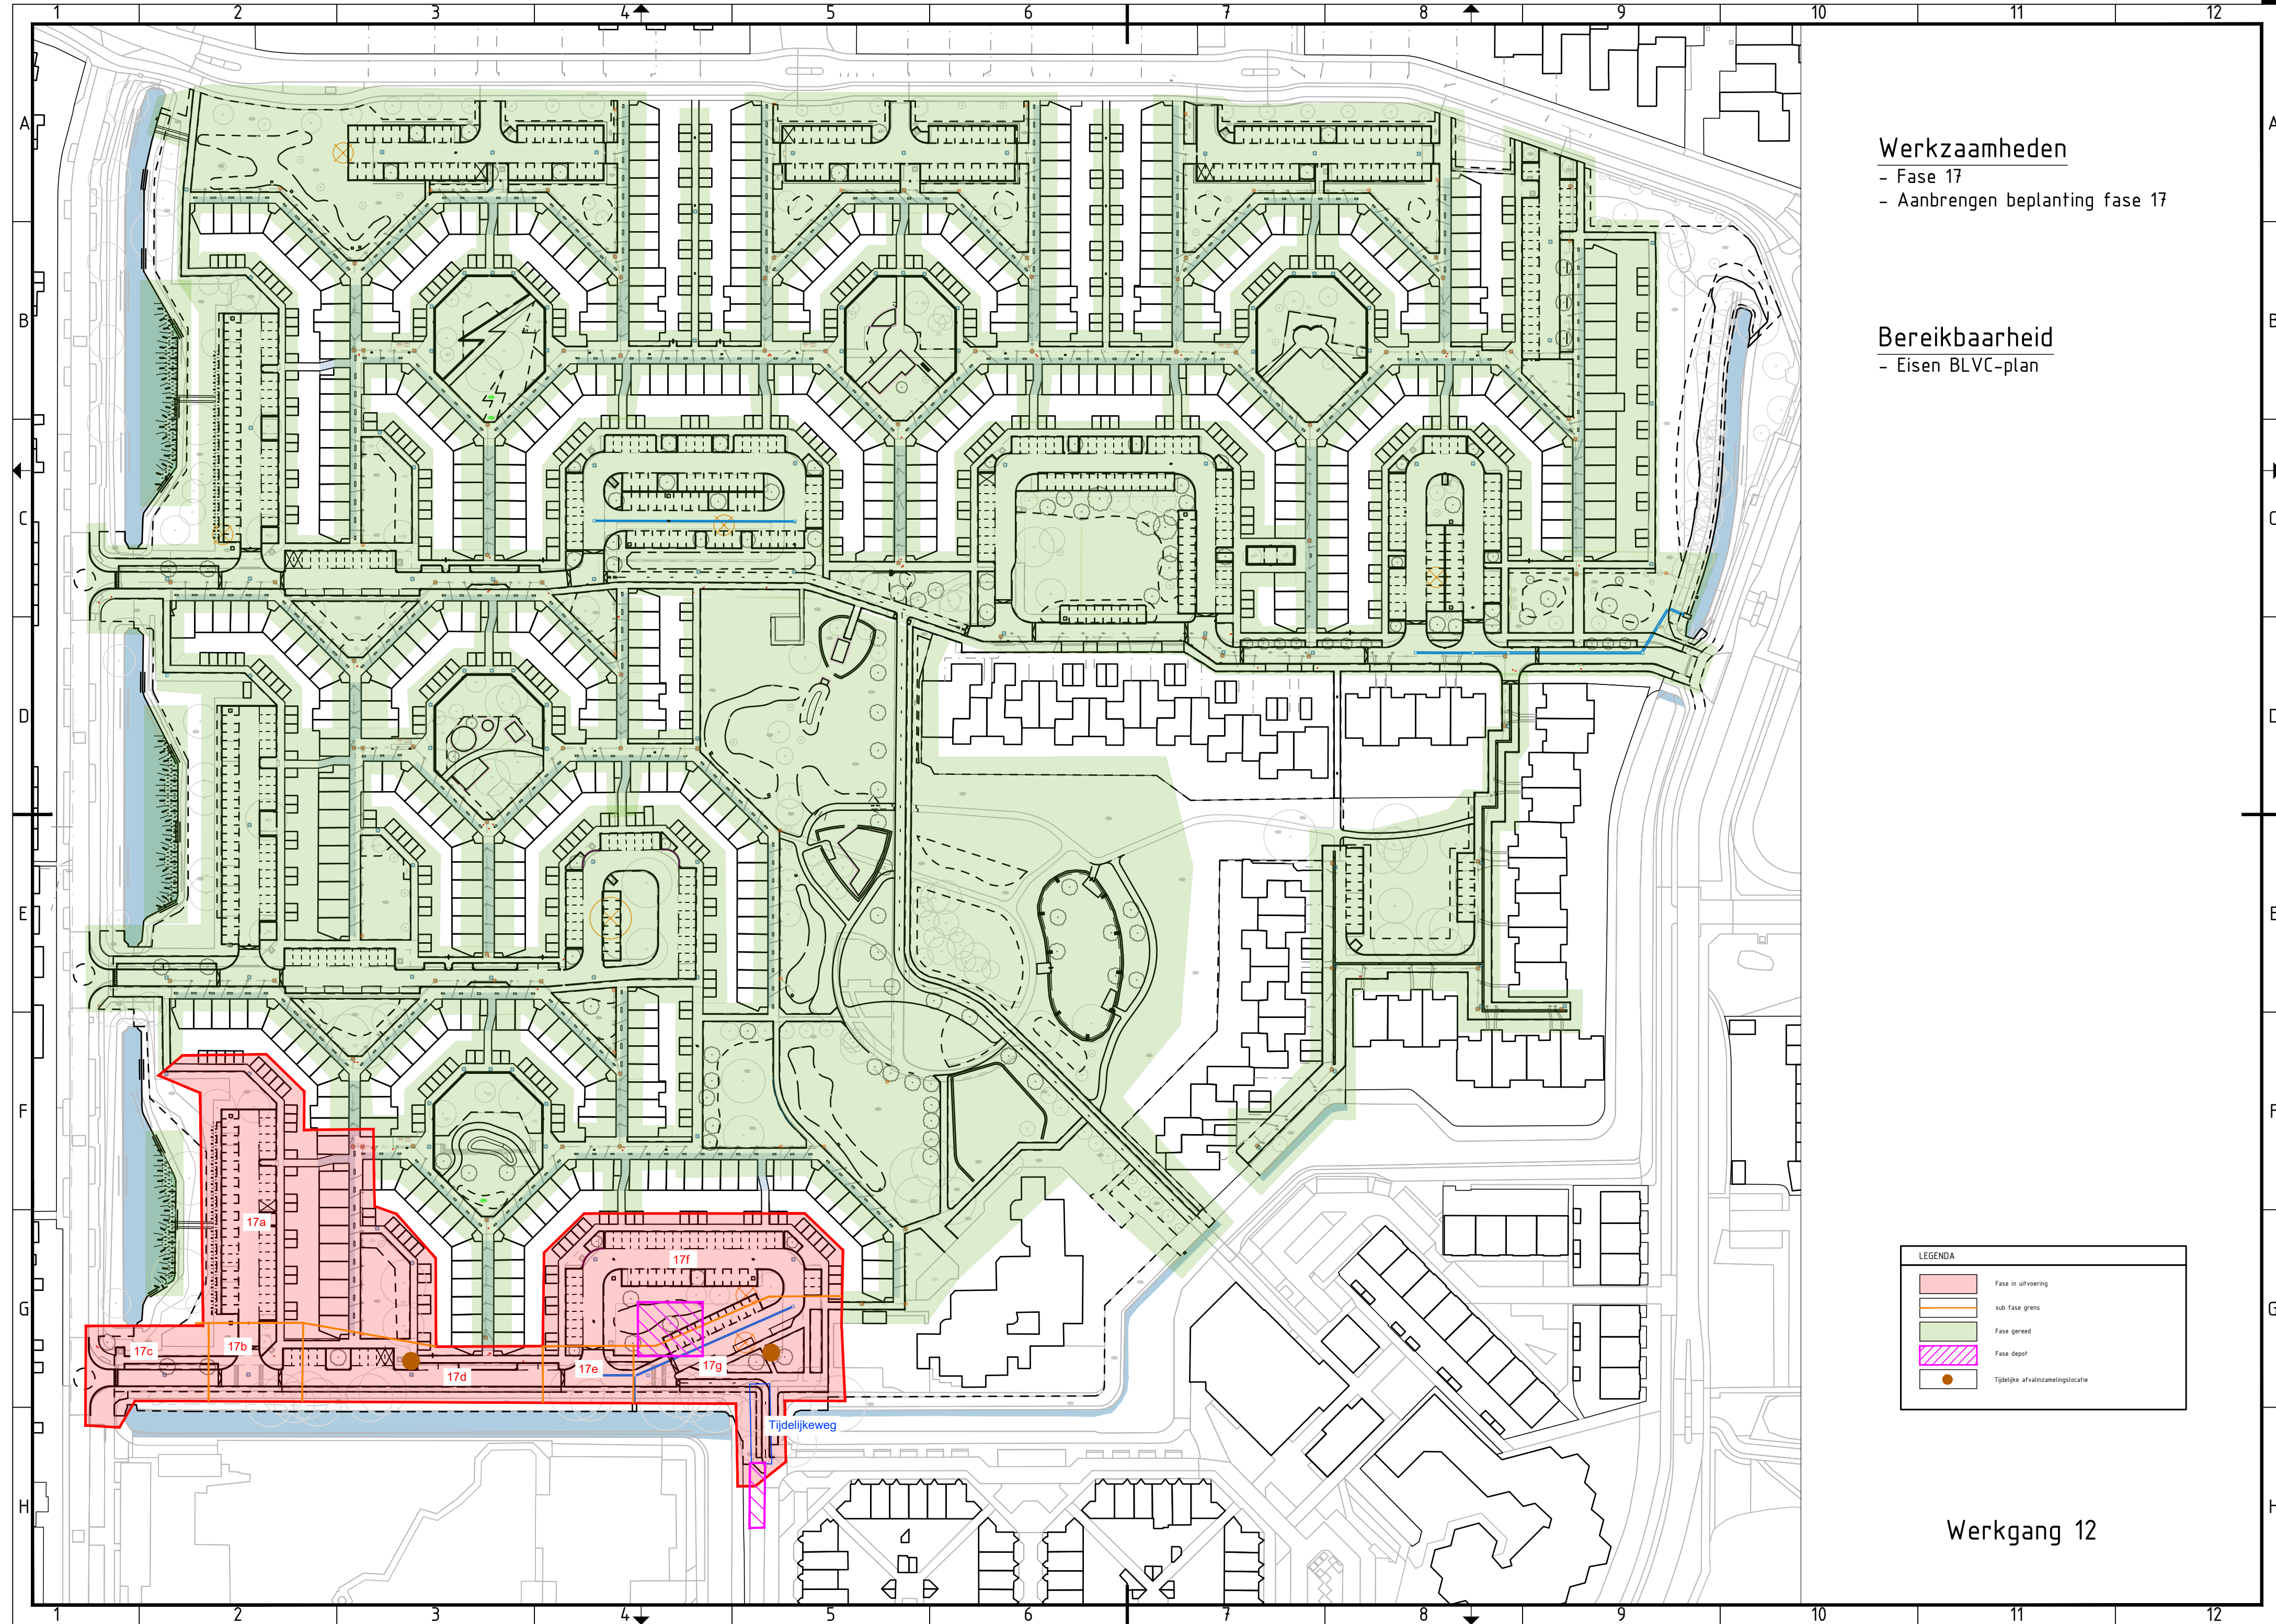


Werkzaamheden


- Fase 17
- Aanbrengen beplanting fase 17

Bereikbaarheid

-
- Eisen BLVC-plan

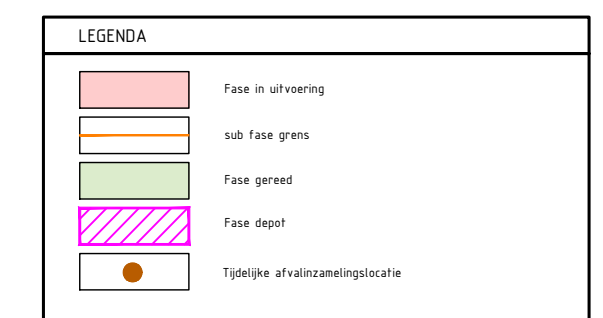

Werkgang 12

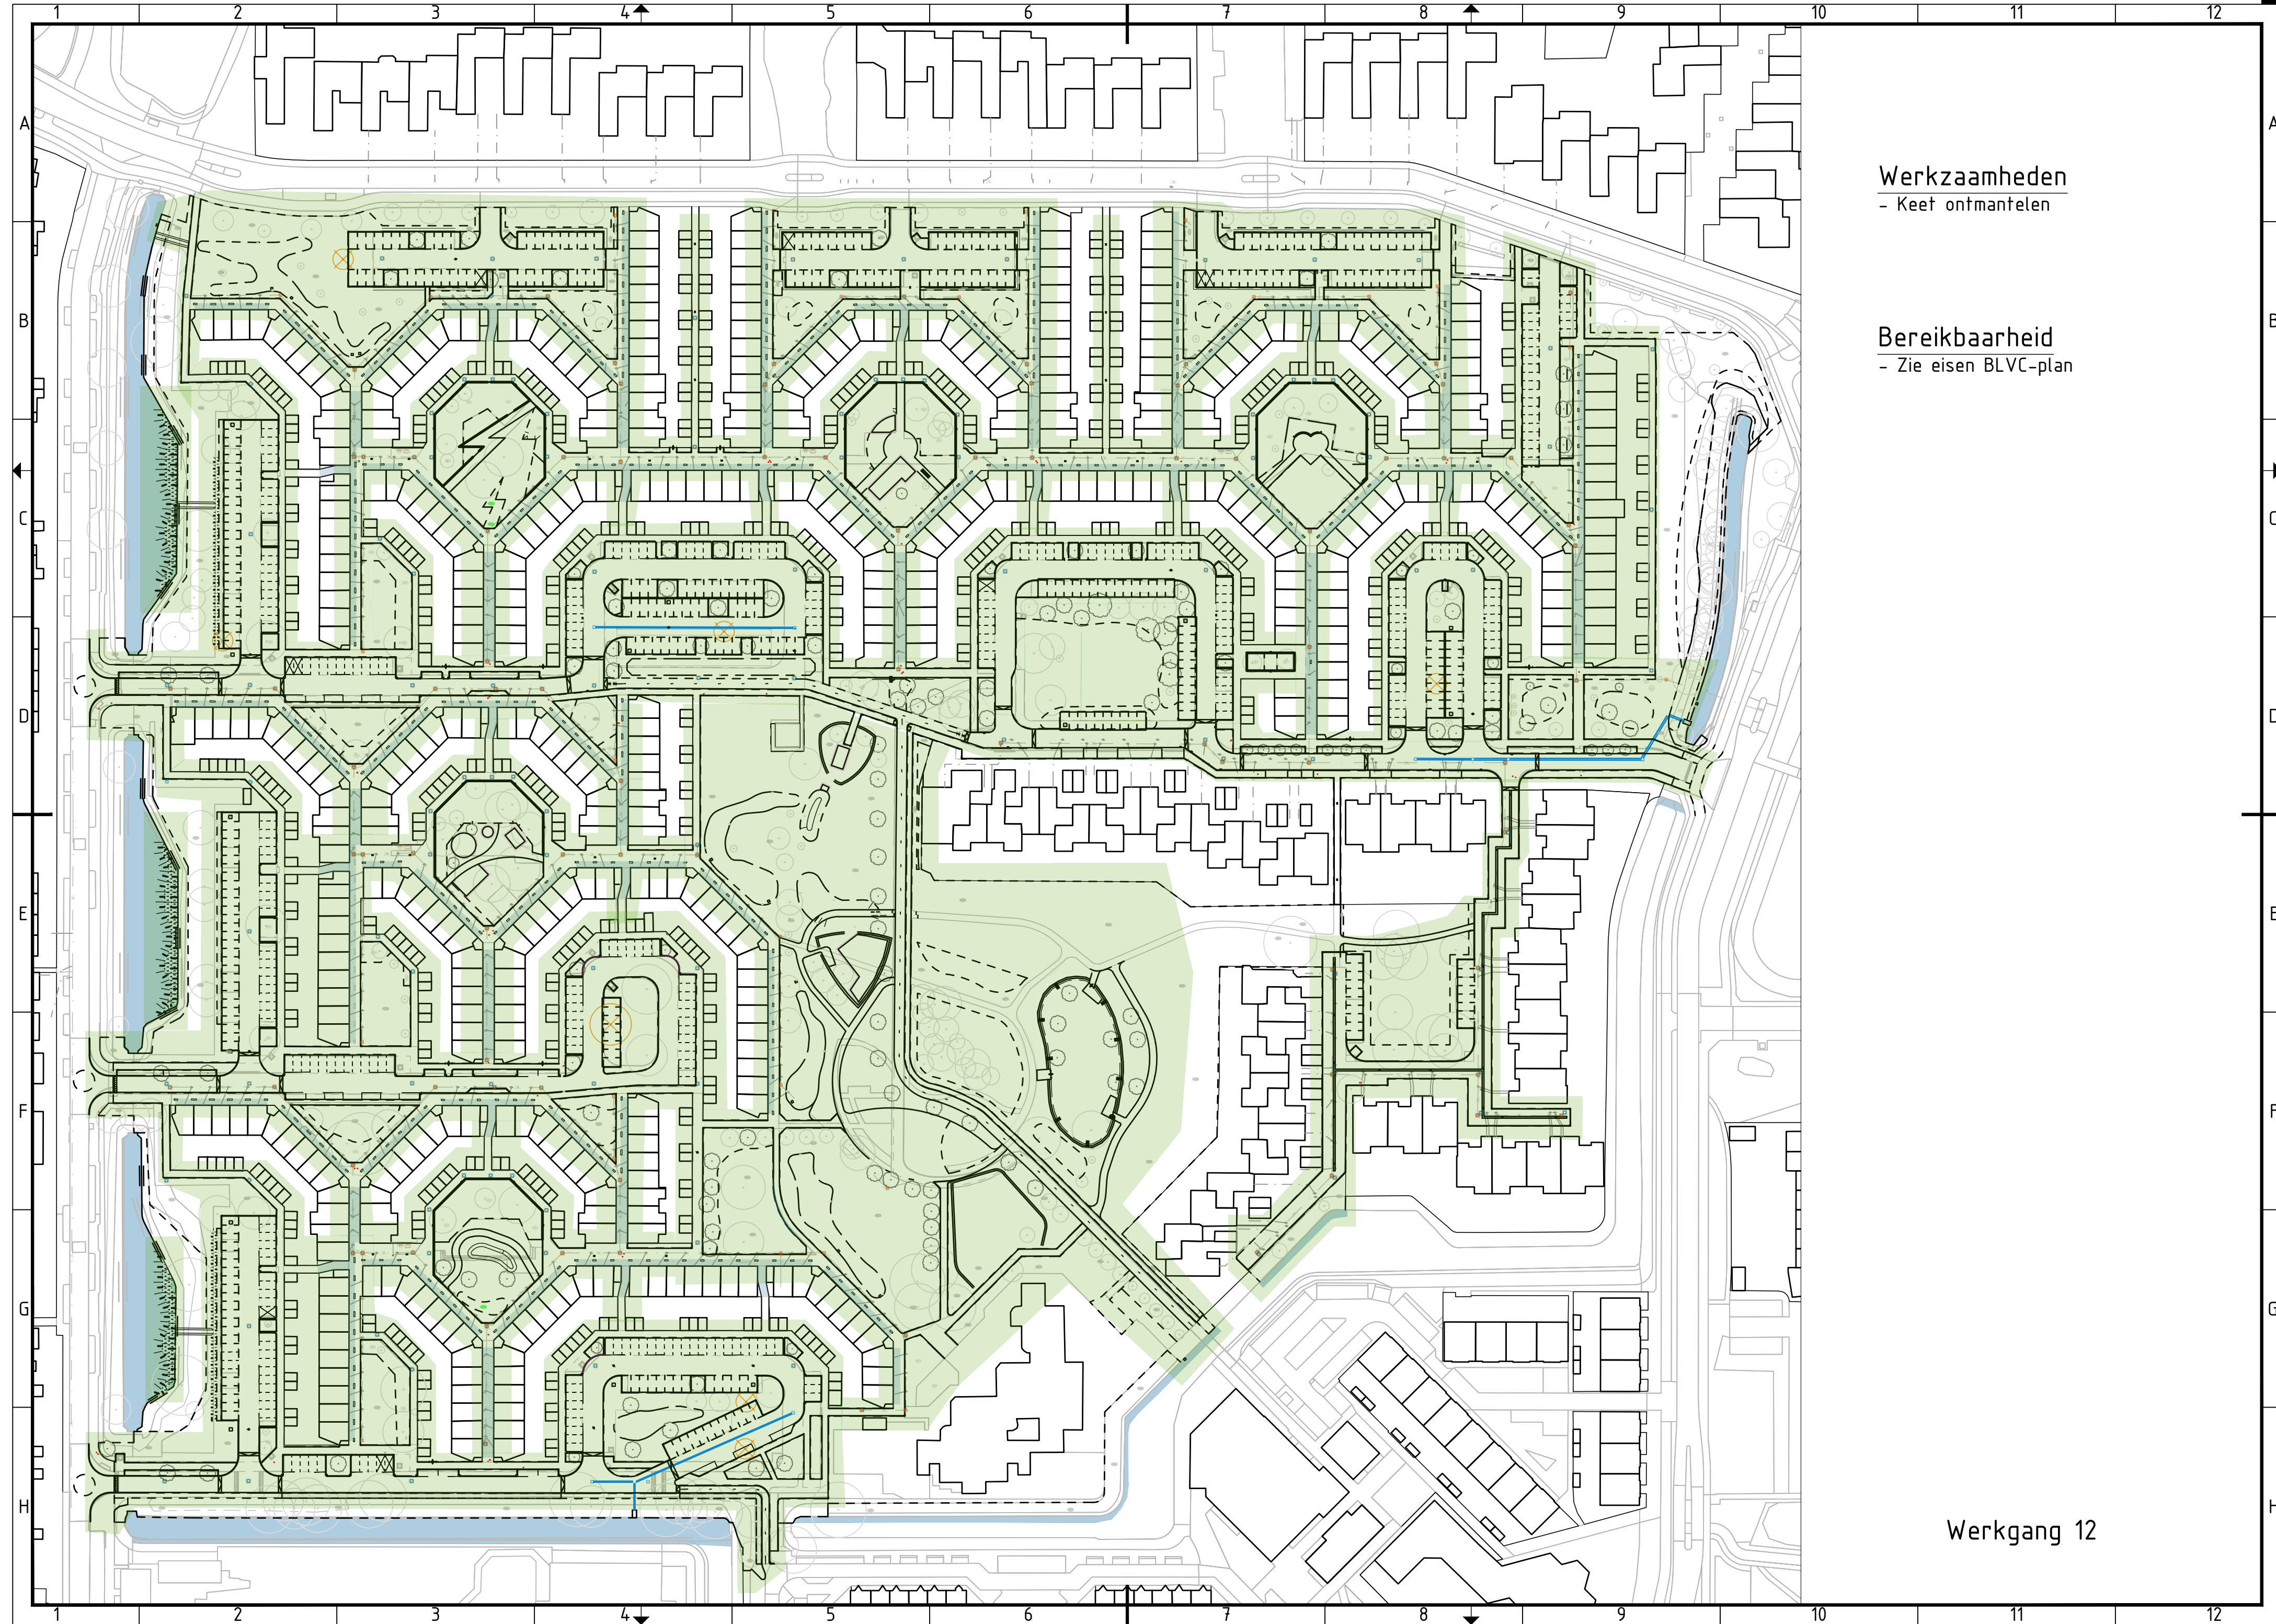

Werkzaamheden

- Keet ontmantelen

Bereikbaarheid
- Zie eisen BLVC-plan

Werkgang 12
