

Inspectierapport SCOPE 10



Naam: Gemeente Werstervoort
Adres: Dorpsplein 1
Postcode en plaats: 6931 CZ Westervoort
Datum inspectie: 03-02-2026
Documentnummer: 41228
Scios nummer: JMY-AAA-07

Herinspectie noodzakelijk?

Ja

Nee

Fysieke herinspectie noodzakelijk

De constatering(en) genoemd in deze rapportage die minimaal een classificatie hebben meegekregen conform IB22 dienen uiterlijk binnen 3 maanden beoordeeld te worden middels een herinspectie* (er zijn o.a. fysieke metingen door een Scope gecertificeerd inspecteur noodzakelijk)

Let op: een inspectie met constatering(en) zonder herstel is maximaal 1 jaar geldig. Afmelden van de installatie zonder constatering(en) dient binnen 1 jaar na rapportdatum te zijn afgerond. Na deze interval is een nieuwe inspectie noodzakelijk.

Wees daarom tijdig met het aanvragen van een vervolgofferte en afspraak via Omega Energietechnik.


Fysieke herinspectie noodzakelijk voor:

Metingen en visuele constatering(en) na herstel

Er zijn metingen en een visuele beoordeling noodzakelijk na herstel van de constatering(en).

Cat. 3

Ondertekening inspecteur:



dhr. T. Hasselman

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Gegevens
- Samenvatting
- Inspectieplan
- Bevindingen installatiedelen
- Bevindingen overige installatiedelen
- Bijlage - Herstelverklaring

Inleiding

Voor u ligt het inspectierapport met de constatering die tijdens de uitgevoerde inspectie zijn vastgesteld.

Met 'constatering' wordt bedoeld dat de elektrische installatie op dat punt niet voldoet aan een of meer eisen uit relevante normen. Voldoen aan normen is belangrijk om daarmee te voldoen aan relevante wetgeving zoals Besluit bouwwerk leefomgeving of Arbowetgeving.

De constatering is zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Daarbij is bewust vaktechnische terminologie gebruikt, zodat de bevindingen met de juiste nuance worden weergegeven. Ter verduidelijking zijn ook foto's opgenomen.

Mocht u moeite hebben met de interpretatie van dit rapport, dan adviseren wij u om bijstand te vragen van een erkend installateur. Deze beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om de constatering te beoordelen en, indien nodig, de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Mocht de installateur vragen hebben over de inhoud van dit rapport, dan kunnen zij contact opnemen met de inspecteur.

Gegevens

Installatie

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Contactpersoon:

Gemeente Werstervoort

Dorpsplein 1

6931 CZ

Westervoort

b.aalberts@1stroom.nl

Bastiaan Aalberts

Opdrachtgever

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail

Contactpersoon:

Gemeente Werstervoort

Dorpsplein 1

6931 CZ

Westervoort

b.aalberts@1stroom.nl

Bastiaan Aalberts

Installatie

Type installatie:

Stroomstelsel:

Netspanning:

Onderlinge beïnvloeding:

Uitvoeren van onderhoud:

Overig

TN-S

230V / 400V

N.v.t.

N.v.t.

Uitwendige invloeden:

Onderdeel:

Aanwezigheid van stof:

Aanwezigheid van water:

Binnen

IP3X

IPX0

Onderdeel:

Aanwezigheid van stof:

Aanwezigheid van water:

Buiten

IP5X

IPX4

41228 / 41228 - Inspectierapport SCOPE 10 Gemeente
Werstervoort (Scios nr: JMY-AAA-07)

Inspectiebedrijf

Naam:	Omega Energietechniek
Adres:	Hagenweg 1C
Postcode en plaats:	4131 LX Vianen
Telefoonnummer:	088 - 2056 101
Mail adres:	info@omega-energietechnik.nl
Bedrijfslicenties:	Registratienummer: R361
	Scope 8: SSC-K105653/02
	Scope 10: SSC-K100326/01
	Scope 12: SSC-K106084/01

Inspecteur(s)

Inspecteur	dhr. T. Hasselman
E-mail	tim@omega-energietechnik.nl
Certificaatnummer Scope 8: 20214920	
Certificaatnummer Scope 10: 20212405	
Certificaatnummer Scope 12: 20212016	
Gebruikte meetinstrumenten (incl. evt. kalibratiedatum / controledatum)	
☒	Flir, E54, Thermografie, 84510123, 14-02-2025
☒	Nieaf Smitt, Installtest XE, installatietester, 23282444, 10-10-2025

Inspectie

Installatieverantwoordelijke:	Niet aangewezen
Aanleiding van de inspectie:	Op aanvraag
Reden van de inspectie:	SCOPE 10
	PI (Periodieke inspectie)
Rapportnummer:	Certificaatnummer(s) Scios verklaring(en): JMY-AAA-07
Ordernummer:	41228
Referentie:	41228
Datum rapport:	N.v.t.
Datum inspectie:	04-02-2026
	04-02-2026

Samenvatting

Op deze pagina ziet u een tabel met een samenvatting van alle tijdens de inspectie vastgestelde constatering en opmerkingen. Om de tabel goed te kunnen interpreteren, geven wij eerst een korte toelichting.

In de kolommen ziet u het aantal constatering en opmerkingen. Een constatering betekent dat de elektrische installatie op dat punt in strijd is met een relevante normbepaling en een risico vormt op schade of letsel. Deze moeten door een erkend installateur worden verholpen. De constatering zijn gerangschikt van ernstig naar gering risico, overeenkomstig het SCIOS-document IB22 (versie 2.0: 2024-01).

In de rechterkolom vindt u de samenvatting van de opmerkingen. Deze zijn niet gekoppeld aan een direct risico, maar vormen een aandachtspunt, advies of verbetermogelijkheden. Het doel hiervan is om mogelijke toekomstige risico's te signaleren en te voorkomen.

Classificatie	Ernstig (er moeten direct maatregelen worden ondernomen)	Serieus (hersteltermijn 3 maanden)	Gering (hersteltermijn 3 maanden)	Opmerking (vereist aandacht)
A: Defect in beschermingsmaatregel tegen elektrische schok	Defect of niet aanwezig zijn van de basisbescherming zoals beschadiging van de fundamentele isolatie of omhulling c.q. afstand	Defect of niet aanwezig zijn van de foutbescherming c.q. de vereffening	Defect of niet aanwezig zijn van de aanvullende bescherming	
Aantal:	A1: 0	A2: 1	A3: 0	
B: Brand door elektrisch materieel	Elektrisch materieel overschrijdt de toegestane temperatuur	Elektrisch materieel overschrijdt niet de temperatuur echter vertoont hitteverschijnselen of een temperatuurgradiënt	Elektrisch materieel vertoont geen hitteverschijnselen maar wordt oneigenlijk gebruikt of verwacht oneigenlijk gebruikt	Elektrisch materieel vertoont een defect maar verwacht geen temperatuurverhoging
Aantal:	B1: 0	B2: 0	B3: 31	B4: 2
C: Beschikbaarheid of betrouwbaarheid van elektrisch materieel	Niet functioneren kan levensbedreigend zijn voor mens of dier	Geen spanning meer aanwezig	Verstoring in processen	Installatie voldoet aan standaarden maar wordt niet periodiek functioneel getest
Aantal:	C1: 0	C2: 0	C3: 0	C4: 0
D: Defect elektrisch materieel en/of toepassingsfout		Schade/letsel	Uitval	Wijkt af van de standaard
Aantal:		D2: 0	D3: 0	D4: 0
E: Elektrisch materieel niet geschikt voor invloeden van buitenaf		Defect	Beschermingsgraad is niet voldoende	Productspecificatie
Aantal:		E2: 0	E3: 0	E4: 0
F: Geen of onjuiste informatie		Schade/letsel	Te weinig informatie	Wijkt af van de standaard
Aantal:		F2: 0	F3: 0	F4: 0
Totaal aantal constatering en opmerkingen: 34				

Inspectieplan

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving:	
Bouwjaar:	1980
Van toepassing zijnde normen:	NEN1010:1962+A1:1975
SCOPE 10	NTA8220:2017 (nl) NPR8040-1 SCIOS technisch document 14 Versie 2.10-2025-04 Conform Scios Technisch Document 14
Wijze van rapporteren:	Overige normen
Aanvullende eisen:	Geen aanvullende eisen.
SCOPE 10 Deze inspectie heeft betrekking op: Uitsluitingen in deze inspectie: PV-systeem aanwezig? Nee Elektrische installatie en elektrische materieel Gebouwtype: Gemeentehuizen N.v.t.	
Bijzondere ruimten:	Niet van toepassing
Deze inspectie is uitgevoerd middels:	Visuele controle en meting en beproeving
Aantal m²:	2500
Aantal verdeelinrichtingen:	9
Aantal regelkasten:	0
Aantal vast opgestelde machines:	Niet van toepassing
Te inspecteren:	Geheel
Overige informatie en afspraken	
Schakelen en scheiden:	De inspecteur zal uitsluitend na overleg met de contactpersoon schakelen en scheiden.
Bereikbaarheid:	Alle te inspecteren installatiedelen zijn zonder hulpmiddelen goed bereikbaar.
Veiligheidseisen:	Er zijn geen specifieke veiligheidseisen; Werkvergunning, veiligheidsinstructie en dergelijke zijn niet van toepassing.
Veiligheidsvoorzieningen:	De inspecteur zorgt zelf voor de benodigde PBM's conform de actuele versie van NEN3140. Verder zijn er geen veiligheidsvoorzieningen benodigd.
Wijze van rapporteren:	Het inspectierapport wordt per e-mail verstrekt in PDF-format. "Negatief rapporteren" zal worden gehanteerd. Hierbij worden enkel afwijkingen opgenomen in het inspectierapport. Een volledige meetstaat is opvraagbaar bij het inspectiebedrijf.
Overige informatie (voor de inspecteur):	N.v.t.
Inspectieomvang	100 procent
Inspectie-interval conform:	
SCOPE 10	
Inspectie-interval conform NTA8220:	3 Jaar
Afwijkingen ten opzichte van inspectieplan	
De inspectieomvang wijkt niet af ten opzichte van het inspectieplan.	
Aanvullende diensten	
Thermografie verdeelinrichtingen:	Ja
Thermografie PV:	Nee
I/U-curves:	Nee
Opsomming totale verdeelinrichtingen?:	Ja
	De volgende verdeelinrichtingen zijn opgenomen in dit inspectierapport: L0, HVK, OVK L1, OVK B, L OVK 1E verdieping, LKT, LK 2E verdieping, OVK kantine,
	Aantal verdeelinrichtingen: 8

Bevindingen installatiedelen


Er is middels visuele controle, metingen en beproevingen gecontroleerd of de installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

installatiedeel:	L0
Voorbeveiliging:	125 Amp.
Hoofdschakelaar:	160 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel

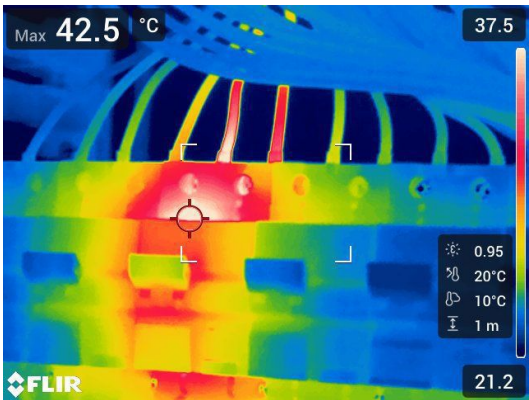

Afgaande eindgroep
Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)
Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)
Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering: 01 Locatie L0 Onderdeel Beveiligingen Omschrijving De eindgroep is te zwaar afgezekerd voor de afgaande bedrading. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Controlepunt(en) CV-d Keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie hoofdstuk 53);
Constatering: 02 Locatie L0 Onderdeel Verdeelinrichting Omschrijving Er zijn losse verbindingen aangetroffen. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Controlepunt(en) CV-k Deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (zie rubriek 526);

installatiedeel:HVK


Voorbeveiliging:160 Amp.

Hoofdschakelaar:250 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel

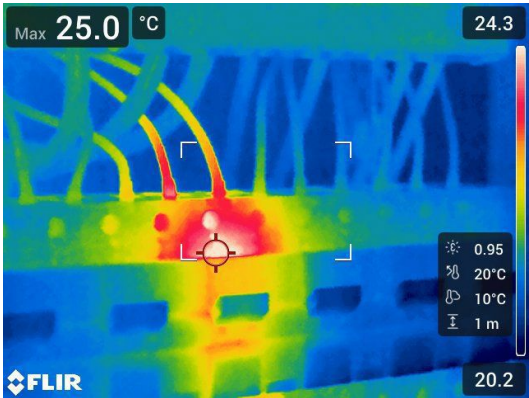

Afgaande eindgroep
Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)


Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
03	HVK	Kabelschoen(en)	
Omschrijving Door de aanwezigheid van krimpkousen zijn de kabelschoenen niet correct te controleren op de juiste persingsmethode.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-m Toegankelijkheid voor bediening, identificatie en onderhoud (zie rubriek 513).

installatiedeel:	OVK L1
Voorbeveiliging:	16 Amp.
Hoofdschakelaar:	40 Amp.

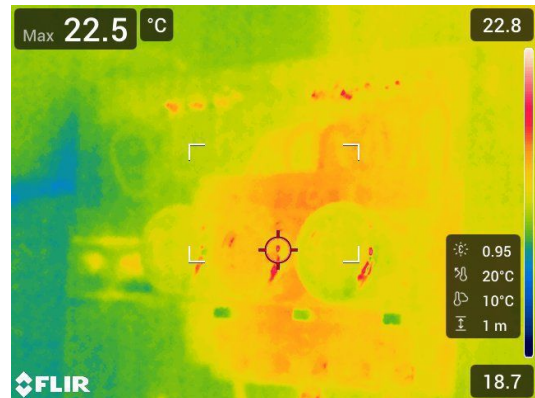Foto installatiedeel**IR-foto installatiedeel**

OVK

Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.

Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

installatiedeel:	OVK B
Voorbeveiliging:	50 Amp.
Hoofdschakelaar:	63 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel



Afgaande eindgroep
Conclusie thermografie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

installatiedeel:	L OVK 1E verdieping
Voorbeveiliging:	50 Amp.
Hoofdschakelaar:	63 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel



Relais

Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

installatiedeel: LKT

Voorbeveiliging: 63 Amp.

Hoofdschakelaar: 63 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel



Trafo

Conclusie thermografie


Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)
Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)
Er zijn afwijkingen geconstateerd:


Constatering: 04 Omschrijving Het elektrisch materieel is niet vrij van stof of vuil. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie LKT	Onderdeel Behuizing	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 05 Omschrijving De kijkglasjes ontbreken. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie LKT	Onderdeel Patroonhouder	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

installatiedeel: LK 2E verdieping


Voorbeveiliging: 50 Amp.

Hoofdschakelaar: 63 Amp.

Foto installatiedeel

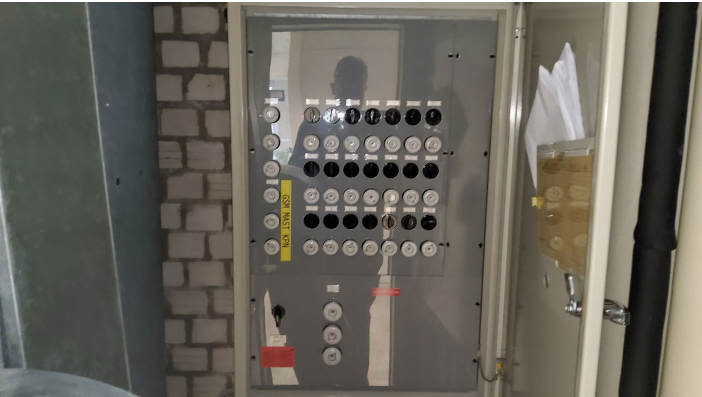

IR-foto installatiedeel

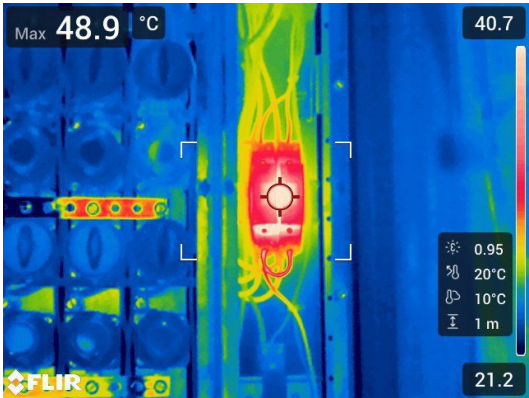

Relais

Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.

Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
06	LK	Kabelschoen(en)	
Omschrijving			
Het onderdeel is niet geïnstalleerd conform de voorschriften van de fabrikant.			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en)
			CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

installatiedeel:OVK kantine

Voorbeveiliging:0 Amp.

Hoofdschakelaar:40 Amp.

Foto installatiedeel



IR-foto installatiedeel



Bedrading afgaande eindgroep
Conclusie thermografie

Voldoet niet

Voldoet

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie (metingen)

Er zijn geen afwijkende waarden gemeten.
Een volledige meetstaat kan worden opgevraagd bij het inspectiebedrijf.

Conclusie (visuele controle)

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
07	OVK	Beveiligingen	
Omschrijving			
Voorbeveiligingen onbekend. (nader onderzoek noodzakelijk)			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			
			Controlepunt(en) CV-d Keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie hoofdstuk 53);

Bevindingen overige installatiedelen

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Alle verdeelkasten

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
08	Alle verdelers	Installatiedelen	
Omschrijving			
Geen bevoegdheid om op locatie te mogen schakelen. Niet alle installatiedelen kunnen hierdoor worden beproefd.			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en)
			Ca-i Functionele en operationele beproevingen (zie bepaling 61.3.10);

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Pand algemeen

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
09	In diverse kamers	Tafelcontactdoos	
Omschrijving			
Er zijn meerdere tafelcontactdozen achter elkaar doorgekoppeld.			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en)
			CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Gemeentehuis beganegrond

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
10	In de kolkkamer	Elektrisch materieel	
Omschrijving			
Het elektrisch materieel bevindt zich bij brandbare materialen.			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en)
			CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
11	In de kelder	Armatuur	
Omschrijving			
Het elektrisch materieel vertoont defecten.			
Classificatie			
Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en)
			CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

41228 / 41228 - Inspectierapport SCOPE 10 Gemeente Werstervoort (Scios nr: JMY-AAA-07)

Constatering: 12	Locatie In de trapkast	Onderdeel Installatiedelen	
Omschrijving Om overzicht te krijgen kunnen de oude installatiedelen verwijderd worden. Classificatie Brand door elektrisch materieel Elektrisch materieel vertoont een defect maar nog geen hitteverschijnselen B4			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 13	Locatie In het magazijn	Onderdeel Component	
Omschrijving Het elektrisch materieel vertoont defecten. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 14	Locatie In de openruimte	Onderdeel Elektrisch materieel	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd. Classificatie Brand door elektrisch materieel Elektrisch materieel vertoont een defect maar nog geen hitteverschijnselen B4			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 15	Locatie In de bodekamer en vergaderruimte 2	Onderdeel Wandcontactdoos	 
Omschrijving Het elektrisch materieel vertoont defecten. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Gemeentehuis 1e verdieping

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering: 16	Locatie In de schacht	Onderdeel Elektrisch materieel	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3			
			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Gemeentehuis 2e verdieping

Conclusie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Politie

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
17	Politie	Installatiedelen	
Omschrijving Installatiedelen politie zijn niet bereikbaar / toegankelijk voor inspectie en onderhoud.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-m Toegankelijkheid voor bediening, identificatie en onderhoud (zie rubriek 513).

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:


Oudbouw Oekraïne

Conclusie

Er zijn afwijkingen geconstateerd:

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
18	Ruimte A1.10	Elektrisch materieel	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
19	Ruimte A1.10	Component	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;


Constatering:	Locatie	Onderdeel	
20	Gang 1e verdieping	Wandcontactdoos	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Constatering:	Locatie	Onderdeel	
21	Keuken beganegrond	Installatiedelen	
Omschrijving Het elektrisch materieel is niet beschermd tegen uitwendige invloeden.			
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			
			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

41228 / 41228 - Inspectierapport SCOPE 10 Gemeente Werstervoort (Scios nr: JMY-AAA-07)

Constatering: 22 Omschrijving Verlengsnoeren of tafelcontactdozen gebruikt voor de vaste installatie. Deze zijn hier niet voor bedoeld. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie Keuken	Onderdeel AC-kabel(s)	  Controlepunt(en) CV-k Deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (zie rubriek 526);
Constatering: 23 Omschrijving Vreemdgeleidende delen zijn niet verbonden met vereffening. Classificatie Defect in beschermingsmaatregel Foutbescherming A2	Locatie Waterleiding algemeen	Onderdeel Waterleiding	  Controlepunt(en) CV-a Gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok;
Constatering: 24 Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie A0.03	Onderdeel Wandcontactdoos	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 25 Omschrijving De warmteafvoer van het elektrisch materieel wordt nadelig beïnvloed. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie Algemeen	Onderdeel AC-kabel(s)	 Controlepunt(en) CV-b Aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en de bescherming tegen thermische invloeden;
Constatering: 26 Omschrijving Het elektrisch materieel vertoont defecten. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie A1.08	Onderdeel Component	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 27 Omschrijving Er zijn meerdere tafelcontactdozen achter elkaar doorgekoppeld. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	Locatie Oudbouw Oekraïne algemeen	Onderdeel Tafelcontactdoos	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

41228 / 41228 - Inspectierapport SCOPE 10 Gemeente
Werstervoort (Scios nr: JMY-AAA-07)

Constatering: 28 Locatie A1.01 Onderdeel Wandcontactdoos Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 29 Locatie A1.07 Onderdeel Wandcontactdoos Omschrijving Het elektrisch materieel is niet op een deugdelijke wijze geïnstalleerd. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 30 Locatie A1.05 Onderdeel AC-kabel(s) Omschrijving Verlengsnoeren of tafelcontactdozen gebruikt voor de vaste installatie. Deze zijn hier niet voor bedoeld. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CV-k Deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (zie rubriek 526);
Constatering: 31 Locatie Algemeen Onderdeel Elektrisch materieel Omschrijving Het elektrisch materieel is niet geschikt voor gebruik in europa, CE keurmerk ontbreekt. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Constatering: 32 Locatie Locatie algemeen Onderdeel Wandcontactdoos Omschrijving Er is geen meetbare beschermingsleiding aanwezig. Betreft de verlengblokken/WCD uitbreiding. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CA-a Het ononderbroken zijn van geleiders (zie bepaling 61.3.2);
Constatering: 33 Locatie A2.02 Onderdeel Component Omschrijving Het elektrisch materieel vertoont defecten. Classificatie Brand door elektrisch materieel Geen juist gebruik B3	 Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;

Constatering: 34	Locatie A0.01	Onderdeel Component	
Omschrijving Het elektrisch materieel vertoont defecten.			Controlepunt(en) CV-f Keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
Classificatie Brand door elektrisch materieel			
Geen juist gebruik			
B3			

Er is middels visuele controle gecontroleerd of de overige installatiedelen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Installatiedeel:

Gemeentehuis zolder

Conclusie

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Bijlage - Herstelverklaring

Geïnspecteerde object: Gemeente Werstervoort
Inspectierapportnummer: 41228
Verzekering:
Polisnummer:

Ondergetekende, erkend installateur, verklaart dat:

Minimaal de genoemde constatering 'Ernstig', 'Serieus', en 'Gering' zoals vastgelegd in dit inspectierapport nummer: 41228 vakkundig en binnen 1 jaar na de inspectiedatum zijn hersteld;
Er minimaal een verklaring is afgegeven betreffende de opmerkingen en nader onderzoek onder de betreffende classificatie vastgelegd in dit inspectierapport;
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, normen en/of leveranciers / fabriekseisen.

Indien bij een vervolgininspectie of controle wordt geconstateerd dat de herstelwerkzaamheden niet overeenkomstig de geldende installatievoorschriften, normen of leveranciersvoorschriften zijn uitgevoerd zal dit alsnog in het rapport worden aangemerkt.

De (erkend) installateur:

Bedrijfsnaam:

Verantwoordelijke:

Adres:

Functie:

Postcode/Plaats:

Datum:

Telefoon:

Handtekening:

De (erkend) installateur:

Naam:

Handtekening:
