


Projectplanning Zwembad Hoogeveen

Taaknaam		Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid	Voorafgaar taken	Opvolgende taken	2027																	
								sep	kw 4, 2026 okt	nov	dec	kw 1, 2027 jan	feb	mrt	kw 2, 2027 apr	mei	jun	kw 3, 2027 jul	aug	sep	kw 4, 2027 okt				
1	Fase 1 - Vaststellen routekaart en uitgangspunten uitwerken routekaart	77 dagen	vri 1-11-24	maa 3-3-25	100%																				
6	Fase 2 - Programma van Eisen	152 dagen	maa 3-3-25	don 2-10-25	100%																				
11	Fase 3 - Aanbesteden ontwerpende partijen	47 dagen	woe 17-12-25	don 5-3-26	0%																				
27	Fase 4a - Organisatievorm en onderzoeken	321 dagen	maa 3-3-25	don 11-6-26	0%																				
30	Fase 4b - Ontwerp	185 dagen	woe 11-3-26	din 15-12-26	0%																				
31	Uitwerken Voorlopig Ontwerp (installaties, constructies en bouwfysica)	20 wkn	woe 11-3-26	din 18-8-26	0%	26GB	39GB;33;32																		
32	VO-raming maken	15 dagen	woe 19-8-26	din 8-9-26	0%	31																			
33	Uitwerken Defintief Ontwerp	15 wkn	woe 19-8-26	din 1-12-26	0%	31	34;45																		
34	DO-raming maken	2 wkn	woe 2-12-26	din 15-12-26	0%	33																			
35	Stukken indienen bij College	0 dagen	maa 28-9-26	maa 28-9-26	0%																				
36	Besluit College en indienen stukken bij Raad	0 dagen	din 27-10-26	din 27-10-26	0%																				
37	Besluit Raad	0 dagen	don 3-12-26	don 3-12-26	0%		45																		
38	Fase 4c - BOPA Procedure	250 dagen	woe 11-3-26	din 30-3-27	0%																				
39	Uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken	4 mndn	woe 11-3-26	din 30-6-26	0%	31GB	40																		
40	Uitwerken van het BOPA-document	5 mndn	woe 1-7-26	din 8-12-26	0%	39	41																		
41	BOPA aanvraag indienen	0 dagen	woe 9-12-26	woe 9-12-26	0%	40	42																		
42	Proceduretijd - beslistermijn 8 weken	8 wkn	woe 9-12-26	din 16-2-27	0%	41	43																		
43	Proceduretijd - verlenging 6 weken	6 wkn	woe 17-2-27	din 30-3-27	0%	42																			
44	Fase 5 - Opstellen bestek en contractdocumenten	99 dagen	don 3-12-26	woe 5-5-27	0%																				
45	Opstellen TO en bestek	14 wkn	don 3-12-26	woe 24-3-27	0%	37;33	46;51GB																		
46	TO-raming maken	2 wkn	don 25-3-27	woe 7-4-27	0%	45																			
47	Indienen stukken aan college	0 dagen	don 8-4-27	don 8-4-27	0%																				
48	Besluit TO en bestek door college	0 dagen	woe 5-5-27	woe 5-5-27	0%		58																		
49	Fase 6 - Aanbesteding aannemer	202 dagen	don 3-12-26	vri 5-11-27	0%																				
50	6.1 Selectiefase	55 dagen	don 3-12-26	woe 3-3-27	0%																				
51	Opstellen selectie leidraad incl. selectiecriteria	15 dagen	don 3-12-26	woe 6-1-27	0%	45GB	52																		
52	Opstellen inschrijvingsleidraad incl. contractdocumenten	15 dagen	don 7-1-27	woe 27-1-27	0%	51	53																		
53	Plaatsing aankondiging + selectieleidraad op TenderNed	5 dagen	don 28-1-27	woe 3-2-27	0%	52	54GB																		
54	Reactietijd aanmeldingen inclusief NvI	20 dagen	don 28-1-27	woe 24-2-27	0%	53GB	55																		
55	Beoordelen aanmeldingen	5 dagen	don 25-2-27	woe 3-3-27	0%	54	56GB																		
56	Selectiebeslissing	5 dagen	don 25-2-27	woe 3-3-27	0%	55GB																			
57	6.2 Inschrijvingsfase	103 dagen	woe 5-5-27	vri 5-11-27	0%																				
58	Uitnodigen geselecteerden	1 dag	woe 5-5-27	woe 5-5-27	0%	48	59																		
59	Reactietijd uitwerken aanbieding inclusief NvI's	8 wkn	don 6-5-27	woe 30-6-27	0%	58	60																		
60	Indienen aanbidding	1 dag	don 1-7-27	don 1-7-27	0%	59																			
61	Beoordelen aanbiddingen	1 dag	don 8-7-27	don 8-7-27	0%		63BE+4 dage																		
62	indienen bij College	0 dagen	maa 16-8-27	maa 16-8-27	0%																				
63	Voornemen tot gunning (met voorbehoud goedkeuring gemeenteraad)	1 dag	don 26-8-27	don 26-8-27	0%	61BE+4 dagen	66																		
64	Besluit college en stukken naar Raad sturen	0 dagen	din 7-9-27	din 7-9-27	0%																				
65	Besluit raad over beschikbaar stellen middelen	0 dagen	don 28-10-27	don 28-10-27	0%		67BE+2 dage																		
66	Alcatel termijn	20 dagen	vri 27-8-27	don 23-9-27	0%	63																			
67	Defintieve gunning	5 dagen	maa 1-11-27	vri 5-11-27	0%	65BE+2 d	70																		
68	Fase 7 Realisatiefase	380 dagen	maa 8-11-27	vri 25-5-29	0%																				
69	7.1 Algemeen	15 dagen	maa 8-11-27	vri 26-11-27	0%																				
70	Aannemingsovereenkomsten (bouw + installaties) ondertekenen	5 dagen	maa 8-11-27	vri 12-11-27	0%	67	71																		
71	PSU: voorbereiding, bespreking inschrijving, plan van aanpak, planning en risicosessie	10 dagen	maa 15-11-27	vri 26-11-27	0%	70	73GB																		
72	7.2 Uitvoeringsontwerp	50 dagen	maa 15-11-27	vri 4-2-28	0%																				
73	Uitwerken uitvoeringsontwerpen bouw (incl. infra) en installaties	8 wkn	maa 15-11-27	vri 21-1-28	0%	71GB	74																		
74	Uitvoeringsontwerpen vaststellen	10 dagen	maa 24-1-28	vri 4-2-28	0%	73	76																		
75	7.3 Uitvoering	325 dagen	maa 7-2-28	vri 25-5-29	0%																				
76	Werkvoorbereiding	20 dagen	maa 7-2-28	vri 3-3-28	0%	74	77																		
77	Start bouw	5 dagen	maa 6-3-28	vri 10-3-28	0%	76	78GB																		
78	Uitvoeringswerkzaamheden	15 mndn	maa 6-3-28	vri 18-5-29	0%	77GB	81;80GE																		
79	Vooropname	25 dagen	maa 16-4-29	vri 18-5-29	0%	80GE																			
80	Afhandelen punten vooropname	10 dagen	maa 7-5-29	vri 18-5-29	0%	78GE	79GE																		
81	Oplevering	5 dagen	maa 21-5-29	vri 25-5-29	0%	78																			

Projectplanning Zwembad Hoogeveen

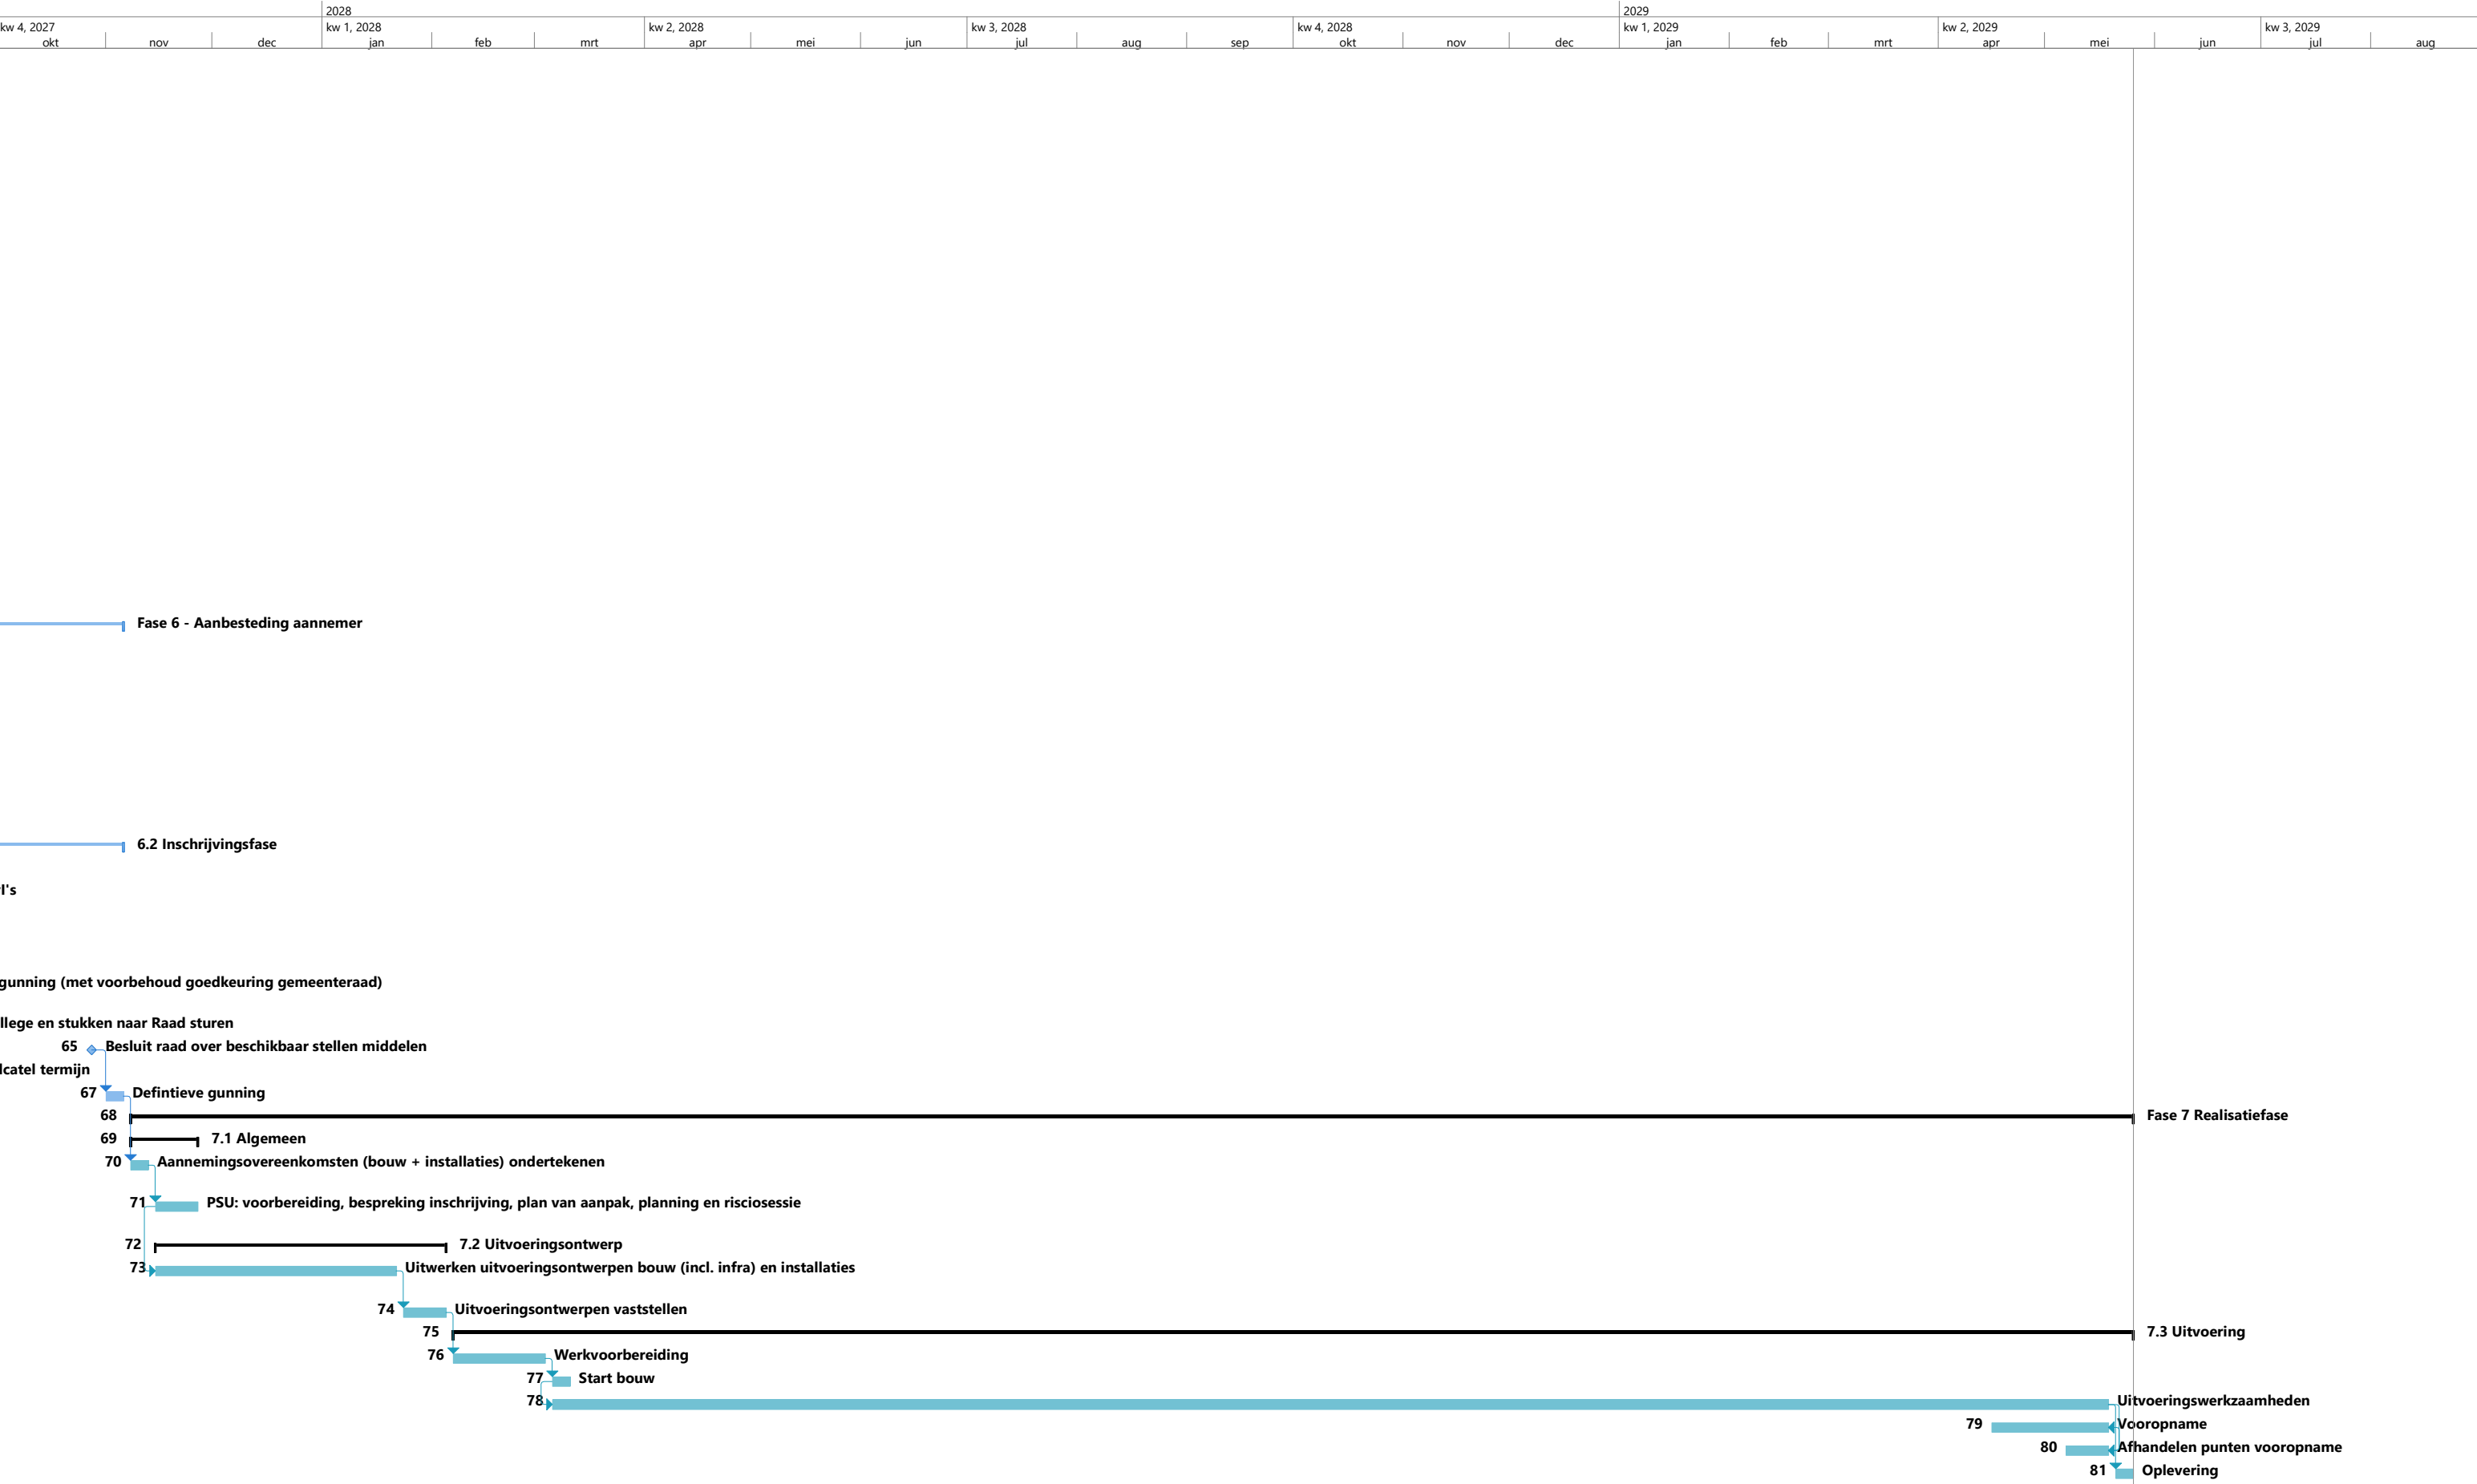

Projectplanning Zwembad Hoogeveen
