

**Projectgegevens**

Project nr.	AAA 07.3052	Contactpersoon	R. Spiters
Opdrachtgever	HH Delfland		
Projectleider	R.J. Pullen		

**Locatiebezoek**

Datum	4 december 2008	Tijd	9:00 – 10:00
Bezoeker	R.J. Pullen		
Saneerder	Vissers	DTA-a	Patrick
Aantal werknemers	2		

Omschrijving bijzonderheden / algemene zaken:

Ten behoeve van het asbestvrij krijgen van het Gemeenlandshuis en Pauwhuis vindt er een asbestsanering plaats. Hiervoor is een asbestinventarisatierapport en een plan van aanpak asbestverwijdering opgesteld. Tevens is door HH Delfland een planning opgezet. De sanering is aangevangen op 1 december 2008.

Omschrijving werkzaamheden:

Met Patrick is het plan van aanpak en de planning doorgenomen, deze is begrepen.

In het Pauwenhuis is de ketel (bron 2) ontluchting (bron 1) inmiddels gesaneerd en vrijgegeven. Door het ontbreken van de sleutel is dit niet gecontroleerd. Ook de verwijdering van de beplating in de D-vleugel (bron 3) is afgerond en vrijgegeven.

Inmiddels is een containment geplaatst voor de gangkasten, hieruit wordt asbesthoudend vloerzeil verwijderd. Deze wordt vandaag opgeleverd.

Vernomen is dat de kelder D, waar leidingisolatie wordt verwijderd (bron 5), niet leeggeruimd is. Vissers zal zoveel mogelijk alles opzij plaatsen om het containment te verkleinen. Van vloer en stellingen zijn reeds kleefmonsters genomen, deze zijn allen negatief (geen asbest). Vandaag wordt ook een luchtmeting in de kelder genomen om vast te stellen of hier zonder adembescherming werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Er is geen reden om aan te nemen dat van de planning afgeweken moet worden of deze niet wordt gehaald.



foto 01: gesaneerde converstorputten in de D-vleugel



foto 02: opbouw van het containment voor het verwijderen van vloerzeil. De douche is in het kantoor geplaatst



foto 03: toegang vanuit de gang

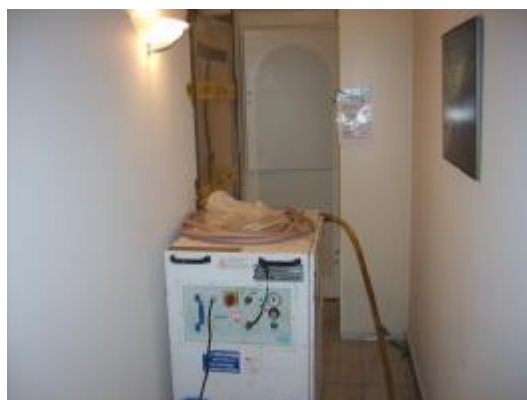


foto 04: plaatsing van de onderdruk en watermanagent
