



Kwaliteitscontrole OVL gemeente Stein

Q3 2026

Opdrachtgever: gemeente Stein

Aannemer: @@@@

Datum opname: 01-10-2026



Samenvatting

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de rapportage van de onlangs uitgevoerde kwaliteitscontrole, periode Q3 2026, van aannemer @@@@.

Deze controle is uitgevoerd op 01-10-2026.

Indien u na het doornemen van de rapportage nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Roel Gevers van de firma Nobralux via telefoonnummer 0647028378 of emailadres roel.gevers@nobralux.nl.

Met vriendelijke groet,

Roel Gevers

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

1

Kwaliteitscontrole

Nobralux heeft namens de gemeente Stein een kwaliteitscontrole per verlichtingsobject uitgevoerd. Er is gecontroleerd¹ op de volgende onderdelen:

- vervangen van een schademast.
- vervangen van een (defect) armatuur.
- veiligstellen van een aanrijding.
- rechtzetten van de mast.
- het correct uitvoeren van een werkopdracht.

De selectie van de kwaliteitscontrole is bepaald door afgesloten meldingen in het beheerprogramma Liteweb. Tijdens de kwaliteitscontrole zijn er meerdere verlichtingsobjecten gecontroleerd (ca. 10 stuks).

Bij elke controle¹ zijn er foto's gemaakt van het verlichtingsobject en de eventuele herstelpunten.

Tot slot is er bepaald of de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt aangegeven of een object akkoord of niet akkoord is bevonden.

Indien van toepassing krijgt de aannemer bij een of meerdere herstelpunt(en) de mogelijkheid om deze te herstellen voor een bepaalde datum, welke in deze rapportage is vermeld. Herstelpunten met een (groot) veiligheidsrisico zijn door de toezichthouder beoordeeld en er is aangegeven of deze direct opgelost moeten worden.

¹ [Voor meer informatie over de controlepunten, zie bijlage 1](#)

2 Gegevens en conclusie

2.1 Klantgegevens

| Klantgegevens opdrachtgever | | Projectgegevens aannemer | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Opdrachtgever | gemeente Stein | Aannemer | |
| Contact | | Contact | |
| Email | | Email | |
| Telefoonnr | | Telefoonnr | |
| Besteknr | STE-26-01 | | |

2.2 Herstelpunten

Herstelpunten

Er zijn tijdens de opname **geen herstelpunten** geconstateerd!

- *De (eventuele) herstelpunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 Controle.*

2.3 Uitslag aannemer



| Meldingsnummer | Kwalificatie risico |
|----------------|---------------------|
| Ticket @@ | Akkoord |
| Ticket @@ | Akkoord |
| Ticket @@ | Akkoord |

2.4 Algemene opmerking

3 Controle melding

3.1 Werkopdracht

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Actienummer | Plaatsnaam | Straatnaam | Mastnummer |
| Ticket @ | Urmond | Kerkstraat | 9095 |
| Bestekposten | Oorzaak: | | |
| Herstelpunten lichtmast | | Herstelpunten armatuur/lamp | |
| lichtmast is akkoord, | | armatuur is akkoord, | |
| Beoordeling object | Opmerking | | |
| Akkoord | | | |
| Foto's | | | |

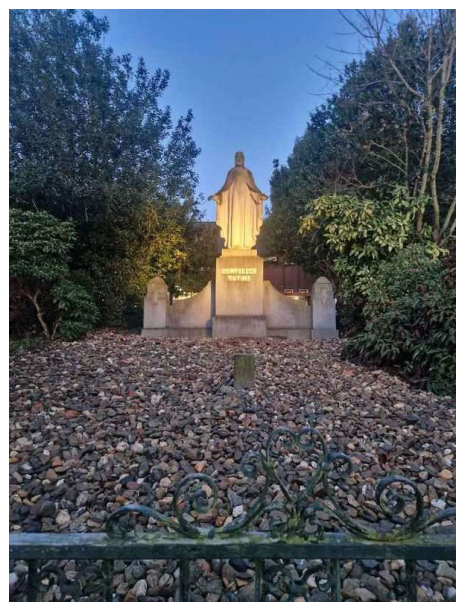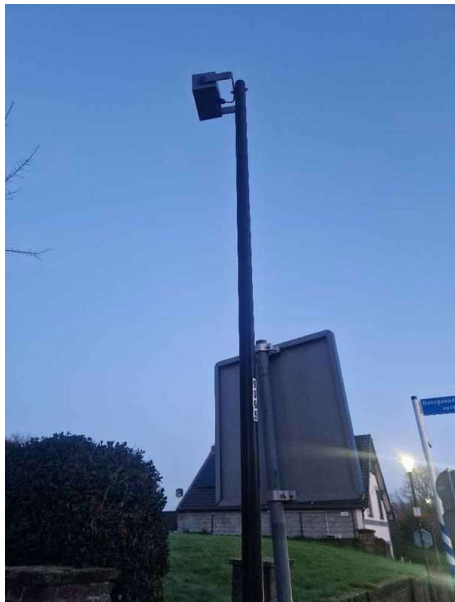

3.2 Armatuur

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Actienummer | Plaatsnaam | Straatnaam | Mastnummer |
| Ticket @@ | Stein | Valderstraat 18 | 5778 |
| Bestekposten | Oorzaak: | | |
| Herstelpunten lichtmast | Herstelpunten armatuur/lamp | | |
| | armatuur is akkoord, | | |
| Beoordeling object | Opmerking | | |
| Akkoord | | | |
| Foto's | | | |



3.3 Schademast

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Actienummer | Plaatsnaam | Straatnaam | Mastnummer |
| Ticket @@ | Nieuwdorp | Diepenbeekstraat | 488 |
| Bestekposten | | Oorzaak: | |
| Herstelpunten lichtmast | | Herstelpunten armatuur/lamp | |
| lichtmast is akkoord, | | armatuur is akkoord, | |
| Beoordeling object | Opmerking | | |
| Akkoord | | | |
| Foto's | | | |



4

Bijlage

4.1 Controlepunten schademast

| nr: | controle lichtmast |
|-----|---|
| 1 | lichtmast staat niet volgens tekening |
| 2 | lichtmast staat niet juist in straatwerk |
| 3 | lichtmast staat scheef |
| 4 | lichtmast staat te diep of ondiep |
| 5 | lichtmast heeft kleine krassen of beschadigingen |
| 6 | lichtmast heeft diepe krassen of beschadigingen |
| 7 | lichtmast is niet op de juiste wijze afgevuld |
| 8 | lichtmast is niet aangesloten op aarde (aardschroef) |
| 9 | sticker is niet (goed) aangebracht |
| 10 | mastluik zit aan de verkeerde zijde |
| 11 | aansluitsnoer is niet correct |
| 12 | aansluitkabel is niet juist aangesloten |
| 13 | straatwerk rondom lichtmast is niet goed afgewerkt of opgeruimd |
| 14 | bebording is niet op de juiste wijze aan de mast bevestigd |
| 15 | lichtmast heeft verkeerde mastuitvoering/mastkleur |
| 16 | lengte aansluitsnoer is niet juist |
| 17 | aansluitvoorziening zit los in de mast |
| 18 | lichtmast is akkoord |

| nr: | controle armatuur |
|-----|---|
| 1 | armatuurtype of RAL kleur is niet juist |
| 2 | armatuur staat niet haaks op de rijbaan |
| 3 | armatuur heeft last van vocht of water |
| 4 | armatuur heeft geen afscherming |
| 5 | binnenwerk van de armatuur is vies of zit niet vast |
| 6 | armatuur is niet aangesloten als klasse I of II |
| 7 | aansluitsnoer is niet juist aangesloten |
| 8 | armatuur beschikt niet over dynamische onderdelen |
| 9 | armatuur is akkoord |

4.2 Controlepunten armatuur

| nr: | controle armatuur |
|-----|---|
| 1 | armatuurtype of RAL kleur is niet juist |
| 2 | armatuur staat niet haaks op de rijbaan |
| 3 | armatuur heeft last van vocht of water |
| 4 | armatuur heeft geen afscherming |
| 5 | binnenwerk van de armatuur is vies of zit niet vast |
| 6 | armatuur is niet aangesloten als klasse I of II |
| 7 | aansluitsnoer is niet juist aangesloten |
| 8 | armatuur beschikt niet over dynamische onderdelen |
| 9 | armatuur is akkoord |

4.3 Controlepunten scheefstand

| nr: | controle armatuur |
|-----|---|
| 1 | mast is niet rechtgezet |
| 2 | mast is beschadigd |
| 3 | straatwerk rondom lichtmast is niet goed afgewerkt of opgeruimd |
| 4 | lichtmast is akkoord |
| 5 | lichtmast is niet op de juiste wijze afgevuld |

4.4 Controlepunten veiligstellen

| nr: | controle object is gehandhaafd |
|-----|--|
| 1 | sticker aannemer ontbreekt op de mast |
| 2 | aansluitingen aansluitblok zijn niet correct |
| 3 | aansluitkabel armatuur is beschadigd |
| 4 | grondkabel is beschadigd |
| 5 | zekering aansluitblok is defect |
| 6 | mast heeft deuken |
| 7 | de knik in de mast geeft een onveilig situatie |
| 8 | armatuur zit los op de mast |
| 9 | veiligstellen is akkoord |

| nr: | controle object is (deels) verwijderd |
|-----|--|
| 1 | de aansluiting van de netbeheerder is niet verwijderd |
| 2 | het stompje is niet veilig achtergelaten |
| 3 | materialen afkomstig van het object zijn niet opgeruimd |
| 4 | omgeving is niet netjes achtergelaten na verwijdering object |
| 5 | veiligstellen is akkoord |
