


Schakelbericht laagspanning (afschakelen en onder spanning brengen) **voorbeeld**

Datum: 09-04-19		Blad 1 van 2									
Objectnummer: 30G03		Gebouwnummer: 104	Werkadres: Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag								
Omschrijving aard en plaats van de werkzaamheden: Het uit bedrijf nemen van de 400V voedingskabel tussen Fa VG de Vries veld C4 en verdeelkast Hal 11 i.v.m. montagewerkzaamheden aan deze kabel.											
nr.	U in V	Waar	Welke richting	Met.	Bev.	Waarmee	Wat is gevolg	Met.	Bev.	Bijzonderheden	Gereed
1	400	Verdeelkast Hal 11	Eindgroepen verdeelkast	COS DM	-	Hoofdschakelaar	Afschakelen	SLA -	A	-	
2	400	Veld C4 Fa. VG de Vries	Verdeelkast Hal 11	- -	-	Lastscheider	Afschakelen	SLA -	A	-	
3	400	Veld C4 Fa. VG de Vries	Verdeelkast Hal 11	SLA -	-	Mespatronen	Scheiden	- -	A	Dummy's	
4	400	Verdeelkast Hal 11	Veld C4 Fa. VG de Vries	SLA -	-	Mespatronen	Scheiden	- -	A	Dummy's	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Geschreven door: Dhr. Jansen						Gewenste datum uitvoering: nader te bepalen					
Installatieverantwoordelijke (IV)						Werkverantwoordelijke (WV)					
Naam: Dhr. Pietersen			Paraaf: XX			Naam: Dhr. Jansen			Paraaf: XX		
Opmerkingen: bijlage installatieschema MDK-410-004											
Legenda metingen (Met.)						Legenda beveiligen (Bev.)					
COS	Controleren op spanning (bedrijfsspanning)		DM	Draaiveld meten		A	Beveiligen tegen opnieuw inschakelen en bord of label plaatsen		V	Beveiliging tegen opnieuw inschakelen verwijderen en bord of label verwijderen	
SLA	Spanningsloosheid aantonen		IWM	Isolatieweerstand meten							
FGA	Fasegelijkheid aantonen										

Schakelbericht laagspanning (afschakelen en onder spanning brengen) **voorbeeld**

Datum: 09-04-19		Blad 2 van 2									
Objectnummer: 30G03		Gebouwnummer: 104	Werkadres: Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag								
Omschrijving aard en plaats van de werkzaamheden: Het in bedrijf stellen van de 400V voedingskabel tussen Fa VG de Vries veld C4 en Hal 11 na afronding montagewerkzaamheden aan deze kabel.											
nr.	U in V	Waar	Welke richting	Met.	Bev.	Waarmee	Wat is gevolg	Met.	Bev.	Bijzonderheden	Gereed
1	400	Veld C4 Fa. VG de Vries	Verdeelkast Hal 11	SLA IWM	V	Mespatronen	Scheiding opheffen	- -	-	-	
2	400	Veld C4 Fa. VG de Vries	Verdeelkast Hal 11	- -	V	Lastscheider	Onder spanning brengen	COS -	-	-	
3	400	Verdeelkast Hal 11	Veld C4 Fa. VG de Vries	COS DM	V	Mespatronen	Scheiding opheffen	- -	-	PBM's	
4	400	Verdeelkast Hal 11	Eindgroepen verdeelkast	- -	V	Hoofd/groepsschakelaars	Onder spanning brengen	COS -	-	-	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Geschreven door: Dhr. Jansen						Gewenste datum uitvoering: nader te bepalen					
Installatieverantwoordelijke (IV)						Werkverantwoordelijke (WV)					
Naam: Dhr. Pietersen			Paraaf: XX			Naam: Dhr. Jansen			Paraaf: XX		
Opmerkingen: bijlage installatieschema MDK-410-004											
Legenda metingen (Met.)						Legenda beveiligen (Bev.)					
COS	Controleren op spanning (bedrijfsspanning)		DM	Draaiveld meten		A	Beveiligen tegen opnieuw inschakelen en bord of label plaatsen		V	Beveiliging tegen opnieuw inschakelen verwijderen en bord of label verwijderen	
SLA	Spanningsloosheid aantonen		IWM	Isolatieweerstand meten							
FGA	Fasegelijkheid aantonen										

Fa. VG de Vries

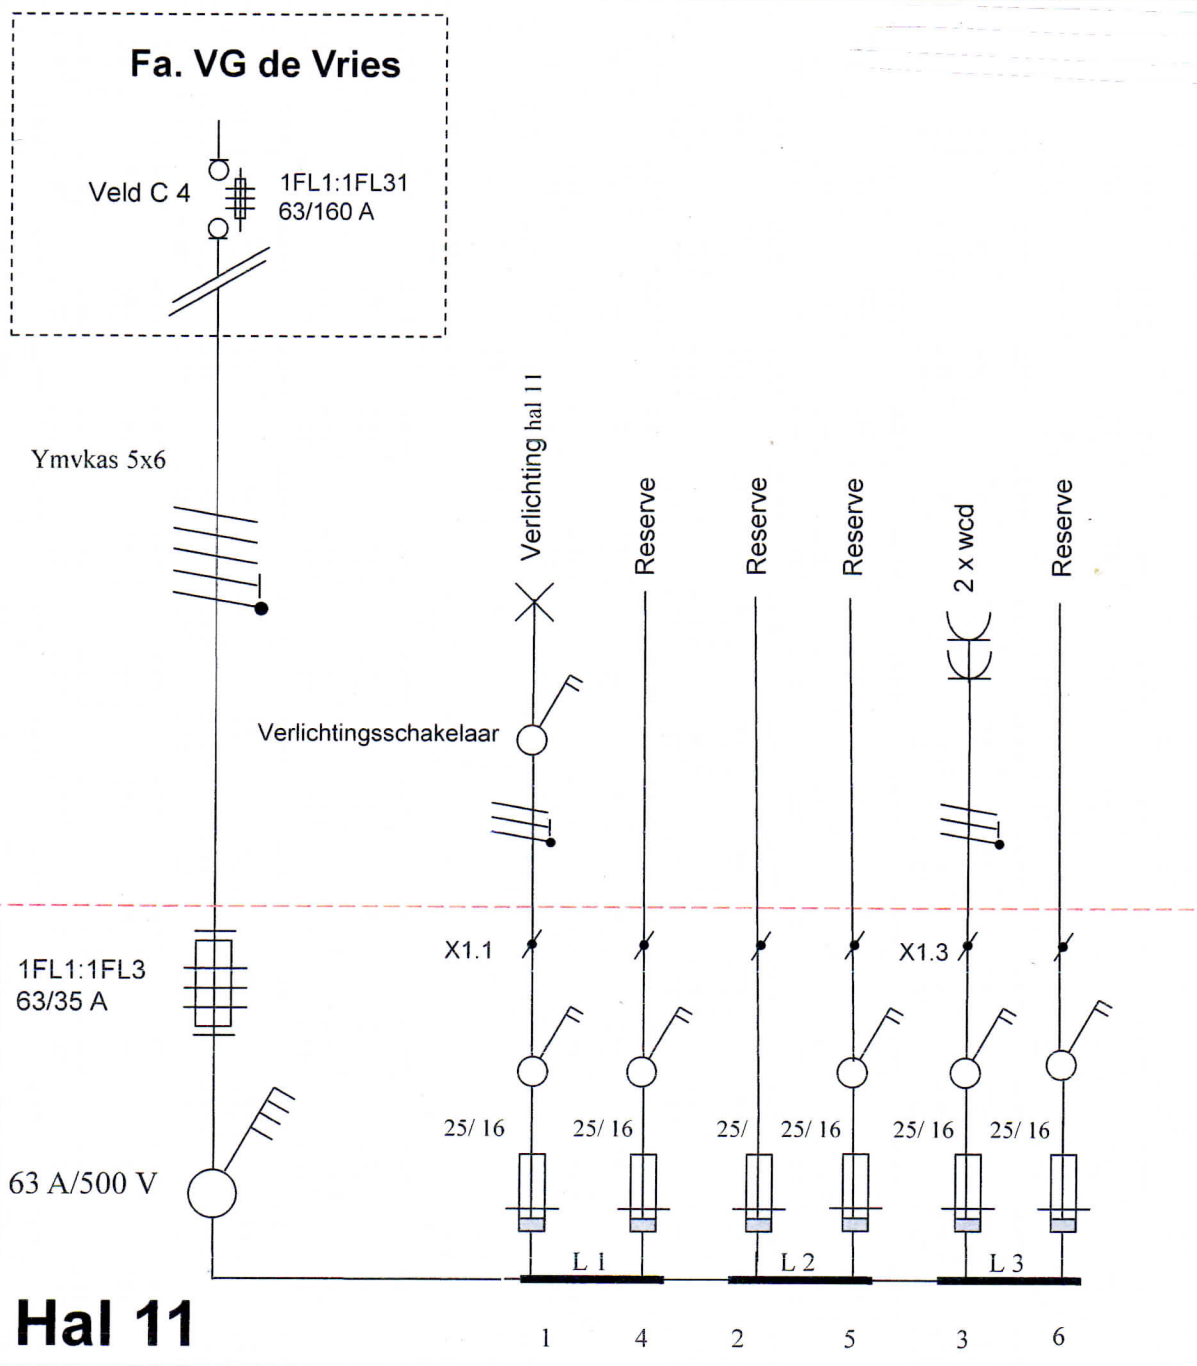

TEK. MDK-410-004
