


## Unitgegevens



## Adresgegevens

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Titel    | Sportcomplex Hogekwartier |
| Adres    | De Velduil 2              |
| Postcode | 3815 XT                   |
| Plaats   | Amersfoort                |
| Regio    |                           |

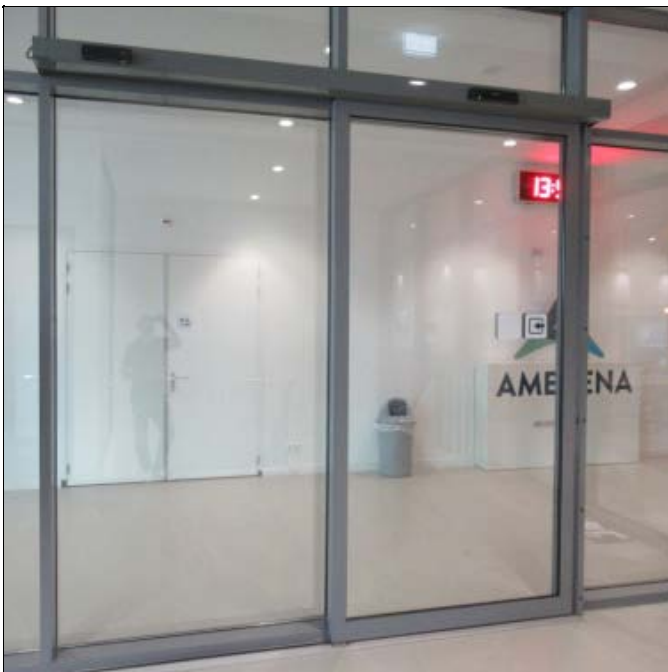

## Unit gegevens

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Locatie                                                                              |                   |
| Bouwjaar                                                                             | 2018              |
| Onderhoudsnummer                                                                     | 0070170           |
| Onderhoudsfirma                                                                      | KONE              |
| Onderhoudscategorie                                                                  | B                 |
| Fabrieksnummer                                                                       | 0070170           |
| Algemene conditie                                                                    | <b>1</b>          |
| Keuringsinstantie                                                                    | NVT               |
| Keuringsnummer                                                                       | NVT               |
| Keuringscertificaat                                                                  | NVT               |
| Norm                                                                                 | machine richtlijn |
|  |                   |
| ECO Technisch                                                                        | B                 |
| ECO Omgeving                                                                         | B                 |

## Inventarisatie

### Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

|                               |                 |                                 |            |                     |       |                          |      |                |  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|------|----------------|--|
| Deurvleugel uitvoering        | glas, aluminium | Afmetingen deurvleugel (bxh,mm) | 1350x2600  | Schuifdeur          | enkel | Vrije doorgang (opening) | 1350 |                |  |
| Zijpaneel, omvatting, rubbers | -               | Type deur                       | schuifdeur | Afmeting (doorsnee) | 2700  | Bovenpaneel              |      | Materialisatie |  |

### Deuraandrijving, automaat en besturing

|                             |   |                 |            |              |    |                             |   |                   |          |           |            |              |
|-----------------------------|---|-----------------|------------|--------------|----|-----------------------------|---|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|
| Soort boven-railaandrijving | - | Motor fabricaat | assa abloy | Vermogen (W) | nb | Soort voeding               | - | Soort aandrijving | tandriem | Besturing | Assa Abloy | Deurautomaat |
| Noodontgrendeling           |   | Brandsturing    | nee        | Omkeer       |    | Controle ontgredel.deurstel |   |                   |          |           |            |              |

### Detectievoorzieningen en beveiligingen

|         |     |                    |    |                    |    |                    |    |             |     |                      |   |                   |     |
|---------|-----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-------------|-----|----------------------|---|-------------------|-----|
| Fotocel | nee | Radarsensor binnen | ja | Radarsensor buiten | ja | Elleboogschakelaar | ja | Bol-druknop | nee | Kuipstijlbeveiliging | - | Dorpelbeveiliging | nee |
|---------|-----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-------------|-----|----------------------|---|-------------------|-----|

### Bedieningen, inhoud paneel, elementen

|                            |     |  |                    |    |  |             |     |
|----------------------------|-----|--|--------------------|----|--|-------------|-----|
| Uit - nacht - dag/handbed. | nee |  | Deurstelblokkering | ja |  | Winterstand | nee |
|----------------------------|-----|--|--------------------|----|--|-------------|-----|

### Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Materile cabine-afsluiting+standaanduiding | nvt |
| Periodieke controle draag-staalkabels      | nvt |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)      | nvt |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70           | nvt |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)     | nvt |
| Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s   | nvt |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)       | nvt |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering     | nvt |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi     | nvt |
| Noodverlichting in de cabine               | nvt |

### Arbo Veiligheid

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Installatie geheel ARBO-veilig | nvt |
|--------------------------------|-----|

## Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

| Onderdeel                                    | Vorige<br>conditie | Huidige<br>conditie | Belang | Intensiteit | Omvang | Conditie<br>na | Opmerking | Actie + jaar   |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 30.31 Deurconstructie, kuip                  |                    |                     |        |             |        |                |           |                |
| Deurvleugel uitvoering                       |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Aanbrengen 0   |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Vervangen 2048 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2033   |
| Deurset-vleugels, vouw-schuif                |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Vervangen 2048 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2033   |
| Deurvleugel en railophangconsole             |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Vervangen 2048 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2048   |
| Geleidingsrail en bovenbakafscherming        |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Vervangen 2048 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2026   |
| Sectional, geleidingsrail                    |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Vervangen 2048 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2033   |
| 30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing |                    |                     |        |             |        |                |           |                |
| Besturing, accu/batterijen                   |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2023 |
| Besturing, voeding                           |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 1              |           | Vervangen 2033 |
| Motor, lagers en wielen                      |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2033 |
|                                              |                    |                     |        |             |        |                |           | Revisie 2026   |
| 30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen |                    |                     |        |             |        |                |           |                |
| Beveiliging, blokkering, deurpositie         |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2026 |
| 30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen  |                    |                     |        |             |        |                |           |                |
| Bediening, deurstelblokkering                |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2026 |
| 30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden      |                    |                     |        |             |        |                |           |                |
| Elektrische installatie                      |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2048 |
| Bouwkundige voorzieningen                    |                    | 1                   | Gering | Laag        | <2%    | 2              |           | Vervangen 2048 |

## Onderhoud

### Keuringen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Keuringsinstantie   | NVT |
| Keuringsnummer      | NVT |
| Keuringscertificaat | NVT |

### Onderhoud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Onderhoudsfirma | KONE |
| Onderhoudsvorm  | B    |

### Storingen

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Opmerkingen<br>storingsoverzicht<br>liftboek |  |
|----------------------------------------------|--|

### Onderhoud

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Inspecteur                                     | Eric Kok               |
| Datum                                          | donderdag 20 juni 2019 |
| Opnametoelichting<br>/ -rapportage<br>algemeen | MJOP 04072019 :<br>-   |
