




Inspectierapport

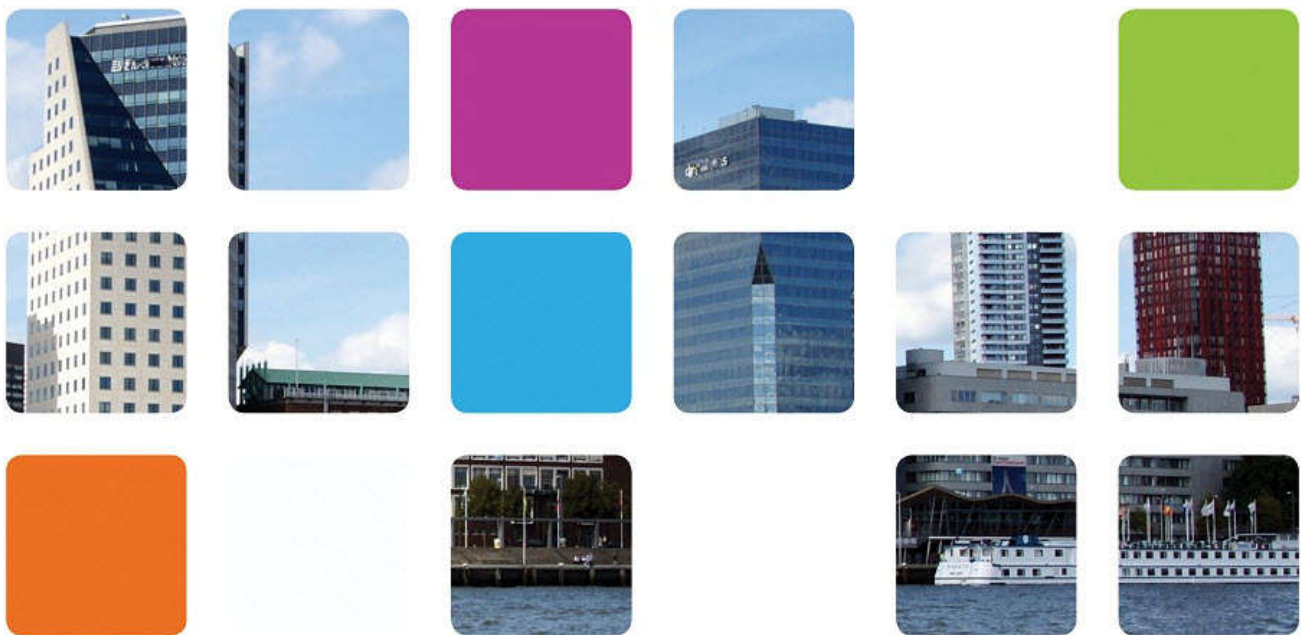

Gemeente Assen

0000000317 Kinderboerderij De Hertenkamp

Hertenkamp ONG

18 februari 2020

J. Derks

Objectgegevens

Objectcode	0000000317
Objectomschrijving	Kinderboerderij De Hertenkamp
Adres	Hertenkamp ONG 9401 HL Assen
Bouwjaar	1842
Verbouwing	2018
BVO	60 m2



Onderhoudsniveau **Gewenst Conditiesniveau 4**

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	60,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	60,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	60,00 BVO	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	60,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00 PM	3
21.16.091	Boeib./windv. < 300 mm schilderwerk dekkend	42,50 M1	1
21.16.110	Boeiboord/windveer hout monumentaal	42,50 M1	1
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Gevel - Gevel			
28.11.092	Skeletdeel > 300mm schilderwerk dekkend buiten	5,20 M2	1
28.11.100	Skeletdeel hout	1,00 PM	2
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	10,00 M1	1
31.41.110	Kozijnwerk hout monumentaal	4,00 M2	1
31.43.092	Buitenluiken schilderwerk dekkend	0,00 M2	1
31.43.110	Buitenluik hout monumentaal	1,00 STK	2
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	3
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	66,50 M2	2
41.12.100	Gevelbekleding hout	66,50 M2	1
41.14.400	Gevelafdichting loodslabben	19,00 M1	2
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	55,00 M2	1
47.12.500	Hellende dakafwerking koper	20,00 M2	2
47.12.800	Hellende dakafwerking riet	35,00 M2	1
47.21.100	Dakbekleding ornament	2,00 STK	1
53 - WATER			
Installatie - Installatie			
53.14.110	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 1 pomp	1,00 STK	3
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.			
Installatie - Installatie			
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	60,00 BVO	1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	1,00 STK	1
61.51.310	Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp	2,00 STK	2
63 - VERLICHTING			
Installatie - Installatie			
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	60,00 BVO	2
63.11.400	Lampen algemeen	60,00 BVO	1

90 - TERREINVOORZIENINGEN

Gevel - Gevel

90.63.320	Gevel- en plafondarmaturen middelgroot	6,00 STK	2
-----------	--	----------	---

Terrein - Terrein

90.33.200	Afrastering (houten) paaltjes met planken	460,00 M1	2
90.41.100	Terreinverharding klinkers	40,00 M2	2
