




Inspectierapport

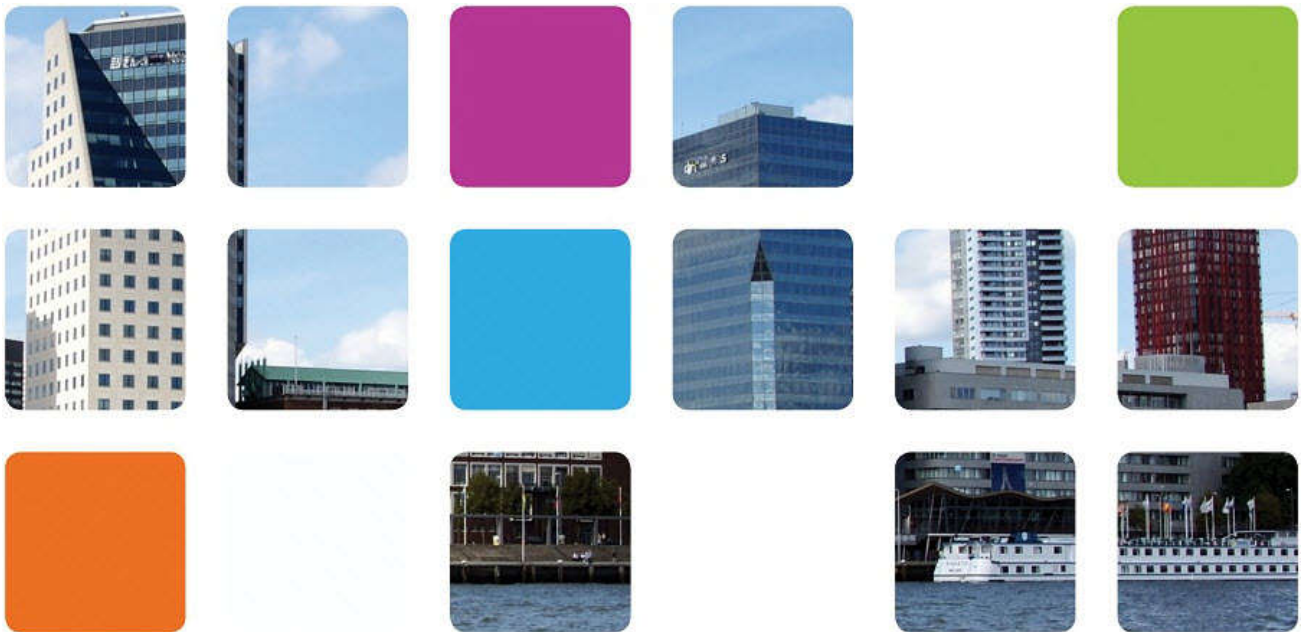

000000372 Tribune ACV

Kortbossen 1

27 januari 2020

T. Teunissen

Objectgegevens

Objectcode	0000000372
Objectomschrijving	Tribune ACV
Adres	Kortbossen 1
	9405 Assen
Bouwjaar	1978
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	250 m2



Onderhoudsniveau **Gewenst Condicioniveau 4**

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	250,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	250,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	250,00 BVO	1
Dak - Dak			
10.10.700	Asbestverdacht materiaal (golfplaten dak)	1,00 PM	6
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.100	Gesloten gevel metselwerk	1,00 PM	2
21.16.500	Boeiboord/windveer vezelcement	97,00 M1	1
24 - TRAPPEN EN HELLINGEN			
Gevel - Gevel			
24.11.300	Rechte steektrap beton (betonnen tribune)	1,00 PM	4
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Gevel - Gevel			
28.11.200	Skeletdeel staal	1,00 PM	3
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	1
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	9,00 M2	2
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	9,00 M2	4
31.40.091	Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten	23,00 M1	4
31.41.100	Kozijnwerk hout	15,50 M2	4
31.41.200	Kozijnwerk staal	11,40 M2	1
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.11.220	Gevelafwerklaag voegwerk platvol	1,00 PM	3
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	90,00 M2	1
41.12.100	Gevelbekleding hout	90,00 M2	1
41.12.240	Gevelbekleding aluminium	160,00 M2	3
41.14.100	Gevelafdichting kitvoegen	76,00 M1	1
41.15.600	Gevelafdekking beton	2,00 M1	4
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.12.340	Hellende dakafwerking profielplaat vezelcement	250,00 M2	4
52 - AFVOEREN			
Gevel - Gevel			
52.12.091	Regenwaterafvoeren < 300mm schilderwerk buiten	15,70 M1	3
52.12.101	Goten en gootbekleding algemeen	42,50 M1	1
52.12.110	Goot prefab kunststof	42,50 M1	1
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	17,70 M1	1
