




## Inspectierapport

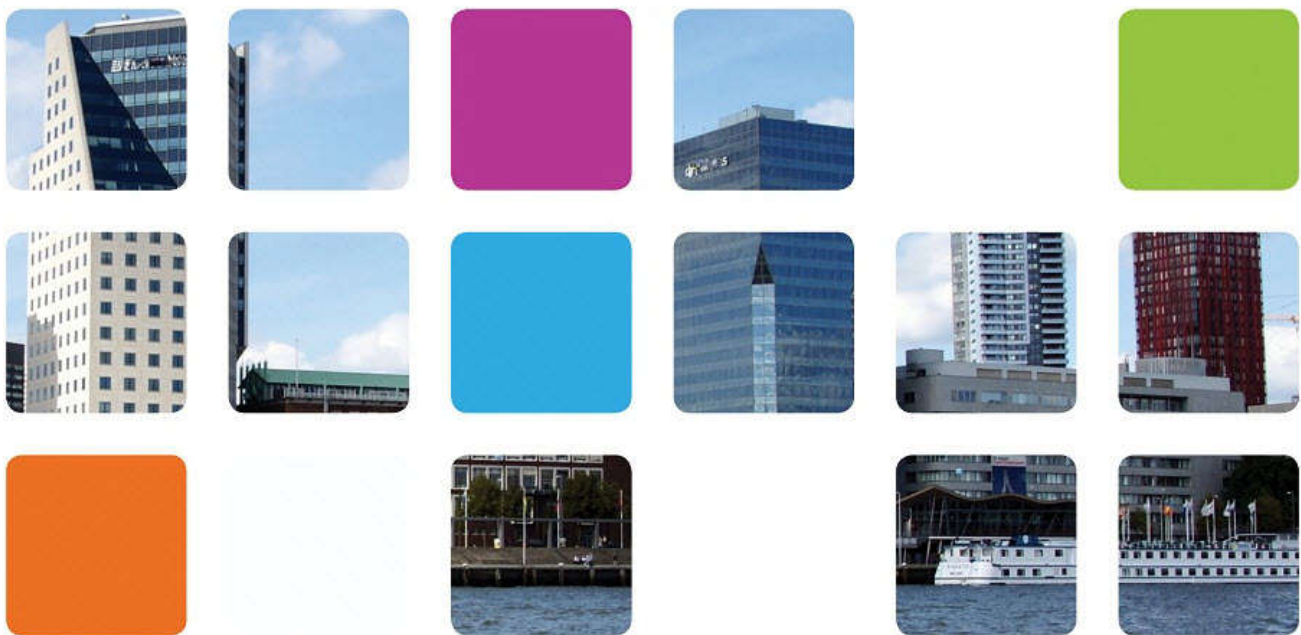

**OBJ0000514 MFA Kloosterveste Wijkcentrum Vesteplein 5**

**Vesteplein 5**

6 maart 2020

P. Kleintjens en T. Teunissen

## Objectgegevens

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Objectcode         | <b>OBJ0000514</b>                                 |
| Objectomschrijving | <b>MFA Kloosterveste Wijkcentrum Vesteplein 5</b> |
| Adres              | <b>Vesteplein 5<br/>9408 Assen</b>                |
| Bouwjaar           | <b>2010</b>                                       |
| Verbouwing         | <b>Niet van toepassing</b>                        |
| BVO                | <b>3176 m2</b>                                    |



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Onderhoudsniveau | <b>Gewenst Conditiesniveau 4</b> |
|------------------|----------------------------------|

## Conditieoverzicht

| Code                               | Element                                    | Hoeveelheid  | O |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---|
| <b>10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN</b> |                                            |              |   |
| Algemeen - Algemeen                |                                            |              |   |
| 10.10.100                          | Herinspectie NEN2767 derden                | 3.176,00 BVO | 1 |
| 10.10.400                          | Herstelonderhoud bouwkundig & installaties | 3.176,00 BVO | 1 |
| 10.10.500                          | Technisch advies derden                    | 1,00 PM      | 2 |
| 10.10.600                          | Schades algemeen                           | 3.176,00 BVO | 1 |
| 10.10.800                          | Klachten onderhoud schoonmaak              | 3.176,00 BVO | 1 |
| 10.40.200                          | Contract schoonmaak                        | 1,00 POST    | 1 |
| 10.40.210                          | Contract gebouwbeheer                      | 1,00 POST    | 1 |
| 10.40.220                          | Contract alarmopvolging                    | 1,00 POST    | 1 |
| Dak - Dak                          |                                            |              |   |
| 10.30.150                          | Keuring valbeveiliging RIE                 | 1,00 POST    | 1 |
| Gevel - Gevel                      |                                            |              |   |
| 10.20.105                          | Steigerwerk schilderwerk (rolsteiger)      | 1,00 POST    | 1 |
| 10.20.190                          | Steigerwerk diverse (hoogwerker)           | 1,00 POST    | 1 |
| Installatie - Installatie          |                                            |              |   |
| 10.10.110                          | Inspectie NEN3140                          | 3.176,00 BVO | 1 |
| 10.30.110                          | Keuring SCIOS                              | 1,00 POST    | 1 |
| 10.30.130                          | Keuring koudeopwekking STEK                | 1,00 POST    | 1 |
| 10.30.160                          | Keuring lift                               | 1,00 POST    | 1 |
| Terrein - Terrein                  |                                            |              |   |
| 10.30.170                          | Keuring speeltoestel                       | 1,00 POST    | 1 |
| <b>21 - BUITENWANDEN</b>           |                                            |              |   |
| Gevel - Gevel                      |                                            |              |   |
| 21.11.092                          | Buitenwanden > 300mm schilderwerk algemeen | 116,00 M2    | 2 |
| 21.11.100                          | Gesloten gevel metselwerk                  | 5,00 PM      | 1 |
| 21.13.900                          | Systeemgevel diverse (glas)                | 281,00 M2    | 1 |
| 21.14.300                          | Vliesgevel aluminium                       | 40,50 M2     | 1 |
| 21.14.300                          | Vliesgevel aluminium                       | 435,00 M2    | 2 |
| 21.14.900                          | Vliesgevel diverse (glas)                  | 47,00 M2     | 1 |
| 21.16.400                          | Boeiboord/windveer kunststof               | 102,00 M1    | 1 |
| <b>22 - BINNENWANDEN</b>           |                                            |              |   |
| Binnen - Binnen                    |                                            |              |   |
| 22.13.100                          | Systeemwand sanitair                       | 21,30 M1     | 1 |
| 22.14.100                          | Systeemwand verplaatsbaar panelen          | 76,00 M2     | 1 |
| <b>23 - VLOEREN</b>                |                                            |              |   |
| Dak - Dak                          |                                            |              |   |
| 23.14.100                          | Bordes hout                                | 91,00 M2     | 2 |
| Gevel - Gevel                      |                                            |              |   |
| 23.13.100                          | Galerij hout                               | 50,00 M2     | 2 |
| 23.13.200                          | Galerij beton                              | 1,00 PM      | 1 |
| 23.13.200                          | Galerij beton                              | 1,00 PM      | 2 |

**28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE**

## Dak - Dak

|           |                  |         |   |
|-----------|------------------|---------|---|
| 28.11.200 | Skeletdeel staal | 1,00 PM | 1 |
|-----------|------------------|---------|---|

## Gevel - Gevel

|           |                  |         |   |
|-----------|------------------|---------|---|
| 28.11.200 | Skeletdeel staal | 2,00 PM | 1 |
| 28.11.200 | Skeletdeel staal | 2,00 PM | 2 |

**31 - BUITENWANDOPENINGEN**

## Binnen - Binnen

|           |                                                |           |   |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|---|
| 31.30.080 | Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen       | 20,50 M2  | 2 |
| 31.40.081 | Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen bi/bu | 441,00 M1 | 2 |
| 31.40.082 | Kozijnwerk > 300mm schilderwerk algemeen bi/bu | 1,00 M2   | 2 |

## Gevel - Gevel

|           |                                                |             |   |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---|
| 31.20.010 | Ramen hang & sluitwerk algemeen                | 111,00 STK  | 1 |
| 31.20.220 | Ventilatiooroster in gesloten gevel algemeen   | 41,00 STK   | 1 |
| 31.30.010 | Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen         | 244,00 STK  | 1 |
| 31.30.092 | Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend       | 236,50 M2   | 2 |
| 31.30.092 | Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend       | 111,70 M2   | 3 |
| 31.32.020 | Schuifdeur elektrisch                          | 3,00 STK    | 2 |
| 31.40.091 | Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten | 2.528,60 M1 | 2 |
| 31.40.091 | Kozijnwerk < 300mm schilderwerk dekkend buiten | 1.443,00 M1 | 3 |
| 31.40.092 | Kozijnwerk > 300mm schilderwerk dekkend buiten | 1,00 M2     | 2 |
| 31.41.020 | Waterslagen algemeen                           | 202,60 M1   | 1 |
| 31.41.020 | Waterslagen algemeen                           | 76,00 M1    | 2 |
| 31.41.100 | Kozijnwerk hout                                | 1.655,70 M2 | 1 |
| 31.41.400 | Kozijnwerk aluminium                           | 292,00 M2   | 2 |
| 31.42.000 | Beglazing algemeen                             | 1,00 PM     | 2 |
| 31.44.000 | Zonwering algemeen                             | 5,00 STK    | 1 |
| 31.44.220 | Zonwering screens elektrisch algemeen          | 5,00 STK    | 2 |
| 31.44.811 | Vaste zonweringconstructie vaste lamellen      | 10,00 M2    | 1 |

**32 - BINNENWANDOPENINGEN**

## Binnen - Binnen

|           |                                                 |            |   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|---|
| 32.10.120 | Binnenwandopening rolluik elektrisch            | 1,00 STK   | 1 |
| 32.30.010 | Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen          | 122,00 STK | 1 |
| 32.30.080 | Binnendeuren schilderwerk algemeen              | 20,50 M2   | 2 |
| 32.31.920 | Binnendeur elektrische deurdranger              | 2,00 STK   | 2 |
| 32.40.081 | Kozijnwerk < 300mm schilderwerk algemeen binnen | 441,00 M1  | 2 |
| 32.40.082 | Kozijnwerk > 300mm schilderwerk algemeen binnen | 1,00 M2    | 2 |

**33 - VLOEROPENINGEN**

## Terrein - Terrein

|           |                    |          |   |
|-----------|--------------------|----------|---|
| 33.21.110 | Vloerrooster staal | 4,00 STK | 1 |
|-----------|--------------------|----------|---|

**34 - BALUSTRADES / LEUNINGEN**

## Dak - Dak

|           |                             |           |   |
|-----------|-----------------------------|-----------|---|
| 34.12.230 | Balustrade buiten aluminium | 3,00 M1   | 1 |
| 34.22.220 | Leuning buiten staal        | 134,50 M1 | 1 |

## Gevel - Gevel

|           |                         |           |   |
|-----------|-------------------------|-----------|---|
| 34.12.220 | Balustrade buiten staal | 169,00 M1 | 1 |
| 34.12.220 | Balustrade buiten staal | 226,50 M1 | 2 |
| 34.22.220 | Leuning buiten staal    | 77,00 M1  | 1 |
| 34.22.220 | Leuning buiten staal    | 6,00 M1   | 2 |

**37 - DAKOPENINGEN**

|                                   |                                              |             |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---|
| <b>Dak - Dak</b>                  |                                              |             |   |
| 37.11.120                         | Dakluik staal                                | 1,00 STK    | 4 |
| 37.21.110                         | Lichtkoepels kunststof algemeen              | 2,00 STK    | 1 |
| 37.22.400                         | Dakraam kunststof                            | 10,00 STK   | 2 |
| 37.25.091                         | Dakkapel < 300mm schilderwerk dekkend buiten | 116,00 M1   | 3 |
| 37.25.092                         | Dakkapel > 300mm schilderwerk dekkend buiten | 4,60 M2     | 3 |
| 37.25.190                         | Dakkapel dakafwerking diverse (EPDM)         | 44,00 M2    | 1 |
| 37.25.310                         | Dakkapel kozijnwerk hout                     | 41,00 M2    | 1 |
| 37.25.410                         | Dakkapel loopdeur                            | 4,00 STK    | 1 |
| 37.25.520                         | Dakkapel wangen kunststof                    | 19,50 M2    | 2 |
| 37.25.590                         | Dakkapel wangen diverse (vezelcement leien)  | 27,80 M2    | 1 |
| <b>41 - BUITENWANDAFWERKINGEN</b> |                                              |             |   |
| <b>Dak - Dak</b>                  |                                              |             |   |
| 41.15.220                         | Gevelafdekking aluminium                     | 22,50 M1    | 2 |
| <b>Gevel - Gevel</b>              |                                              |             |   |
| 41.11.092                         | Gevelafwerklagen schilderwerk dekkend        | 1.039,00 M2 | 2 |
| 41.11.100                         | Gevelafwerklaag pleisterwerk                 | 1.039,00 M2 | 1 |
| 41.11.230                         | Gevelafwerklaag voegwerk verdiept            | 5,00 PM     | 1 |
| 41.12.092                         | Gevelbekledingen schilderwerk dekkend        | 750,00 M2   | 2 |
| 41.12.240                         | Gevelbekleding aluminium                     | 48,00 M2    | 1 |
| 41.12.400                         | Gevelbekleding vezelcement                   | 750,00 M2   | 1 |
| 41.12.400                         | Gevelbekleding vezelcement                   | 173,00 M2   | 2 |
| 41.12.500                         | Gevelbekleding kunststof                     | 267,30 M2   | 1 |
| 41.12.500                         | Gevelbekleding kunststof                     | 71,00 M2    | 2 |
| 41.15.010                         | Gevelafdekking kitvoegen                     | 40,00 STK   | 1 |
| 41.15.220                         | Gevelafdekking aluminium                     | 23,00 M1    | 1 |
| 41.15.220                         | Gevelafdekking aluminium                     | 63,00 M1    | 2 |
| 41.15.400                         | Gevelafdekking zink                          | 6,00 M1     | 2 |
| 41.15.600                         | Gevelafdekking beton                         | 70,50 M1    | 1 |
| <b>42 - BINNENWANDAFWERKINGEN</b> |                                              |             |   |
| <b>Binnen - Binnen</b>            |                                              |             |   |
| 42.10.080                         | Wandafwerkingen schilderwerk algemeen        | 3.200,00 M2 | 2 |
| 42.11.100                         | Wandafwerklaag tegelwerk algemeen            | 1,00 PM     | 1 |
| 42.11.110                         | Wandafwerklaag tegelwerk sanitair            | 250,00 M2   | 1 |
| <b>43 - VLOERAFWERKINGEN</b>      |                                              |             |   |
| <b>Binnen - Binnen</b>            |                                              |             |   |
| 43.21.100                         | Vloerafwerklaag tegelwerk algemeen           | 1,00 PM     | 1 |
| 43.21.210                         | Vloerafwerklaag kunststof coating            | 62,00 M2    | 3 |
| 43.22.100                         | Vloerbekleding tapijt                        | 14,00 M2    | 1 |
| 43.22.200                         | Vloerbekleding linoleum                      | 2.800,00 M2 | 2 |
| 43.22.610                         | Bekleding entreemat inloopmat                | 12,50 M2    | 3 |
| <b>Gevel - Gevel</b>              |                                              |             |   |
| 43.21.210                         | Vloerafwerklaag kunststof coating            | 705,00 M2   | 4 |
| <b>Terrein - Terrein</b>          |                                              |             |   |
| 43.22.640                         | Bekleding entreemat rubberingmat             | 3,50 M2     | 1 |
| <b>45 - PLAFONDAFWERKINGEN</b>    |                                              |             |   |
| <b>Binnen - Binnen</b>            |                                              |             |   |
| 45.12.000                         | Systeemplafonds algemeen                     | 2.900,00 M2 | 2 |

|                             |                                                             |             |  |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--|---|
| Gevel - Gevel               |                                                             |             |  |   |
| 45.00.091                   | Plafonds schilderwerk sauswerk buiten                       | 46,80 M2    |  | 1 |
| 45.00.091                   | Plafonds schilderwerk sauswerk buiten                       | 17,50 M2    |  | 2 |
| 45.22.900                   | Plafondbekleding diverse                                    | 2,50 M2     |  | 1 |
| 45.22.900                   | Plafondbekleding diverse<br>(pleisterwerk)                  | 61,80 M2    |  | 1 |
| <b>47 - DAKAFWERKINGEN</b>  |                                                             |             |  |   |
| Dak - Dak                   |                                                             |             |  |   |
| 47.10.000                   | Dakafwerkingen algemeen                                     | 2.957,50 M2 |  | 1 |
| 47.11.110                   | Vlakke dakafwerking bitumineus                              | 70,50 M2    |  | 1 |
| 47.11.120                   | Vlakke dakafwerking bitumineus met leislag                  | 172,00 M2   |  | 1 |
| 47.11.130                   | Vlakke dakafwerking bitumineus geballast                    | 1.320,00 M2 |  | 2 |
| 47.11.140                   | Vlakke dakafwerking bitumineus met tegels                   | 786,00 M2   |  | 1 |
| 47.11.140                   | Vlakke dakafwerking bitumineus met tegels                   | 71,00 M2    |  | 2 |
| 47.11.310                   | Vlakke dakafwerking kunststof                               | 162,00 M2   |  | 2 |
| 47.12.220                   | Hellende dakafwerking leien vezelcement                     | 285,00 M2   |  | 2 |
| <b>51 - WARMTEOPWEKKING</b> |                                                             |             |  |   |
| Installatie - Installatie   |                                                             |             |  |   |
| 51.21.141                   | Atmosf. gasketel wand HR < 25 kW                            | 1,00 STK    |  | 1 |
| 51.21.143                   | Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW<br>(CV-ketel Brasserie) | 1,00 STK    |  | 2 |
| 51.21.144                   | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW<br>(RK-1/401KK5)           | 1,00 STK    |  | 2 |
| 51.21.144                   | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW<br>(RK-1/401KK7)           | 1,00 STK    |  | 2 |
| 51.21.144                   | Atmosf. gasketel wand HR > 80 kW<br>(RK-1/401KK9)           | 1,00 STK    |  | 2 |
| 51.24.200                   | Rookgas toe-/afvoer gecombineerd                            | 1,00 STK    |  | 1 |
| 51.24.200                   | Rookgas toe-/afvoer gecombineerd                            | 4,00 STK    |  | 2 |
| <b>52 - AFVOEREN</b>        |                                                             |             |  |   |
| Dak - Dak                   |                                                             |             |  |   |
| 52.12.410                   | Hemelwaterafvoer kunststof                                  | 11,00 M1    |  | 1 |
| Gevel - Gevel               |                                                             |             |  |   |
| 52.12.101                   | Goten en gootbekleding algemeen                             | 59,50 M1    |  | 1 |
| 52.12.210                   | Gootbekleding zink                                          | 25,00 M1    |  | 1 |
| 52.12.210                   | Gootbekleding zink                                          | 34,50 M1    |  | 2 |
| 52.12.410                   | Hemelwaterafvoer kunststof                                  | 138,20 M1   |  | 1 |
| Installatie - Installatie   |                                                             |             |  |   |
| 52.11.100                   | Leidingen hemelwaterafvoer algemeen binnen                  | 1,00 PM     |  | 1 |
| 52.21.100                   | Leidingen fecaliënaafvoer algemeen                          | 1,00 PM     |  | 1 |
| 52.30.200                   | Vetvanginstallatie afvalwater algemeen                      | 1,00 STK    |  | 1 |
| <b>53 - WATER</b>           |                                                             |             |  |   |
| Binnen - Binnen             |                                                             |             |  |   |
| 53.21.210                   | Voorraadboiler elektrisch < 30 l                            | 11,00 STK   |  | 2 |
| Installatie - Installatie   |                                                             |             |  |   |
| 53.10.000                   | Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen                   | 1,00 PM     |  | 1 |
| 53.21.200                   | Voorraadboilers elektrisch algemeen                         | 12,00 STK   |  | 1 |
| 53.21.250                   | Voorraadboiler elektrisch 120 l                             | 1,00 STK    |  | 2 |
| <b>54 - GASSEN</b>          |                                                             |             |  |   |

|                                         |                                                                               |              |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 54.10.100                               | Leidingen brandstofinstallatie gas algemeen                                   | 1,00 PM      | 1 |
| <b>55 - KOUDE OPWEKKING</b>             |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 55.12.120                               | Split systeem enkelvoudig 3 - 6 kW                                            | 2,00 STK     | 2 |
| <b>56 - WARMTEDISTRIBUTIE</b>           |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 56.10.100                               | Leidingen cv incl. verw. lichamen+app. algemeen                               | 1,00 PM      | 1 |
| 56.10.311                               | Expansievat cv-installatie 18 -25 liter                                       | 1,00 STK     | 1 |
| 56.10.312                               | Expansievat cv-installatie 35 - 50 liter                                      | 1,00 STK     | 2 |
| 56.10.316                               | Expansievat cv-installatie 200 liter                                          | 1,00 STK     | 3 |
| 56.10.424                               | Circulatiepomp warmtedistr. toerengeregeld DN 40                              | 2,00 STK     | 2 |
| 56.10.620                               | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 25                                | 1,00 STK     | 2 |
| 56.10.640                               | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistr. DN 40                                | 1,00 STK     | 2 |
| 56.13.000                               | Vloerverwarming algemeen                                                      | 100,00 M2    | 1 |
| <b>57 - LUCHTBEHANDELING</b>            |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 57.51.200                               | Luchtkanalen inclusief ornamenten algemeen                                    | 1,00 PM      | 1 |
| 57.71.000                               | Luchtbehandelingskast algemeen                                                | 1,00 STK     | 1 |
| 57.71.854                               | Luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V + WTW 2,8-5,6m3/s<br>(LBK wijkcentrum) | 1,00 STK     | 1 |
| <b>58 - REGELING KLIMAAT</b>            |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 58.20.105                               | Onderstation regeling klimaat algemeen<br>(Cascade regeling)                  | 1,00 STK     | 2 |
| 58.20.130                               | Centrale regelkast cv/lb-installatie<br>(RK-1)                                | 1,00 STK     | 4 |
| 58.20.520                               | Frequentieregelaar 5-10kW                                                     | 1,00 STK     | 2 |
| 58.20.530                               | Frequentieregelaar 10-20kW                                                    | 1,00 STK     | 2 |
| <b>61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.</b> |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 61.00.000                               | Centrale elektrische voorzieningen algemeen                                   | 3.176,00 BVO | 1 |
| 61.51.200                               | Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen                                | 4,00 STK     | 1 |
| 61.51.310                               | Laagspanning hoofdverdeelinrichting <10 grp<br>(HVK)                          | 1,00 STK     | 1 |
| 61.51.450                               | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp<br>(KK)                              | 1,00 STK     | 1 |
| 61.51.450                               | Laagspanning verdeelinrichting 30-40 grp<br>(VK-W1)                           | 1,00 STK     | 1 |
| 61.51.460                               | Laagspanning verdeelinrichting >40 grp<br>(HVK-W)                             | 1,00 STK     | 1 |
| <b>63 - VERLICHTING</b>                 |                                                                               |              |   |
| Installatie - Installatie               |                                                                               |              |   |
| 63.11.301                               | Verlichtingsarmaturen algemeen                                                | 3.176,00 BVO | 2 |
| 63.11.400                               | Lampen algemeen                                                               | 3.176,00 BVO | 1 |
| 63.24.000                               | Calamiteiten decentraal gevoed                                                | 76,00 STK    | 1 |
| 63.24.100                               | Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed                                    | 56,00 STK    | 2 |
| 63.24.200                               | Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed                                  | 20,00 STK    | 2 |
| <b>65 - BEVEILIGING</b>                 |                                                                               |              |   |



|                                           |                                                    |              |  |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--|---|
| Binnen - Binnen                           |                                                    |              |  |   |
| 65.41.100                                 | Invalidetoilet noodsignaal                         | 2,00 STK     |  | 1 |
| Dak - Dak                                 |                                                    |              |  |   |
| 65.39.200                                 | Valbeveiliging algemeen                            | 1,00 POST    |  | 1 |
| Installatie - Installatie                 |                                                    |              |  |   |
| 65.11.110                                 | Brandmeldinstallatie centrale                      | 1,00 STK     |  | 2 |
| 65.11.190                                 | Brandmeldinstallatie kabels + appendages           | 3.176,00 BVO |  | 2 |
| 65.13.320                                 | Brandslanghaspel algemeen                          | 6,00 STK     |  | 2 |
| 65.21.410                                 | Inbraaksignalering centrale algemeen               | 1,00 STK     |  | 2 |
| 65.21.490                                 | Inbraaksignalering kabels + appendages             | 3.176,00 BVO |  | 2 |
| <b>66 - TRANSPORT</b>                     |                                                    |              |  |   |
| Installatie - Installatie                 |                                                    |              |  |   |
| 66.11.900                                 | Spindellift algemeen                               | 1,00 STK     |  | 2 |
| <b>73 - KEUKENVOORZIENINGEN</b>           |                                                    |              |  |   |
| Binnen - Binnen                           |                                                    |              |  |   |
| 73.11.120                                 | Keukenblok incl. bovenkasten                       | 5,00 STK     |  | 2 |
| 73.11.130                                 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.               | 1,00 STK     |  | 1 |
| 73.11.130                                 | Keukenblok compleet incl. inbouwapp.               | 6,00 STK     |  | 2 |
| <b>74 - SANITAIRE VOORZIENINGEN</b>       |                                                    |              |  |   |
| Binnen - Binnen                           |                                                    |              |  |   |
| 74.11.100                                 | Toilet algemeen                                    | 23,00 STK    |  | 2 |
| 74.11.300                                 | Wastafelcombinatie algemeen                        | 3,00 STK     |  | 1 |
| 74.11.300                                 | Wastafelcombinatie algemeen                        | 9,00 STK     |  | 2 |
| 74.11.310                                 | Fonteincombinatie algemeen                         | 4,00 STK     |  | 2 |
| 74.11.400                                 | Uitstortgootsteen algemeen                         | 4,00 STK     |  | 2 |
| 74.11.700                                 | Wastrogcombinatie algemeen                         | 1,00 STK     |  | 1 |
| 74.12.220                                 | Opklapbare beugel                                  | 4,00 STK     |  | 1 |
| 74.13.900                                 | Sanitaire accessoires diverse                      | 1,00 STK     |  | 1 |
| <b>82 - LOSSE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN</b> |                                                    |              |  |   |
| Binnen - Binnen                           |                                                    |              |  |   |
| 82.10.100                                 | AED algemeen                                       | 1,00 STK     |  | 1 |
| <b>90 - TERREINVOORZIENINGEN</b>          |                                                    |              |  |   |
| Dak - Dak                                 |                                                    |              |  |   |
| 90.63.310                                 | Gevel- en plafondarmaturen klein                   | 2,00 STK     |  | 2 |
| Gevel - Gevel                             |                                                    |              |  |   |
| 90.63.310                                 | Gevel- en plafondarmaturen klein                   | 145,00 STK   |  | 1 |
| 90.63.310                                 | Gevel- en plafondarmaturen klein                   | 7,00 STK     |  | 2 |
| 90.63.320                                 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot             | 5,00 STK     |  | 1 |
| 90.63.320                                 | Gevel- en plafondarmaturen middelgroot (grondspot) | 3,00 STK     |  | 2 |
| Terrein - Terrein                         |                                                    |              |  |   |
| 90.41.200                                 | Terreinverharding betontegels                      | 92,00 M2     |  | 1 |
| 90.41.300                                 | Bestrating rubbertegels (kunstgras)                | 175,00 M2    |  | 2 |
| 90.42.000                                 | Tuinonderhoud algemeen                             | 1,00 POST    |  | 1 |
| 90.52.100                                 | Straatkolken terrein algemeen                      | 3,00 STK     |  | 1 |
| 90.71.700                                 | Terreinmeubilering speeltoestellen algemeen        | 1,00 PM      |  | 1 |
