

Datum inspectie 19-3-2019
Reden van inspectie Nulmeting
Uitgevoerd door



Algemeen

Spoelpunten op haspel (2 stuks bij vulstation) zitten op het waternet de rest op bron 1. Er zitten 2 mengautomaten in technische ruimte. Merk Datapross geen onderdelen meer verkrijgbaar. Technische ruimte is inpandig.

Calcium menginstallatie

Aanwezig

Verouderd

Technische ruimte

Uitvoering Anders
Verwarming OK

Goed

Bron

Voor pompruimte
Bronkop afwerking: putschacht met deksel. 2 stuks

Goed

Besturing

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Technische ruimte
CaCl ₂ Menginstallatie
Datapross | Installatie 1 |
| 2. | Technische ruimte
CaCl ₂ Menginstallatie
Datapross | Installatie 2 |

Tanks

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Werktank 1 - CaCl ₂ (33%)
Inhoud 30 m ³ .
Betontank, ondergronds, met lining.
1 vlotterschakelaar. Geen niveaumeting.
Externe niveaumonitoring onbekend | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp
Aanname inhoud 30m ³ ? |
| 2. | Buffertank 1 - CaCl ₂ (33%)
Inhoud 30 m ³ .
Betontank, ondergronds, met lining.
1 vlotterschakelaar. Ultrasoon niveaumeting (Endress & Hauser).
Externe niveaumonitoring onbekend | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 2 x pomp.
Aanname inhoud 30m ³ ? |
| 3. | Werktank 2 - CaCl ₂ (33%)
Inhoud 30 m ³ .
Betontank, ondergronds, met lining.
3 vlotterschakelaars. Geen niveaumeting.
Externe niveaumonitoring onbekend | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp
Aanname inhoud 30m ³ ? |
| 4. | Buffertank 2 - CaCl ₂ (33%)
Inhoud 30 m ³ .
Betontank, ondergronds, met lining.
1 vlotterschakelaar. Geen niveaumeting.
Externe niveaumonitoring onbekend | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp
Aanname inhoud 30m ³ ? |
| 5. | Grijswatertank - H ₂ O (vuil)
Inhoud 30 m ³ .
Betontank, ondergronds.
2 vlotterschakelaars. Geen niveaumeting.
Externe niveaumonitoring onbekend | 2 pompen 2 vlotterballen. Tanks zijn in
2017 gereinigd.
Aanname inhoud 30m ³ ? |

Pompen

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | In werktank 1
Merk/type: Flygt
Functie: Mengen/Vulpunt - CaCl ₂ (33%) | |
| 2. | In buffertank 1
Merk/type: Flygt
Functie: Overpompen - CaCl ₂ (33%) | |
| 3. | In buffertank 1
Merk/type: Kleine waaierpomp?
Functie: Overpompen - CaCl ₂ (33%) | Naar werktank 2 |
| 4. | In werktank 2
Merk/type: Flygt
Functie: Mengen/Vulpunt - CaCl ₂ (33%) | |

5. In buffertank 2
Merk/type: Flygt
Functie: Overpompen - CaCl_2 (33%)
6. In grijswatertank
Merk/type: Flygt
Functie: Mengen/Vulpunt - H_2O (vuil)
7. In grijswatertank
Merk/type: Flygt
Functie: Mengen/Vulpunt - H_2O (vuil)
8. In bron
Merk/type onbekend
Functie: Bronpomp - H_2O (schoon)
9. In bron
Merk/type onbekend
Functie: Bronpomp - H_2O (schoon)

Naar werktank 2

Spoelpunten

Geka koppeling. 11 stuks.

Goed


Vulpunten

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Voor kantoorpand - zwenkarm (membraanklep)
Elaflex koppeling. 3-polige overvulbeveiliging.
Elektrische aansluiting: 400V 4P 32A | Goed, vuleiland 1 |
| 2. | Voor kantoorpand - zwenkarm (membraanklep)
Elaflex koppeling. 3-polige overvulbeveiliging.
Elektrische aansluiting: 400V 4P 32A | Goed, vuleiland 1 |
| 3. | Voor kantoorpand - zwenkarm (membraanklep)
Elaflex koppeling. 3-polige overvulbeveiliging.
Elektrische aansluiting: 400V 4P 32A | Goed, vuleiland 2 |
| 4. | Voor kantoorpand - zwenkarm (membraanklep)
Elaflex koppeling. 3-polige overvulbeveiliging.
Elektrische aansluiting: 400V 4P 32A | Goed, vuleiland 2 |


Foto's




Vulpunt

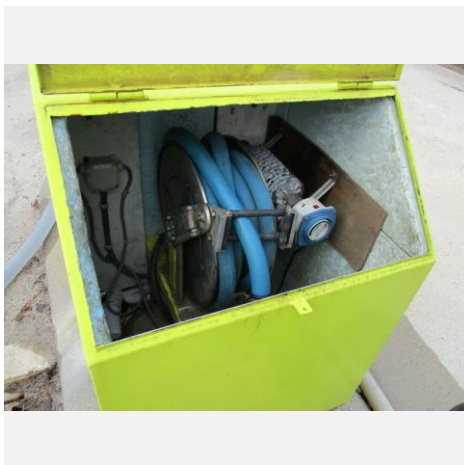


Spoelhaspel op waternet 2x

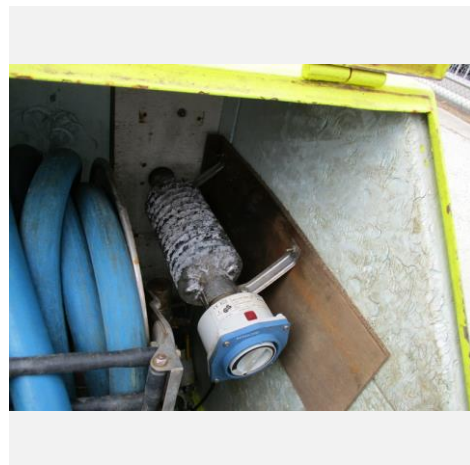


Kachel

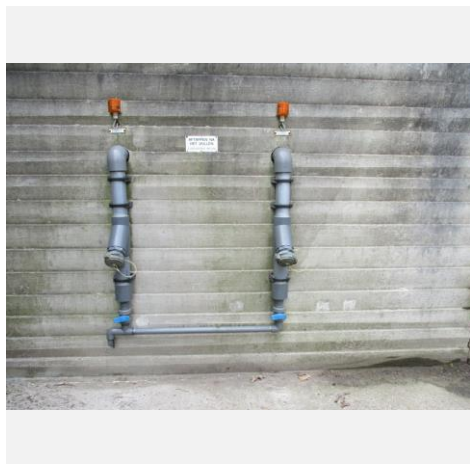


Tank vulpunten buffertank 1 en 2

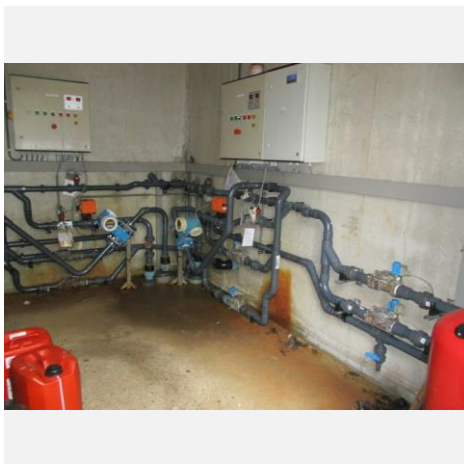


Technische ruimte

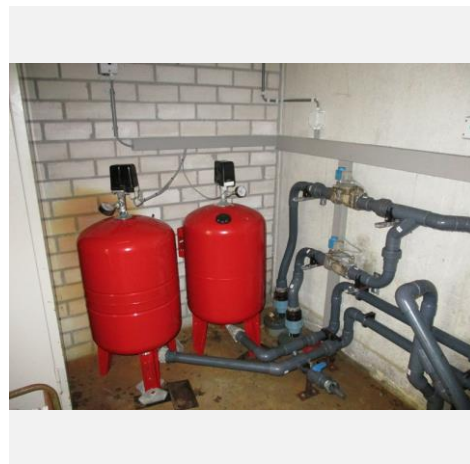


Drukvaten 1 en 2

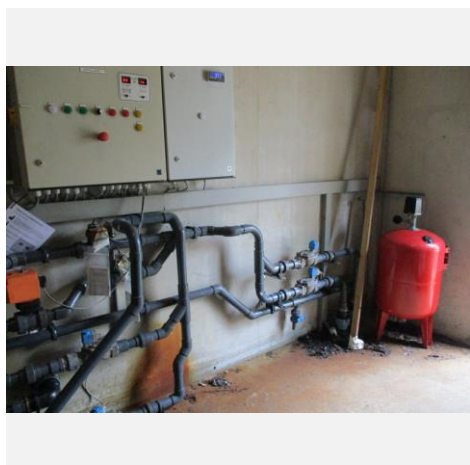

Drukvat 3

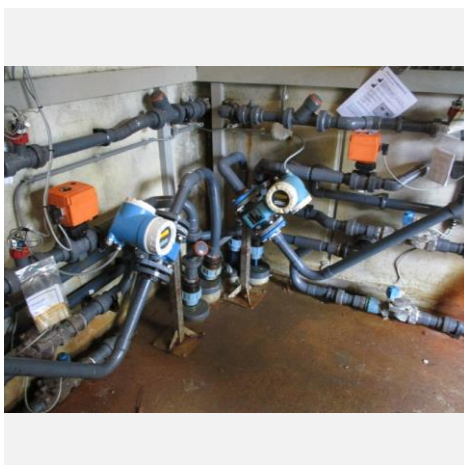

Leidingwerk

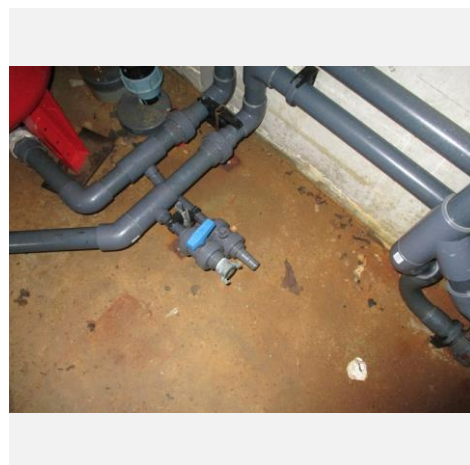


Extra spoelpunt



Menginstallatie 1 met niveau buffertnk
1



Menginstallatie 2

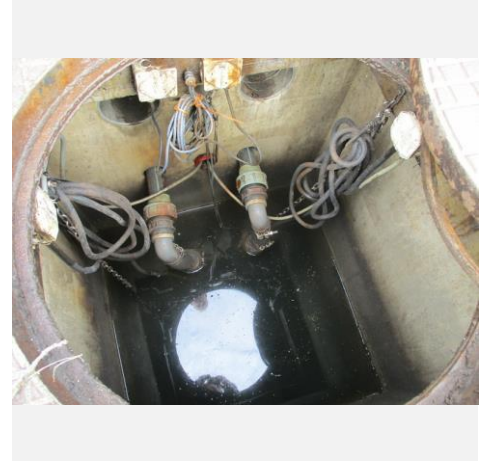

Grijswater tank




Grijswater tank




Grijswater tank




Bronpomp 2

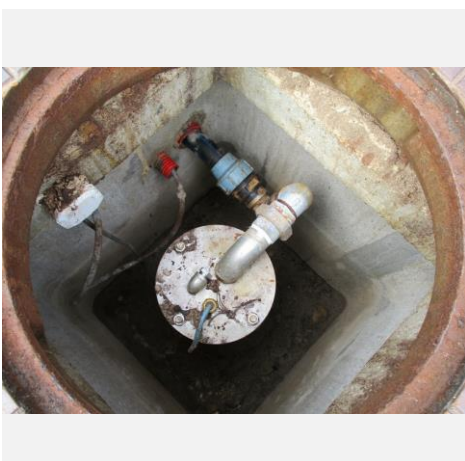

Bronpomp 2

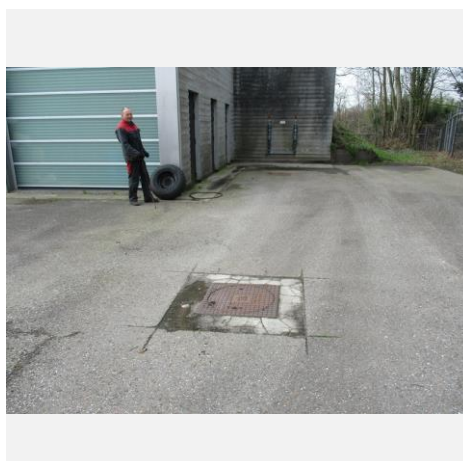

Positie bronpomp2

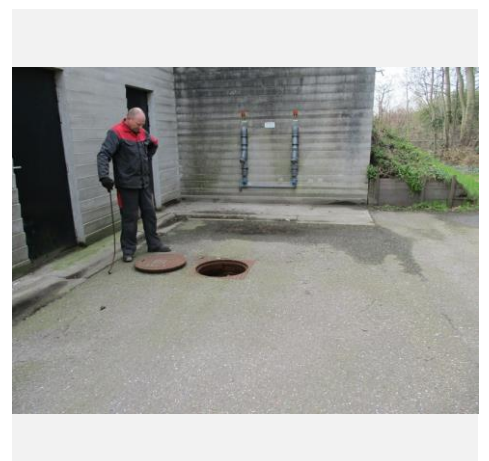

Positie bronpomp 1



Bronpom 1



Positie grijswatertank



Werktank 1




Werktank 1



Werktank 1



Buffertank 1

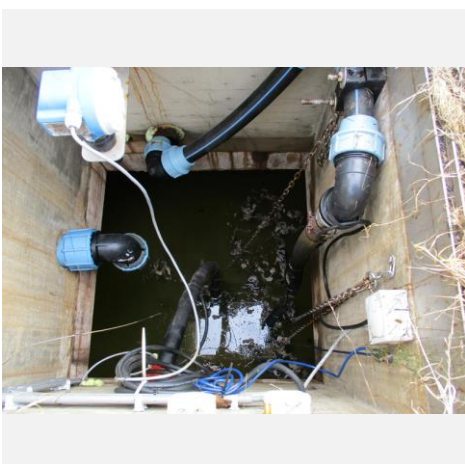

Buffertank 1



Buffertank 1



Werktank 2



Werktank 2




Buffertank 2



Buffertank 2



11 x spoelpunt

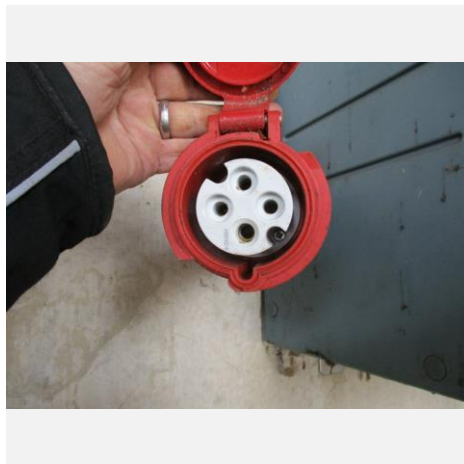

400 volt 4 polig 32 Amp



400 volt 4 polig 32 Amp



Overzicht stalling
