



memo

Van : J.H. Jonk

Datum : 12 oktober 2022

Betreft : locatiebeschrijving voetbalverenigingen tbv
vervanging kunstgrasvelden


1. Inleiding

In deze memo wordt per veld algemene info, maatregelen op hoofdlijnen en planning beschreven.

2. Sportcomplexen

2.1 algemene info RKAV Volendam

Het sportcomplex RKAV Volendam is de grootste vereniging van de gemeente met 9 voetbalvelden waarvan er 6 zijn uitgevoerd in kunstgras.

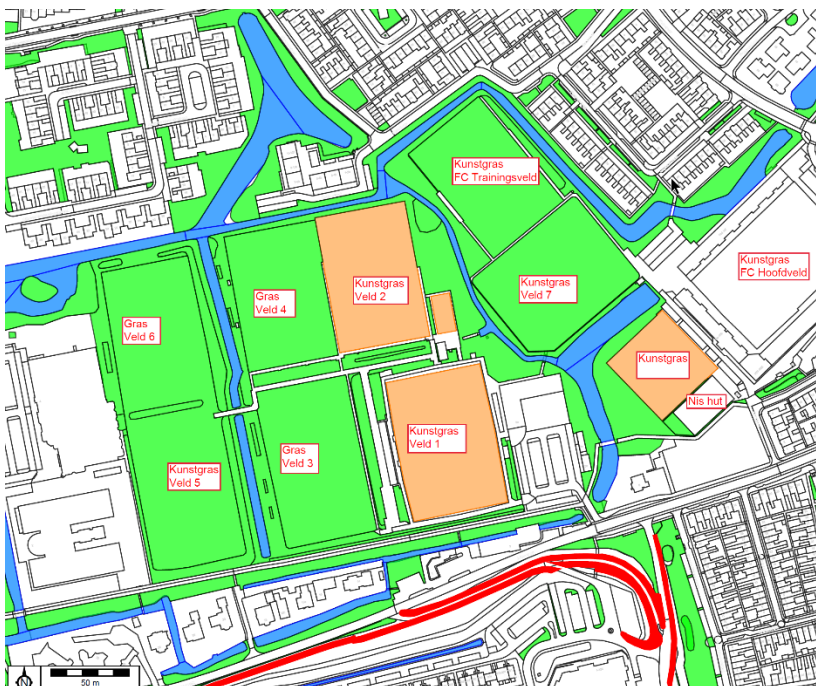

Het kunstgrasveld naast het stadion van FC Volendam komt te vervallen en wordt samen met de nishut gebruikt voor ontwikkeling van woningen. Het veld waar FC Volendam traint wordt vanaf volgend seizoen door RKAV gebruikt. In de nieuwe situatie zijn er 8 velden waarvan 5 zijn voorzien van een kunstgrasmat. In 2023 wordt veld 7 vervangen en in 2024 veld 2.

2.2 Algemene info veld 2:

Veld 2 ligt naast het hoofdveld van de vereniging en ten zuiden van het appartementencomplex Zonnesingel. Het veld is alleen vanaf het complex te voet en met materieel bereikbaar, via het parkeerterrein en achter de tribune van veld 1 langs. zie de rode lijn op de plattegrond. Op het parkeerterrein bij de ingang van het complex is ruimte voor keten en om materialen op te slaan, zie het rood gearceerde deel op de plattegrond. Het terrein is een veengebied met een beperkte drooglegging en deels voorzien van onderbemaling. Deze omstandigheden hebben invloed op keuze van materieel.



2.3 Activiteiten veld 2 in hoofdlijnen:

De huidige kunstgrasmat is voorzien van TPE infill, foamlayer en geovlies. De lava onderbouw en drainage moet volledig worden vervangen. Om te voldoen aan de milieueisen worden rondom het veld betonplaten met opstaande rand en noppenplaten geplaatst. Het hekwerk en de ballenvangers worden vervangen.

2.4 Planning veld 2

Veld 2 wordt in 2024 vervangen, de periode is nog niet vastgelegd. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden op dit veld is 40 werkbare werkdagen.

2.5 Algemene info veld 7:

Veld 7 ligt naast het stadion van FC Volendam en tegen een woonwijk. Het veld is vanaf het complex alleen te voet bereikbaar via de brug aan de zuidzijde. Via de oostzijde is het veld wel met materieel bereikbaar, vanaf de Julianaweg-Eikenlaan, zie de rode lijn op de plattegrond. Op het parkeerterrein tussen veld 7 en het stadion is ruimte voor keten en om materialen op te slaan, zie het rood gearceerde deel op de plattegrond. De ondergrond van het terrein is veen met een beperkte drooglegging. Deze ondergrond heeft invloed op de keuze van het materieel.



2.6 Activiteiten veld 7 in hoofdlijnen:

De huidige kunstgrasmat is voorzien van SBR infill, foamlayer en geovlies en moet volledig worden vervangen. Om te voldoen aan de milieueisen worden rondom het veld betonelementen met opstaande rand en noppenplaten geplaatst. Het hekwerk en ballenvangers worden vervangen.

2.7 Planning veld 7

Veld 7 dient in de zomerstop van 2023 te worden uitgevoerd. Omdat het veld alleen via het stadion bereikbaar is kan pas worden gestart als de laatste thuiswedstrijd van FC Volendam, op 28 mei 2023, is gespeeld. De kans is aanwezig dat er nacompetitie moet worden gespeeld, die data zijn nog niet bekend. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden op dit veld is 30 werkbare werkdagen.

3.1 algemene info EVC Edam

Het sportcomplex EVC ligt in aan de Burg. Versteeghsingel te Edam. Het complex heeft 4 velden waarvan alleen het hoofdveld, veld A, is voorzien van kunstgras. In het midden van het



complex zijn de kantine en kleedkamers gevestigd en ten zuiden daarvan staat Sporthal het Bolwerck. Het complex wordt de hele week, zowel overdag als in de avond, door leden van de verenigingen, maar ook door scholieren die gymles krijgen, gebruikt. Veld A en B worden in 2023 vervangen



3.2 Algemene info veld A:

Veld A is het hoofdveld van de vereniging en is via de hoofdweg in het midden met materieel bereikbaar (zie de rode lijn op de plattegrond). Het complex ligt midden in een woonwijk. Het parkeerterrein bij de ingang wordt door zowel bewoners als bezoekers van het complex gebruikt. Links naast de ingang van het complex is ruimte voor keten en opslag, zie het rood gearceerde deel op de plattegrond. Dit terrein is niet verhard. Het terrein is een veengebied en is volledig voorzien van een onderbemaling en wordt aan de westzijde met een pomp op hoogte gehouden. Rondom het complex is het hoog water. Deze omstandigheden hebben invloed op keuze van materieel.



3.3 Activiteiten veld A in hoofdlijnen:

De huidige kunstgrasmat is voorzien van infill zand en infill rubber, foamlayer en geovlies. Om te voldoen aan de milieueisen worden kantplanken van aluminium en kunststof geplaatst. De opstelplaatsen voor doelen worden uitgebreid.

3.4 Planning veld A

Veld A wordt tussen half april en mei 2023 vervangen. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden op dit veld is 30 werkbare werkdagen.

3.5 Algemene info veld B:

Veld B is momenteel een natuurgrasveld. Dit veld wordt vervangen door een nieuw kunstgrasveld. Het veld is via de hoofdweg in het midden met materieel bereikbaar (zie de rode lijn op de plattegrond). Links naast de ingang van het complex is ruimte voor keten en opslag, dit terrein is niet verhard, zie het rood gearceerde deel op de plattegrond. Het terrein is een veengebied en is volledig voorzien van een onderbemaling. Deze omstandigheden hebben invloed op keuze van materieel.



3.6 Activiteiten veld B in hoofdlijnen:

De huidige natuurgrasmat wordt vervangen door kunstgras met zand en TPE infil. De onderbouw dient nieuw te worden aangebracht. De drainage wordt vervangen. De vrijkomende grond wordt deels op veld C en deels op het terrein verwerkt en een deel wordt binnen de gemeentegrenzen opgeslagen. Om te voldoen aan de milieueisen worden rondom het veld betonelementen met opstaande rand en noppenplaten geplaatst. Het hekwerk rondom het veld en ballenvangers worden vervangen.

3.7 Planning veld B

Veld B wordt in de zomerstop van 2023 vervangen. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden op dit veld is 50 werkbare werkdagen.

4.1 algemene info VV Oosthuizen

Het sportcomplex VV Oosthuizen is aan de Sportlaan te Oosthuizen. Het complex heeft 4 velden waarvan alleen het hoofdveld, veld A, is voorzien van kunstgras. Veld A wordt in 2024 vervangen.



4.2 Algemene info veld A:

Veld A is via de toegangsweg en parkeerterrein met materieel bereikbaar (zie de rode lijn op de plattegrond). Links naast de ingang van het complex is ruimte voor keten en opslag, dit terrein is niet verhard, zie het rood gearceerde deel op de plattegrond. Het terrein is een veengebied en is volledig voorzien van een onderbemaling. Deze omstandigheden hebben invloed op keuze van materieel.



4.3 Activiteiten veld A in hoofdlijnen:

De huidige kunstgrasmat is voorzien van infill zand infill rubber, foamlayer en geovlies. De huidige verharding van betontegels wordt herstraat. Om te voldoen aan de milieueisen worden kantplanken van aluminium en kunststof geplaatst. De opstelplaatsen voor doelen worden uitgebreid.

4.4 Planning veld A

Veld A wordt in 2024 vervangen. De startdatum is nog niet bekend. De maximale doorlooptijd van de werkzaamheden op dit veld is 30 werkbare werkdagen.
