

Bijlagen

Behorende bij I&A_2022_0151

behorende bij

bestek 40926

Bijlage 1

Behorende bij I&A_2022_0151

behorende bij

bestek 40926

VGM-PLAN

**“Raamovereenkomst Asfalteer- en markeringswerkzaamheden
2023 - 2025”**

RAW Bestek 40926

AMSTELVEEN EN AALSMEER

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Categorie en indeling naar klasse	3
3. Afspraken tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer	4
3.1 Overleg, rapportage, instructie en eindevaluatie	4
3.2 Bouwproces	7
4. Projectgegevens	7
5. Namen en adressen van de betrokken partijen	8
6. Planning en uitvoeringsgegevens	9
7. Goedkeuring VGM-plan ontwerpfase	9
8. VGM gevaren voortvloeiend uit het ontwerp	10
9. VGM gevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie	13
10. Milieurisico's voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie	15

1. Inleiding

Dit VGM-plan is onderdeel van RAW bestek 40926 betreffende Raamovereenkomst asfalteer- en markeringswerkzaamheden 2023 - 2025.

In dit plan zijn onder meer opgenomen:

- de bij het werk betrokken instanties;
- een risico-inventarisatie van het werk.

2. Categorie en indeling naar klasse

De werken die onder verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtgevers zijn ingedeeld in categorie A, B of C en klasse I of II.

I (meer werkgevers)	A (> 500 mandagen)	B (bijzonder risico)	C (geen A en/of B)
1. Kennisgeving	x		
2. V&G- coördinator	x	x	x
3. V&G- plan	x	x	
4. V&G- plan in bestek	x	x	
5. Contractbepaling	x	x	x
6. V&G- dossier	x	x	x
II (1 werkgever)	A (> 500 mandagen)	B (bijzonder risico)	C (geen A en/of B)
1. Kennisgeving	x		
2. V&G- coördinator			
3. V&G- plan	x	x	
4. V&G- plan in bestek	x	x	
5. Contractbepaling			
6. V&G- dossier			

Werken

A werken waarbij:

- de geraamde duur van het (bouw)werk meer dan 30 dagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, OF
- met de totstandbrenging van het (bouw)werk meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid.

B werken (ongeacht de grootte) die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd. Er moet dan sprake zijn van gevaren die aan reguliere bouwactiviteiten verbonden gebruikelijke risico's overstijgen.

Dit betreft tenminste de volgende werkzaamheden of activiteiten.

- werken met een extra risico voor bedelving, vastraken of vallen
- werken met bijzonder gevaarlijke chemische of biologische stoffen
- werken met ioniserende straling
- werken in de nabijheid van hoogspanningskabels
- werken met risico voor verdrinking
- werken met duikuitrusting
- werkzaamheden uitgevoerd onder overdruk
- het graven van putten, tunnels en ondergrondse werken
- werkzaamheden met springstoffen
- werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware prefab- elementen

C alle overige werken, niet vallende onder categorie A en/of B.

Situaties

I Bouwplaatsen waar twee of meer werkgevers dan wel één werkgever en één of meer zelfstandig werkende(n) dan wel twee of meer zelfstandigen arbeid gaan/ doen verrichten. *)

II Bouwplaatsen waar uitsluitend werknemers van één werkgever werken.

*) De werkgevers van de directievoerenden en/ of toezichthouders gelden niet als werkgever in de zin van het Bouwprocesbesluit.

Het werk omschreven in bovengenoemd bestek valt in **categorie A** en **klasse II**

Deze keuze is gemaakt op grond van het te verwachten aantal werkgevers (hoofdaannemer, onderaannemer derden), dat groter zal zijn dan één.

3. Afspraken tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Na het Gunnen van het werk aan de Opdrachtnemer zal er een voorbespreking plaats vinden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Bij deze bespreking zal het goedgekeurde VGM-plan besproken worden (zie ook Bestek deel 3 hoofdstuk 01.19.01 lid 01).

Tijdens deze bespreking zullen afspraken worden gemaakt over de regelgeving met betrekking tot Veiligheid Milieu geldend gedurende het project.

Voorbeelden van actiepunten zijn:

- coördinatie uitvoeringsfase;
- bijzondere gevaren voor medewerkers;
- op het werk geldende VGM-regels;
- overleg/ communicatie en verslaglegging tijdens de uitvoering van het werk;
- de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

3.1 Overleg, rapportage, instructie en eindevaluatie

Kopieën van de verslagen worden opgenomen in een projectmap.

Er zal een lijst bij moeten worden gehouden waarin afspraken en de te volgen acties over veiligheid vermeld zullen worden.

3.1.1 Overlegstructuren

Naam vergadering	Doel	Frequentie	Notulen door	Deelnemers
Bouwvergadering	bespreken werkorganisatie, voortgang & planning, contractuele zaken, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.	# - wekelijks	de toezichthouder(s)	namens de Opdrachtgever: de directievoerder en de toezichthouder(s), eventueel VGM adviseur; Namens de Opdrachtnemer:
Kick-off uitvoering		1 x (start werk)		namens de Opdrachtgever: de directievoerder en de toezichthouder(s), VGM adviseur
(Start)Werkbespreking		1 x bij start elke deelopdracht		
Evaluatieoverleg	Evalueren van de projectervaringen en vaststellen verbeterpunten ten behoefte van optimaliseren toekomstige werkwijze project	1 x (einde werk)		

Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt een startwerkvergadering gehouden met de onderaannemers. Tijdens de startwerkvergadering worden de project-werk-instructies (PWI) besproken. Hierbij wordt onder andere besproken wat de risico's zijn en welke maatregelen genomen worden om de risicoweg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zodat werkzaamheden zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider van de aannemer er op toe te zien dat de startwerkvergaderingen voor aanvang van de werkzaamheden worden gehouden en geregistreerd.

Teneinde alle werknemers binnen dit project te informeren en te instrueren over de geldende voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek, moet iedere werknemer voor aanvang van de werkzaamheden bij de kick off aanwezig zijn en een introductie ontvangen. Tijdens de kick off zullen de volgende onderwerpen toegelicht worden:

- De projectorganisatie;
- De belangrijkste delen van het uitvoeringsplan V&G;
- Verontreinigingssituatie;
- De risico identificatie en evaluatie / wijze van blootstelling;
- Algemene veiligheids- en gedragsregels / verboden verontreinigde zone;
- Arbeidshygiënische maatregelen;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
- Vastlegging / afspraken meetstrategie
- Het melden van ongevallen, incidenten en risicovolle situaties;
- Het houden van periodieke toolboxmeetings en werkplekinspecties.

Medewerkers die niet aanwezig waren krijgen de kick off van de uitvoerder/DLP/veiligheidskundige. De deelname aan de kick off is verplicht en zal worden vastgelegd op een registratieformulier.

Gezien de korte uitvoeringsduur, in combinatie met de duidelijke afbakening van de werkzaamheden, zal geen (voorafgaand) overleg met externen plaatsvinden. Op de dag van uitvoering, zal voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, een startwerkbijeenkomst gehouden worden waarin alle relevante zaken worden besproken.

3.1.2 overleg en voorlichting/instructie werknemers

Overleg voorlichting/instructie door:	Aan wie	Waarover ¹	Afspraken en Acties ²

- 1) Bijvoorbeeld
- overleg over VGM-aspecten op het werk
 - voorlichting over projectafspraken en -maatregelen
 - taakgerichte voorlichting
 - specifieke instructiebijeenkomsten

- 2) Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in het VGM-plan
- Bijvoorbeeld
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's
 - acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades

3.1.3 Voorlichting

Introductie VGM op het werk

Alle medewerkers (inclusief ingehuurd personeel) ontvangen voor aanvang van het werk instructie betreffende de VGM-regels op de werkplek.

3.2 Bouwproces

Een ander aspect van het Bouwprocesbesluit is dat bij elk bouwwerk een Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan) moet zijn ontwikkeld.

Aandachtspunten zijn:

- is het VGM-plan op het werk aanwezig
- is er een VGM dossier conform het Bouwprocesbesluit.
- is in dit dossier de informatie van de Coördinator Voorbereiding aanwezig.
- is er afstemming tussen de Coördinator Voorbereiding en de Coördinator Uitvoering.
- zijn deze VGM plannen op elkaar afgestemd
- is het VGM plan uitvoeringsfase bekend bij onderaannemers en zijn zij betrokken bij de opstelling hiervan
- beschikt de Coördinator Uitvoeringsfase over voldoende arbo-deskundigheid
- is er ondersteuning/toetsing door een deskundige dienst.

4. Projectgegevens

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het inspecteren van asfaltverharding;
- Het inspecteren van wegmarkeringen;
- Het frezen/opbreken van asfaltverharding;
- Het verwijderen van wegmarkeringen;
- Het aanbrengen van asfaltverharding;
- Het aanbrengen van wegmarkeringen;
- Het uitvoeren van kleinschalige bestratingswerkzaamheden;
- Het uitvoeren van verkeersmaatregelen.

Ligging van de bouwlocatie: Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer.

5. Namen en adressen van de betrokken partijen

5.1 Opdrachtgever(s)

Naam : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer
Adres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode/plaats : 1180 BA Amstelveen
Telefoon : 020 540 4911
E-mail adres : gemeente@amstelveen.nl

5.2 Ontwerpende partij(en)

Architect : Afdeling Projecten en Advies van de gemeente Amstelveen
Adres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode/plaats : 1180 BA Amstelveen
Contactpersoon : R.J. van Lammeren
Telefoon : 020 540 4117
E-mail adres : r.van.lammeren@amstelveen.nl

5.3 VGM- Coördinator(en) Ontwerpfase

Architect : Afdeling Projecten en Advies van de gemeente Amstelveen
Adres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode/plaats : 1180 BA Amstelveen
Contactpersoon : R.J. van Lammeren
Telefoon : 020 540 4117
E-mail adres : r.van.lammeren@amstelveen.nl

5.4 Directie en toezicht Uitvoeringsfase

Naam : Afdeling Projecten en Advies van de gemeente Amstelveen
Adres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode/plaats : 1180 BA Amstelveen
Contactpersoon : R.J. van Lammeren
Telefoon : 020 540 4117
E-mail adres : r.van.lammeren@amstelveen.nl

5.5 Uitvoerende partij(en)

Naam : - nader in te vullen -
Adres :
Postcode/plaats :
Contactpersoon :
Mobiele telefoon :
E-mail adres :

5.6 VGM-Coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : - nader in te vullen -
Adres :
Postcode/plaats: :
Contactpersoon :
Telefoon :
Mobiele telefoon :
E-mail adres :

6. Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande looptijd van het raamcontract: van 1 april 2023 tot 1 april 2025, met twee keer een optie tot verlening van telkens één jaar.

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

- Nader in te vullen aantal - werknemers

Gepland aantal ondernemers en zelfstandigen op de bouwlocatie:

- Nader in te vullen aantal - ondernemers
- Nader in te vullen aantal - zelfstandigen

Regeling VGM-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De VGM-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de Opdrachtnemer van onderhavig project. Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

-
-
-
-

7. Goedkeuring VGM-plan ontwerpfase

Opdrachtgever

Handtekening

Plaats

Naam

Datum

Functie

8. VGM gevaren voortvloeiend uit het ontwerp

Besteksanalyse

In deze besteksanalyse is ten aanzien van de arbeid en veiligheid uitgegaan van de aandachtspunten zoals deze genoemd staan in bijlage 2 van Publicatieblad 190 "Arbo- en verzuimbeleid".

Inventarisatie van bijzondere risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

BESTEKS-POST	ACTIVITEIT	ARBO-RISICO	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
1	VOORBEREIDENDE WERKEN			
	Toepassen boombescherming, werkzaamheden bestrating	Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid	Werkwijze Slechte verkeersafzettingen Defect materieel Handmatig werken Werken in nabijheid van machines	Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Goede verkeersafzettingen Inzet van machines
	Verwijderen en aanbrengen van putafdekking	Ongeval/lichamelijk letsel Beknelling en bedelving Vallen van materiaal uit hijsankers	Werkwijze Defect materieel In werking zijnd materieel	Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Toepassen van machines
2	REPAREREN FUNDERINGEN EN ASFALTVERHARDINGEN			
	Aanbrengen fundering, herstel asfaltverhardingen	Ongeval/lichamelijk letsel Rugklachten Aanrijgevaar Vallen/struikelen Inademen stof	omgevingslawaaï tillen (te zwaar)materiaal/materieel geen/te weinig verkeersvoorzieningen ongelijke ondergrond	Persoonlijke beschermingsmiddelen Mechanisch werken Goede verkeersvoorzieningen Obstakels verwijderen Nat slijpen
	Aanbrengen puinfundering	Inademen stof	Aanwezigheid Asbest	Persoonlijke beschermingsmiddelen Besproeien met water
	Transport	Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding	Werkverkeer Wegslingerend materiaal	Veiligheidsvoorzieningen Persoonlijke beschermingsmiddelen
5	ASFALTVERHARDINGEN			
	Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen	Ongeval/lichamelijk letsel Rugklachten Aanrijgevaar Vallen/struikelen Inademen stof	omgevingslawaaï tillen (te zwaar)materiaal/materieel geen/te weinig verkeersvoorzieningen ongelijke ondergrond/obstakels	Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Mechanisch werken Goede verkeersvoorzieningen Obstakels verwijderen
	Verwijderen van (teerhoudend) asfalt	Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid	Werkwijze Slechte verkeersafzettingen Defect materieel Handmatig werken Werken in nabijheid van	Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen Goede verkeersafzettingen Inzet van machines

BESTEKS-POST	ACTIVITEIT	ARBO-RISICO	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
		Blootstelling aan PAKS	machines Geen onderzoek gedaan	Onderzoek doen naar PAKS Asfalt nat frezen
	Transport	Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding	Werkverkeer Wegslingerend materiaal	Veiligheidsvoorzieningen Persoonlijke beschermingsmiddelen
6	MARKERINGEN			
	Verwijderen en aanbrengen van markeringen	Ongeval/lichamelijk letsel Rugklachten Gevaarlijke verkeerssituatie	Defect materiaal Slechte verkeersmaatregelen In werking zijnd materieel	Persoonlijke beschermingsmiddelen Mechanisch werken Juiste verkeersmaatregelen CROW publicatie 96B
7	TRANSPORT			
	Transport asfalt, puin en bestratingsmateriaal.	Ongeval/lichamelijk letsel Overrijding	Werkverkeer Wegslingerend materiaal Te vol geladen bak	Veiligheidsvoorzieningen Persoonlijke beschermingsmiddelen Bak niet te vol laden en afdekken
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
	Plaatsen kantoorwagen Aanbrengen verkeersmaatregelen	Transport op terrein en opslag materiaal/materieel (knellen/klemmen, omvallen van) Bedrijfshulpverlening Brandpreventie (brand/explosie)	Transportroute niet vrij van obstakels Onstabiele opslag Ontbreken richtlijnen/hulpmiddelen Onjuiste opslag van brandbare goederen/vloeistoffen/gassen Werkwijze Defect materieel Gewicht materieel	Transportwegen verharderen en routes markeren Toegankelijkheid controleren Stabiliteit verhogen door verharding en/of onderstopping Calamiteitenplan en hieraan verbonden middelen/mensen Gescheiden opslag brandblusmiddelen Instructie personeel Overleg brandweer Technische inspectie materieel Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Inrichten van werkterrein	Ongeval/lichamelijk letsel Fysieke overbelasting Vallen/struikelen Blootstelling aan gehoorbeschadigend geluid	Werkwijze Defect materieel Ongelijke ondergrond/obstakels In werking zijnd materieel Gewicht materieel	Juiste werkwijze Technische inspectie materieel Obstakels verwijderen Persoonlijke beschermingsmiddelen Toepassen van machines

9. VGM gevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit de omgeving van de bouwlocatie voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven kunnen gaan.

De ondergenoemde risico's zijn van toepassing op het gehele werk, en dienen dus altijd extra aandacht te krijgen.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "**Lichamelijk letsel**".

OMGEVINGS FACTOR	ACTIVITEIT	ARBO-RISICO	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
	ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN)			
	Werken onder extreme druk	Stress Lichamelijk letsel	Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze	Verkorting werktijd Planning en afstemming
	Werken in weer en wind	Gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen
	Werken zonder adequate bouw- plaatsvoorzieningen	Irritatie Gezondheid	Overbemanning Geen ruimte	Verkorting werktijd Planning en afstemming
	Slechte bereikbaarheid	Ongeval Lichamelijk letsel	Geïsoleerde ligging van de bouwplaats	Voorlichting gevarenaspect Hulpvoorzieningen Communicatie voorzieningen
	ALGEMENE FACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN)			
	Werken die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken	Gezondheid	Werkwijze Keuze materiaal en/of materieel	Keuze materiaal en/of materieel Wijzigen werkwijze
	Werken aan/nabij (hoofd)gas-/olie- waterleidingen	Explosie Verbranding Overstroming	Werkwijze Beschadiging Lekkage Geen of onvoldoende revisietekeningen	Voorlichting ligging NUTS- leidingen Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgsmaatregelen
	Werken aan/nabij hoog - en/of laagspanningskabels	Elektrocutie	Werkwijze Beschadiging Onvoldoende afstand	Voorlichting ligging NUTS- leidingen Voorlichting gevarenaspect Juiste voorzorgsmaatregelen
	Werken op terrein met slechte bodemgesteldheid	Omvallend materieel/materiaal Ongeval Lichamelijk letsel	Onstabiliteit materiaal en/of materieel	Grondverbetering Tijdelijke hulpvoorzieningen
	Werken met zwaar materieel	Beknelling Ongeval Lichamelijk letsel Omvallen machines	Werkwijze Technische staat materieel Instabiele grondslag Onvoldoende zicht vanuit materieel	Voorlichting gevaren aspect Andere keuze materieel Spiegels ramen e.d. schoon houden. Dodehoekspiegel en/of markering.

10. Milieurisico's voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie

In het onderstaande overzicht worden de milieurisico's voortvloeiend uit de werkzaamheden op de bouwlocatie beschreven.

De hier onder genoemde milieurisico's zijn van toepassing op het gehele werk, en dienen dus altijd extra aandacht te krijgen.

OMGEVINGS FACTOR	ACTIVITEIT	MILIEU-RISICO	RISICO-OORZAAK	SUGGESTIES
	Transport van grond en zand	Verspreiden van grond en zand op ongewenste plaatsen	Grond/zand tussen/aan banden Overbelading Niet afdekken van lading	Zoveel mogelijk banden reinigen voor het verlaten van het bouwterrein. Overbelading voorkomen Afdekken van lading
	Brandstof tanken	Bodemverontreiniging	Morsen bij aftanken Tankplaats onverhard opgesteld Geen absorptiemiddelen aanwezig	Goedgekeurde tankinstallatie met automatische afslag Tankplaats op verharding plaatsen Zorgen voor juiste absorptie middelen
	Machines hydraulisch aangedreven (denk ook aan werkzaamheden nabij de waterkant)	Bodemverontreiniging Verontreiniging oppervlaktewater	Slangbreuk hydrauliek Aan- afkoppelen hulpstukken	Zorgen voor juiste absorptie middelen Aan- en afkoppelen hulpmiddelen boven verharding
	Gemotoriseerde machines	Luchtverontreiniging	Onnodige uitstoot CO voorkomen	Machines niet onnodig laten draaien
	Afval	Verontreiniging omgeving	Niet opruimen van afval in daarvoor bestemde bakken / containers	Zorg voor voldoende en juiste containers ten behoeve van afval

Bijlage 2

Behorende bij I&A_2022_0151

behorende bij


bestek 40926

Boombescherming op bouwlocaties



Stadswerk

Opbouw van de boom

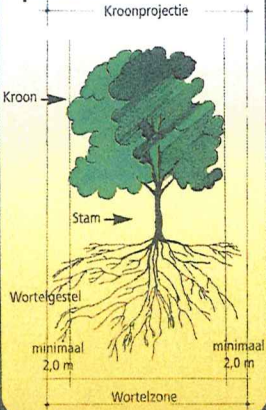

Let op!

Voor dat bouwwerkzaamheden beginnen, aandacht voor de volgende voorschriften:

Algemeen

De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de bouwlocatie aanwezig te zijn. De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de boombeheerder en vervolgens met de directie te worden vastgesteld (zie: Standaard R.A.W. bepalingen). De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

Schade

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken dan wel voorkomen. Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door de aard en omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de "Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen" (NVTB) voor de waardebepaling van bomen.

Beschermingscode:

1. Vooruitlopend op bouw-/sloopactiviteiten moeten de te handhaven bomen met de werkelijke kroonprojectie op tekening staan aangegeven.
2. Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de boombeheerder over de te nemen beschermingsmaatregelen.
3. Machinaal graafwerk binnen de kroonprojectie is verboden!
4. Voorkom bodemverdichting onder de kroonprojectie door transport, opslag van materialen e.d.
5. Snoeien van takken en wortels dikker dan 5 cm doorsnede uitsluitend na overleg met de boombeheerder en vervolgens laten uitvoeren door vakbekwame boomverzorgers (European Treeworkers).


1. Kroonprojectie-bescherming

Afbaken van kroonprojectie of wortelzone zorgt voor maximale bescherming!



2. Boomspiegel-bescherming

Bescherming ter grootte van de boomspiegel bij beperkte werkruimte!




Terreinaanpassingen

afbeelding 8-9

Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering toegestaan, en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) in overleg met de boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie. Ophoging of afgraving leidt tot afsterving van boomwortels door schade of zuurstofgebrek.


8. Terreinophoging

In wortelzone grond-/zandaanvullingen zo veel mogelijk vermijden! Uitsluitend werken volgens voorschrift




9. Terreinafgraving

Nooit machinaal ontgraven binnen kroonprojectie!



3. Stambescherming

Alleen in uitzonderingsituatie (trottoirs) bij ruimtegebrek!




Boombescherming

afbeelding 1-2-3

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (niet-verplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigeronderdelen etc.) zodat beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de boombeheerder en de directie.


10. Bodemverdichting

Bodemverdichting leidt tot afsterven van de boom!



11. Bodemverdichting

Geen bodemverdichtende machines op het wortelpakket! Uitsluitend handarbeid toegestaan




Bodemverdichting

afbeelding 10-11

Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingmachines (trillingen) leidt tot verdichting van de grond en verstikking van de boom en is niet toegestaan binnen de kroonprojectie. Bouwverkeer binnen de kroonprojectie is evenmin toegestaan.


4. Bouwplaats

Geen bouwketen op het wortelpakket plaatsen! Parkeren binnen de kroonprojectie is niet toegestaan



5. Bouwverkeer

Rijden binnen de kroonprojectie voorkomen! Noodzakelijk verkeer alleen op een rijplatenbaan




Bouwplaats/Bouwverkeer

afbeelding 4-5

Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek) in overleg met de boombeheerder en de daarop volgende toestemming van de directie. Gebruik van rijplaten (beton, staal, hout of kunststof) en/of andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk.

12. Opslagplaats

Geen opslag van materialen binnen de kroonprojectie!



Opslagplaats

afbeelding 12

Bouwmateriaal opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is niet toegestaan. Opslag van olie, brandstoffen en chemicaliën moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan. Cementresten, spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen in bodem en/of oppervlaktewater en begraven is nooit toegestaan.

Bijlage 3

Behorende bij I&A_2022_0151

behorende bij

bestek 40926

GRONDBANK AMSTELVEEN
ACCEPTATIEREGLEMENT COMPOSTEERINRICHTING ESCAPADE

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het acceptatiereglement
En tekent voor ontvangst.

Datum:

Naam:

Adres:

Postcode

Plaats

Tel nr:

Handtekening:

ACCEPTATIEREGLEMENT COMPOSTEERINRICHTING ESCAPADE

(Lidnummer 42, Branche Vereniging Organische Reststoffen, sinds 1994)

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het acceptatiereglement
En tekent voor ontvangst.

Datum:

Naam:

Adres:

Postcode

Plaats

Tel nr:

Handtekening:

Acceptatiereglement

Bijlage 1 Samenstellingwaarden en immissiewaarden Besluit Bodemkwaliteit.

Bijlage 2 Voorwaarden en voorschriften voor de verwerking van iepenhout door verwerkingsbedrijven

Bijlage 3 Inschrijfformulier nieuwe relaties Grondbank Amstelveen

Composteerinrichting Escapade

Algemeen reglement voor het aanbieden van groenafval en schone grond aan de Escapade:

Artikel 1 Definities

Aanbieder:

Bedrijf, gemeente of rechtspersoon die afvalstoffen ter bewerking aan de gemeentelijke composteerinrichting Escapade, te Amstelveen aanbiedt volgens de lijst in bijlage 4.

Aanbieding:

Het aanbieden van afvalstoffen aan de gemeentelijke composteerinrichting Escapade, te Amstelveen.

Aanmelding:

Schriftelijk of telefonische verzoek van een aanbieder om de afvalstoffen bij de inrichting te laten accepteren.

Acceptatie:

Het aannemen van een vracht afvalstoffen voor bewerking op de inrichting na het doorlopen van de acceptatieprocedure. De laatste controle in deze procedure is tijdens of na het lossen op de inrichting. Als de vracht daar goed bevonden is, is de vracht geaccepteerd.

Acceptatieprocedure:

De procedure die de aanbieder moet doorlopen om afvalstoffen te laten bewerken.

Afvalstof:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. In dit acceptatiereglement worden daarmee bedoeld: groenafval, agrarisch afval. Door de composteerinrichting Escapade kunnen deze worden geaccepteerd indien deze een fysische kwaliteit en een chemische samenstelling hebben zoals gedefinieerd in de vigerende wet- en regelgeving alsmede de door het bevoegd gezag verstrekte vergunning.

Afvalstroomnummer:

Uniek nummer, toe te kennen door de composteerinrichting Escapade, waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de soort afvalstof, de herkomst, de bewerkingsmethode en de bewerker.

Agrarisch afval:

Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij de agrarische bedrijfsvoering.

Begeleidingsbrief:

Het formulier dat de composteerinrichting Escapade informatie biedt over de aanbieder, de soort afvalstof, en de vervoerder.

Exploitant:

Composteerinrichting Escapade, onderdeel van de Grondbank Amstelveen, behorende bij de gemeente Amstelveen.

Bewerking:

Het uitvoeren van fysische handelingen met een afvalstof teneinde de eigenschappen en/of samenstelling daarvan te veranderen.

Feitelijke acceptatie:

Acceptatie van de vracht door de controleur(s) op het stortgedeelte, na controle en/of analyse van de vracht.

Gereed product:

Het eindproduct alsmede halffabrikaten die gerealiseerd worden op de inrichting door middel van het bewerken van de afvalstoffen.

Gevaarlijke afvalstoffen:

Afvalstoffen die volgens de Europese Afvalstoffen Lijst zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen.

Groenafval:

Organisch-plantaardig afval die vrijkomen bij het beheer van wegen en watergangen, alsmede bij het onderhoud van openbaar en particulier groenbezit, en die met inachtneming van de wet- en regelgeving, de vergunning van composteerinrichting Escapade, en de door composteerinrichting Escapade gehanteerde specifieke aanlevervoorwaarden kunnen worden aangeboden aan de inrichting.

Grond:

Niet vormgegeven bouwstof met een vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, en niet door de mens is geproduceerd. Composteerinrichting Escapade mag alleen schone grond accepteren (conform Bodemkwaliteitskaart (**BKK**) of Besluit Bodemkwaliteit (**BBK**)).

Inrichting:

De plaats waar de exploitant de bij haar aangeboden afvalstoffen conform de aan haar verstrekte vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangt en bewerkt. Dit is de vestigingslocatie van composteerinrichting Escapade aan de Escapade 2, te Amstelveen.

Ontdoener:

Bedrijf, gemeente of rechtspersoon die zich wenst te ontdoen van de afvalstoffen.

Opslagplaats:

Terreingedeelte van de inrichting waar de aangevoerde afvalstof tijdelijk wordt opgeslagen in afwachting van bewerking.

Schone grond:

Grond die voldoet aan de eisen volgens het Besluit Bodemkwaliteit met de klasse AW indeling.

Grond die in het kader van de Bodemkwaliteitskaart schoon is, B1 en O6 en in overleg met de gemeentelijke bodemadviseur hergebruikt mag worden in de regio Amstelland-De Meerlanden.

Per 01-08-2008 zijn de nieuwe samenstellingswaarden van kracht conform het Besluit Bodemkwaliteit. Ook de Bodemkwaliteitskaart zal worden herzien aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Specifieke aanlevervoorwaarden:

De door composteerinrichting Escapade per soort afvalstof alsmede per aanbieder onderscheidenlijk te bepalen en aan aanbieder kenbaar te maken voorwaarden waaronder composteerinrichting Escapade de aan haar aangeboden afvalstof kan accepteren ter bewerking (zie ook artikel 4 en 5).

Stortgedeelte:

Gedeelte van de inrichting waar de aangeboden afvalstof grond wordt gelost.

Transporteur:

Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert. De transporteur kan in sommige gevallen ook de aanbieder zijn.

Vervoerder:

Transporteur.

Vóóraanmelding:

Het door de aanbieder met behulp van een door hem volledig ingevuld inschrijfformulier (zie bijlage 3) aan composteerinrichting Escapade kennis geven van de voorgenomen aanbieding van afvalstoffen. Aan de aanbieder wordt gelijktijdig een acceptatiereglement ter ondertekening afgegeven.

Voorlopige acceptatie:

Verklaring van de exploitant de afvalstof te willen bewerken op basis van de gegevens zoals vermeld op het door aanbieder aan composteerinrichting Escapade verstrekte omschrijvingsformulier.

Vracht:

(deel van een) afvalstroom die in één vervoermiddel ter bewerking wordt aangeboden.

Weigeren:

Het niet accepteren van (delen van) vrachten die niet volgens de gemaakte afspraken zijn aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

- 2.1 Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van groenafval, agrarisch afval en schone grond aan composteerinrichting Escapade.
- 2.2 Voorwaarden van de aanbieder dan wel vervoerder, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing.
- 2.3 In gevallen waarin de voorwaarden van composteerinrichting Escapade niet voorzien, beslist de beheerder van de composteerinrichting.
- 2.4 Op de inrichting is de Wegenverkeerswet van (overeenkomstige) toepassing.
- 2.5 Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.

Artikel 3 Locatie, openingstijden, toegankelijkheid, instructies

- 3.1 De inrichting is gelegen aan de Escapade 2 te Amstelveen.
- 3.2 De inrichting is voor het aanbieden van afvalstoffen en het afhalen van gereed product geopend op maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 16:00 uur.
- 3.3 De inrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van de inrichting en – na verkregen toestemming – personen die afvalstoffen vervoeren en/of gereed product ophalen, alsmede personen die uit hoofde van hun functie werkzaamheden op de inrichting verrichten.
- 3.4 De aanbieder en afnemer alsmede de vervoerder zijn verplicht de aanwijzingen van de (operationeel) beheerder composteerinrichting Escapade op te volgen.

Artikel 4 Te accepteren afvalstoffen

- 4.1 Ter bewerking worden alleen afvalstoffen geaccepteerd waarvoor composteerinrichting Escapade in het kader van de in artikel 6 omschreven procedure schriftelijk toestemming verleend heeft en welke conform de aan haar verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn toegestaan.
- 4.2 De inrichting staat open voor:
- * berm- en slootmaaisel
 - * tuin- en plantsoenafval
 - * snoeihout, takken en boomstobben
 - * houtsnippers
 - * organisch bosafval
 - * agrarisch afval
 - * schone grond.
- 4.3 De inrichting staat tevens open voor iepenhout. De voorwaarden waaronder composteerinrichting Escapade iepenhout accepteert, zijn opgenomen in bijlage 2 van dit acceptatiereglement.

Artikel 5 Te weigeren afvalstoffen

- 5.1 De aangeboden afvalstoffen worden geweigerd indien deze en bestanddelen daarvan op zichzelf, tezamen of in verbinding met andere stoffen:
- * giftig en/of anderszins gevaarlijk zijn;
 - * een hinderlijke geur en/of stof veroorzaken;
 - * schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas, voorzover deze niet ingevolge dit reglement worden geaccepteerd;
 - * voor zelfontbranding vatbaar en zeer licht ontvlambaar zijn;
 - * explosief zijn;
 - * in aanraking met water explosieve, brandbare, giftige, schadelijke en/of walgingwekkende gassen ontwikkelen;
 - * schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater en/of het grondwater, voorzover deze niet ingevolge dit reglement worden geaccepteerd;
 - * milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk verwerkbaar zijn.
- 5.2 Tevens mogen in de aangeboden afvalstoffen de volgende bestanddelen niet aanwezig zijn:
- * gevaarlijk afval;
 - * asbesthoudend en/of daarop gelijkend materiaal;
 - * pathologisch afval;
 - * kadavers of gedeelten daarvan, faecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval;
 - * radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;
 - * lege, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde drums, flessen, bussen, kisten en containers, voorzover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen en componenten, tenzij anders is overeengekomen;
 - * autowrakken;
 - * bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan, voorzover deze niet ingevolge dit reglement worden geaccepteerd;
 - * giftige chemicaliën en mengsels van stoffen die chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen;
 - * specifiek ziekenhuisafval.
- 5.3 Stoffen die door composteerinrichting Escapade op grond van haar moverende redenen zijn uitgesloten worden eveneens geweigerd. Van deze uitsluitingen zal mededeling worden gedaan middels publicaties die ter inzage liggen en/of verkrijgbaar zijn bij de inrichting.

Artikel 6 Algemene aanbiedingsprocedure groenafval

- 6.1 Voordat afvalstoffen kunnen worden aangeboden, dient de aanbieder per soort afvalstof een vóóraanmelding te doen bij composteerinrichting Escapade. Deze plicht tot vóóraanmelding geldt niet:
- * voor de aanbieders in bijlage 4 die tot 20 m3 groenafval, agrarisch afval of schone grond per keer aanbieden.
- 6.2 De vóóraanmelding vindt plaats door bij composteerinrichting Escapade een afvalstroomnummer aan te vragen middels een door aanbieder volledig en juist ingevuld omschrijvingsformulier. Indien composteerinrichting Escapade de afvalstof kan accepteren krijgt de aanbieder per soort afvalstof een afvalstroomnummer toegewezen. Het toegewezen afval-

stroomnummer dient vervolgens te worden vermeld op de begeleidingsbrief die bij de vrachten met betreffende afvalstof wordt gevoegd.

- 6.3 Composteerinrichting Escapade kan nadere eisen stellen aan specifieke soorten afvalstoffen, onder meer met betrekking tot wijze, tijdstip en plaats van aanbidding, hoeveelheid per aanbidding of stukgrootte. Deze eisen worden de aanbieder medegedeeld bij toekenning van het afvalstroomnummer.
- 6.4 Composteerinrichting Escapade kan in overleg met de aanbieder een regeling treffen met betrekking tot een gespreide aanlevering van grote hoeveelheden afvalstoffen van één en dezelfde soort. Onder grote hoeveelheden wordt begrepen de aanvoer van:
- * een partij van meer dan 20 m³ afvalstoffen per dag;
 - * afvalstoffen waarvan delen een stukgrootte hebben die meer is dan 0,5 kubieke meter;
 - * afvalstoffen waarvan delen een lengte hebben van meer dan 1 meter en/of een doorsnee van meer dan 0,5 meter;
 - * afvalstoffen waarvan delen een gewicht hebben van meer dan 500 kg per stuk.
- 6.5 De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangevoerd dat noch de lading, noch delen daarvan, van het voertuig kunnen vallen voordat het stortgedeelte of de opslagplaats is bereikt. Tevens dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de afvalstoffen zodanig te worden aangeboden dat deze geen stof- en/of geuroverlast veroorzaken bij de aanvoer, lossen en/of tijdens de verwerking.
- 6.6 Bij iedere aangeboden vracht dient een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief aanwezig te zijn.
- 6.7 De vervoerder dient zich te melden bij de (operationeel) beheerder van de inrichting. De operationeel beheerder beoordeelt visueel of de vracht kan worden geaccepteerd op de inrichting. Indien de vracht niet geaccepteerd kan worden, wordt de vracht geregistreerd als "geweigerde vracht". Indien de vracht wel kan worden geaccepteerd, dan wordt met inachtneming van dit reglement bepaald tot welke categorie afvalstof deze vracht behoort. Vervolgens wordt de vracht gewogen en geregistreerd, en wordt de vervoerder aangegeven waar op de inrichting de afvalstof gelost kan worden.
- 6.8 Indien tijdens het lossen de aard en/of samenstelling van de afvalstof anders blijkt te zijn dan door composteerinrichting Escapade op grond van de door aanbieder overlegde informatie werd aangenomen, is de vervoerder verplicht dit direct te melden aan de beheerder. Door composteerinrichting Escapade wordt de vracht indien mogelijk geregistreerd onder de juiste categorie of anders geweigerd.
- 6.9 Indien composteerinrichting Escapade op voorhand twijfel heeft over de aard en/of samenstelling van de vracht, dient de vervoerder de vracht te lossen op de aangewezen losplaats, waarna door composteerinrichting Escapade wordt bepaald tot welke categorie afvalstof de vracht behoort.
- 6.10 Composteerinrichting Escapade zal steekproefsgewijs de geloste vrachten controleren op aard en samenstelling en op eventuele verdachte/verboden bestanddelen.
- 6.11 Indien twijfels bestaan over de aard en hoedanigheid van de aangeboden afvalstof kan de betreffende vracht apart in depot worden gezet. Deze partij zal daarna door de beheerder worden onderzocht. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de vracht of gedeelten daarvan, niet voldoen aan het acceptatiereglement van composteerinrichting Escapade, dan wordt de vracht ter verwerking aangeboden aan een geëigende verwerker. Alle kosten die met het onderzoek en het transport c.q. verwerking elders gepaard gaan, zullen worden doorbelast aan de aanbieder.
- 6.12 Na lossing van de vracht wordt het vervoermiddel leeg gewogen ter bepaling van het gewicht van de aangeboden afvalstof. Dit gewicht is bepalend voor de in rekening te brengen vergoeding.
- 6.13 Het gestelde in dit artikel laat onverlet het gestelde in de andere artikelen van dit reglement.

Artikel 7 Acceptatie en weigering

- 7.1 Composteerinrichting Escapade accepteert alleen afvalstoffen indien deze voldoen aan de specifieke aanlevervoorwaarden zoals vermeld in dit acceptatiereglement met bijbehorende bijlagen. Indien de afvalstoffen niet aan de specifieke aanlevervoorwaarden voldoen, moeten deze afvalstoffen door composteerinrichting Escapade geweigerd worden.
- 7.2 Door composteerinrichting Escapade geweigerde afvalstoffen dan wel ten onrechte geaccepteerde afvalstoffen, die reeds op de inrichting zijn gedeponeerd, dienen door de aanbieder terstond na de eerste sommatie van de inrichting te worden verwijderd. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van de aanbieder. Indien deze afvalstoffen niet terstond worden verwijderd, is, onverminderd het verschuldigd zijn van eventuele invorderingskosten

en andere bijkomende kosten, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, per etmaal of deel daarvan dat de gewraakte toestand voortduurt een bedrag van € 500,00 per ton exclusief omzetbelasting verschuldigd.

- 7.3 Indien tegen de beslissing als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel geen schriftelijk beroep conform het bepaalde in artikel 11 wordt ingediend en niet wordt voldaan aan de eis tot verwijdering van geweigerde afvalstoffen, kan composteerinrichting Escapade de geweigerde afvalstoffen verwijderen of laten verwijderen. Alle kosten die met voorbereidingen, transport en/of verwerking elders gepaard gaan, zullen worden doorbelast aan aanbieder.
- 7.4 Indien tegen de beslissing als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel beroep wordt ingediend, kan composteerinrichting Escapade een plaats aanwijzen waar de geweigerde afvalstoffen in afwachting van de uitspraak tijdelijk kunnen worden opgeslagen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanbieder. In dit geval is de aanbieder vooraf aan composteerinrichting Escapade een door laatstgenoemde vast te stellen waarborgsom verschuldigd.
- 7.5 Indien composteerinrichting Escapade besluit de gewraakte afvalstoffen te accepteren, wordt de waarborgsom gerestitueerd dan wel gecompenseerd, met verrekening van de kosten voor uitvoering van het in lid 4 bedoelde.
- 7.6 Indien composteerinrichting Escapade besluit de gewraakte afvalstoffen niet te accepteren, is het derde lid ook ten aanzien van een ingevolge het vijfde lid van dit artikel aangewezen plaats van overeenkomstige toepassing. Indien de bedoelde afvalstoffen niet binnen een termijn van tien dagen na de beslissing conform het bepaalde in artikel 11 zijn verwijderd, zal composteerinrichting Escapade met verrekening van de waarborgsom op kosten van de aanbieder de geweigerde afvalstoffen verwijderen of laten verwijderen.

Artikel 8 Vergoeding

- 8.1 Voor het aanbieden van afvalstoffen is een vergoeding verschuldigd, welke door composteerinrichting Escapade jaarlijks voor iedere categorie afzonderlijk wordt vastgesteld voor de duur van het kalenderjaar.
- 8.2 Het tarief kan door composteerinrichting Escapade tussentijds worden aangepast indien de kostprijs van de be- en/of verwerking, overslag en/of door of namens composteerinrichting Escapade verricht vervoer, als gevolg van wettelijke bepalingen alsmede andere buiten de invloedssfeer van composteerinrichting Escapade gelegen oorzaken, zich wijzigt.
- 8.3 Het tarief van de afvalstoffen wordt bepaald door de categorie waar deze afvalstof toe behoort alsmede de hoedanigheid van de aangeboden vracht, zulks ter beoordeling van composteerinrichting Escapade.
- 8.4 Als basis voor de vergoeding geldt het nettogewicht van de lading, zijnde het verschil tussen het totaalgewicht van het geladen voertuig en het eigen gewicht van het voertuig, zoals aangegeven op de weegbonnen van de voor commerciële doeleinden en daartoe geijkte weegbrug op de inrichting.

Artikel 9 Betaling

- 9.1 Het tarief wordt maandelijks achteraf, voor de in die maand aangeboden hoeveelheden afvalstoffen, per factuur aan de aanbieder in rekening gebracht.
- 9.2 Indien de aanbieder, ook na aanmaning, niet voldoet aan lopende verplichtingen is het bepaalde in artikel 11 van dit reglement van toepassing, met dien verstande dat toelating eerst plaatsvindt nadat volledig aan de verplichtingen is voldaan, met inbegrip van een verhoging van tenminste 10% exclusief omzetbelasting, zulks ter beoordeling van composteerinrichting Escapade.

Artikel 10 Gedragsregels

- 10.1 Het betreden van de inrichting geschiedt op eigen risico.
- 10.2 De aanbieder alsmede de vervoerder zijn gehouden de aanwijzingen van of namens composteerinrichting Escapade strikt op te volgen op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein van de inrichting.
- 10.3 Die vervoerder dient zich te houden aan de op het terrein vigerende verkeersregels. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 5 km/u. Bij de weegbrug wordt het verkeer geregeld via verkeerslichten.
- 10.4 Bij het betreden van het terrein dienen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, die duidelijk worden gemaakt middels bebording, te allen tijde worden gedragen.
- 10.5 De aanbieder alsmede de vervoerder mogen geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werkzaamheden op de inrichting belemmeren.

- 10.6 De voertuigen en ander materieel van de exploitant hebben te allen tijde voorrang.
- 10.7 Op het terrein van de inrichting mogen de chauffeurs alleen indien noodzakelijk het vervoermiddel verlaten. Bij het verlaten van het vervoermiddel, anders dan in verband met het lossen of laden, dient de motor van het vervoermiddel te worden stilgezet en het vervoermiddel te worden afgesloten. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.
- 10.8 De aanbieder zorgt te allen tijde dat de vervoerder van de aan te bieden afvalstoffen op de hoogte is van de inhoud van dit reglement.
- 10.9 Composteerinrichting Escapade is gerechtigd de ontdoener alsmede de vervoerder die naar het oordeel van composteerinrichting Escapade in strijd handelt met het in dit reglement gestelde, de toegang tot de inrichting te ontzeggen voor een door composteerinrichting Escapade te bepalen duur.

Artikel 11 Beroep

- 11.1 Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de inrichting is schriftelijk beroep mogelijk binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum van beslissing tot weigering. Het beroep dient te worden gericht aan **Grondbank Amstelveen** Ingenieursbureau Postbus 4 1180BA Amstelveen, die binnen één maand na het beroep beslist.
- 11.2 Een schriftelijk beroep schort een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de inrichting niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

- 12.1 De aanbieder alsmede de vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn personeel, de in opdracht van of namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de inrichting aanwezig zijnde materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan composteerinrichting Escapade, de materiële zaken op de inrichting, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de inrichting aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van composteerinrichting Escapade, of aan de op de inrichting in gebruik zijnde voorwerpen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.
- 12.2 De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de door hem aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van composteerinrichting Escapade dan wel landelijke, provinciale en/of lokale overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.
- 12.3 De aanbieder alsmede de vervoerder vrijwaren composteerinrichting Escapade tegen alle schadeclaims door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

Artikel 13 Slotbepalingen

- 13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist composteerinrichting Escapade.
- 13.2 Dit reglement treedt in werking op 1 april 2008
- 13.3 Dit reglement kan worden aangehaald als "Algemeen acceptatiereglement composteerinrichting Escapade".

Bijlage 1

Samenstellingwaarden en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit



samenstellingswaarde (mg/kg droge stof)
standaardbodem¹ L en H gecorrigeerd²

Stof	S1 streefwaarde	S2 grenswaarde	S1 streefwaarde	S2 grenswaarde	immissiewaarde mg/m ² /100jr
Metalen					
antimoon (Sb)	-	-	-	-	39
arseen (As)	29	55	15+0,4(L+H)	28+0,76(L+H)	435
barium (Ba)	200	625	38,7+6,5L	121+20L	6300
cadmium (Cd)	0,8	12	0,4+0,007(L+3H)	6+0,105(L+3H)	12
chrom (Cr)	100	380	50+2L	190+7,6L	1500
cobalt (Co)	20	240	4,4+0,62L	53+7,5L	300
koper (Cu)	36	190	15+0,6(L+H)	79+3,17(L+H)	540
kwik (Hg)	0,3	10	0,2+0,0017(2L+H)	6,7+0,057(2L+H)	4,5
lood (Pb)	85	530	50+L+H	312+6,2(L+H)	1275
molybdeen (Mo)	10	200	10	200	150
nikkel (Ni)	35	210	10+L	60+6L	525
seleen (Se)	-	-	-	-	15
tin (Sn)	-	-	-	-	300
vanadium (V)	-	-	-	-	2400
zink (Zn)	140	720	50+1,5(2L+H)	257+7,7(2L+H)	2100
Anorganische verbindingen					
cyaniden-vrij	1	-	-	-	-
cyaniden-complex	5	-	-	-	-
thiocyanaten (som)	-	20	-	-	-
bromide ₃	20	-	-	-	90 ⁴
chloride ₃	200	-	-	-	87000 ^{4,5}
fluoride ₃	500	-	175+13L	-	14000
sulfaat ₃	-	-	-	-	100000 ^{4,5}
Aromatische verbindingen					
benzeen	0,05	1	0,005H	0,1H	-
ethylbenzeen	0,05	1,25	0,005H	0,125H	-
tolueen	0,05	1,25	0,005H	0,125H	-
xylene	0,1	1,25	0,01H	0,125H	-
styreen(vinylbenzeen)	0,3	100	0,03H	10H	-
fenol	0,05	1,25	0,005H	0,125H	-
cresolen (som)	0,05	5	0,005H	0,5H	-
catechol	0,05	20	0,005H	2H	-
resorcinol	-	10	-	1H	-
hydrochinon	-	10	-	1H	-



Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)					
PAK (som 10)	1	40	0,1H ²	4H ²	-
naftaleen	-	5	-	5	-
antraceen	-	10	-	10	-
fenantreen	-	20	-	20	-
fluoranteen	-	35	-	35	-
benzo(a)antraceen	-	40	-	40	-
chryseen	-	10	-	10	-
benzo(a)pyreen	-	10	-	10	-
benzo(ghi)peryleen	-	40	-	40	-
benzo(k)fluorantheen	-	40	-	40	-
indeno(1,2,3-cd)pyreen	-	40	-	40	-
Gechloroorede koolwaterstoffen					
vinylchloride	-	0,1	-	0,01H	-
dichloormethaan	0,4	4	0,04H	0,4H	-
1,1-dichloorethaan	0,02	-	0,002H	-	-
1,2-dichloorethaan	0,02	4	0,002H	0,4H	-
1,1-dichlooretheen	0,1	-	0,01H	-	-
1,2-dichlooretheen (cis+trans)	0,2	-	0,02H	-	-
trichloormethaan (chloroform)	0,02	3	0,002H	0,3H	-
1,1,1-trichloorethaan	0,07	-	0,007H	-	-
1,1,2-trichloorethaan	0,4	-	0,04H	-	-
trichlooretheen (tri)	0,1	4	0,01H	0,4H	-
tetrachloormethaan (tetra)	0,4	1	0,04H	0,1H	-
tetrachlooretheen (per)	0,01	4	0,001H	0,4H	-
chloorbenzenen (som)	0,03	5	0,003H	0,5H	-
chloorfenolen (som)	0,01	6	0,001H	0,6H	-
chlooranilinen	0,005	0,5	0,0005H	0,05H	-
polychloorbifenylen (som 7)	0,02	1	0,002H	0,1H	-
EOX 7	0,8	0,8	0,8	0,8	-
Bestrijdingsmiddelen					
drins	0,005	0,5	0,0005H	0,05H	-
chloordaan	0,01	-	0,001H	-	-
DDT/DDD/DDE	0,01	0,5	0,001H	0,05H	-
endosulfan	0,0025	-	0,00025H	-	-
HCH-verbindingen	0,01	0,5	0,001H	0,5	-
heptachloor	0,0025	-	0,00025H	-	-
heptachloor-epoxide	0,0025	-	0,0002H	-	-
atrazine	0,0002	0,5	0,00002H	0,05H	-
carbaryl	-	0,5	-	0,05H	-
carbofuran	-	0,5	-	0,05H	-
maneb	-	0,5	-	0,05H	-
organo-chloorhoudend	-	0,5	-	0,05H	-
niet-chloorhoudend	-	0,5	-	0,05H	-
organotinverbindingen	0,001	2,5	0,0001H	0,25H	-
Overige verontreinigingen					
cyclohexanon	0,1	270	0,01H	27H	-
ftalaten (som)	0,1	60	0,01H	6H	-
minerale olie 6	50	500	5H	50H	-
pyridine	0,1	1	0,01H	0,1H	-
tetrahydrofuran	0,1	2	0,01H	0,2H	-
tetrahydrothiofeen	0,1	90	0,01H	9H	-

Bijlage 2

Voorwaarden en voorschriften voor de verwerking van iepenhout door verwerkingsbedrijven

1. Algemeen
2. Verwerkers
3. Periode onschadelijk maken van vrijgekomen iepenhout
4. Verwerkingsmethoden
5. Registratie
6. Controle
7. Certificering

1. Algemeen

Om tot een effectief iepenbeheer voor alle belanghebbenden te komen, is het belangrijk (deze) voorwaarden af te stemmen op de Handleiding 'Goed Iepenbeheer' uit mei 1999 en de juridische handleiding iepziektebestrijding 'Handhaving A.P.V. artikel', maart 2000. Beide zijn ontwikkeld door het IepenBeraad. De informatie over iepen wordt tevens ondersteund door de interactieve Cd-rom: Dutch Elm Disease, gemaakt in 2000 door de Universiteit van Amsterdam. Deze informatie is in het bezit gebracht van BVOR-leden en zonodig verkrijgbaar bij bovengenoemde instelling.

Het verwerken van vrijgekomen iepenhout dient tussen 1 april en 1 oktober op een dusdanige wijze te gebeuren, dat risico van ziekteoverbrenging geminimaliseerd wordt. Het is inmiddels bewezen dat nauwkeurig en snel opruimen na ontvangst van los, vatbaar- en/of ziek hout de epidemie indamt. Broedhout* dient onmiddellijk onschadelijk gemaakt te worden!

**Onder broedhout verstaat men iepenhout waarop de iepenspinkever reeds eitjes heeft gelegd . In een gevorderd stadium zijn het gangenpatroon onder de bast en de larven zichtbaar; in een nog later stadium zijn de uitvlieggaatjes in de bast zichtbaar. De "Dutch Elm Disease Cd-rom" geeft dit duidelijk weer.*

Dit is te bereiken door afspraken vast te leggen, tussen alle iepenbeheerders en verantwoordelijke overheden (partijen kunnen tot beide groepen behoren).

De 'haalbare' richtlijnen staan hieronder weergegeven. De schakel tussen 'ontdoener'*, eigenaar/opdrachtgever en 'verwerker' wordt door Aequator (voorheen DLV)* beschreven in opdracht van het IepenBeraad.

Opdrachtgevers voor verwijdering van ziek- en/of gezond snoeihout en stobben van iepen zijn hoofdzakelijk overheden op alle niveaus, landschapbeheerders voor stichtingen en waterwingebieden, beheerders van infrastructuur en particulieren op eigen terrein. Hoofdzaak is dat iedere opdrachtgever tot verwijdering van vrijgekomen iepenhout* laat uitvoeren door gecertificeerde ontdoeners*/inzamelaars*, zoals deze volgens de provinciale milieuverordening (pmv*) genoemd worden.

Toezicht en Regelgeving berusten bij de gemeenten, waarbij zich geografisch één of meerdere situaties voordoen. Meestal is dit in de plaatselijke APV* opgenomen. Daarnaast is er controle op inrichtingen door provinciale handhavers, in en rond Amsterdam en Haarlemmermeer door Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA), steekproefsgewijs in alle Nederlandse buitenruimte door Bomenstichting/IepenBeraad, soms gecombineerd met de BVOR*. Tevens worden plantenziektkundige diensten en Alterra* te Wageningen betrokken bij onderzoek en/of vaststelling van ziekten en plagen, door een ieder die hierom verzoekt. Naast waarnemingen betreffende iepziekte krijgen ook de perenprachtkever en bacterievuur in rosacaeën en watermerkiekte in wilgen aandacht, zodat ook deze negatieve invloeden op bomen zoveel mogelijk uitgebannen kunnen worden. Voor deze twee laatste genoemde ziekten en plagen kan het mede noodzakelijk zijn, dat voor de vernietiging gecertificeerde inrichtingen benaderd worden.

2. Verwerkers

Verwerkers van vrijgekomen ziek en/of gezond snoeihout en stobben van iepen zijn inrichtingen die zich door middel van een door de BVOR verstrekte 'erkenning' conformeren aan de geldende richtlijnen. Voorbeelden zijn composteerinrichtingen, bio-centrales en houtbe- en

verwerkingsbedrijven. Het logistieke traject kan deel uitmaken van het takenpakket van de 'verwerker' wanneer dit mede aangevraagd is. De 'verwerker' dient te allen tijde een geldige be- en verwerkersvergunning te bezitten volgens de PMV*, afgegeven door de betrokken overheidsinstelling (meestal de provincie).

3. Periode onschadelijk maken van vrijgekomen iepenhout

Ongeschild iepenhout moet in de periode 1 april en 1 oktober binnen 8 dagen onschadelijk gemaakt worden. (APV*) De voorkeur gaat er naar uit, dit op de werkplek te doen. Onschadelijk maken van ongeschild iepenhout kan uitgesteld worden door het hout binnen een inrichting geheel onder water te bewaren. Voor broedhout*, herkenbaar door uitvlieggaten, geldt dat verwerking direct gebeurt.

4. Verwerkingsmethoden

A. *Bewerken voor hergebruik in houtproducten*

B. *Bewerken tot compost*

C. *Bewerken voor bio-centrales*

D. *Wateren*

E. *Inzamelmethode stamhout voor A*

F. *Schillen*

G. *Onder de compostwiers bewaren*

A. *Bewerken voor hergebruik in houtproducten*

Ongeschilde iepenstammen kunnen direct verwerkt worden in houtzagerijen, indien na het zagen geen schorsranden op het gezaagde hout voorkomen. De afgezaagde schorsranden dienen verkleind te worden tot stukjes < 4 cm. Opslag van ongeschild iepenhout langer dan 3 etmalen is uitgesloten. Voor al het aanwezige iepenhout is een registratieplicht.

B. *Bewerken tot compost*

Indien iepenhout ongeschikt is voor verantwoorde houtproductie is, dient het onschadelijk gemaakt te worden. Indien het hout ongeschild is of niet gewaterd kan worden, moet het binnen 8 dagen na aanvoer verkleind worden, zodanig dat de iepenspintkever zich niet tussen schors en stamhout kan vestigen. De acceptabele doorsnede van de snippers is hierbij maximaal 4cm.

C. *Bewerken voor bio-centrales*

Iepenhout dat als brandstof naar bio-centrales gaat moet binnen 8 dagen verkleind worden tot houtchips < 4cm. Het hout hoeft niet apart van de overige brandstofproductie gescheiden te worden.

D. *Wateren*

Wateren is een methode om broedhout ongeschild onschadelijk te maken, of iepenhout voor nadere bewerking op te slaan. Het hout dient geheel onder water, gedurende een jaar opgeslagen te worden. Broedhout is pas na een jaar volledig veilig/onschadelijk.

E. *Inzamelmethode stamhout voor A*

Inrichtingen kunnen naast verwerker ook een depotfunctie vervullen, om iepenhout (uitgezonderd broedhout*) te verzamelen voor bewerking in houtzagerij e.d. Hierdoor verbindt de inrichting zich tot een wekelijkse ophaalverplichting, waarbij eventueel ketenafspraken gemaakt kunnen worden. Direct na ontvangst bij het houtbe-/verwerkingsbedrijf moet het hout de eerste dag al in het productieproces opgenomen worden.

F. *Schillen*

Schillen (ontbasten) is een methode die toegepast kan worden om stamhout direct onschadelijk te maken. Dit gebeurt d.m.v. schilschop en motorzaag of motorfrees. De schillen of bastdelen moeten versnipperd worden.

G. *Onder de compostwiers bewaren*

Ondergraven van stamhout, één meter diep in de composthoop. Door broei van >60° C is binnen drie tot vier omzettingen de bast van stamhout losgelaten. De bast verteerd verder in de compost en de stammen worden voor diverse toepassingen gebruikt. (Deze methode wordt gedoogd tot het onderzoek hier naar afgerond is!)

5. Registratie

Op de inrichting dient tijdens openstelling altijd een persoon aanwezig te zijn die op de hoogte is van deze richtlijnen. Per inrichting dienen bevoegde personen éénmaal per twee jaar de iepenmiddag bij te wonen. De 'erkenning' behoort voor de klanten zichtbaar in of bij de registratieruimte aanwezig te zijn. Bij controlebezoeken dienen navolgende gegevens aanwezig te zijn. Van alle aan- en/of afgevoerde iepenhout moet worden geregistreerd:

a. de datum en tijdstip van aan- en/of afvoer;



- b. de naam en het adres van degene van wie het iepenhout afkomstig is resp. de naam en het adres van degene aan wie het iepenhout is afgegeven;
- c. de afvalstof- of productcode waaronder ingezameld c.q. afgegeven is;
- d. de getotaliseerde hoeveelheid in gewicht of volume;
- e. de plaats waar en de wijze waarop het iepenhout is afgegeven;
- f. bij aanvoer de wijze waarop iepenhout onschadelijk gemaakt wordt en/of bij afvoer de voorgenomen wijze waarop iepenhout onschadelijk gemaakt wordt door verwerking in zagerij of bio-centrale;
- g. de naam en het adres van de transporteur van het iepenhout en de naam van degene in wiens opdracht het vervoer geschiedt.

6. Controle

Door bevoegde personen van de Bomenstichting*/IepenBeraad* wordt d.m.v. controlebezoeken gecontroleerd op een verantwoorde wijze van verwerking van vrijgekomen iepenhout. Hierbij worden de plaatselijke APV*/kapverordening houtopstanden gehanteerd en de "voorwaarden voor de verwerking van iepenhout door verwerkingsbedrijven". Hierbij dient de administratie over iepenhout ter inzage te zijn. Er wordt gecontroleerd of broedhout* binnen een dag onschadelijk gemaakt wordt, of opgeslagen onder water is. Van de (iepen)houtstroom wordt bekeken of de bewerking tot stukken < 4cm binnen 8 dagen geschiedt. Er wordt bekeken of een eventueel aanwezig depot voor transport naar de houtzagerij frequent genoeg geledigd wordt. Boetes en sancties volgens APV*. Er worden bovendien per provincie eventuele mogelijkheden benut, ter subsidiëring van het onschadelijk maken van ziek hout.

7. Certificering

Certificering gebeurt door middel van aanmelding bij de BVOR te Wageningen. Hier wordt bekeken of het mogelijk is aanvrager volgens de "Voorwaarden" van een "erkenning" te voorzien. Deze kan ingaan na het bijwonen van een iepenmiddag met info en demonstratie, het volledig invullen van de aanvraag en het betalen van de leges/scholing.

Indien men aan deze voorwaarden voldoet, wordt het erkenningscertificaat uitgereikt.

Apeldoorn/Utrecht, april 2005.

* DEFINITIES

Alterra	Research instituut voor de groene ruimte, www.alterra.wur.nl
APV	Algemene Plaatselijke Verordening (plaatselijk=gemeentelijk)
Bacterievuur	Ziekte in rosacaeën waardoor verwelking optreedt
Bomenstichting	Stichting voor alle bomenbelangen, waarin het Iepenberaad geïntegreerd is (voorzitter en provinciaal coördinatoren), www.bomenstichting.nl
Broedhout	Onder broedhout verstaat men iepenhout waarop de iepenspintkever reeds eitjes heeft gelegd. In een gevorderd stadium zijn het gangenpatroon onder de bast en de larven zichtbaar; in een nog later stadium zijn de uitvlieggaatjes in de bast zichtbaar. De "Dutch Elm Disease Cd-rom" geeft dit duidelijk weer
BVOR	Branche Vereniging Organische Reststoffen, www.bvor.nl
Aequator	(voorheen DLV) Aequator Groen & Ruimte (www.aequator.nl)
IepenBeraad	Commissie van iependeskundigen en Provinciale Coördinatoren gevestigd bij de Bomenstichting
Iepenhout	Hout van de iep
Inzamelaar	Vergunde inrichting voor organische reststoffen
Ontdoener	Opdrachtgever welke afstand doet van organisch restafval
Opdrachtgevers	Overheden alle niveaus, landschapbeheerders voor stichtingen en waterwingebieden, beheerders van infrastructuur en particulieren op eigen terrein
Perenprachtkever	Kevers welke onder boombasten van rosacaeën gangen maakt
Pmv	Provinciale Milieuverordening
Watermerkziekte	Virusziekte in wilgenbomen die neergaande sapstroom stagneert

GRONDBANK AMSTELVEEN

Inschrijfformulier nieuwe relaties Grondbank Amstelveen

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	FINANCIËLE GEGEVENS
Bedrijf bedrijf	Afdeling/bedrijf Ingenieursbureau Bedrijfsbureau
Naam / t.a.v. naam	Debiteurennummer debiteurennr
Postbus postbus	Fcl fcl
Straat + huisnr. straat + huisnr	
Postcode 1234 AB	
Woonplaats Woonplaats	
K.v.k. nummer 000.00.000	
Bank/giro nr 000 000 0000	
VIHB nr HN1234VIHB	
Bedrijfs nr 000 000 0000	
Soort klant Ontdoener en/of Afnemer	Artikel(en) Artikel(en)
Heeft acceptatiebeleid ontvangen	Akkoord klant Paraaf Klant
Toegewezen afvalstroomnummer	073828.....
Opgesteld door Opgesteld door	
Datum	
	Paraaf

Bijlage 4

Behorende bij I&A_2022_0151

behorende bij

bestek 40926

Huisregels die gelden op het terrein van de Krijgsman

Versie Januari 2019

Algemeen

- Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 07:00 – 16:00 uur. In overleg zijn aangepaste openingstijden mogelijk.
- Beheerder grondbank: dhr. G.J. Kragtwijk (tel. 06-53 29 20 11)
- Coördinator : T. Wandelaar (06-10 84 91 56)
- Depotbeheerder: R. de Rue (06-53 77 49 55)
- 27MC-band contact via kanaal 22.
- De minimale leeftijd op het terrein is 18 jaar.
- De vervoerder dient VCA gecertificeerd te zijn.
- De vervoerder dient in het bezit te zijn van een geldig VIHB nummer.
- Houd rekening met onze burens en rijd niet te hard over de drempel Amsteldijk / Amstelzijde

Met betrekking tot het terrein

- Het terrein is geschikt voor kleppenvrachtwagens achterlossend en voor trekkers achterlossend. Terrein aanrijden met gesloten / afgezeilde vrachten.
- Het terrein is niet geschikt voor trailers.
- De maximaal toegestane snelheid op het terrein is 5 km per uur.
- Op het terrein is slechts één rijrichting toegestaan. Zie de kaart onderaan deze pagina.
- Bij het uitrijden aan de Amsteldijk-zuid links afslaan.
- Bij het verlaten van de vrachtauto dient men de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen. Dit betreft minimaal een reflecterend vest en veiligheidsschoenen.
- Het is niet toegestaan koffiebekertjes, blikjes, flesjes en ander afval te dumpen op het terrein.

Procedure

- Vervoerder dient zich elke dag bij de eerste keer betreden van het terrein te melden bij de depotbeheerder.
- Vervoerder dient een begeleidingsbrief bij zich te hebben (ontvangen via toezichthouder).
- Heeft de vervoerder geen geldige begeleidingsbrief bij zich, dan wordt de vracht geweigerd en retour gestuurd.
- Een begeleidingsbrief is één dag geldig. De volgende dag dient men een nieuwe bij zich te hebben, met het aan de vervoerder toegekende afvalstroomnummer.
- Bij het niet tijdig inleveren van de begeleidingsbrief wordt elke volgende vracht geweigerd en € 250,- in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de niet gebruikte begeleidingsbrieven. Deze dienen ook altijd ingeleverd te worden.
- Vervoerder dient bij de laatste vracht van die dag de begeleidingsbrief af te geven bij de depotbeheerder.
- De aanwijzingen van de beheerder en kraanmachinist dienen altijd te worden opgevolgd.
- De grond dient steekvast aangeleverd te worden. Voor Bagger geldt dit natuurlijk niet

