

Controle terugstroombeveiligingen

Almere College Locatie Copernicus
te Dronten

Testing For Life



Locatiegegevens:

Locatienaam	Almere College Locatie Copernicus
Adres	Educalaan 6-8
Postcode/plaats	8251 GC Dronten

Opdrachtgever:

Naam opdrachtgever	Hollander techniek
Adres	Boogschutterstraat 30
Postcode/plaats	7324 AG Apeldoorn

Rapportagedatum 16-06-2023

De terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd door Wesley ter Harmsel op 02-06-2023.

Aantal gecontroleerd:*	36
Aantal goedgekeurd:	25
Aantal afgekeurd:	8
Aantal met onbekend oordeel:	3

Controle terugstroombeveiligingen

De controle van terugstroombeveiligingen is onderdeel van de verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties. Deze verplichting is in Waterwerkblad 1.4G en de NEN 1006 vanuit de achterliggende wetgeving nader uitgewerkt.

Terugstroombeveiligingen niet in orde of (deels) niet controleerbaar

Wanneer terugstroombeveiligingen zijn afgekeurd, dienen deze te worden verplaatst, geplaatst of vervangen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om welke beveiligingen het gaat, is te vinden in de lijst op de volgende pagina's.

De beoordelingscriteria zijn hieronder weergegeven:

- Drukvast
- Toegepast type
- Plaats van de terugstroombeveiliging

* Onder gecontroleerde terugstroombeveiligingen vallen:

- Beveiligingen die daadwerkelijk gecontroleerd zijn op plaats, of type, of functie.
- Beveiligingen die op de (aangeleverde) lijst stonden, maar sinds vorige controle zijn verwijderd.

Gecontroleerde beveiligingen

Legenda bij de kolom 'Drukvast'			
V	Gecontroleerd en goedgekeurd	---	(Deels) niet kunnen controleren, indirect afgekeurd
X	Gecontroleerd en afgekeurd	---	Niet kunnen controleren: beveiliging of tappunt verwijderd of verkeerd in de lijst

Over het tappunt					Over de controle			
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
1	Bgg	Cv ruimte A.08 bij lokaal 201	A.kk.1	Gasboiler	EA	EA	V	Methode: Standaard ---
2						INL	V	Methode: Standaard ---
3	Bgg	Cv ruimte bij lokaal 201	A.kk.2	Deelcirculatieleiding	EA	EA	X	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.
4		Gang bij lokaal 201	B.kk.1	Brandslanghaspel	EA	EA	V	Methode: Overdruk ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
5	Bgg	Lokaal 201	B.kk.2	Nooddouche	EA	??	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
6	Bgg	Lokaal 201 meubel leraar	B.kk.3	Labkraan	CA	CA	X	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.
7		TOA lokaal 201	B.kk.4	Aansluiting t.b.v. Zuurkast TOA	CA	CA	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
8	Bgg	TOA lokaal 201	B.kk.5	Close-in boiler	EA	INL	V	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
9	Bgg	TOA lokaal 201	B.kk.6	Aansluiting t.b.v. Distillatie kolom	EA	EA	✓	Methode: Standaard ---
10	Bgg	TOA lokaal 202	B.kk.7	Close-in boiler	EA	EA	✓	Methode: Standaard ---
11		Lokaal 202 B.09	B.kk.8	Labkraan	CA	CA	✗	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.
12		Lokaal 202 B.09	B.kk.9	Nooddouche	EA	??	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
13		Lokaal 203	B.kk.10	Nooddouche	EA	??	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
14	Bgg	Lokaal 203	B.kk.11	Nooddouche	EA	??	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
15	Bgg	Lokaal 203 meubel leraar	B.kk.12	Labkraan	EA	CA	X	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.
16		Docentenkamer	C.kk.1	Koffieautomaat	EA	EA	V	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
17		Docentenkamer	C.kk.2	Koffieautomaat	EA	EA	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
18	Bgg	Docentenkamer	C.kk.2a	Close-in boiler	EA	INL	✓	Methode: Overdruk ---
19		Kruipruimte C.09	C.kk.3	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
20	Bgg	Cv ruimte bij Docentenkamer	C.kk.4	Brandslanghaspel	EA	EA<15	✓	Methode: Standaard ---
21		CV ruimte bij Docentenkamer	C.kk.5	CV-vulkraan	CA	CA	✗	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.
22						EA	✓	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
23	Bgg	Gang bij Docentenkamer	C.kk.6	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
24		Kruipruimte C.32	C.kk.7	Ontharder	CA	??	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
25		Keuken Aula C.32	C.kk.8	Knijpdouche	EA	EA	✓	Methode: Standaard ---
26						EA	✗	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.
27		Keuken Aula C.32	C.kk.9	Koffieautomaat	EA	EA	✓	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
28	Bgg	Aula bij keuken	C.kk.10	Brandslanghaspel	EA	??	---	Methode: Standaard Bij de controle op overdruk is gebleken dat de spuitkop van de brandslanghaspel lekt. Laat de spuitkop vervangen.
29		Ruimte D.12 naast lokaal 404	D.kk.2	Close-in boiler	EA	INL	✓	Methode: Standaard ---
30						EA	✓	Methode: Standaard ---
31	Bgg	Lokaal 405 D.13	D.kk.3	Labkraan	CA	CA	✗	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
32	Bgg	Lokaal 405 D.13	D.kk.4	Nooddouche	EA	Geen	---	Methode: Standaard De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.
33		Hal D.01 bij lokaal 405	D.kk.5	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
34	Bgg	Mediatheek 411	D.kk.6	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
35		Kruipruimte E.07	E.kk.1	Aansluiting t.b.v. buitenevenementen	EA	??	---	Methode: Standaard Bij dit toestel is een controle van de terugstroombeveiliging niet mogelijk
36		Gang E.06 bij lokaal 501	E.kk.2	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
37	Bgg	Gang bij lokaal 501	E.kk.3	Brandslanghaspel	EA	EA	✓	Methode: Overdruk ---
38		BHV EHBO ruimte E.18	E.kk.4	Close-in boiler	EA	INL	✓	Methode: Standaard ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerklelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
39	Bgg	Cv ruimte gang E.01	E.kk.4	CV-vulkraan	CA	??	X	Methode: Standaard Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.
40	Bgg	Gang F.07 bij jongens toilet	F.kk.1	Brandslanghaspel	EA	EA	V	Methode: Overdruk ---
41		Kast F.09 lokaal 612	F.kk.2	Elektrische boiler	EA	INL	V	Methode: Standaard ---
42		Pantry F.10	F.kk.3	Koffieautomaat	EA	EA	---	Het betreffende tappunt is verwijderd.
43		Plafond docentenwerkplek C.05	G.kk.1	Brandslanghaspel	EA	EA	---	Methode: Standaard Bij de controle op overdruk is gebleken dat de spuitkop van de brandslanghaspel lekt. Laat de spuitkop vervangen.
49	BG	lokaal 607	1	Brandslanghaspel	EA<15	EA	V	Methode: Overdruk ---

Over het tappunt					Over de controle			
Keerkelelabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Verplicht	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
50	BG	Berging bij kluisjes aula	2	Brandslanghaspel	EA<15	EA	✓	Methode: Overdruk ---

Bijlage I: Foto's genomen bij de controle van de terugstroombeveiligingen


Keerkleplabel	2
Locatieomschrijving	A.kk.1 - Gasboiler t.b.v. - Cv ruimte A.08 bij lokaal 201 (verdieping Bgg)
Opmerking	---




Keerkleplabel	3
Locatieomschrijving	A.kk.2 - Deelcirculatieleiding t.b.v. - Cv ruimte bij lokaal 201 (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.



Keerkleplabel	5
Locatieomschrijving	B.kk.2 - Nooddouche t.b.v. - Lokaal 201 (verdieping Bgg)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.

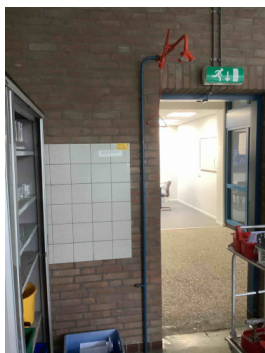

Keerkleplabel	6
Locatieomschrijving	B.kk.3 - Labkraan t.b.v. - Lokaal 201 meubel leraar (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.

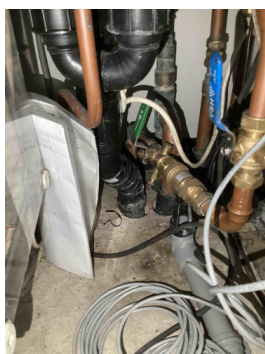

Keerkleplabel	7
Locatieomschrijving	B.kk.4 - Aansluiting t.b.v. Zuurkast TOA- TOA lokaal 201 (verdieping)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.



Keerkleplabel	11
Locatieomschrijving	B.kk.8 - Labkraan t.b.v. - Lokaal 202 B.09 (verdieping)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.



Keerklelabel	12
Locatieomschrijving	B.kk.9 - Nooddouche t.b.v. - Lokaal 202 B.09 (verdieping)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.



Keerklelabel	13
Locatieomschrijving	B.kk.10 - Nooddouche t.b.v. - Lokaal 203 (verdieping)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.




Keerkleplabel	14
Locatieomschrijving	B.kk.11 - Nooddouche t.b.v. - Lokaal 203 (verdieping Bgg)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.



Keerkleplabel	15
Locatieomschrijving	B.kk.12 - Labkraan t.b.v. - Lokaal 203 meubel leraar (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.



Keerklelabel	17
Locatieomschrijving	C.kk.2 - Koffieautomaat t.b.v. - Docentenkamer (verdieping)
Opmerking	De terugstroombeveiliging is niet toegankelijk voor controle. Draag zorg dat de terugstroombeveiliging benaderbaar is, zodat deze bij de volgende controle kan worden gecontroleerd.

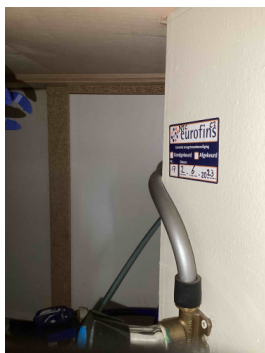

Keerklelabel	18
Locatieomschrijving	C.kk.2a - Close-in boiler t.b.v. - Docentenkamer (verdieping Bgg)
Opmerking	---



Keerklelabel	20
Locatieomschrijving	C.kk.4 - Brandslanghaspel t.b.v. - Cv ruimte bij Docentenkamer (verdieping Bgg)
Opmerking	---




Keerkleplabel	21
Locatieomschrijving	C.kk.5 - CV-vulkraan t.b.v. - CV ruimte bij Docentenkamer (verdieping)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.




Keerkleplabel	26
Locatieomschrijving	C.kk.8 - Knijpdouche t.b.v. - Keuken Aula C.32 (verdieping)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert. Vervang de terugstroombeveiliging type EA, plaats voor de keerklep een afsluiter.



Keerkleplabel	28
Locatieomschrijving	C.kk.10 - Brandslanghaspel t.b.v. - Aula bij keuken (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle op overdruk is gebleken dat de spuitkop van de brandslanghaspel lekt. Laat de spuitkop vervangen.

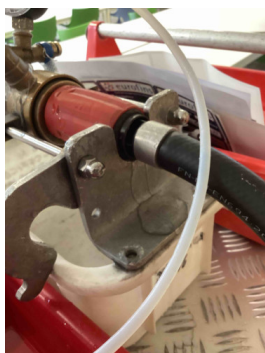

Keerkleplabel	31
Locatieomschrijving	D.kk.3 - Labkraan t.b.v. - Lokaal 405 D.13 (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.

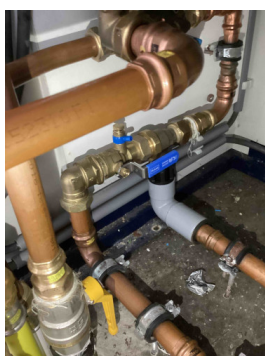

Keerkleplabel	39
Locatieomschrijving	E.kk.4 - CV-vulkraan t.b.v. - Cv ruimte gang E.01 (verdieping Bgg)
Opmerking	Bij de controle is gebleken dat de terugstroombeveiliging niet correct functioneert, de ontlastklep/1e keerklep is defect. Vervang de terugstroombeveiliging type CA, plaats de beveiliging bij voorkeur tussen 2 afsluiters met aftapper.



Keerkleplabel	43
Locatieomschrijving	G.kk.1 - Brandslanghaspel t.b.v. - Plafond docentenwerkplek C.05 (verdieping)
Opmerking	Bij de controle op overdruk is gebleken dat de spuitkop van de brandslanghaspel lekt. Laat de spuitkop vervangen.



Keerklelabel 49
Locatieomschrijving 1 - Brandslanghaspel t.b.v. - lokaal 607 (verdieping BG)
Opmerking ---



Keerklelabel 50
Locatieomschrijving 2 - Brandslanghaspel t.b.v. - Berging bij kluisjes aula (verdieping BG)
Opmerking ---

