


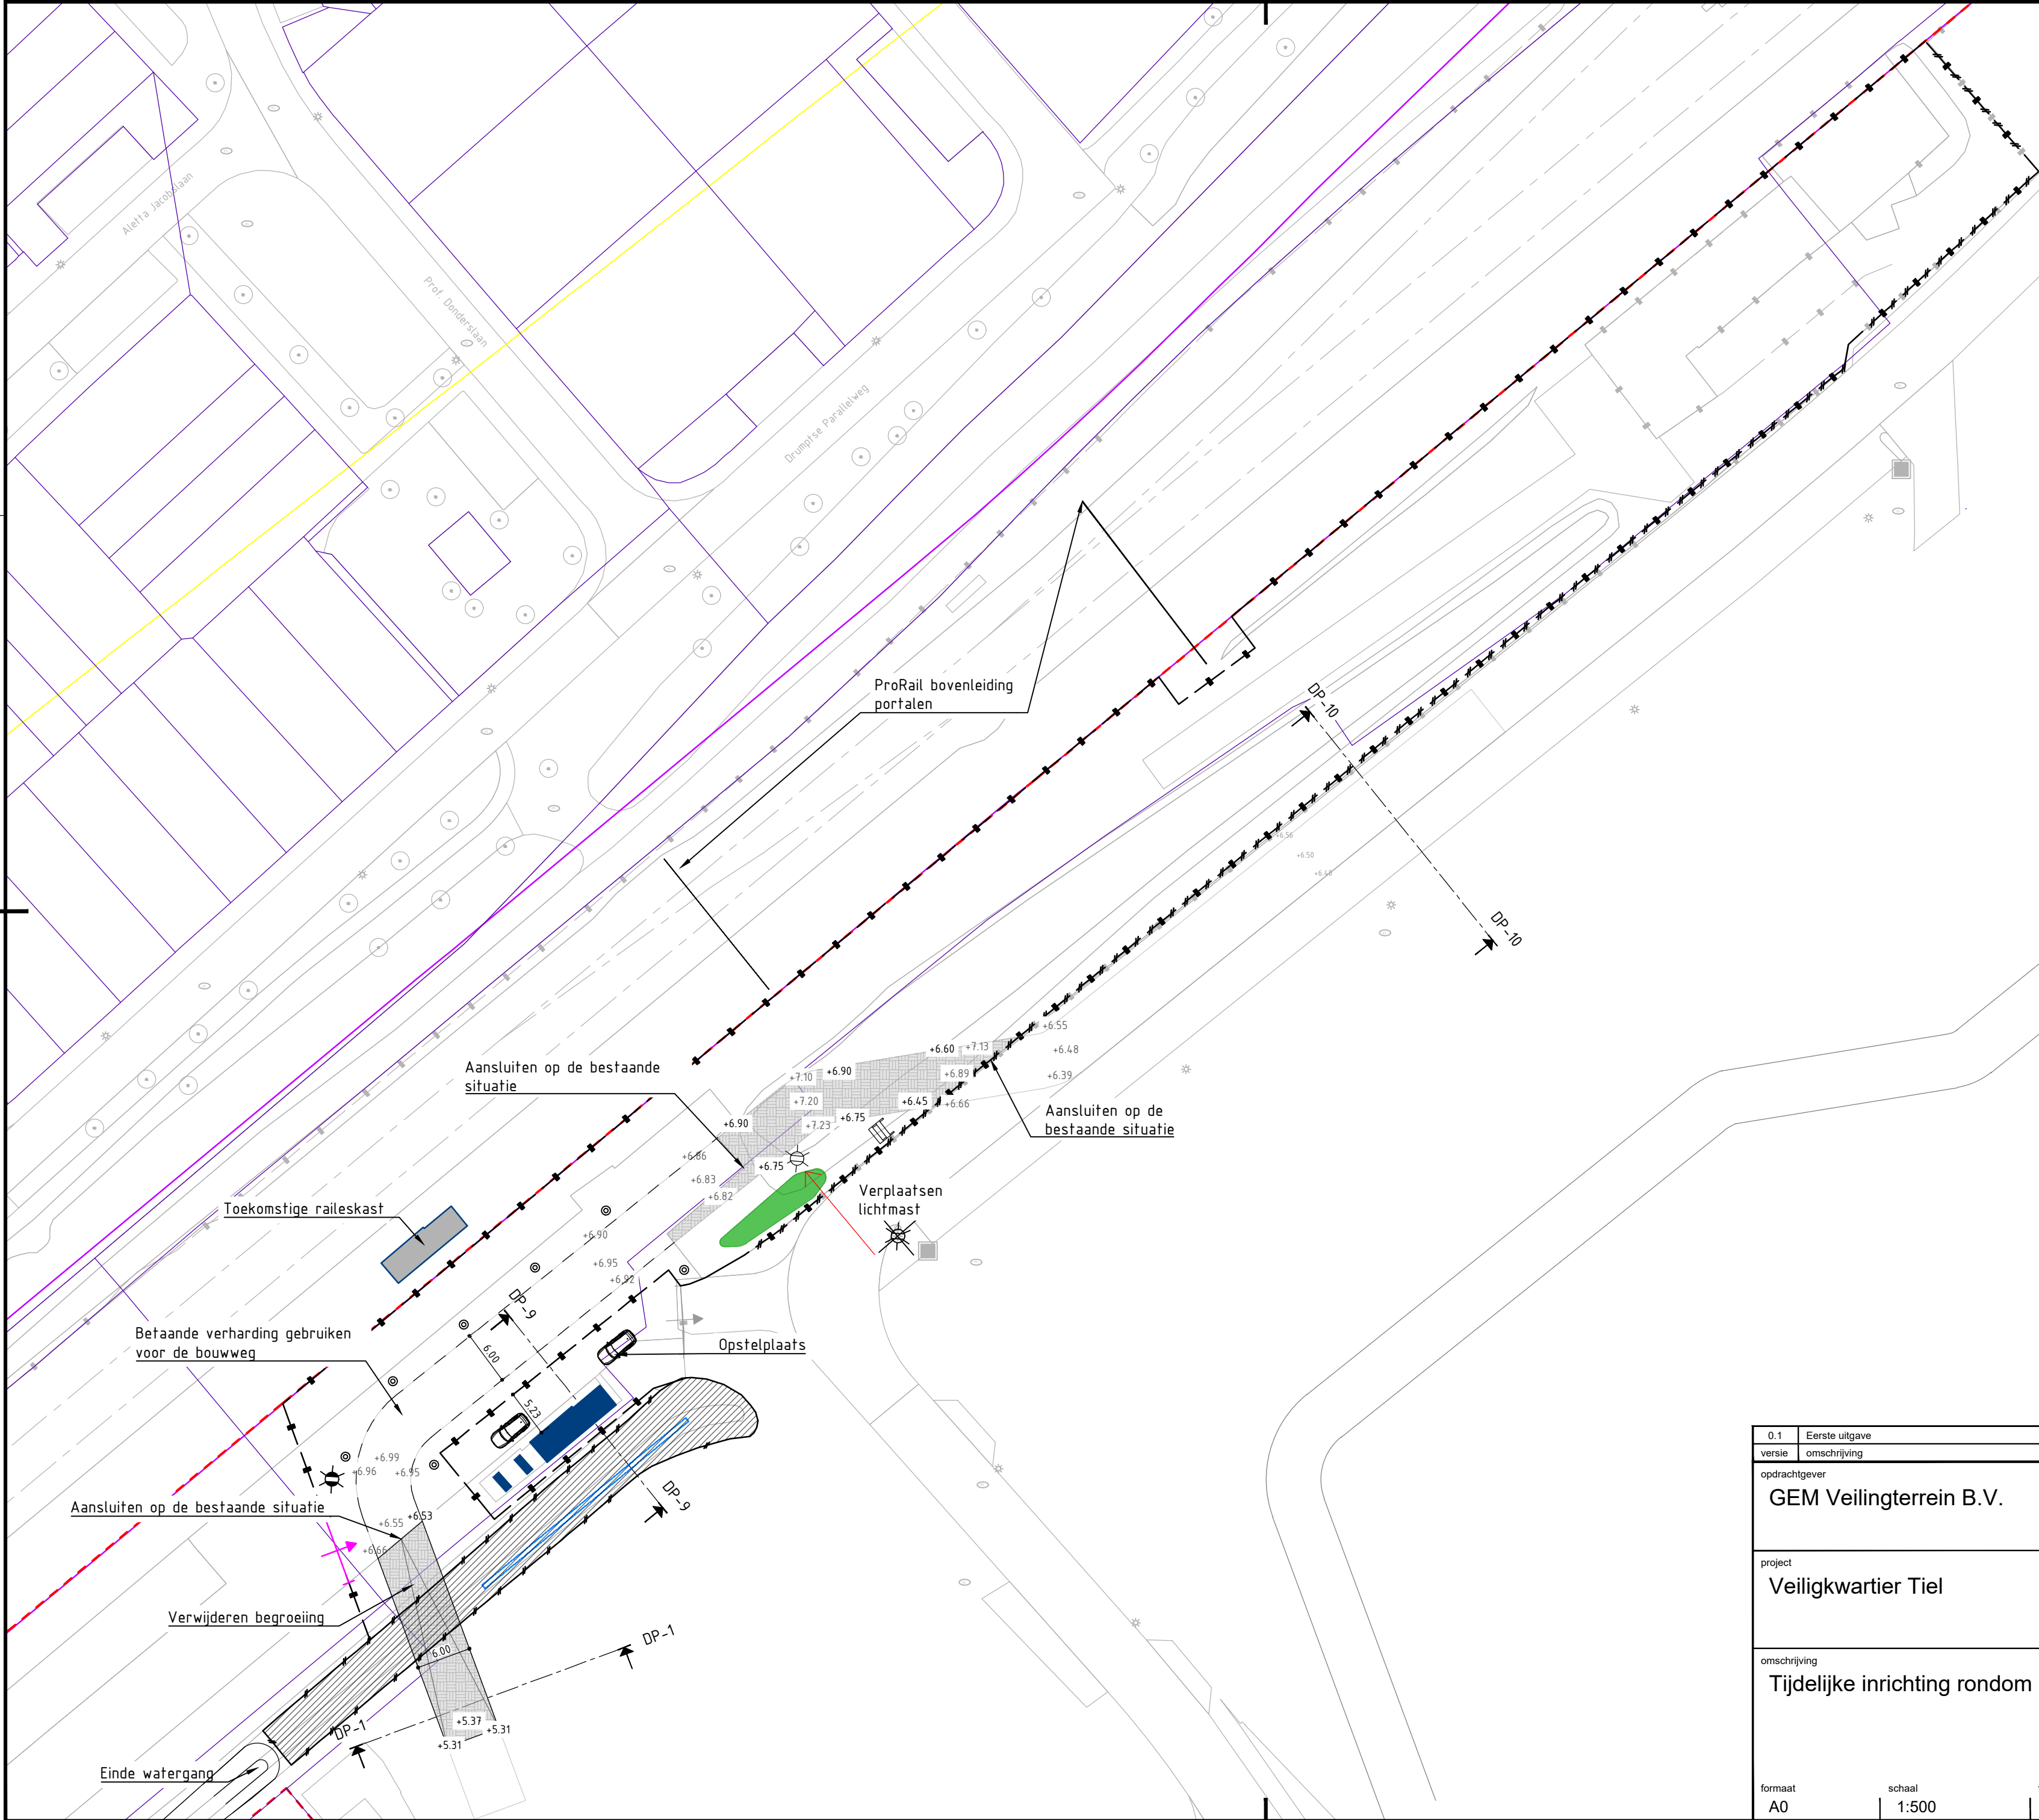

Legenda

Projectgrens

Beperkingsgrens hoofdspoorwegen
Prorail

Kadastrale grenzen
Per juli 2023

Raileskast
Bebouwing

Bouwweg
Vrijkomende befonstraatstenen KF, 5cm straatzand, 25cm menggranulaat,
50cm zand voor zandbed

Hekwerk poort
Bestaand

Leveren en aanbrengen poort
Draaiport, breedte 7,5m

Leveren en aanbrengen hekwerk (totaal 333m)
Hergebruik bestaand hekwerk (70m)
Leveren en aanbrengen hekwerk type Pallas rail security (263m)

Verwijderen bestaand hekwerk (235m)

Leveren en aanbrengen schrikhek
Type BB16-2

Dempen watergang

Greppel
Lengte 25m, diepte 0,25m, talud 1:1

Infiltratiegebied
45cm diep

Leveren en aanbrengen tijdelijke lichtmast
Sirius 8500, lengte 8m

Leveren en aanbrengen megablok
Type ME1684 160x80x40 cm

Wegmarkering tijdelijke bouwweg

Bestaande maaiveldhoogte

Nieuwe maaiveldhoogte

Aandachtspunt: Proefsleuven graven nabij Relaiskast

Schaal 1:500
0 5 10 15 20m

0.1	Eerste uitgave	M. Vos	J. van Oorsouw	H. van Dijk	11-01-2024
versie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
GEM Veilingterrein B.V.					
project			 Royal HaskoningDHV <i>Enhancing Society Together</i> HaskoningDHV Nederland B.V. Mobility & Infrastructure		
Veiligkwartier Tiel					
omschrijving					
Tijdelijke inrichting rondom Relaiskast			documentstatus		
			Definitief		
			documentversie		
			0.1		
formaat			projectnummer / tekeningnummer		
A0			BI5715-RHD-RZ-DG-C-440001		
schaal		fase	bladnr.	van	
1:500		Bestek	1	1	



Frame: B0805715 Tiel terrein Veilingterrein BI5715 Tiel terrein Datum: 2023-01-11 Versie: 0.1 Project: BI5715-RHD-RZ-DG-C-440001 Tegel: 1:500 Schaal: 1:500
