

**Checklist vlootschouw** (bijlage 9)  
versie 1 26-09-2024



**(geheel in te vullen door vertegenwoordiger opdrachtgever, tenzij anders vermeld)**

**Algemeen**

Steunpunt:

Datum vlootschouw:

Hoofdaannemer:

**Chauffeur**

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Naam:

Certificaat winterdiensttraining:

*CROW 283 Artikel 31.4*

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Transporteur:

Geldig tot:

**Tractie**

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Kenteken:

Strooier nummer RWS/kenteken:

Ploeg nummer RWS:

**Oplegger**

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Kenteken:

**Tags**

**Opmerkingen** (geconstateerde tekortkomingen, storingen of schade's)


Ploeg  
.....


Ploeg  
.....

Tractie  
.....

Tractie  
.....

Tractie  
.....

Tractie  
.....

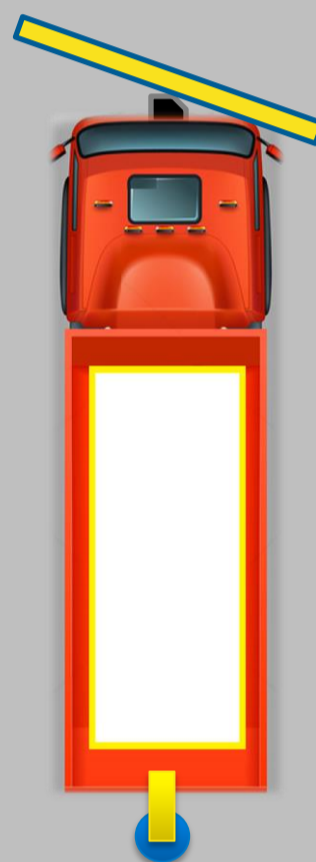

**Akties**


**Is de tractie geschikt voor de betreffende strooier en/of ploeg qua maatvoering** (in te vullen door RWS & monteur onderhoudsplichtige)

ja / nee

Naam monteur:

Naam vertegenw. RWS:

Handtekening vertegenw. RWS:

**Check door monteur leverancier**

Bevestiging / afstelling naafadapter incl aandrijving  
Hoogte afstelling strooiplaat

**akkoord?**  
ja / nee / n.v.t.  
ja / nee

**Voorbouw**

Type plaat  0-plaat (ploeg < 2.10m)  Cat. 1-600 (t/m 600kg)  
 Cat. 2-1200 (t/m 1200 kg)  Cat. 3-1800 (t/m 1800kg)

Hoogte bovenkant ploegbevestigingsplaat voldoet?  ja / nee

Borgbouten aanwezig  ja / nee

DIN-plaat beschermkap aanwezig  ja / nee / n.v.t.

**Controle strooimanagement**

(in te vullen door steunpuntcoördinator)


- 47 Strooier zichtbaar (SMS)
- 48 Ploeg -tags- zichtbaar (PasPoort)?
- 49 Tractie -tags- zichtbaar (PasPoort)?
- 50 Juiste route geprogrammeerd (Autologic)?

**werking ok?**

ja / nee
ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

**opmerking**


**Ook andere zijde invullen!!**



(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)

## Checklist vlootschouw (bijlage 9)

versie 1 26-09-2024

### Strooier

- 1 Lengte veiligheidsband onder strooier juist
- 2 Zijgeleiding juist afgesteld
- 3 Koppeling in de vangmuil
- 4 Middelen t.b.v. vastzetten strooier (kettingen/spanbanden)
- 6 Attentieverlichting (zwaai- en/of flitslicht)
- 7 Remlichten strooier
- 8 Richtingaanwijzer rechts
- 9 Richtingaanwijzer links
- 10 Alarmlichten (links + rechts)
- 11 Rode werkklamp strooiplaat
- 12 Bedieningskast aan/uit
- 13 Juiste instelling beschikbare dooimiddel? (fijn of grof zout)
- 14 Juiste instelling beschikbare natte component (NaCl of CaCl<sub>2</sub>)
- 15 Verstelling dosering
- 16 Verstelling strooibreedte
- 17 Verstelling strooi patroon
- 18 Leegdraaien
- 19 Strooier vol met natte component
- 20 Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!

#### werking ok?

ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

#### opmerking


### Ploeg

- 21 Stads-/dimlichten (werking en afstelling)
- 22 Heffen ploeg
- 23 Afstelling ploeg t.o.v. wegdek (wielen of drukontlasting) juist?
- 24 Zwenken ploeg
- 25 Werking inklappen ploeg
- 26 Werking breedte markeringslampen en aanwezigheid stokken
- 27 Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!
- 28 Hoogte slijtstrook voldoende? (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 29 Hoogte glijvloeden (bij 4.40 m -ploegen Aebi) (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 30 Indien barrièreploeg: hoogte wegdek - onderkant voorruit cabine min 2.25m (in beladen toestand)?

#### werking ok?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
..... cm
..... cm / n.v.t.
ja / nee

#### opmerking


### Tractie

- 31 Attentieverlichting (zwaai- en/of knipperlicht)
- 32 Akoestisch signaal werkt bij achteruitrijden
- 33 Massaslot voertuig
- 34 Vaste voeding t.b.v. bedieningskast aanwezig?

#### werking ok?

ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

#### opmerking


### Oplegger van toepassing?

- 35 Zijwanden max. 15 cm hoog
- 36 Lengte oplegger max. 7m
- 37 Verzwaring op koppelschotel
- 38 Verzwaring deugdelijk bevestigd?

#### werking ok?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

#### opmerking


### Frame van toepassing?

- 39 Chauffeur bekend met correcte werking en toepassing frame?
- 40 Technische beveiligingsmaatregelen aanwezig en correcte werking?
- 41 - bevestiging frame op tractie
- 42 - bevestiging strooier op tractie
- 43 Zijwanden frame max 15cm hoog (indien frame achterblijft op stnpnt)
- 44 Waarschuwingen, markeringen en stickers aanwezig?
- 45 Typeplaatje conform Machinerichtlijn aanwezig?
- 46 Typeplaatje volledig?  
(NAW firma, aanduiding, CE-markering, typeaanduiding, serienummer indien van toepassing, bouwjaar)

#### werking ok?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

#### opmerking


(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)
