

Opnameformulier installaties

ENERVISIE

Projectnummer: 024024
Datum: 04-07-2024

Contactgegevens:

Naam **Basisschool 't Warmelinck**
Adres **Kruisdijk 17**
Postcode / plaats **7122 JX Aalten (Ijzerlo)**
Telefoon **0543 - 466 213**
Contactpersoon **Jan van der Horst**
Telefoon **06 - 57883397**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x25 Amp.**
EAN-code aansluiting **871687120054824410**
Meternummer **E005204479879319**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Buitenkast bij entree**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	15	
Aantal krachtgroepen (16A)	1	
Aantal krachtgroepen (25A)	-	
Aantal reserve groepen	-	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☐ ja	☒ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☒ ja	☐ nee

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☒ ja	☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	3x32A (B-kar.)	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	63 stuks à 335 Wp	

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Bekabeling in buis boven verlaagd plafond**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?


Beschrijving: -

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

- ☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

Hoofdverdeelinrichting

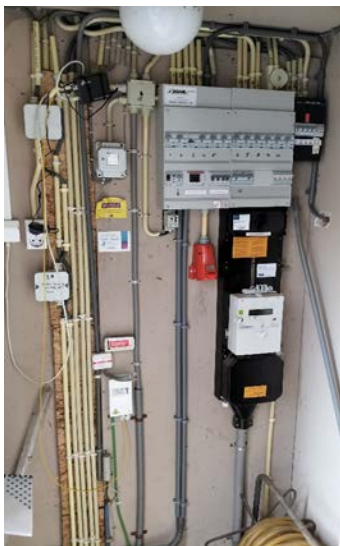

Onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Groepsruimten

Groepsruimte 0.31 L= *² mtr. *² zie tekening
 B= *² mtr.
 H= 2,833 / 3,97 mtr. (plafond schuin oplopend)

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 650 mm.

Groepsruimte 0.30 L= *² mtr. *² zie tekening
 B= *² mtr.
 H= 2,833 / 3,97 mtr. (plafond schuin oplopend)

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 650 mm.

Groepsruimte 0.14 L= *² mtr. *² zie tekening
 B= *² mtr.
 H= 2,8 / 3,95 mtr. (plafond schuin oplopend)

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 650 mm.

Groepsruimte 0.13 L= *² mtr. *² zie tekening
 B= *² mtr.
 H= 2,8 / 3,95 mtr. (plafond schuin oplopend)

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 650 mm.

Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☐ anders nl.:

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Buitenunits te plaatsen op de platte dakdelen

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar? ☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Valbeveiliging ter plaatse van lichtkoepels

Ingevuld door:

Naam G.H. Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 04-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:
