

COR/PREV - management rapportage 2024 – Februari

Auteur(s)
A.J.R Kuipers

Naam	Functie	Afdeling	Handtekening	Datum
A.J.R. Kuipers	Auteur	INFRA		

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Aandachtsgebieden	4
3	Maand rapportage Februari	5
3.1	Analyse CO	5
3.1.1	Aantal meldingen per maand	5
3.1.2	Tijdstip registratie & aanrijtijd	6
3.1.3	Recidive storingen RCA	6
3.2	Analyse PREV	7
3.2.1	Geplande PO's	7
3.2.2	Uitgevoerde PO's	7
3.2.3	Bijzonderheden	7

1 Inleiding

Dit document beschrijft het managementrapport op basis van correctief en preventief van de installaties aan BSGU-project (14 bruggen en sluis).

Dit rapport dient als vertrekpunt voor het opstarten van eventuele verbeter acties.

Het onderhoud wordt uitgevoerd in het projectverband van BSGU. Het doel van deze evaluatie is om op tactisch- en op operationeel niveau het onderhoud te kunnen verbeteren.

Het huidige preventieve onderhoudsplan is gebaseerd op de eisen set en project ervaringen van CWD (FMEA (Failure Mode & Effect Analyse)) met daaraan per faalmode een onderhoudsstrategie gekoppeld. De preventieve werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van geclusterde werkinstructies.

Storingen en calamiteiten worden in een storingsdatabase bijgehouden.

De storingsdatabase en aanvullende gesprekken met operationele medewerkers en de projectmanager, dienen als uitgangspunt bij het bepalen van eventuele verbeteracties.

2 Aandachtsgebieden

In de database (OMS) worden bij storingen /schades/ calamiteiten de volgende gegevens geregistreerd:

- Datum en tijd van melding van de storing;
- Datum en tijdstip van melding van de medewerker ter plaatse en datum/tijd waarop de storing is verholpen;
- Het systeem, subsysteem en component waarop de melding betrekking heeft;
- Omschrijving van storing;
- Omschrijving uitgevoerde werk;
- Mogelijke oorzaak van de storing.

Door middel van Pareto analyses op de bovenstaande gegevens wordt bepaald:

- Op welk (sub)systeem de meeste storingen voorkomen;
- Wat de trend in het aantal storingen is.

Vervolgens zal worden ingezoomd op die subsystemen met het grootste aandeel in de storingen en/of reparatiekosten.

Naast het correctieve onderhoud zal op basis van het uitgevoerde preventieve onderhoud ook worden gekeken naar verbeteringen op het gebied van het preventieve onderhoud o.a.:

- Verbeteringen in frequenties
- Verbeteringen in uitvoering.
- Verbeteringen in effectiviteit en efficiency.
- Verbeteringen in werkomschrijvingen/procedures.

3 Maand rapportage februari


3.1 Analyse COR

3.1.1 Aantal meldingen per maand

Om te kunnen bepalen of een trend waarneembaar is in het aantal meldingen per maand, wordt als onderdeel van deze rapportage een diagram/tabel toegevoegd.

- Uit de data valt het volgende te constateren:
- Totaal meldingen in februari 2024 : **4**
 - Contractueel afgehandeld (SLUIT) : -
 - Volledig afgeronde melding (ADMG) : -
 - Technisch afgeronde meldingen (TECHG) : 1
 - Meldingen in de WACHT : -
 - Meldingen nog in uitvoering (UITV) : 3
 - Melingen technisch gecontroleerd (TGC) : -

Er wordt een analyse gemaakt van het totaal aantal meldingen per object. Dit zal hieronder verder toegelicht worden.

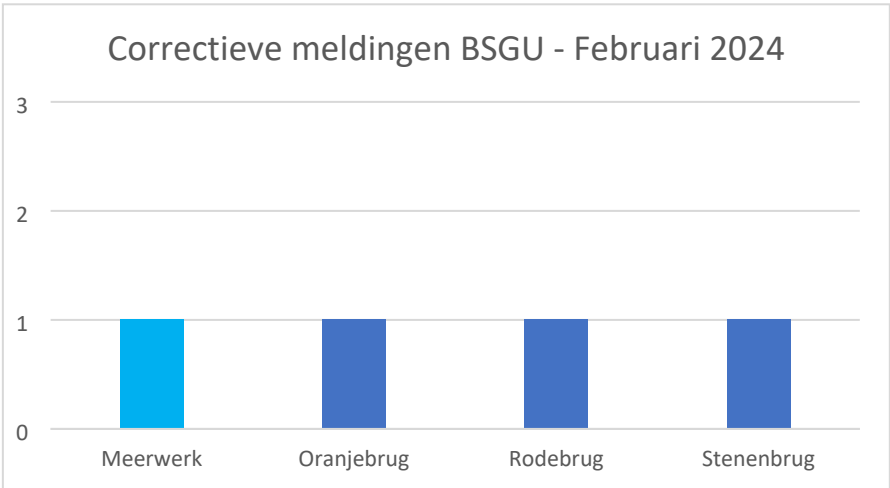

Uit de maand rapportage blijkt dat in februari 2024 een totaal van 4 meldingen zijn gemeld, intern dan wel extern. Voor het overzicht zijn alle meldingen bekeken.

Hieronder staan de storingen vermeld in een tabel:

Nr	Rapportdatum	Werkorder	Werkorder beschrijving	Locatie	Status
1	8-2-2024	2280276	Meerwerk: Assistentie draaien Nelson Mandelabrug	Meerwerk	INUITV
2	15-2-2024	2280781	storing oranjebrug camera 4	Oranjebrug	TECHG
3	9-2-2024	2280277	Storing: Rodebrug lampen afsluitboom 2	Rodebrug	INUITV
4	9-2-2024	2280278	storing: Stenenbrug kelderverlichting	Stenenbrug	INUITV

3.1.2 Tijdstip registratie & aanrijtijd

In de tabel hieronder worden de tijdstippen van de storingen weergegeven, waarin er een overzicht wordt gecreëerd van melding storing, monteur ter plaatste tot de functionele hersteltijd.

Datum	Werkorder	Werkorder beschrijving	Prioriteit	Tijdstip monteur ter plaatse	Functioneel herstel	Definitief hersteld	< 30 min?
15-02-24	2280781	storing oranjebrug camera 4		16-2-2024	16-2-2024	16-2-2024	14:31:00
09-02-24	2280277	Storing: Rodebrug lampen afsluitboom 2		16-02-24			> 7 dgn
09-02-24	2280278	storing: Stenenbrug kelderverlichting					

3.1.3 Recidive storingen RCA

In de maand zijn er geen recidive storingen (>2).

3.2 Analyse PREV

3.2.1 Geplande PO's

Uit de data valt het volgende te constateren:

• Totaal geplande meldingen in februari 2024	:	16
• Contractueel afgehandeld (SLUIT)	:	-
• Volledig afgeronde melding (ADMG)	:	-
• Technisch afgeronde meldingen (TECHG)	:	-
• Meldingen in de WACHT	:	-
• Meldingen nog in uitvoering (UITV)	:	16

Nr	Rapportdatum	Werkorder	Werkorder beschrijving	Locatie	Status
1	20-2-2024	2284704	Maandelijkse schouwronde A003	Zuiderbrug	INUITV
2	20-2-2024	2284665	Maandelijkse schouwronde A012	Meernbrug	INUITV
3	20-2-2024	2284671	Maandelijkse schouwronde A008	Balijsbrug	INUITV
4	20-2-2024	2284686	Maandelijkse schouwronde A004	Rode brug	INUITV
5	20-2-2024	2284668	Maandelijkse schouwronde A009	Nelsonmandelabrug	INUITV
6	20-2-2024	2284689	Maandelijkse schouwronde A011	Socratesbrug	INUITV
7	20-2-2024	2284698	Maandelijkse schouwronde A001	Vondelbrug	INUITV
8	20-2-2024	2284701	Maandelijkse schouwronde A014	Werkspoorhavenbrug	INUITV
9	20-2-2024	2284707	Maandelijkse schouwronde V001	Weerdsdijk	INUITV
10	20-2-2024	2284695	Maandelijkse schouwronde A006	Stenenbrug	INUITV
11	20-2-2024	2284710	Maandelijkse Schouwronde A015	Expediëbrug	INUITV
12	20-2-2024	2284692	Maandelijkse schouwronde A010	Spinozabrug	INUITV
13	20-2-2024	2284674	Maandelijkse schouwronde A005	David van Mollemabrug	INUITV
14	20-2-2024	2284680	Maandelijkse schouwronde A007	Liesboschbrug	INUITV
15	20-2-2024	2284683	Maandelijkse schouwronde A002	Oranjebrug	INUITV
16	20-2-2024	2284677	Maandelijkse schouwronde A013	Industriehavenbrug	INUITV

3.2.2 Uitgevoerde PO's

Alle preventieve WO's zijn...

3.2.3 Bijzonderheden
