


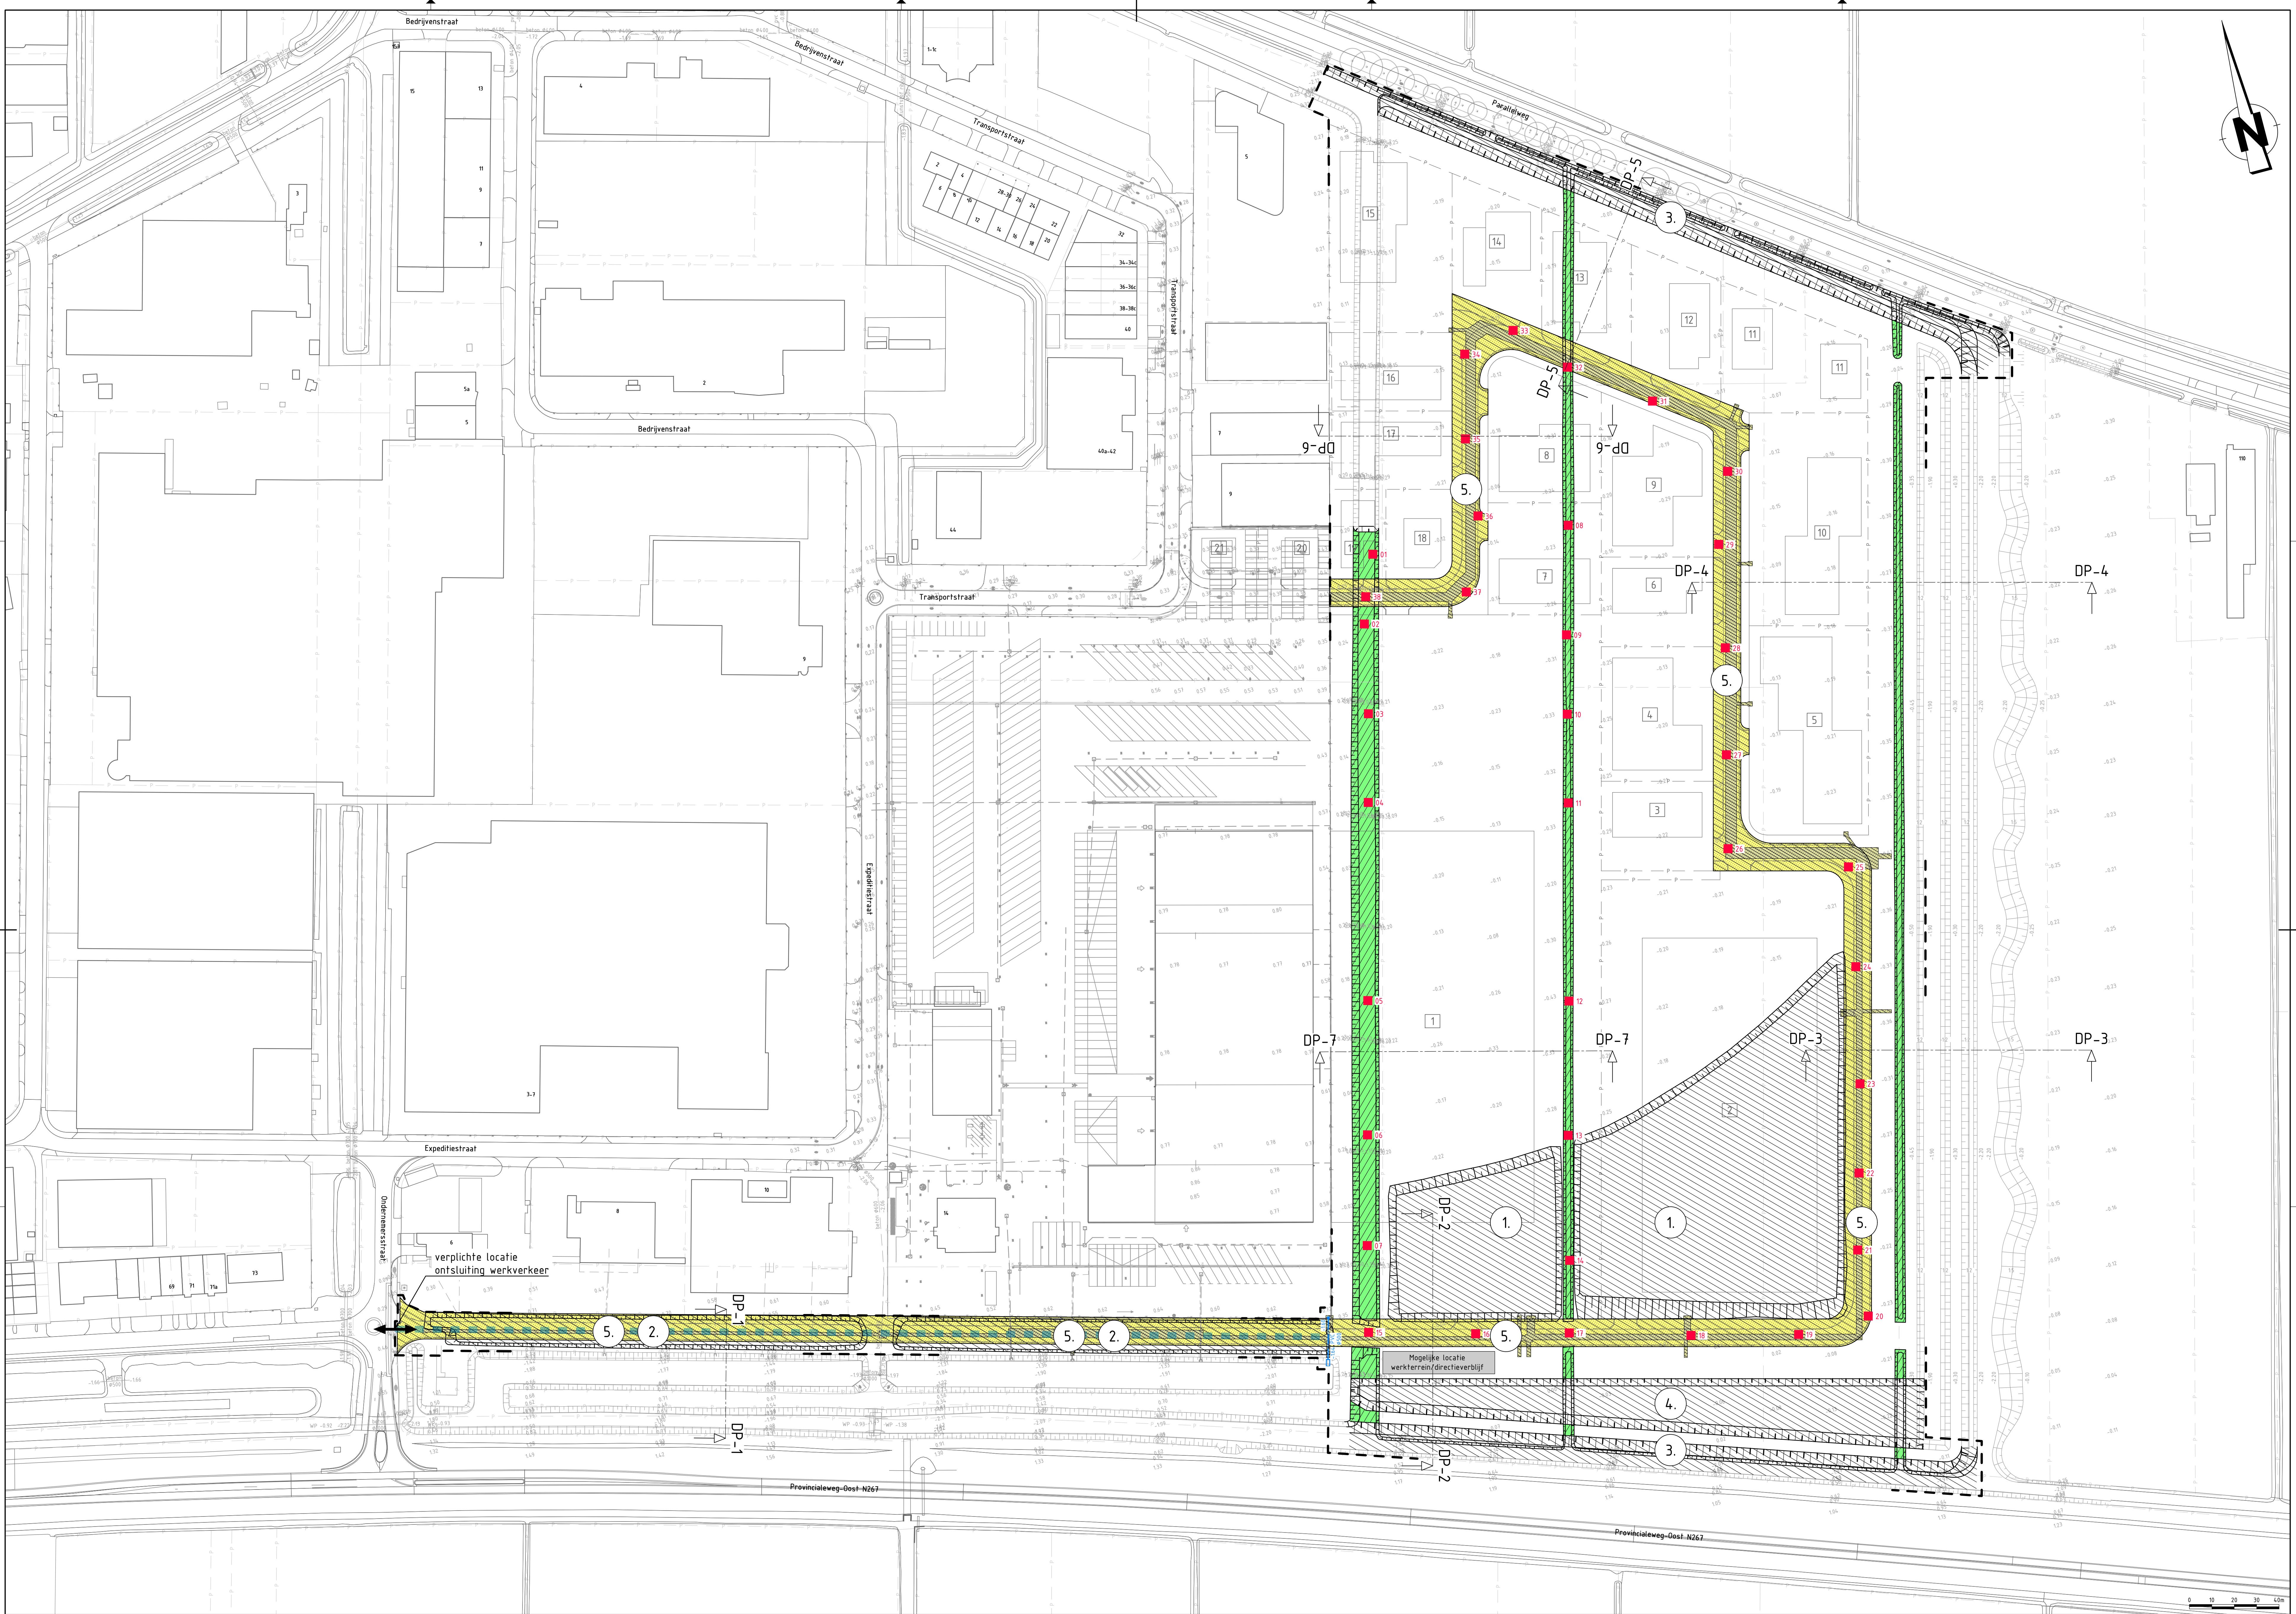


VERKLARING

- werkgrans
- huidelijke rijplatenbaan, geschikt voor dubbelspoor
- bestaande perceelsgrenzen
- bestaande bebouwing
- bestaande situatie
- kavelnummer
- bestaande hoogte in meters tov NAP
- aanbrengen zakbaak
- aanbrengen duker PVC Ø500 met bob in meters tov NAP, incl. inspectieput en uitstroombak
- dempen watergang met vrijgekomen klei uit dit werk tot bestaand maaiveld (ca. 8.785 m³)
- klei ontgraven uit depot, recent aangebrachte voorbelasting, tot -0.15 NAP (ca. 25.378 m³)
- klei ontgraven uit depot, bestaande voorbelasting (ca. 4.064 m³)
- klei ontgraven uit watergang (ca. 4.537 m³)

klei ontgraven uit waterberging (ca. 8.395 m³)

klei ontgraven uit cunet [-0.74 NAP, ca. 13.518 m³] en sleuf tot 30cm onderkant buis toekomstig riool (ca. 4.932 m³) en aanbrengen zand voor zandbed in sleuf (ca. 4.932 m³) en cunet tot bestaand maaiveld (ca. 13.518 m³) zie tekening 202207-RI-1 blad 1 t/m 4 voor bob toekomstig riool.

D-1	06-02-25	K. van Overbeek	Definitief versie 1
Revisie	Datum	Gepland door	Bevestiging
ROB Land van Heusden en Altena C.V.			
Uitbreiding SRBT Giessen			
FASE 1A - Ontgraven klei, dempen watergangen en aanbrengen zand voor zandbed in cunet en sleuf			
Getekend door K. van Overbeek 06-02-2025	Gecontroleerd door R. Koopmans 06-02-2025	Vrijgegeven door R. Koopmans 06-02-2025	Projectnummer 202207 Beleidsnummer ROB-2024-04
Formaat A0 - 84x1050mm		Status DEFINITIEF	
Blad 1 / 1		Versie 0-1	



Atab Civile Technik

Koopmansstraat 1A
4385 BG WOUDECHEN
T +31 (0)6-52 23 96 94
E v.van@atab.nl
