

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

De eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie conform NEN2990. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.

Opdrachtgever

Van Caam Asbestverwijdering en
Sloopwerken BV
Standdaarbuitensedijk 3
4730AA Oud-Gastel

Rapportnummer

MC11163_rev1

datum

26-04-2019

inspecteur

Martijn Caljouw

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk:

loods / kantoor

adres

Edisonlaan 15 Bergen op Zoom

aanvangstijd

11:45 uur

eindtijd

13:30 uur

inspectietijd onder asbestcondities

00:30 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	loods / kantoor bron 1	8,5 m ³ AC buis	CHR I n.v.t.	ja	10-15 / n.v.t.
2	loods / kantoor bron 2	2,25 m ³ AC buis	CHR I n.v.t.	ja	10-15 / n.v.t.
3	loods / kantoor bron 3	36 m ² verontreiniging	CHR I n.v.t.	ja	10-15 / n.v.t.
4	maaiveld bron 3	66 m ² stukjes vinyltegels	CHR I n.v.t.	ja	0,1-2 / n.v.t.

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,

n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

+/- : sporen asbest aantoonbaar, +: duidelijk asbest aangetroffen, ++: zeer veel asbest aangetroffen

Risicoklasse en meetprotocol

risicoklasse(n)

☐ 1

☒ 2

☐ 2A

Uitsluitingen

deel AC buis blijft achter

Disclaimer: Uitsluitingen zijn niet onderzocht en maken derhalve geen deel uit van deze inspectie.

Resultaten(samenvatting)

visuele inspectie

goedgekeurd

volledige eindcontrole ☐ ja

☒ nee: zie uitsluitingen

Rapportnummer

MC11163_rev1

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening:

Ondertekening opdrachtgever:



Martijn Caljouw

Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken BV

Rapportnummer

MC11163_rev1

Doel

De eindcontrole heeft tot doel vast te stellen of in het onderzochte object/terrein nog visueel waarneembare resten van de gesaneerde asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of het onderzochte object/terrein kan worden vrijgegeven voor het betreden zonder beschermende middelen. De eindcontrole heeft plaatsgevonden na het saneren van de asbesthoudende materialen.

Ingangscontrole

projectnummer opdrachtgever	20181543
inventarisatierapport aanwezig	ja
valide sloopmelding aanwezig	ja
werkplan aanwezig	ja
sanering uitgevoerd conform werkplan en/of inventarisatierapport	Ja ☒ Nee ☐ , reden:

weersgesteldheid	droog
aanvullingen en/of afwijkingen	transitroute gelopen onder begeleiding van DTA route niet afgezet en niet geïnspecteerd

Inspectiegebied

totale oppervlakte inspectiegebied	249 m ²
------------------------------------	--------------------

Optionele kleefmonsternamen

aantal genomen kleefmonsters	-- stuks
------------------------------	----------

Koppeling rapportage

☒ nee
☐ ja, namelijk aan rapportage(s) met kenmerk(en)

Rapportnummer

MC11163_rev1

Visueel geïnspecteerde onderdelen

Segmentatie	1
Plafond/ dak (constructie)	N
Kabelgoten/ doorvoeringen	N
Ventilatiekanalen	N
Buizen/ leidingwerk	+
Verwarmingselementen	N
Kozijnen	N
Plinten	N
Vloer	+2
Machines/installaties	N
Kruipruimte	N
Wanden/muren	+
Overige	N
Gereedschap/hulpmiddelen	N
(afval) transit-route	N
Vuile ruimte deco-unit	+
Aantal m2	249

Toelichting symbolen

toelichting keuze "overige": --

+ direct in orde bevonden
+2 in orde bevonden na schoonmaak

A afgekeurd vanwege aantreffen van asbestrestanten
Z afgekeurd wegens andere reden (zie opmerkingen)
N niet aanwezig en/of niet onderzocht

Rapportnummer

MC11163_rev1

Resultaten

Visuele inspectie

- ☒ goedgekeurd de onderzochte ruimte(n) voldoen **wel** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990
☐ afgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **niet** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990

Additionele monsteranalyse

- ☐ goedgekeurd: zie bijlage
☐ afgekeurd: zie bijlage
☒ niet van toepassing

Gegevens over de gevolgde inspectieprocedure en bijhorende prestatiekenmerken kunnen bij Flamant Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden wordt in digitale vorm 7 jaar bewaard. Eventuele monsters worden 2 maanden bewaard. Niets uit deze rapportage mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Flamant Laboratory BV. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditaat 1189.

Opmerkingen/notities

Op het originele inventarisatierapport is een aanvulling gekomen. Zowel in de aanvulling als in het origineel wordt bron 3 gebruikt. De bronnen 3 vermeld in dit rapport zijn dus twee verschillende bronnen.

Dit is een eerste revisie op rapport met kenmerk MC11163 d.d. 26 april 2019, welke hiermee is komen te vervallen. Deze revisie is gemaakt op 30 april 2019. Na controle op verzoek van de opdrachtgever is gebleken dat de inspecteur een vergissing heeft gemaakt bij het invullen van **de tabel met gesaneerde asbesthoudende toepassingen op het certificaat**. Hier was bij **de hoeveelheid / materiaal** van **toepassing 2** ingevuld ' 2,25 m² AC buis, maar dit moet **2,25 m³ AC buis**' zijn. Middels dit rapport is deze ommissie – in samenspraak met de inspecteur – aangepast.


Bijlagen

Geen

Rapportnummer

MC11163_rev1

Edisonlaan

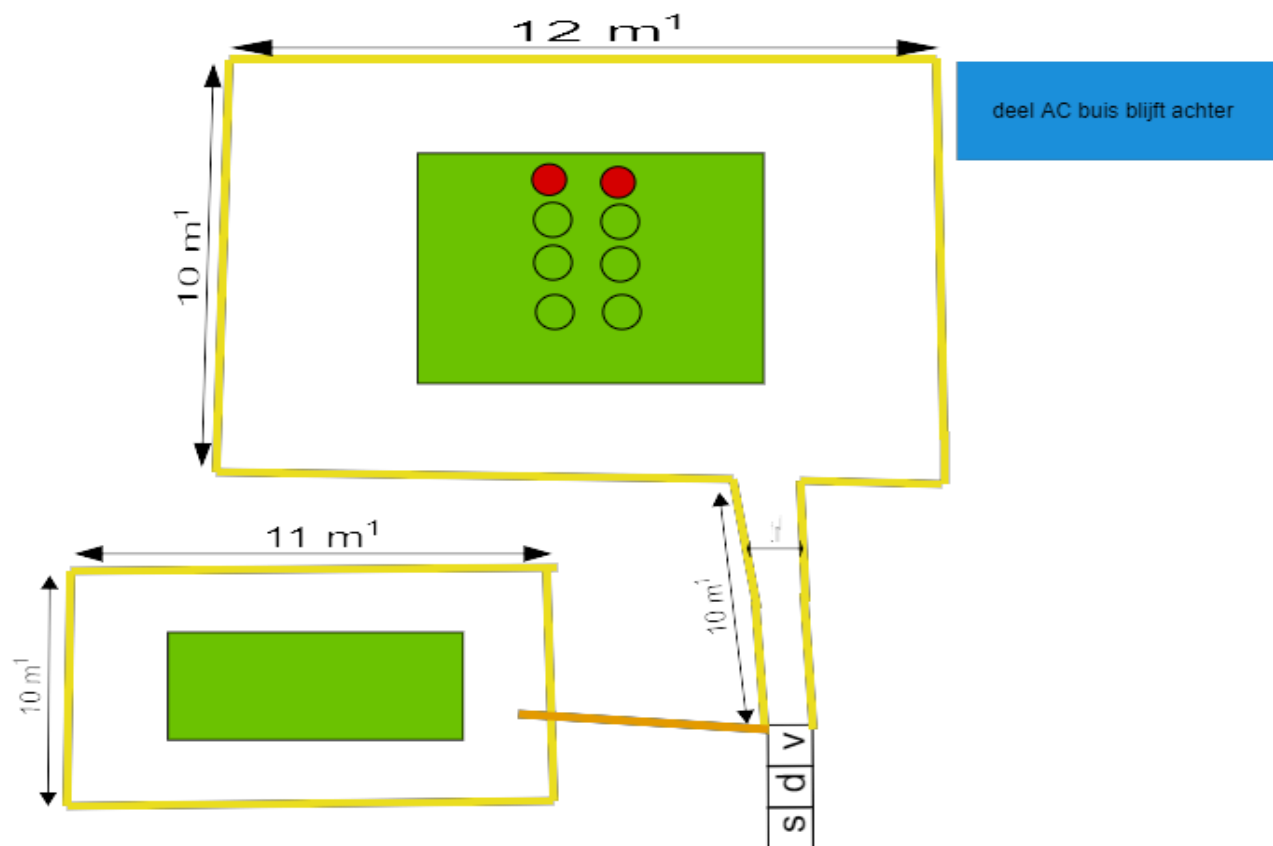

tekening is indicatief
en niet op schaal

luchtpomp:		gesaneerd:		afzetlint:	
kleefmonster:		uitsluitingen:		metrage:	
containment:		asbest:		segmentatie:	
deco-unit:		onderdruk:		transitroute:	

Rapportnummer

MC11163_rev1



toelichting foto: vooraanzicht



toelichting foto: deco-unit



toelichting foto: aanlooproute



toelichting foto: vloer van inspectiegebied en plek waar bron 3 is verwijderd

Rapportnummer

MC11163_rev1



toelichting foto: vloer van inspectiegebied en plek waar bron 3 is verwijderd



toelichting foto: vloer van inspectiegebied



toelichting foto: vloer van inspectiegebied



toelichting foto: plek waar bron 1 en 2 zijn verwijderd

Rapportnummer

MC11163_rev1



toelichting foto: stuk AC buis blijft achter (gecoat tijdens inspectie)



toelichting foto: stuk AC buis blijft achter (gecoat tijdens inspectie)



toelichting foto: plek waar bron 1 en 2 zijn verwijderd



toelichting foto: vooraanzicht

Rapportnummer

MC11163_rev1



toelichting foto: plek waar stukjes vinyltegels verwijderd zijn



toelichting foto: plek waar stukjes vinyltegels verwijderd zijn



toelichting foto: plek waar stukjes vinyltegels verwijderd zijn



toelichting foto: plek waar stukjes vinyltegels verwijderd zijn
