


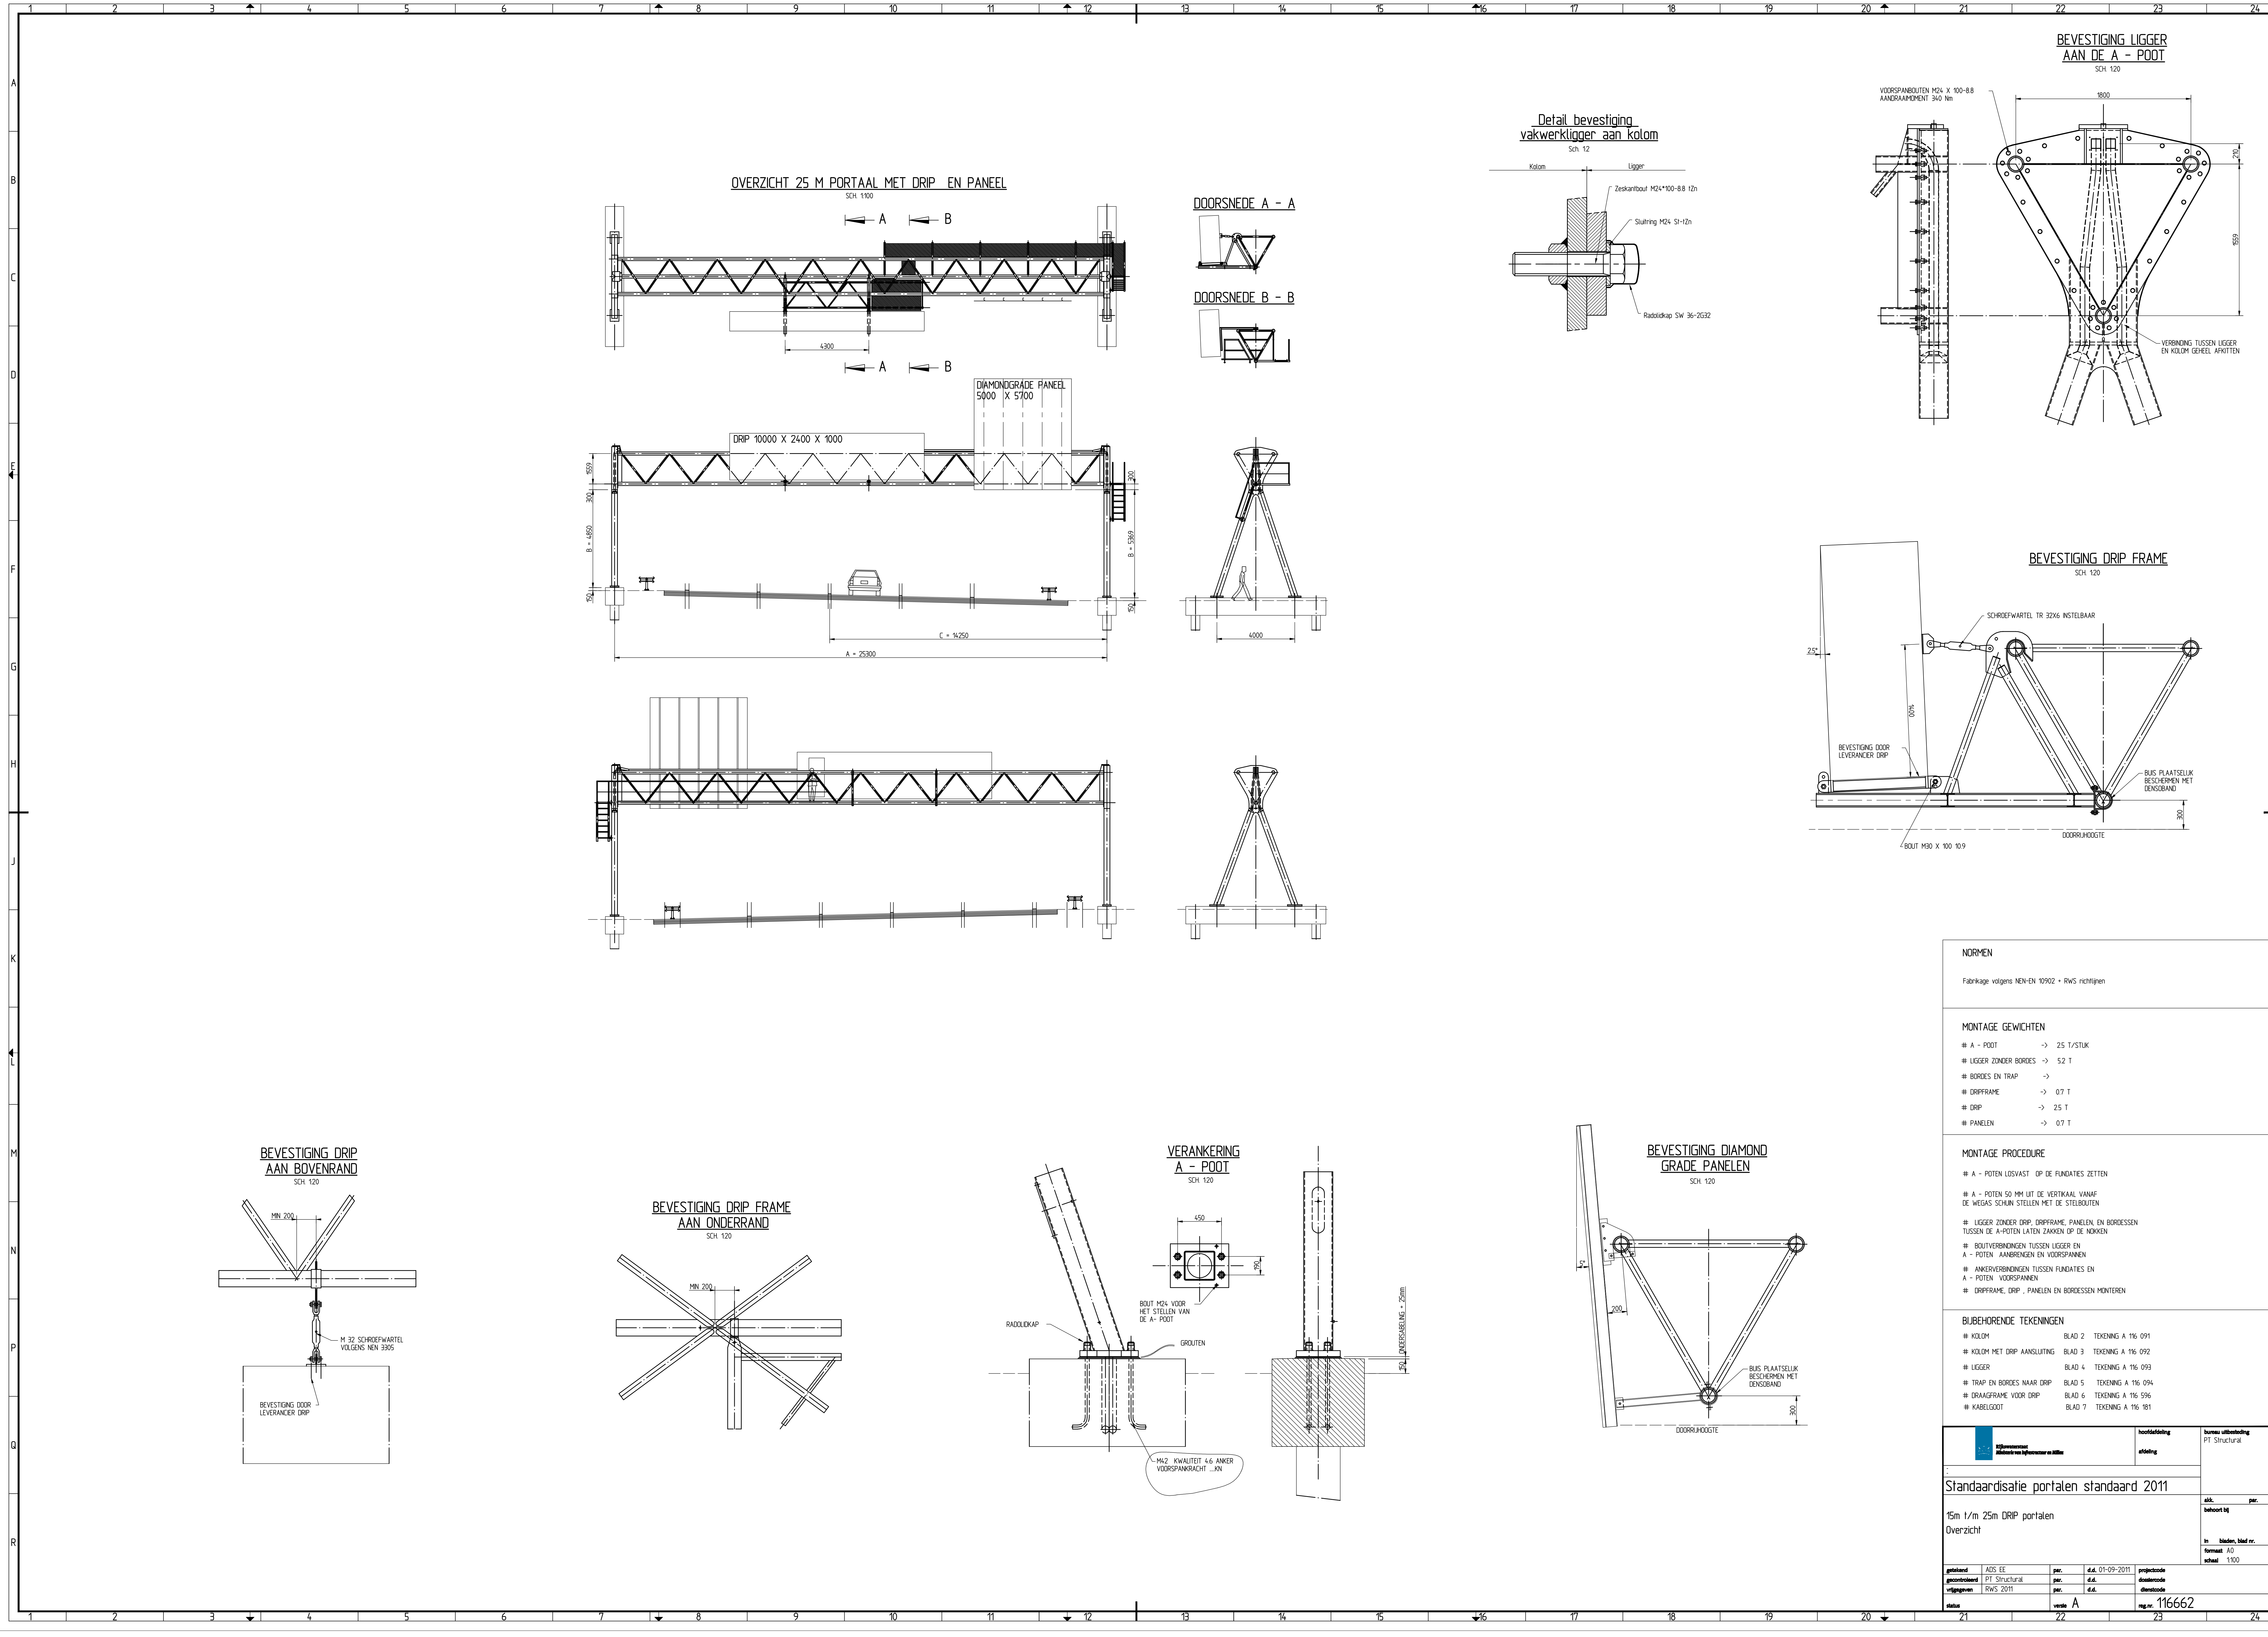

NORMEN			
Fabrikage volgens NEN-EN 10902 + RWS richtlijnen			
MONTAGE GEWICHTEN			
# A - POOT	->	25 T/STUK	
# LIGGER ZONDER BORDES	->	52 T	
# BORDES EN TRAP	->		
# DRIPFRAME	->	0,7 T	
# DRIP	->	25 T	
# PANELEN	->	0,7 T	
MONTAGE PROCEDURE			
# A - POTEN LOSMAK. OP DE FUNDATIES ZETTEN			
# A - POTEN 50 MM UIT DE VERTICAAL VANAF DE WEGAS SCHUIN STELLEN MET DE STELBOUTEN			
# LIGGER ZONDER DRIP, DRIPFRAME, PANELEN EN BORDESSEN TUSSEN DE A-POTEN LATEN ZAKKEN OP DE NOKKEN			
# BOUTVERBINDINGEN TUSSEN LIGGER EN A - POTEN AANREKENEN EN VOORSPANNEN			
# ANKERVERBINDINGEN TUSSEN FUNDATIES EN A - POTEN VOORSPANNEN			
# DRIPFRAME, DRIP, PANELEN EN BORDESSEN MONTEREN			
BIJBEHOORENDE TEKENINGEN			
# KOLM	BLAD 2	TEKENING A 116 091	
# KOLM MET GRP AANSLUITING	BLAD 3	TEKENING A 116 092	
# LIGGER	BLAD 4	TEKENING A 116 093	
# TRAP EN BORDES NAAR DRIP	BLAD 5	TEKENING A 116 094	
# DRAAGFRAME VOOR DRIP	BLAD 6	TEKENING A 116 096	
# KABELGOOT	BLAD 7	TEKENING A 116 181	
Standaardisatie portalen standaard 2011		hoofdafdeling	bureau uitbesteding
15m 1/m 25m DRIP portalen		afdeling	PT Structuraal
Overzicht		alc.	per.
		behoort bij	
		in	bladen, blad nr.
		formaat	A0
		schaal	1:100
getekend	ADS EE	per.	d.d. 01-09-2011
gecontroleerd	PT Structuraal	per.	d.d.
verigevaren	RWS 2011	per.	d.d.
status		versie	A
		reg.nr.	116662
