


Plan van aanpak detectie voor grondwerkzaamheden opdrachtnemer

Stap 1 (voor aanvang opdrachtnemer sporthal en dus tkn): alle significante verstoringen benaderen (zowel machinaal als handmatig) buiten de PFAS-spot en direct het deel van de PFAS-spot buiten het oorspronkelijke projectgebied inmeten door middel van Non-realtimedetectie (zie onderstaande afbeelding). Om deze detectie te kunnen uitvoeren is het van belang dat de aanwezige stoep wordt verwijderd om een optimaal detectieresultaat te realiseren.

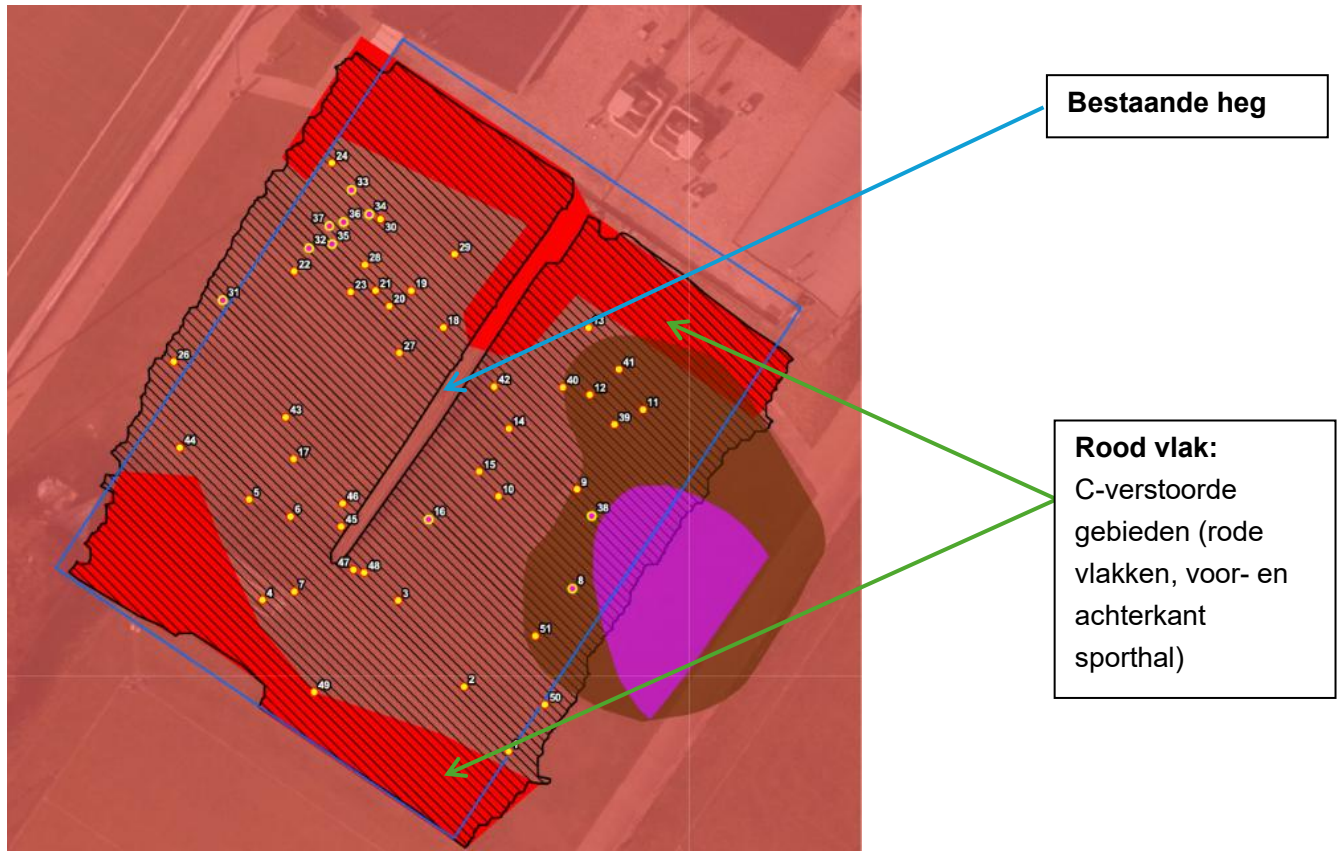


Stap 2 (voor aanvang opdrachtnemer sporthal en dus tkn): Het benaderen van de significante verstoringen binnen de PFAS-spot met behulp van kraan en gecertificeerde machinist van de aannemer. Dan kunnen we mogelijk direct de eventuele benaderwerkzaamheden van het nog te detecteren gebied meenemen.

Stap 3 (voor werkzaamheden opdrachtnemer): ter plaatse van de bestaande heg is nog geen detectie uitgevoerd. Dit gebied en de C-verstoorte gebieden (rode vlakken, voor- en achterkant sporthal) adviseren wij om deze te onderzoeken wanneer de bouwkuip ten behoeve van de nieuwbouw wordt ontgraven. Mogelijk zou het resultaat van het benaderen van de significante verstoring nog kunnen leiden tot een afschaling van het uit te voeren onderzoek maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen.

Daar waar het geen heg en/of rood vlak betreft, kan er zonder begeleiding van Euroradar afgegraven worden.

Betontegels

De betontegels en tribune op onderstaande foto (in paars gemarkeerd) worden door de opdrachtgever voor de start van de bouwwerkzaamheden verwijderd. Voor de oplevering van de sporthal dient de opdrachtnemer het tegelpad opnieuw aan te brengen met de betontegels die langs de rand van het pad gelegd. Gebroken tegels dienen vervangen te worden. Kosten voor het terugbrengen van het pad dient onderdeel te zijn van de aanbieding. Opdrachtgever zorgt voor vervangende tegel, daar waar gebruiken voor start aanbrengen pad.

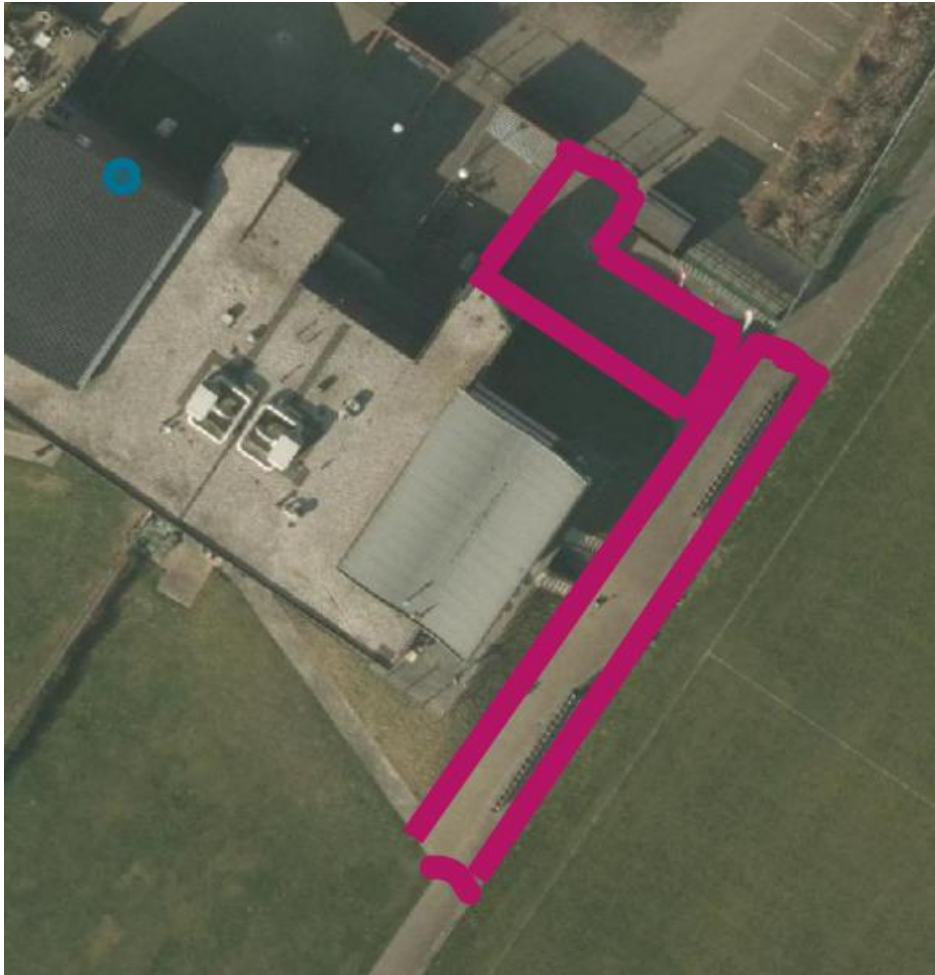

In paars het door de opdrachtnemer terug te brengen pad.



Afbeelding pad oude situatie
