

## Bijlage Technische Omschrijving

Voor de units zijn 3 verschillende uitvoeringen samengesteld.

### Unit conform uitvoering 1:

4 ruimten, bestaande uit kantoor, kantine, sanitaire ruimte en kleedruimte:

- kantine voorzien van keukenblok, koelkast met boven- en onderkast kasten met mengkraan en 10 liter elektrische boiler;
- sanitaire ruimte voorzien van 1 doucheruimte;
- 2 wandtoiletten voorzien van toilet en fontein;
- doucheruimte voorzien van voorzien van 50 liter elektrische boiler en deur voorzien van lange hoge spiegel;
- lijst met 3 kledinghaken;
- kleedruimte voorzien van wastrog met 2 mengkranen.
  
- leveren en aanbrengen benodigde fundatie;
- groepenkast/meterkast met tussenmeter elektra en water;
- isolatiewaarden met een gemiddelde Rc waarde van 2,5 – 3 m<sup>2</sup>K/W;
- kunststof of aluminium kozijnen, ramen en deuren met minimaal dubbel glas en daar waar nodig voorzien van veiligheidsglas;
- zonwering (screens) rondom van binnenuit bedienbaar;
- de binnenwanden zijn naadloos en voorzien van een stootvaste en afwasbare wandafwerking kleur wit;
- plafond van Fermacell o.g. kleur wit;
- cementgebonden vloerplaat o.g. (stevig en stabiel);
- Droogloopmat grijs gemêleerd ter plaatse van entree deur;
- marmoleum kwaliteit C, 2,5 mm dik, kleur n.t.b.;
- kleurstelling buitenzijde antraciet (RAL7016, o.g.);
- prefab opstap met rooster buiten tpv entree deur.
  
- elektrische installatie conform NEN1010;
- LED-verlichting;
- noodverlichtingsinstallatie;
- verwarmingsinstallatie (gasloos) in kantoor, kantine, kleedruimte (alternatief meerprijs airco aanbieden);
- per functionele ruimte een deugdelijke Co2 meter aan te brengen;
- mechanische afzuiging toiletten;
- koud- en warmwater installatie;
- 4 dubbele wcd per functionele ruimte;
- Buitenlamp met schemerschakelaar.

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor:

- Het bouwrijp maken van de grond waarop de tijdelijke huisvesting wordt geplaatst. De grond zal obstakelvrij worden afgewerkt;
- Het aanvragen van nutsvoorzieningen, echter de geselecteerde partij dient tijdig de noodzakelijke vermogen door te geven;

## Uitvoering 1



## Unit conform uitvoering 2:


3 ruimten, bestaande uit kantoor, kantine en sanitaire ruimte:

- kantine voorzien van keukenblok, koelkast met boven- en onderkast kasten met mengkraan en 10 liter elektrische boiler;
- sanitaire ruimte voorzien van 1 doucheruimte;
- 2 wandtoiletten voorzien van toilet en fontein;
- doucheruimte voorzien van voorzien van 50 liter elektrische boiler en deur voorzien van lange hoge spiegel;
- lijst met 3 kledinghaken.
  
- leveren en aanbrengen benodigde fundatie;
- groepenkast/meterkast met tussenmeter elektra en water;
- isolatiewaarden met een gemiddelde Rc waarde van 2,5 – 3 m<sup>2</sup>K/W;
- kunststof of aluminium kozijnen, ramen en deuren met minimaal dubbel glas en daar waar nodig voorzien van veiligheidsglas;
- zonwering (screens) rondom van binnenuit bedienbaar;
- de binnenwanden zijn naadloos en voorzien van een stootvaste en afwasbare wandafwerking kleur wit;
- plafond van Fermacell o.g. kleur wit;
- cementgebonden vloerplaat o.g. (stevig en stabiel);
- Droogloopmat grijs gemêleerd ter plaatse van entree deur;
- marmoleum kwaliteit C, 2,5 mm dik, kleur n.t.b.;
- kleurstelling buitenzijde antraciet (RAL7016, o.g.);
- prefab opstap met rooster buiten tpv entree deur.
  
- elektrische installatie conform NEN1010;
- LED-verlichting;
- noodverlichtingsinstallatie;
- verwarmingsinstallatie (gasloos) in kantoor, kantine, kleedruimte (alternatief meerprijs airco aanbieden);
- per functionele ruimte een deugdelijke Co2 meter aan te brengen;
- mechanische afzuiging toiletten;
- koud- en warmwater installatie;
- 4 dubbele wcd per functionele ruimte;
- Buitenlamp met schemerschakelaar.

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor:

- Het bouwrijp maken van de grond waarop de tijdelijke huisvesting worden geplaatst. De grond zal obstakelvrij worden afgewerkt;
- Het aanvragen van nutsvoorzieningen, echter de geselecteerde partij dient tijdig de noodzakelijke vermogen door te geven;

## Uitvoering 2

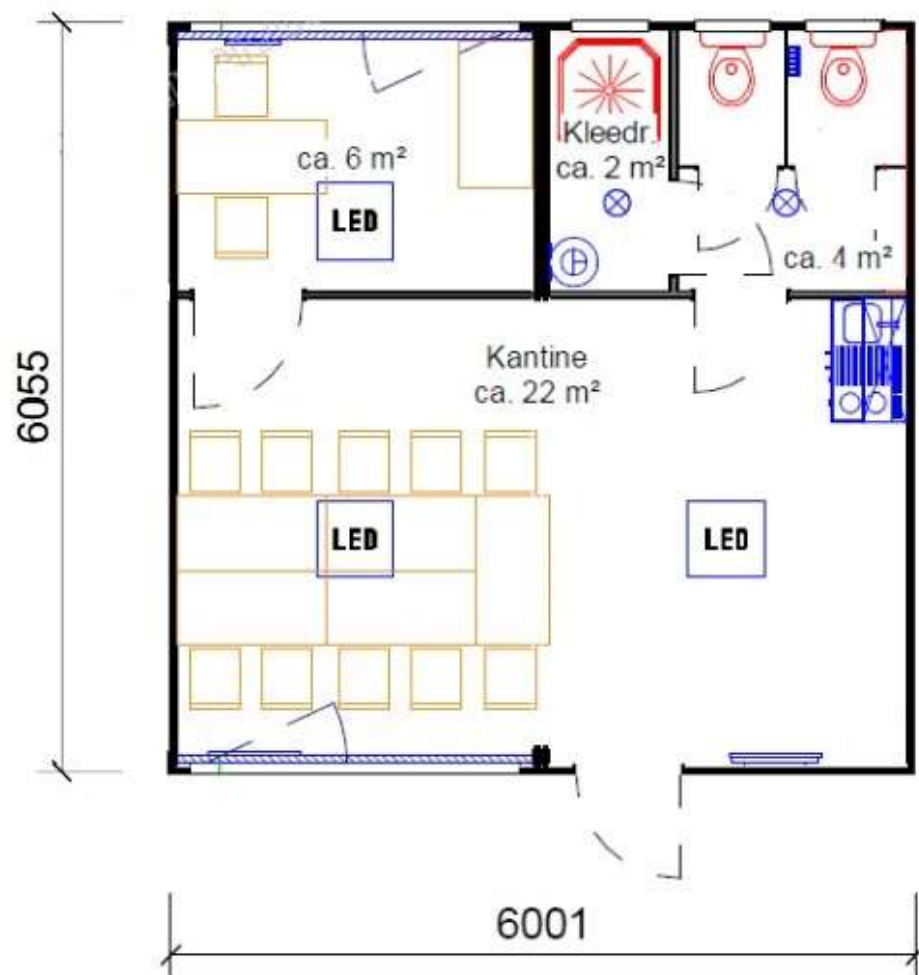

### Unit conform uitvoering 3:

4 ruimten bestaande uit kantoor, kantine, sanitaire ruimte en kleedruimte:

- kantine voorzien van keukenblok, koelkast met boven- en onderkast kasten met mengkraan en 10 liter elektrische boiler;
- sanitaire ruimte voorzien van 1 doucheruimte;
- 2 wandtoiletten voorzien van toilet en fontein;
- doucheruimte voorzien van voorzien van 50 liter elektrische boiler en deur voorzien van lange hoge spiegel;
- lijst met 3 kledinghaken;
- kleedruimte voorzien van wastrog met met 2 mengkranen.
  
- leveren en aanbrengen benodigde fundatie;
- groepenkast/meterkast met tussenmeter elektra en water;
- isolatiewaarden met een gemiddelde Rc waarde van 2,5 – 3 m<sup>2</sup>K/W;
- kunststof of aluminium kozijnen, ramen en deuren met minimaal dubbel glas en daar waar nodig voorzien van veiligheidsglas;
- zonwering (screens) rondom van binnenuit bedienbaar;
- de binnenwanden zijn naadloos en voorzien van een stootvaste en afwasbare wandafwerking kleur wit;
- plafond van Fermacell o.g. kleur wit;
- cementgebonden vloerplaat o.g. (stevig en stabiel);
- Droogloopmat grijs gemêleerd ter plaatse van entree deur;
- marmoleum kwaliteit C, 2,5 mm dik, kleur n.t.b.;
- kleurstelling buitenzijde antraciet (RAL7016, o.g.);
- prefab opstap met rooster buiten tpv entree deur.
  
- elektrische installatie conform NEN1010;
- LED-verlichting;
- noodverlichtingsinstallatie;
- verwarmingsinstallatie (gasloos) in kantoor, kantine, kleedruimte (alternatief meerprijs airco aanbieden);
- per functionele ruimte een deugdelijke Co2 meter aan te brengen;
- mechanische afzuiging toiletten;
- koud- en warmwater installatie;
- 4 dubbele wcd per functionele ruimte;
- Buitenlamp met schemerschakelaar.

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor:

- Het bouwrijp maken van de grond waarop de tijdelijke huisvesting worden geplaatst. De grond zal obstakelvrij worden afgewerkt;
- Het aanvragen van nutsvoorzieningen, echter de geselecteerde partij dient tijdig de noodzakelijke vermogen door te geven;

### Uitvoering 3

