Versiedatum: 12 maart 2020

# Globale Uitvoeringsplanning Renovatie Achter Sint Pieter 200
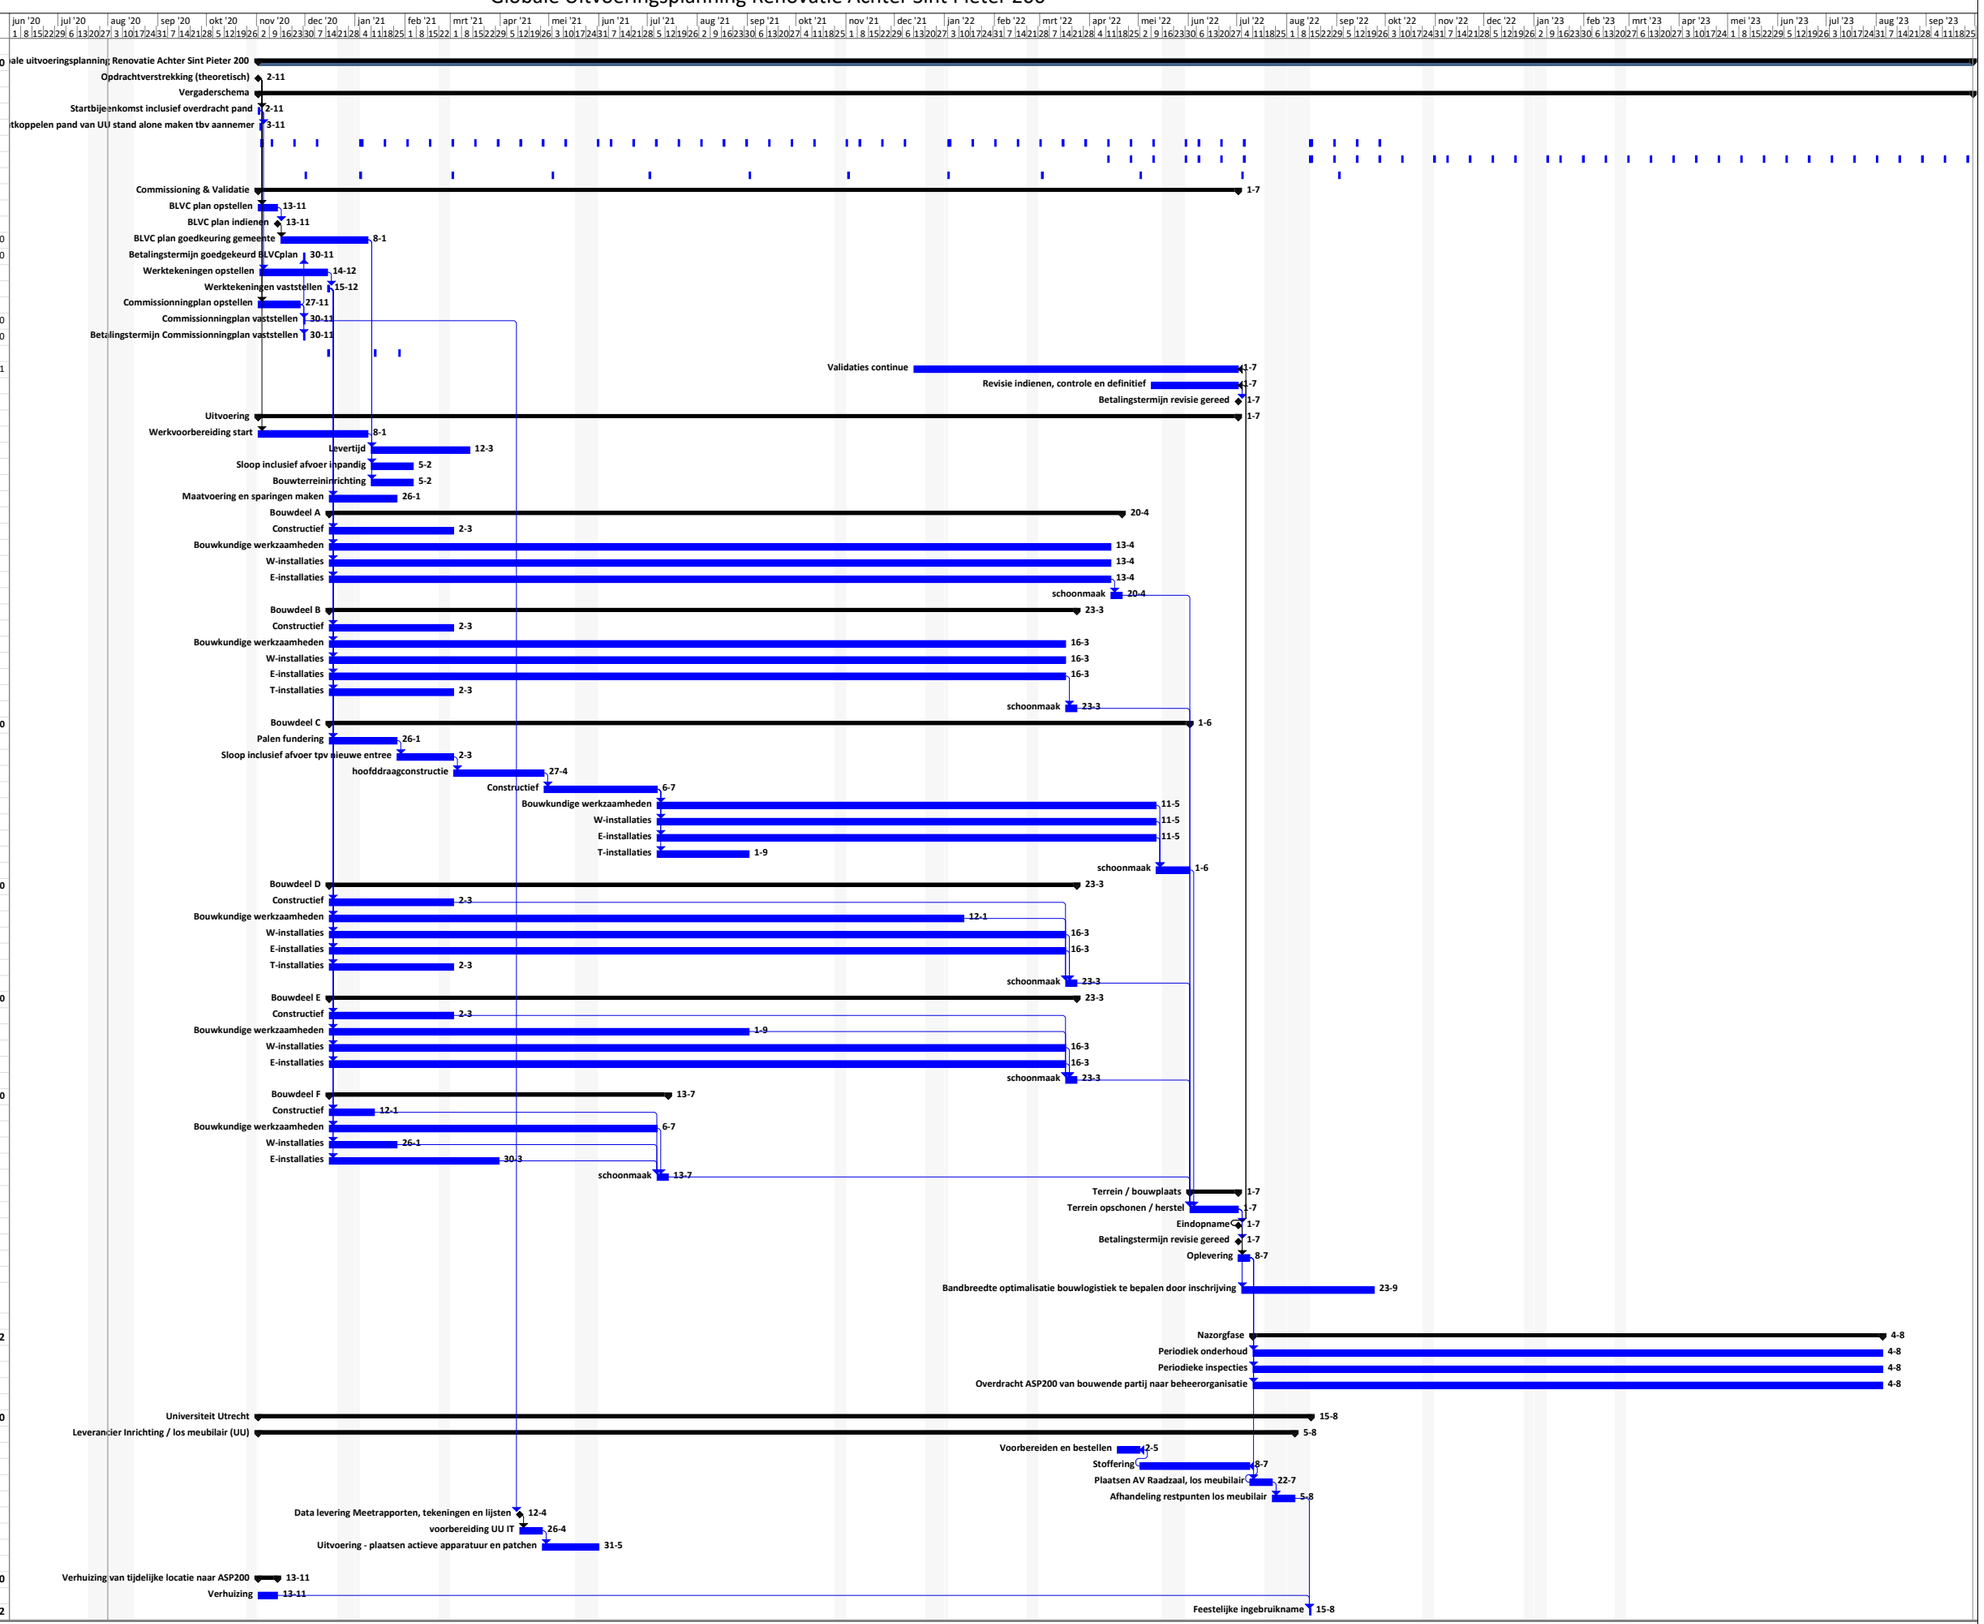
| Id | Taaknaam | Duur | Begindatum |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | **Globale uitvoeringsplanning Renovatie Achter Sint Pieter 200** | **664 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 3 | **Opdrachtverstrekking (theoretisch)** | **0 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 4 | **Vergaderschema** | **664 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 5 | Startbijeenkomst inclusief overdracht pand | 1 dag | maa 2-11-20 |
| 6 | Ontkoppelen pand van UU stand alone maken tbv aannemer | 1 dag | din 3-11-20 |
| 7 | **Bouwvergadering** | **419 dagen** | **woe 4-11-20** |
| 176 | **Comissioningsteambijeenkomsten** | **662 dagen** | **woe 4-11-20** |
| 216 | **Bewonersbijeenkomsten** | **383 dagen** | **din 1-12-20** |
| 229 | **Commissioning & Validatie** | **379 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 230 | BLVC plan opstellen | 2 wkn | maa 2-11-20 |
| 231 | BLVC plan indienen | 0 dagen | vri 13-11-20 |
| 232 | BLVC plan goedkeuring gemeente | 6 wkn | maa 16-11-20 |
| 233 | Betalingstermijn goedgekeurd BLVCplan | 1 dag | maa 30-11-20 |
| 234 | Werktekeningen opstellen | 6 wkn | din 3-11-20 |
| 235 | Werktekeningen vaststellen | 1 dag | din 15-12-20 |
| 236 | Commissionningplan opstellen | 4 wkn | maa 2-11-20 |
| 237 | Commissionningplan vaststellen | 1 dag | maa 30-11-20 |
| 238 | Betalingstermijn Commissionningplan vaststellen | 1 dag | maa 30-11-20 |
| 239 | **Bemonstering Bouwkunde 3 sessies** | **23 dagen** | **din 15-12-20** |
| 243 | Validaties continue | 6 mndn | maa 13-12-21 |
| 244 | Revisie indienen, controle en definitief | 6 wkn | maa 9-5-22 |
| 245 | Betalingstermijn revisie gereed | 0 dagen | vri 1-7-22 |
| 246 | **Uitvoering** | **379 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 247 | Werkvoorbereiding start | 2 mndn | maa 2-11-20 |
| 248 | Levertijd | 2 mndn | maa 11-1-21 |
| 249 | Sloop inclusief afvoer inpandig | 1 mnd | maa 11-1-21 |
| 250 | Bouwterreininrichting | 1 mnd | maa 11-1-21 |
| 251 | Maatvoering en sparingen maken | 1 mnd | woe 16-12-20 |
| 252 | **Bouwdeel A** | **305 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 253 | Constructief | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 254 | Bouwkundige werkzaamheden | 15 mndn | woe 16-12-20 |
| 255 | W-installaties | 15 mndn | woe 16-12-20 |
| 256 | E-installaties | 15 mndn | woe 16-12-20 |
| 257 | schoonmaak | 1 wk | don 14-4-22 |
| 258 | **Bouwdeel B** | **285 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 259 | Constructief | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 260 | Bouwkundige werkzaamheden | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 261 | W-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 262 | E-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 263 | T-installaties | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 264 | schoonmaak | 1 wk | don 17-3-22 |
| 265 | **Bouwdeel C** | **325 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 266 | Palen fundering | 1 mnd | woe 16-12-20 |
| 267 | Sloop inclusief afvoer tpv nieuwe entree | 1 mnd | woe 27-1-21 |
| 268 | hoofddraagconstructie | 2 mndn | woe 3-3-21 |
| 269 | Constructief | 2 mndn | woe 28-4-21 |
| 270 | Bouwkundige werkzaamheden | 10 mndn | woe 7-7-21 |
| 271 | W-installaties | 10 mndn | woe 7-7-21 |
| 272 | E-installaties | 10 mndn | woe 7-7-21 |
| 273 | T-installaties | 2 mndn | woe 7-7-21 |
| 274 | schoonmaak | 1 wk | don 12-5-22 |
| 275 | **Bouwdeel D** | **285 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 276 | Constructief | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 277 | Bouwkundige werkzaamheden | 12 mndn | woe 16-12-20 |
| 278 | W-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 279 | E-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 280 | T-installaties | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 281 | schoonmaak | 1 wk | don 17-3-22 |
| 282 | **Bouwdeel E** | **285 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 283 | Constructief | 2 mndn | woe 16-12-20 |
| 284 | Bouwkundige werkzaamheden | 8 mndn | woe 16-12-20 |
| 285 | W-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 286 | E-installaties | 14 mndn | woe 16-12-20 |
| 287 | schoonmaak | 1 wk | don 17-3-22 |
| 288 | **Bouwdeel F** | **125 dagen** | **woe 16-12-20** |
| 289 | Constructief | 2 wkn | woe 16-12-20 |
| 290 | Bouwkundige werkzaamheden | 6 mndn | woe 16-12-20 |
| 291 | W-installaties | 1 mnd | woe 16-12-20 |
| 292 | E-installaties | 3 mndn | woe 16-12-20 |
| 293 | schoonmaak | 1 wk | woe 7-7-21 |
| 294 | **Terrein / bouwplaats** | **22 dagen** | **woe 1-6-22** |
| 295 | Terrein opschonen / herstel | 1 vmnd | woe 1-6-22 |
| 296 | **Eindopname** | **0 dagen** | **vri 1-7-22** |
| 297 | Betalingstermijn revisie gereed | 0 dagen | vri 1-7-22 |
| 298 | **Oplevering** | **7 vdagen** | **vri 1-7-22** |
| 299 | | | |
| 300 | **Bandbreedte optimalisatie bouwlogistiek te bepalen door inschrijving** | **2 mndn** | **maa 4-7-22** |
| 301 | | | |
| 302 | **Nazorgfase** | **240 dagen** | **maa 11-7-22** |
| 303 | Periodiek onderhoud | 12 mndn | maa 11-7-22 |
| 304 | Periodieke inspecties | 12 mndn | maa 11-7-22 |
| 305 | Overdracht ASP200 van bouwende partij naar beheerorganisatie | 12 mndn | maa 11-7-22 |
| 306 | | | |
| 307 | **Universiteit Utrecht** | **390 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 308 | **Leverancier Inrichting / los meubilair (UU)** | **389 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 309 | Voorbereiden en bestellen | 2 wkn | maa 18-4-22 |
| 310 | Stoffering | 2 mndn | maa 2-5-22 |
| 311 | Plaatsen AV Raadzaal, los meubilair | 2 vwkn | vri 8-7-22 |
| 312 | Afhandeling restpunten los meubilair | 2 vwkn | vri 22-7-22 |
| 313 | Data levering Meetrapporten, tekeningen en lijsten | 0 dagen | maa 12-4-21 |
| 314 | voorbereiding UU IT | 2 wkn | din 13-4-21 |
| 315 | Uitvoering - plaatsen actieve apparatuur en patchen | 3 wkn | din 27-4-21 |
| 316 | | | |
| 317 | **Verhuizing van tijdelijke locatie naar ASP200** | **10 dagen** | **maa 2-11-20** |
| 318 | Verhuizing | 2 wkn | maa 2-11-20 |
| 319 | **Feestelijke ingebruikname** | **1 dag** | **maa 15-8-22** |
