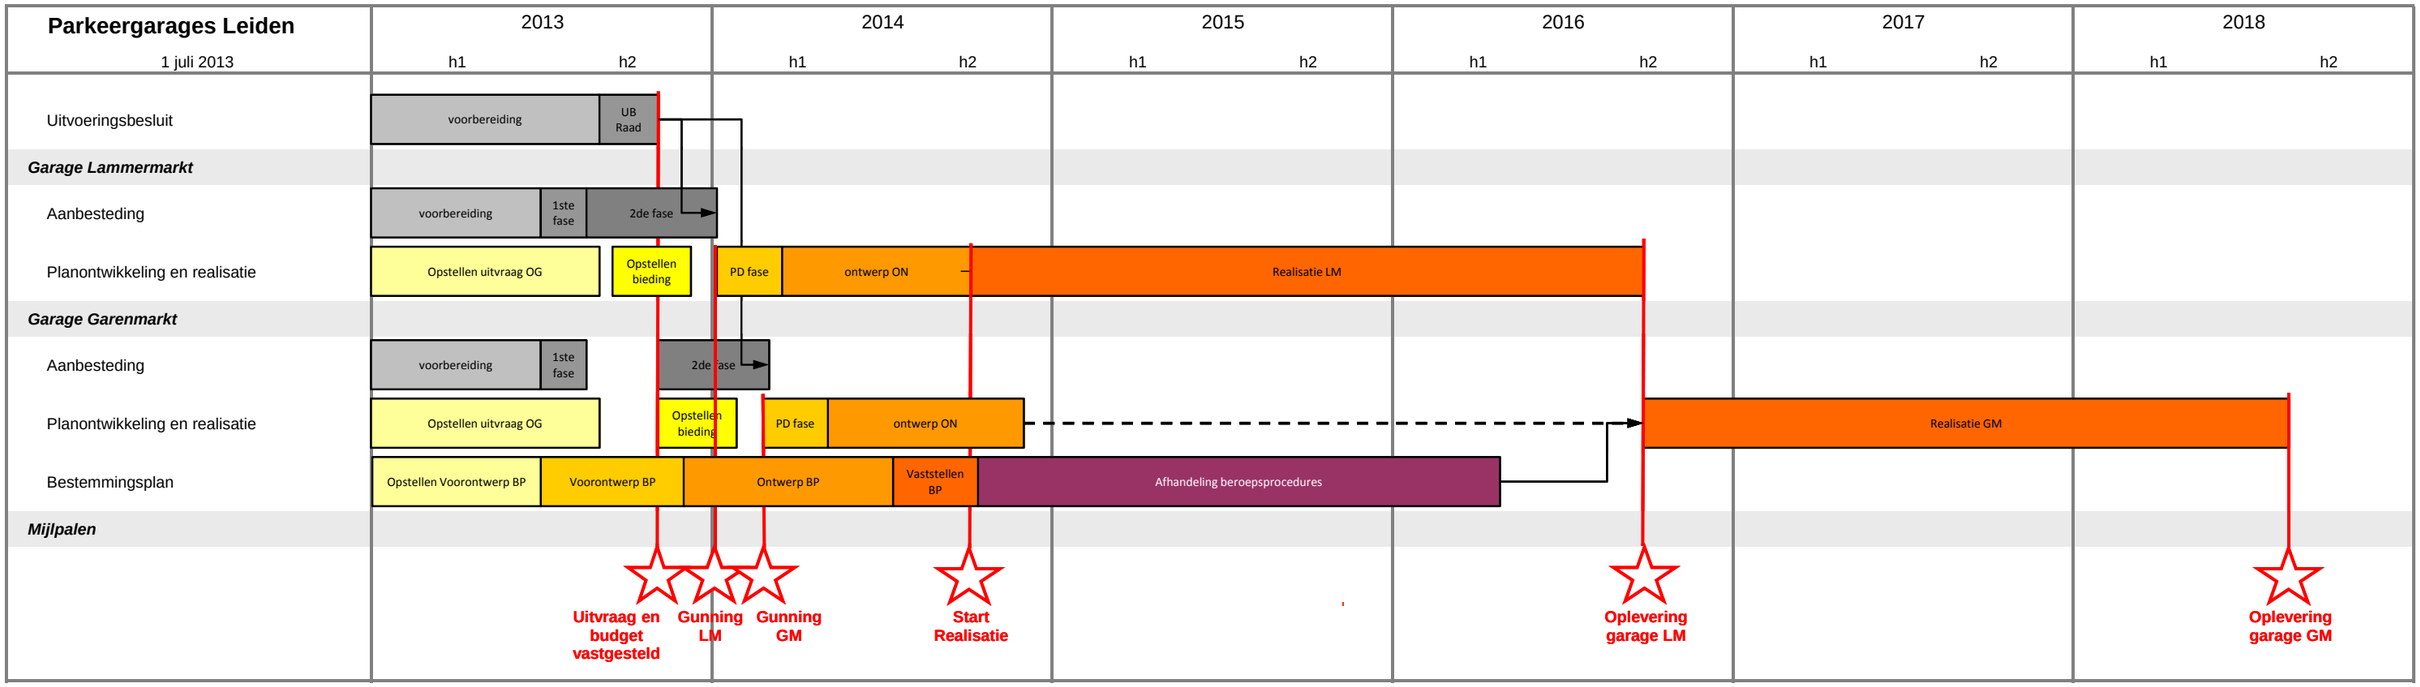

Toelichting		
Uitvoeringsbesluit	9 september 2013 worden alle stukken ambtelijk aangeleverd voor besluitvorming Uitvoeringsbesluit Raad (UB).	[Aanvraag uitvoeringskrediet, instemmen aanbestedingsleidraad (gunningscriteria) & DBM- contracten LM en GM]
Gezamenlijke voorbereiding aanbesteding	Selectiefase aanbesteding DBM-contracten LM en GM worden gezamenlijk doorlopen.	1ste fase (selectie) start met publicatie 2 juli 2013
Garage Lammermarkt		
	De 2de fase van de aanbesteding LM (inschrijvingsfase) start na collegebehandeling stukken UB.	2de fase aanbesteding LM start 24 september 2013 en eindigt 7 januari 2014 met voornemen tot gunning.
		Na Alcatelperiode is op 27 januari 2014 sprake van definitieve gunning.
		19 maart 2014, 10 weken na voorlopige gunning, wordt de PD-fase / verificatiefase afgerond en start de ontwerpfase uit het DBM contract.
	Start realisatie garage LM zo spoedig mogelijk na 3 oktoberfestiviteiten 2014.	7 oktober 2014, 29 weken na einde verificatiefase kan gestart worden met realisatie pgarage (aanname).
	Garage LM wordt voor voorbereidingen 3 oktoberfestiviteiten 2016 opgeleverd.	Aangenomen wordt dat de garage binnen 2 jaar kan worden gerealiseerd.
Garage Garenmarkt		
	De 2de fase van de aanbesteding GM (inschrijvingsfase) start na Raadsbesluit UB.	2de fase aanbesteding GM start 12 november 2013 en eindigt 25 februari 2014 met voornemen tot gunning.
		Na Alcatelperiode is op 17 maart 2014 sprake van definitieve gunning.
		7 mei 2014, 10 weken na voorlopige gunning, wordt de PD-fase / verificatiefase afgerond en start de ontwerpfase uit het DBM contract.
	Voorontwerp BP Garenmarkt wordt voor zomerreces 2013 vrijgegeven voor inspraak.	De inspraakperiode voor het voorontwerp eindigt eind augustus. Aan de raad zal een inspraaknotitie op hoofdlijnen worden aangeboden.
		Het ontwerp BP zal vlak na het UB (november 2013) door het college worden vrijgegeven voor zienswijzen.
		In verband met de verkiezingsperiode, zal het bestemmingsplan na het zomerreces 2014 worden vastgesteld door de gemeenteraad.
		Naar verwachting zal het BP voor de GM voor de zomer 2016 onherroepelijk worden (1,5 jaar afhandeling beroepschriften)
	Start realisatie garage GM zo spoedig mogelijk na 3 oktoberfestiviteiten 2016.	Voor 3 oktober 2016 zal de garage LM worden opgeleverd. De garage GM zal direct na 3 oktober worden gerealiseerd.
	Garage GM wordt voor voorbereidingen 3 oktoberfestiviteiten 2018 opgeleverd.	Voor 3 oktober 2018 zijn beide garages opgeleverd en in gebruik genomen.
