BIJLAGE 1: OVERALLPLANNING
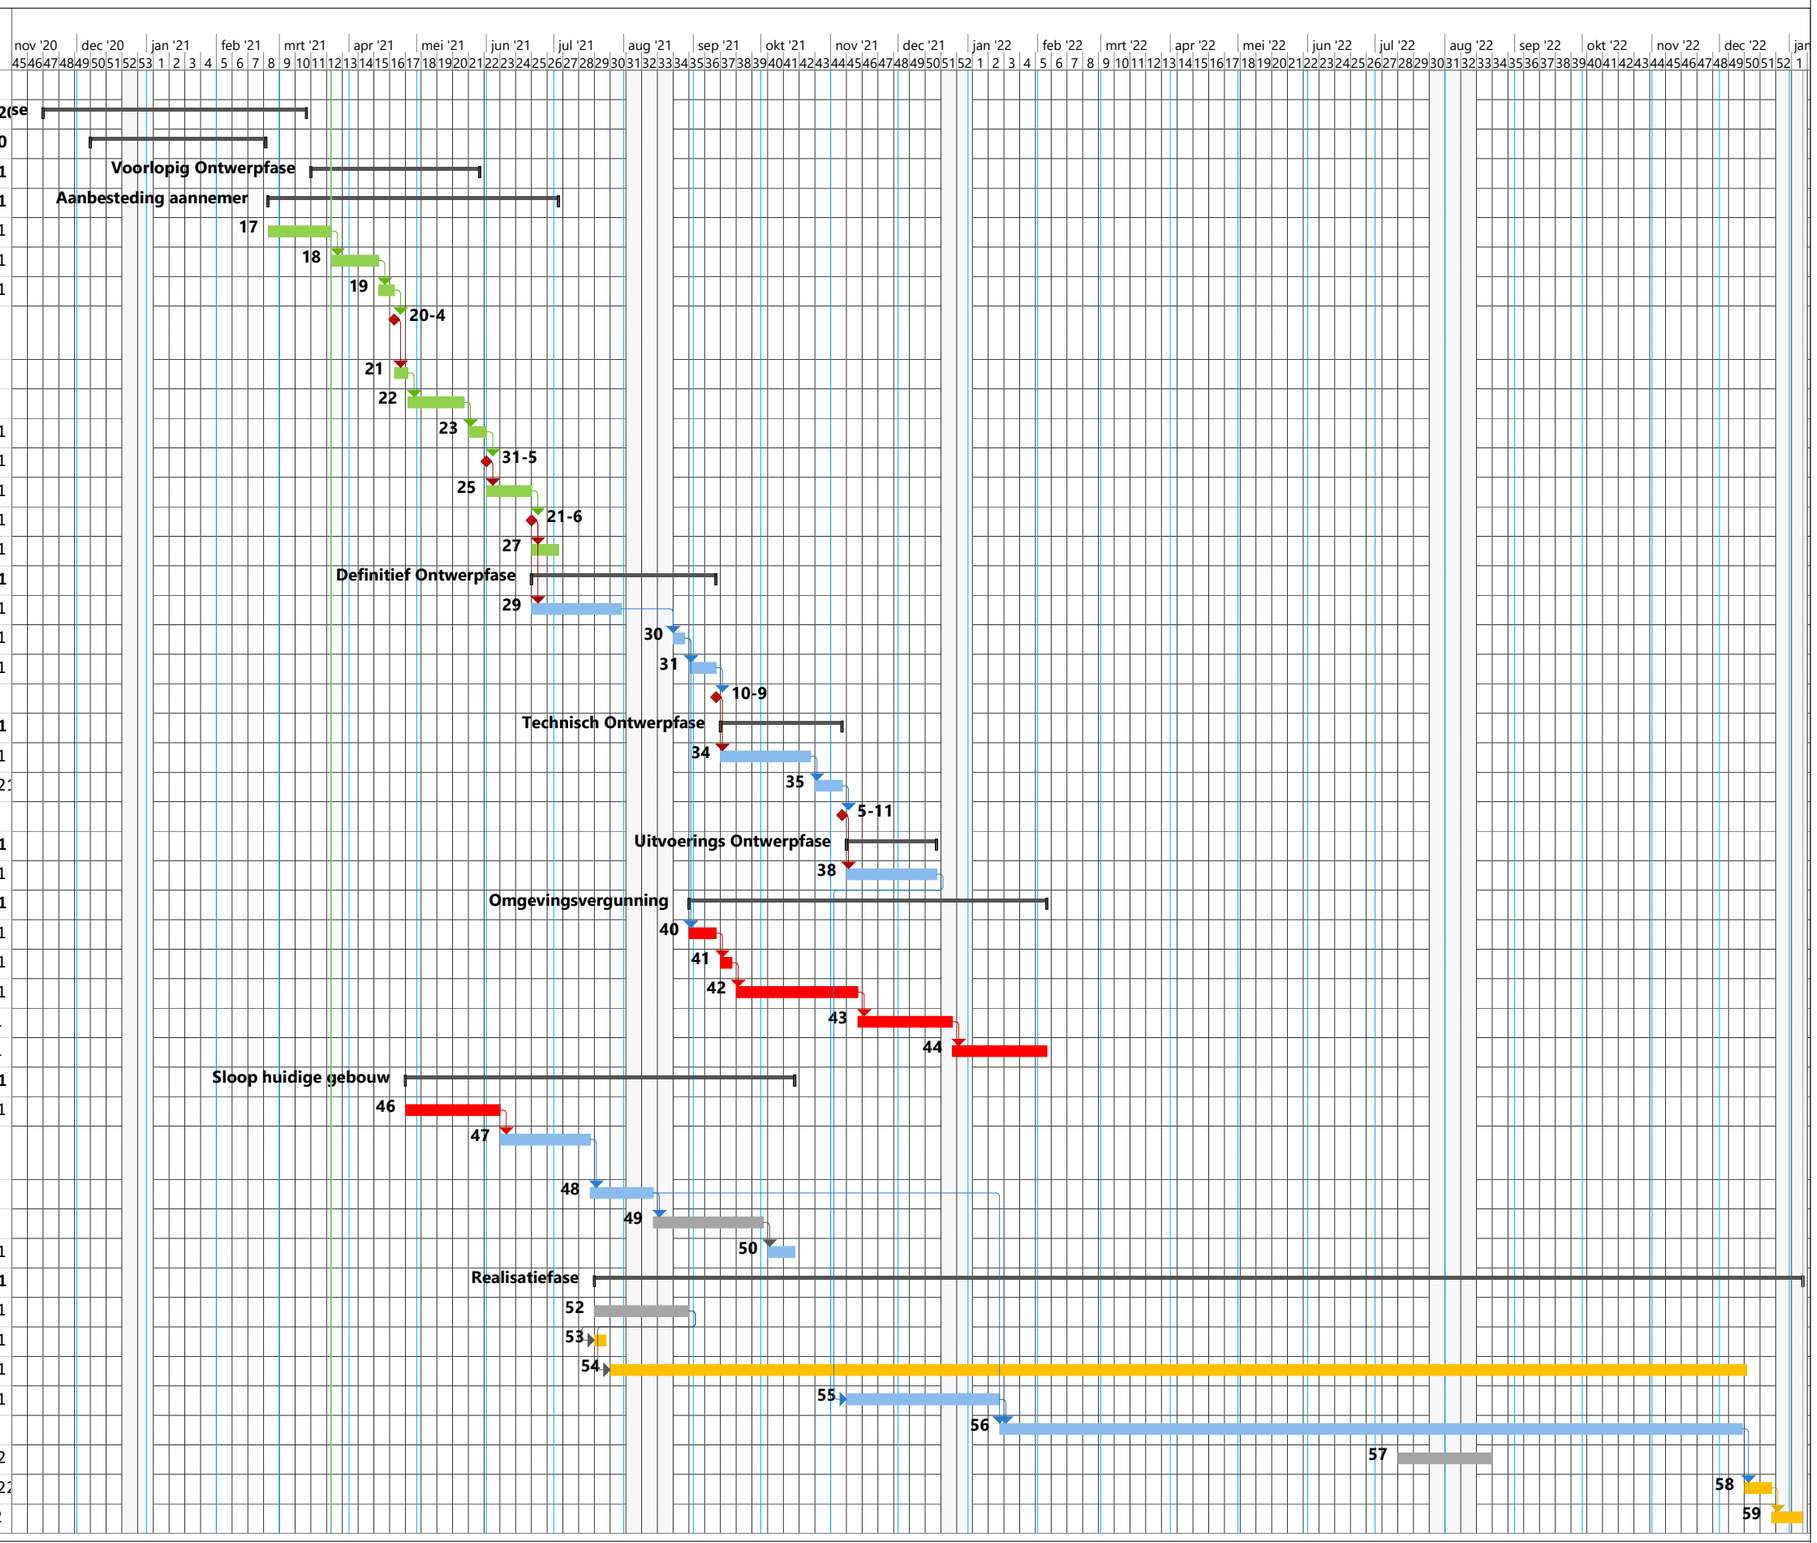
Id	Taakn	Taaknaam	Duur	Begindatum
1				
2		**Structuurontwerp fase**	**75 dagen**	**maa 16-11-2(se**
6		**Aanbesteding Adviseurs**	**46 dagen**	**maa 7-12-20**
11		**Voorlopig Ontwerpfase**	**55 dagen**	**maa 15-3-21**
16		**Aanbesteding aannemer**	**93 dagen**	**woe 24-2-21**
17		Voorbereiding	4 wkn	woe 24-2-21
18		Fase 1: Selectiefase	3 wkn	woe 24-3-21
19		Besluitvorming	5 dagen	woe 14-4-21
20		Bekendmaken voorgenomen selectiebeslissing	0 dagen	din 20-4-21
21		Bezwarentermijn	6 vdagen	din 20-4-21
22		Fase 2: Inschrijvingsfase	3,8 wkn	din 27-4-21
23		Interviews en beoordeling	6 dagen	maa 24-5-21
24		Voornemen tot gunning	0 dagen	maa 31-5-21
25		Alcatel-termijn	20 vdagen	maa 31-5-21
26		Definitieve gunning	0 dagen	maa 21-6-21
27		Bouwteamovereenkomst	2 wkn	maa 21-6-21
28		**Definitief Ontwerpfase**	**45 dagen**	**maa 21-6-21**
29		DO maken	6 wkn	maa 21-6-21
30		kostenraming	1 wk	maa 23-8-21
31		Beoordelen DO	2 wkn	maa 30-8-21
32		Vaststellen DO door stuurgroep	0 wkn	vri 10-9-21
33		**Technisch Ontwerpfase**	**40 dagen**	**maa 13-9-21**
34		TO maken (door architect)	6 wkn	maa 13-9-21
35		Beoordelen TO	2 wkn	maa 25-10-2
36		Vaststellen TO door stuurgroep	0 wkn	vri 5-11-21
37		**Uitvoerings Ontwerpfase**	**30 dagen**	**maa 8-11-21**
38		UO maken (door aannemer)	6 wkn	maa 8-11-21
39		**Omgevingsvergunning**	**105 dagen**	**maa 30-8-21**
40		Stukken omgevingsvergunning definitief	2 wkn	maa 30-8-21
41		Omgevingsvergunning indienen	1 wk	maa 13-9-21
42		Doorlooptijd omgevingsvergunning	8 wkn	maa 20-9-21
43		verlenging (mogelijk)	6 vwkn	vri 12-11-21
44		AWB termijn	6 vwkn	vri 24-12-21
45		**Sloop huidige gebouw**	**110 dagen**	**maa 26-4-21**
46		Sloopmelding	6 vwkn	maa 26-4-21
47		Voorbereiding asbestsanering en sloop	6 wkn	maa 7-6-21
48		Asbestsanering en sloop	4 vwkn	vri 16-7-21
49		Sloopverbod (vanuit gemeente)	7 vwkn	vri 13-8-21
50		Afronden laatste werkzaamheden sloop	2 wkn	maa 4-10-21
51		**Realisatiefase**	**335 dagen**	**maa 19-7-21**
52		Zomervakantie Midden 2021	6 vwkn	maa 19-7-21
53		Verhuizen naar Tijdelijke Huisvesting	1 wk	maa 19-7-21
54		Tijdelijke Huisvesting	16,81 vmn	maa 26-7-21
55		Werkvoorbereiding	8 wkn	maa 8-11-21
56		Realisatie	11 vmndn	vri 14-1-22
57		Zomervakantie Midden 2022	6 vwkn	maa 11-7-22
58		Voorbereiding ingebruikname	2 wkn	maa 12-12-2
59		Verhuizen	2 vwkn	vri 23-12-22
