Planning 20 - Jaren

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)

Karel Boddenweg 1
5044 EL Tilburg

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Printdatum: 22-9-2020

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
21 Buitenwanden																									
2110 Gevelconstructie metselwerk	Schoolgebouw																								
Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	pst	2020		■																			
Verduurzamen: 1.3 buitengevelisolatie: EPS 100mm		1,00	pst	2030												■									
22 Binnenwanden																									
2214 Vouwwand kunststof	Schoolgebouw, Aula																								
Vervangen vouwwand kunststof		31,00	m2	2024	15					■															■
2221 Binnenwanden metselwerk betonsteen																									
Vervangen metselwerk betonsteen (MBI)		1,00	pst	2051	60																				
23 Vloeren																									
2320 Vloerconstructie beton																									
Verduurzamen: 1.7 isoleren vloer 40 mm		1,00	pst	2030												■									
27 Daken																									
2716 Boeiboord-kunststof	Schoolgebouw																								
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen boeiboord kunststof		94,50	m2	2042	40																				
Reinigen boeiboord kunststof		94,50	m2	2020	2	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
31 Buitenwandopeningen																									
3120 Raamdorpel aluminium	Schoolgebouw																								
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen waterslag aluminium		125,00	m1	2065	40																				
3120 Kozijn buiten hout	Schoolgebouw																								
Vervangen kozijn hout		138,00	m2	2043	40																				
Herstellen kozijn hout (houtrot, scheuren, e.d.)		138,00	m2	2021	6		■						■					■							■
3120 Kozijn buiten kunststof	Renovatie/nieuwbouw																								
Vervangen kozijn kunststof		40,00	m2	2044	40																				
Reinigen kozijn kunststof		40,00	m2	2021	6		■						■					■							■
3120 Kozijn buiten aluminium	Schoolgebouw																								
Herstellen	Subelementen. manco	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen kozijn aluminium		105,00	m2	2044	40																				
Reinigen kozijn aluminium		105,00	m2	2021	6		■						■					■							■
3120 Kozijn buiten kunststof	Zwembad																								
Vervangen kozijn kunststof		22,00	m2	2044	40																				
Reinigen kozijn kunststof		22,00	m2	2021	6		■						■					■							■
3120 Raamdorpel kunststof	Renovatie/nieuwbouw																								
Vervangen raamdorpel kunststof		17,00	m1	2065	40																				
3120 Zonwering screens handbediening	Schoolgebouw																								
Vervangen zonwering		40,00	m1	2026	25							■													
Herstellen/bijstellen zonwering screen		40,00	m1	2021			■																		
3120 Zonwering screens handbediening	Renovatie/nieuwbouw																								

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Vervangen zonwering		17,00	m1	2031	25
3120	Zonwering screens elektrisch	Schoolgebouw, gymzaal				
	Vervangen zonwering		14,00	m1	2026	25
	Herstellen/bijstellen zonwering screen		14,00	m1	2021	
3120	Zonwering screens handbediening	Zwembad				
	Vervangen zonwering screen		7,00	m1	2026	25
3120	Beglazing HR++	Schoolgebouw				
	Vervangen beglazing HR++		280,00	m2	2044	40
3120	Beglazing triple	Zwembad				
	Vervangen beglazing triple		22,00	m2	2044	40
3120	Lekdorpel aluminium					
	Vervangen lekdorpel aluminium		315,00	m1	2065	48
3123	Schuifraam aluminium					
	Vervangen schuifraam aluminium		25,00	st	2033	40
3131	Buitendeur hout	Schoolgebouw				
	Actie intern	Blokkeren vluchtweg	1,00	pst	2020	
	Vervangen buitendeur hout		18,00	st	2043	40
	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		18,00	st	2023	20
3131	Roldeur kunststof	Schoolgebouw				
	Vervangen roldeur kunststof		1,00	st	2023	15
3140	Schuifpui buiten aluminium	Renovatie/nieuwbouw				
	Vervangen schuifpui aluminium inclusief beglazing		6,00	st	2044	40
32	**Binnenwandopeningen**					
3230	Kozijnen binnen hout					
	Vervangen kozijn hout		148,00	m2	2048	40
3231	Binnendeur hout	Schoolgebouw				
	Herstellen hang en sluitwerk binnendeuren		46,00	st	2020	3
	Vervangen binnendeur hout		46,00	st	2048	40
3231	Binnendeur hout + kunststof toplaag	Renovatie/nieuwbouw				
	Herstellen hang en sluitwerk binnendeuren		11,00	st	2020	3
	Vervangen binnendeur hout + kunststof toplaag		11,00	st	2048	40
37	**Dakopeningen**					
3721	Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	Verkeersruimte				
	Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2		16,00	st	2034	20
41	**Buitenwandafwerkingen**					
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Schoolgebouw				
	Vervangen voegwerk platvol		510,00	m2	2036	48
4111	Gevelafwerking stucwerk	Renovatie/nieuwbouw				
	Vervangen stucwerk		84,00	m2	2045	30
4112	Gevelbekleding volkern	Schoolgebouw				

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg


Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Vervangen gevelbekleding volkern		25,00	m2	2065	48
	Reinigen gevelbekleding volkern		25,00	m2	2021	6
42	**Binnenwandafwerkingen**					
4212	Binnenwandafwerking tegels	Natte ruimten				
	Vervangen wandafwerking wandtegels		272,00	m2	2053	48
4212	Binnenwandafwerking tegels	Gymzaal, kleedlokaal				
	Vervangen wandafwerking wandtegels		172,00	m2	2053	48
4212	Binnenwandafwerking tegels	Zwembad				
	Vervangen wandafwerking wandtegels		130,00	m2	2053	48
4212	Binnenwandafwerking tegels	Lokaal				
	Vervangen wandafwerking wandtegels		52,00	m2	2053	48
4212	Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Renovatie/nieuwbouw				
	Vervangen behangwerk		291,00	m2	2035	30
43	**Vloerafwerkingen**					
4321	Vloerafwerking linoleum	Lokaal				
	Vervangen vloerafwerking linoleum		690,00	m2	2029	30
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		690,00	m2	2020	3
4321	Vloerafwerking linoleum	Verkeersruimte				
	Vervangen vloerafwerking linoleum		680,00	m2	2029	30
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		680,00	m2	2020	3
4321	Vloerafwerking tapijt	Kantoor				
	Vervangen tapijt		100,00	m2	2035	30
4321	Vloerafwerking cementdekvloer	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen cementdekvloer		110,00	m2	2040	30
4321	Vloerafwerking sportvloer	Gymzaal				
	Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2020	
	Vervangen vloerafwerking sportvloer		280,00	m2	2029	24
	Vervangen belijning		280,00	m2	2039	10
4321	Vloerafwerking schoonloopmat	Schoolgebouw				
	Vervangen vloerafwerking schoonloopmat		60,00	m2	2023	15
4321	Vloerafwerking kunsthars (gietvloer)	Natte ruimten				
	Vervangen vloerafwerking kunsthars (gietvloer)		120,00	m2	2040	30
4322	Vloerafwerking tegels	Natte ruimten				
	Vervangen vloerafwerking tegels		20,00	m2	2053	48
4322	Vloerafwerking tegels	Zwembad				
	Vervangen vloerafwerking tegels		100,00	m2	2053	48
45	**Plafondafwerkingen**					
4510	Buitenplafond hout					
	Vervangen buitenplafond hout		20,00	m2	2053	40
4511	Plafondafwerking houten delen	Overig (berging/techniek)				

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Vervangen plafondafwerking houten delen		27,00	m2	2038	48																			■	
4511	Plafondafwerking houten delen	Zwembad																								
	Vervangen plafondafwerking houten delen		75,00	m2	2038	48																			■	
4511	Plafondafwerking houten delen	Gymzaal																								
	Vervangen plafondafwerking houten delen		280,00	m2	2038	48																			■	
4512	Systeemplafond	Lokaal																								
	Vervangen systeemplafond		690,00	m2	2049	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		690,00	m2	2020		■																			
4512	Systeemplafond	Kantoor																								
	Vervangen systeemplafond		104,00	m2	2049	40																				
4512	Systeemplafond	Natte ruimten																								
	Vervangen systeemplafond		120,00	m2	2049	40																				
4512	Systeemplafond	Verkeersruimte																								
	Vervangen systeemplafond		680,00	m2	2049	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		680,00	m2	2020		■																			
4512	Systeemplafond	Zwembad																								
	Vervangen systeemplafond		20,00	m2	2049	40																				
4512	Systeemplafond	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen systeemplafond		165,00	m2	2039	40																				■
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		165,00	m2	2020		■																			
46	**Schilderwerk**																									
4621	Buitenschilderwerk verzinkt staal	Schoolgebouw																								
	Groot schilderwerk verzinkt staal		51,00	m2	2021	6		■				■				■				■						■
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Renovatie/nieuwbouw																								
	Groot schilderwerk stucwerk		84,00	m2	2021	12		■												■						
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	Terrein																								
	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		30,00	m2	2020	6	■					■				■				■						
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Schoolgebouw																								
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		18,00	st	2021	6		■				■				■				■						■
4622	Binnenschilderwerk metselwerk	Verkeersruimte																								
	Groot schilderwerk metselwerk		610,00	m2	2029	12										■										
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend	Verkeersruimte																								
	Groot schilderwerk hout dekkend		94,00	m2	2029	12										■										
4622	Binnenschilderwerk metselwerk	Kantoor																								
	Groot schilderwerk metselwerk		360,00	m2	2029	12										■										
4622	Binnenschilderwerk metselwerk	Lokaal																								
	Groot schilderwerk metselwerk		1240,00	m2	2029	12										■										
4622	Binnenschilderwerk deur hout dekkend																									
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		46,00	st	2023	12				■											■					
4622	Binnenschilderwerk binnenzijde buitendeur hout dekkend	Verkeersruimte																								

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		18,00	st	2023	12
4631	Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend	Schoolgebouw				
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		138,00	m2	2021	6
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	Lokaal				
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		148,00	m2	2023	12
4632	Binnenschilderwerk binnenzijde buitenkozijn hout dekkend					
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		138,00	m2	2029	12
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	Schoolgebouw				
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend		20,00	m2	2027	12
47	**Dakafwerkingen**					
4711	Dakbedekking kunststof	Gymzaal				
	Vervangen dakbedekking kunststof		282,00	m2	2042	40
	Verduurzamen: 1.4 dakisolatie 160mm op bestaande dakbedekking		1,00	pst	2030	
4711	Dakbedekking kunststof	Schoolgebouw				
	Vervangen dakbedekking kunststof		1743,00	m2	2042	40
	Verduurzamen: 1.4 dakisolatie 160mm op bestaande dakbedekking		1,00	pst	2030	
	Verduurzamen: 4.1 PV-Panelen (223 st.)		1,00	pst	2030	
4711	Dakrandafwerking zink	Schoolgebouw, t.p.v. techniek ruimte				
	Vervangen dakrandafwerking zink		10,00	m1	2035	20
4711	Dakbedekking kunststof	Zwembad				
	Vervangen dakbedekking kunststof		84,00	m2	2042	40
	Verduurzamen: 1.4 dakisolatie 160mm op bestaande dakbedekking		1,00	pst	2042	
4711	Dakbedekking bitumen + grindballast	Renovatie/nieuwbouw				
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		150,00	m2	2049	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		150,00	m2	2029	20
	Vervangen grind		150,00	m2	2049	40
4711	Dakbedekking bitumen	Schoolgebouw, t.p.v. techniek ruimte				
	Herstellen	Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)	1,00	pst	2020	
	Vervangen dakbedekking bitumen		30,00	m2	2049	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		30,00	m2	2029	20
4711	Loodslabben plat dak					
	Herstellen	Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies e.d.	1,00	pst	2020	
	Vervangen loodslabben plat dak		29,00	m1	2029	48
4711	Dakrandafwerking aluminium trim					
	Vervangen daktrim aluminium		315,00	m1	2032	20
4711	Randstrook bitumineus	Renovatie/nieuwbouw				
	Vervangen randstrook bitumineus		43,00	m1	2029	20

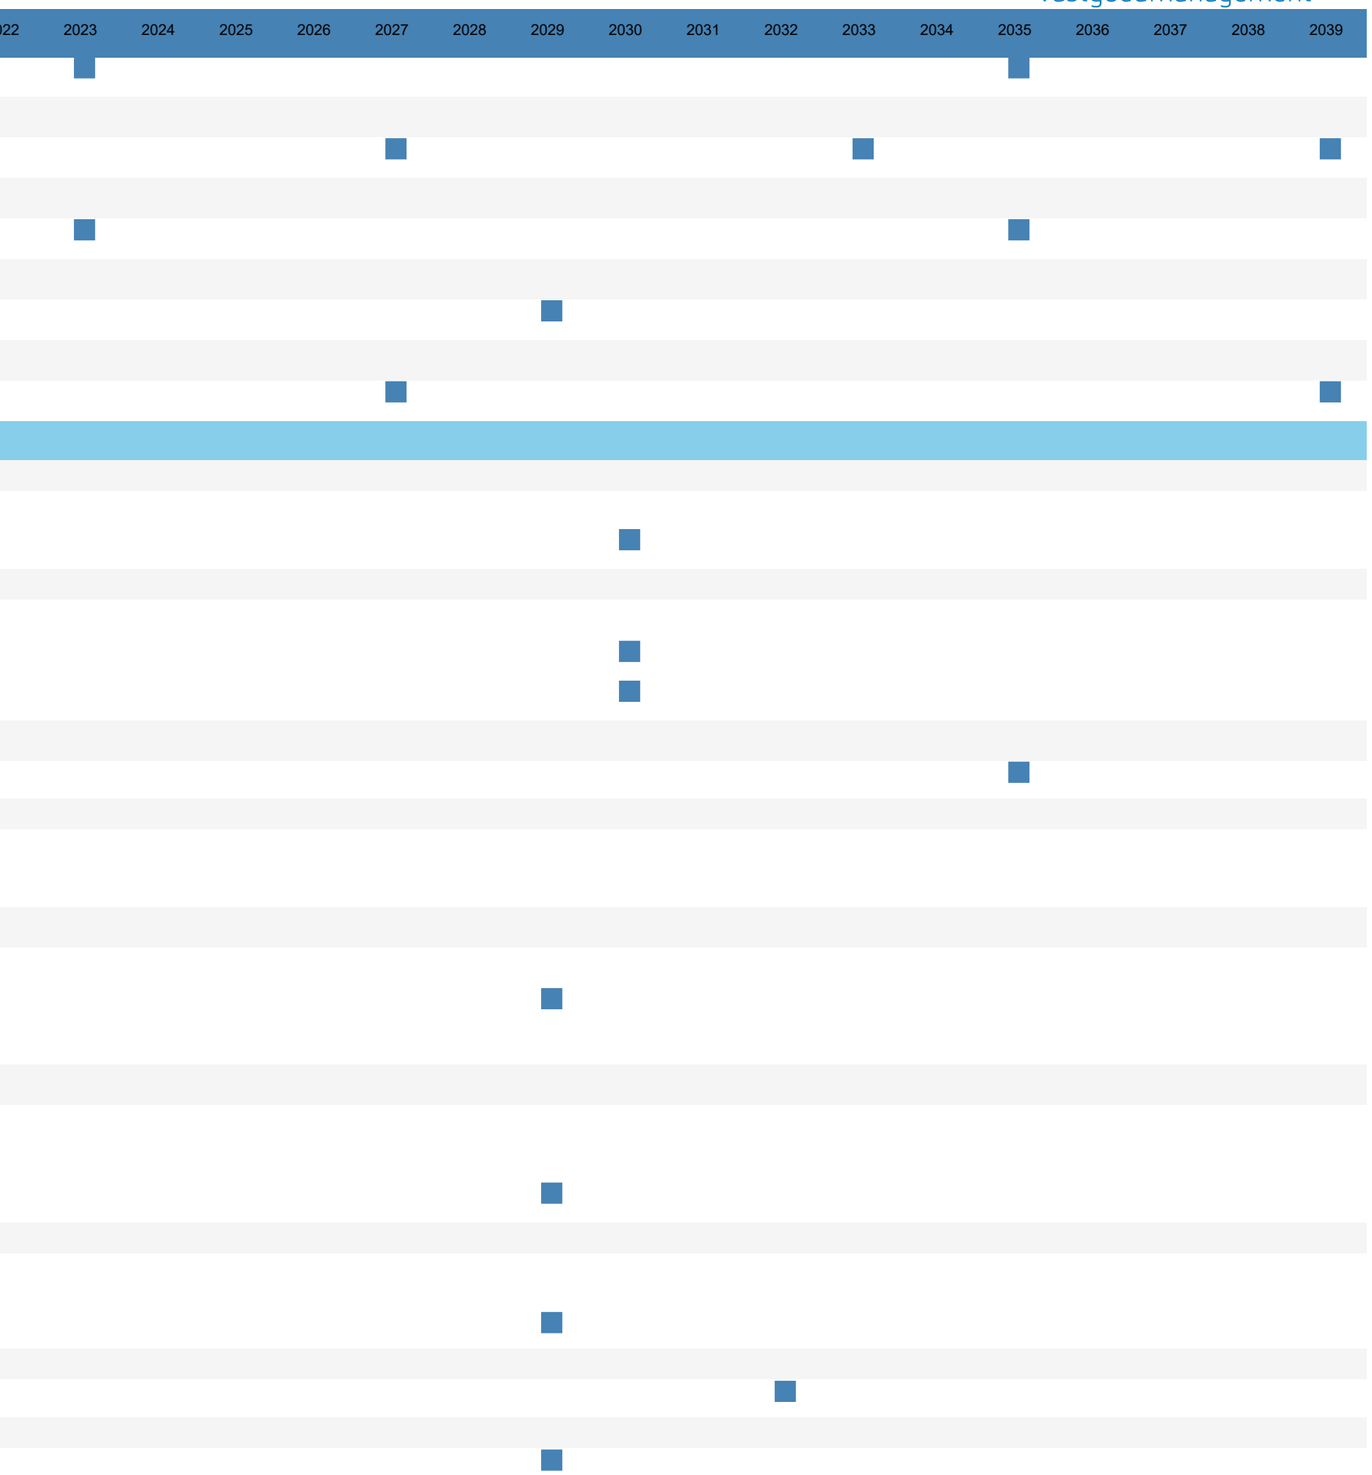

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
4711	Randstrook kunststof																									
	Vervangen randstrook kunststof		272,00	m1	2042	40																				
51	**Warmteopwekking**																									
5121	CV-pomp individueel	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen CV-pomp individueel		7,00	st	2024	20					■															
5121	WW-pomp individueel	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen CV-pomp individueel		1,00	st	2024	20					■															
52	**Afvoeren**																									
5211	Hemelwaterafvoer staal	Schoolgebouw																								
	Vervangen hemelwaterafvoer staal		170,00	m1	2040	36																				
53	**Water**																									
5321	Close-in boiler	Schoolgebouw																								
	Vervangen boiler close-in		3,00	st	2024	18					■															
5321	Boiler elektrisch 50 liter	Schoolgebouw																								
	Vervangen boiler elektrisch 50 l		1,00	st	2024	18					■															
5321	Boiler elektr. 80-250 liter	Schoolgebouw																								
	Vervangen boiler elektrisch 80-250 l		1,00	st	2024	18					■															
5321	Close-in boiler	Lokaal																								
	Vervangen boiler close-in		1,00	st	2024	18					■															
5321	Close-in boiler	(praktijk)Lokaal 1036																								
	Vervangen boiler close-in		1,00	st	2024	18					■															
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen voorraadboilers		1,00	st	2024	18					■															
5334	Zwembad-watersysteem algemeen	Overig (berging/techniek)																								
	Zwembad-watersysteem algemeen		1,00	st	2038	20																			■	
55	**Koudeopwekking**																									
5512	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Schoolgebouw																								
	Vervangen splitsysteem		1,00	st	2023	15				■															■	
56	**Warmtedistributie**																									
5610	CV-expansievat individueel	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen CV-expansievat individueel		2,00	st	2030	12											■									
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 20-40	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen inregelafsluiter		8,00	st	2023	15				■															■	
5610	Membraamafsluiter warmtedistributie	Overig (berging/techniek)																								
	Vervangen membraamafsluiter		20,00	st	2023	25				■																
5611	Radiatoren																									
	Vervangen radiator		71,00	st	2044	40																				
57	**Luchtbehandeling**																									
5710	Ventilatiedakdoorvoer kunststof plat	Schoolgebouw																								
	Vervangen dakdoorvoer kunststof plat		66,00	st	2032	24													■							

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
5721 Dakventilator algemeen	Schoolgebouw				
Vervangen dakventilator		3,00	st	2023	15
5721 Dakventilator algemeen	Zwembad				
Vervangen dakventilator		1,00	st	2033	15
5721 Dakventilator algemeen	Renovatie/nieuwbouw				
Vervangen dakventilator		1,00	st	2033	15
5721 Dakventilator algemeen	Renovatie/nieuwbouw				
Vervangen dakventilator		1,00	st	2033	15
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet toilet		1,00	pst	2020	
5771 Warmteterugwin-sectie algemeen	Zwembad				
Vervangen warmteterugwin-sectie		1,00	st	2042	25
5771 Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s	Overig (berging/techniek)				
Vervangen luchtbehandelingskast toevoer		1,00	st	2042	25
Verduurzamen: meting luchtsnelheden & omgevingstempertuur		1,00	pst	2021	
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet leslokalen		1,00	pst	2020	
Verduurzamen: aanbrengen CO-regeling per lokaal incl. aanpassen toeren regeling		1,00	pst	2042	
5771 Luchtkanalen ventilatie	Schoolgebouw				
Reinigen luchtkanalen		2389,00	bvo	2022	8

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 Noodverlichtingsinstallatie totaal	Schoolgebouw				
Vervangen noodverlichting / picotgrammen		37,00	st	2024	18
Vervangen accu's		37,00	st	2020	4
6171 Bliksembeveilingsinstallatie					
Vervangen bliksembeveiliging-installatie		1,00	pst	2035	18

62 Krachtstroom


6221 Verdeelkast (regelkast techniek)	Overig (berging/techniek)				
Vervangen verdeelkast (laagspanning)		1,00	st	2030	40
6221 Verdeelkast (hoofd)	Overig (berging/techniek)				
Vervangen verdeelkast (laagspanning)		1,00	st	2030	40

63 Verlichting

6311 Elektra armaturen buitenlamp	Schoolgebouw				
Vervangen armaturen buitenlamp		12,00	st	2023	18
Vervangen lampen buiten		12,00	st	2019	2
6311 Elektra armaturen binnenlamp					
Verduurzamen: 3.2.Toepassen aanwezigheidsdetectie bij de huidige LED verlichting		1,00	pst	2030	
Vervangen armaturen binnenlamp		347,00	st	2030	18
Vervangen lampen binnen		347,00	st	2019	2

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
65	**Beveiliging**					
6511	Brandmeldinstallatie totaal	Schoolgebouw				
	Vervangen brandmeldinstallatie besturingskast		1,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie centrale, paneel en ontruimingspaneel		1,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie flitslicht		1,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder		9,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie meldsirene		14,00	st	2033	25
	Vervangen brandmeldinstallatie nevenindicator		3,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder		12,00	st	2023	15
	Vervangen brandmeldinstallatie accu		2,00	st	2020	5
6513	Brandslang haspel	Bestaande bouw + renovatie nieuwbouw				
	Vervangen brandslang haspel		6,00	st	2024	18
6513	Poederblusser	Schoolgebouw				
	Vervangen poederblusser		2,00	st	2022	12
6520	CCTV-camera systeem	Kantoor				
	Vervangen CCTV-camera systeem		4,00	st	2023	15
6521	Inbraakalarminstallatie algemeen	Schoolgebouw				
	Vervangen inbraakalarminstallatie		2389,00	bvo	2024	18
67	**Gebouwbeheersvoorzieningen**					
6720	Gebouwbeheersysteem algemeen	Overig (berging/techniek)				
	Verduurzamen: regeling gebouwbeheersysteem incl. PC-beheer		1,00	pst	2020	
	Vervangen gebouwbeheersysteem		2389,00	bvo	2038	15
73	**Vaste keukenvoorzieningen**					
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Bestaande bouw + renovatie nieuwbouw				
	Vervangen keukenblok <=1.5 m		12,00	st	2028	24
7311	Keukenblok 1.5-2.0 m.	Schoolgebouw				
	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m		5,00	st	2028	24
74	**Vaste sanitairvoorzieningen**					
7410	Sanitaire kitvoeg	Natte ruimten				
	Vervangen kitvoeg binnenwand		110,00	m1	2029	12
7411	Wastafelcombinatie algemeen	Natte ruimten				
	Vervangen wastafelcombinatie		5,00	st	2042	25
7411	Wastrogcombinatie algemeen	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen wastrogcombinatie		1,00	st	2042	25
7411	Fonteincombinatie algemeen	Natte ruimten				
	Vervangen fonteincombinatie		4,00	st	2042	25
7411	Douchecombinatie algemeen	Natte ruimten				
	Vervangen douchecombinatie		14,00	st	2042	25

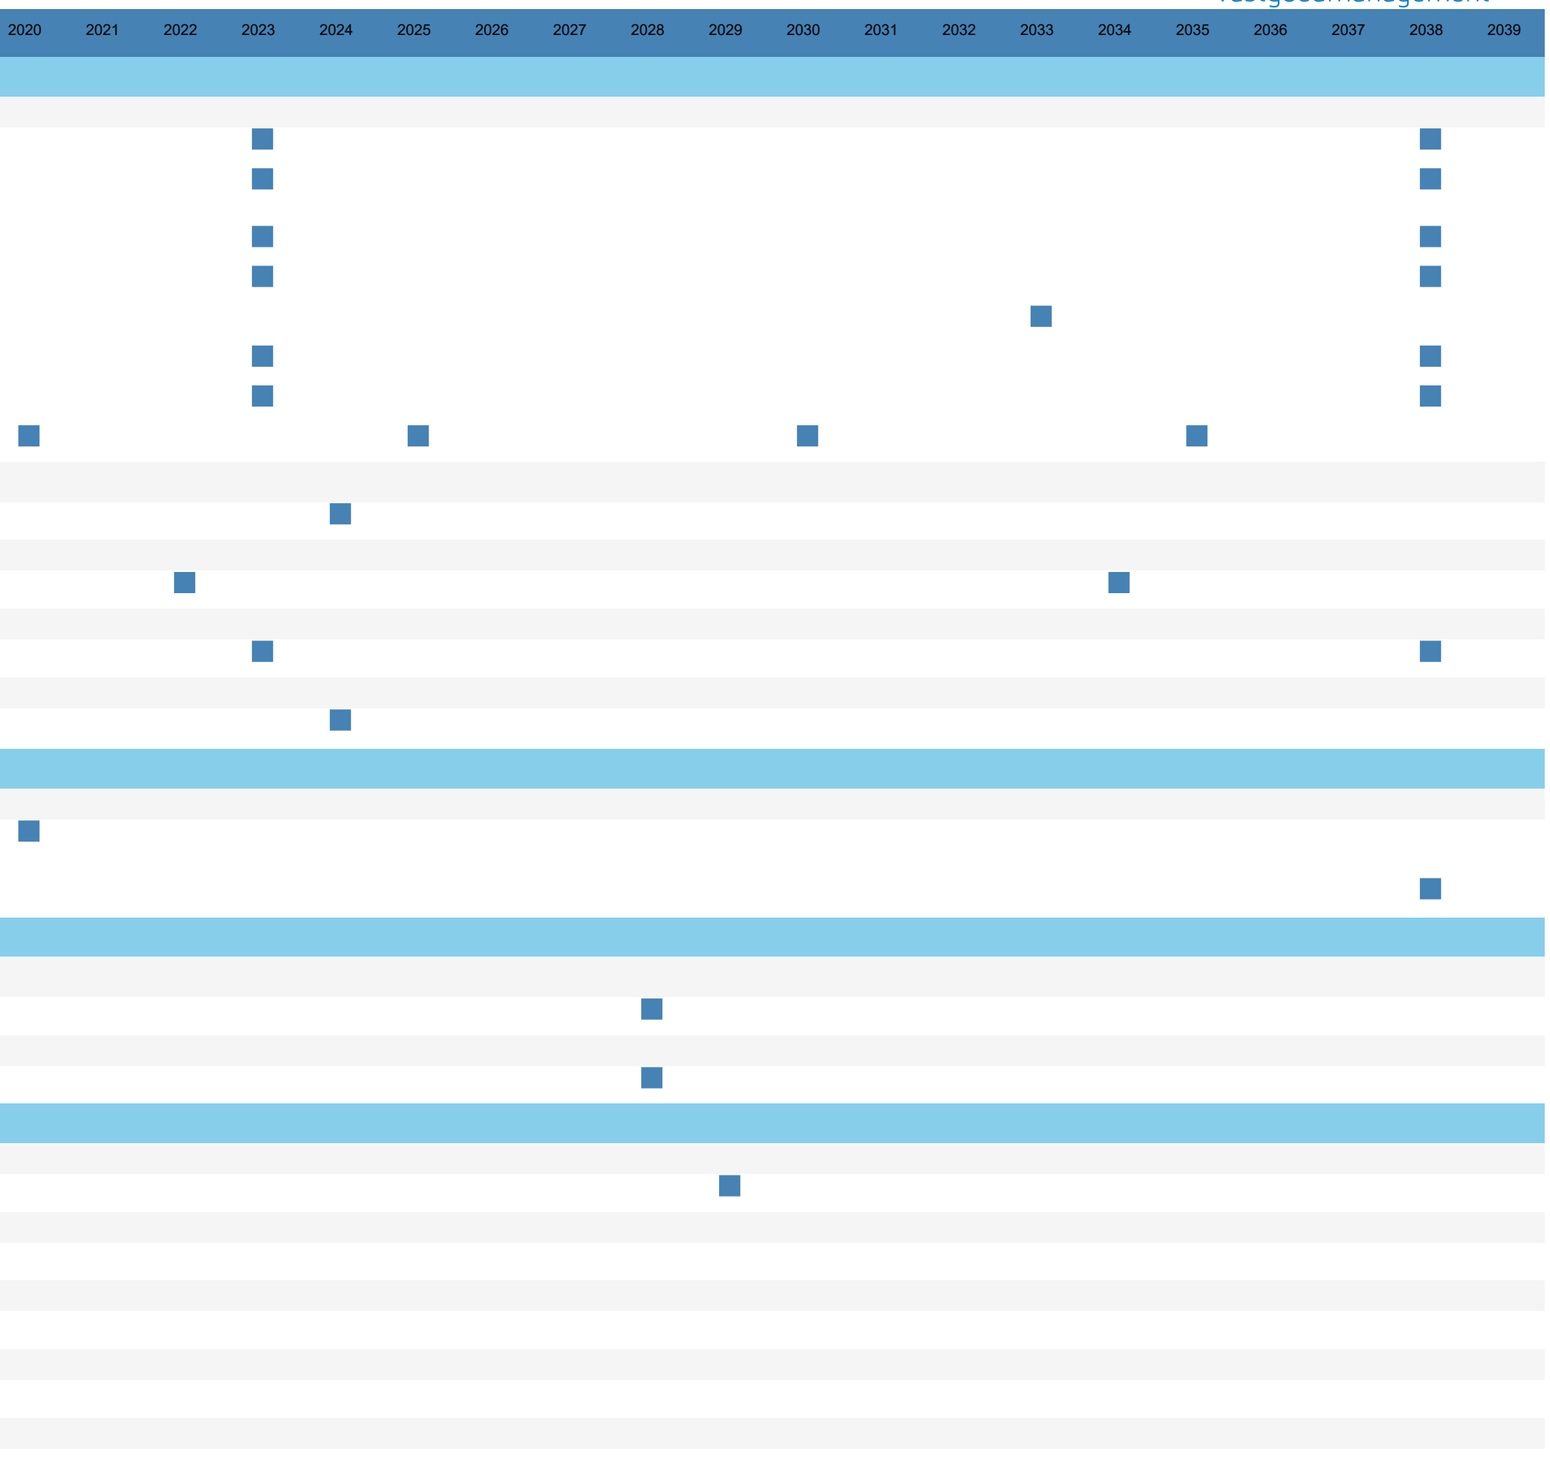

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
7411	Sanitair douche / wc- schot	Natte ruimten				
	Vervangen schaamschot		24,00	st	2042	25
7411	Toilet wandcloset	Natte ruimten				
	Vervangen toilet		20,00	st	2042	25
90	**Terrein**					
9022	Overkapping rijwielstalling / opslag	Terrein				
	Herstellen	Loszittend, onsamenhangend	1,00	pst	2020	
	Vervangen overkapping		40,00	m2	2029	25
9032	Terreinafscheiding hekwerk metaal	Terrein				
	Vervangen terreinafscheiding hekwerk metaal		125,00	m1	2062	48
9034	Toegangspoort metaal	Terrein				
	Vervangen poort staal		4,00	st	2062	48
9041	Terreinverharding kunstgras	Terrein				
	Vervangen kunstgras		481,00	m2	2031	15
9041	Terreinverharding rubbertegels	Terrein				
	Vervangen rubbertegels		50,00	m2	2035	30
9041	Terreinverharding grastegels beton	Terrein, parkeerplaats				
	Nader onderzoek	Verzakking, hoogteverschillen	1,00	pst	2020	
	Vervangen grastegels beton		185,00	m2	2035	30
9041	Terreinverharding betontegels	Terrein				
	Herstraten/herstellen betontegels		1100,00	m2	2025	10
9041	Terreinverharding klinkers	Terrein, voorgevel				
	Herstraten/herstellen klinkers		100,00	m2	2025	10
9064	Intercom terrein algemeen	Schoolgebouw				
	Vervangen intercom		1,00	st	2023	10
9071	Terreinmeubilering bank algemeen	Terrein				
	Vervangen bank		5,00	st	2035	30
9081	Terreinmeubilering rijwielstaanders	Terrein				
	Vervangen rijwielstaanders		15,00	st	2035	30
99	**Algemeen**					
9999	Klachten onderhoud installaties					
	Klachten onderhoud installaties algemeen		2389,00	bvo	2019	1
9999	Klachten onderhoud bouwkundig					
	Klachten onderhoud bouwkundig		2389,00	bvo	2019	1
9999	Herinspectie <adviesbureau>					
	Herinspectie <adviesbureau>		1,00	pst	2022	3
9999	Onderhoudscontracten (en keuringen)					
	Buitenriolering algemeen doorspuiten		1,00	pst	2019	1
	Controle constructie zwembad - Markslag-Beljaars		1,00	pst	2019	1
	OC - Blusmiddelen - Lube Prevent Rijen		1,00	pst	2019	1

92148-5 (S3) • De Bodde 1 (SO)
Karel Boddenweg 1 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
OC - Brandmeldinstallatie - Van Gerwen BV		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OC - Inbraaksignalering - Van Gerwen BV		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OC - Noodverlichting		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
OC - Vouwwand - Trenomat		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PL-lampen/buizen >8W vervangen		6,15	pst	2020	2	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
Zandbak zand vervangen		1,00	pst	2019	2		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
