Planning 20 - Jaren

92147-1 (S3) • VSO Parcours

Generaal Smutslaan 9
5021 XA Tilburg

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Printdatum: 22-9-2020

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
21 Buitenwanden																									
2110 Gevelconstructie metselwerk	Exterieur																								
Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2020		■																			
Verwijderen	uitstekende stalen delen	1,00	pst	2020		■																			
22 Binnenwanden																									
2213 Scheidingswand hout/houtplaat	Lokaal																								
Vervangen scheidingswand hout/houtplaat		22,00	m2	2038	30																			■	
2221 Binnenwand schoonmetselwerk	Verkeersruimte																								
Vervangen schoonwerk metselwerk		1,00	pst	2068	60																				
24 Trappen en hellingen																									
2410 Binnentrap beton	Verkeersruimte																								
Vervangen binnentrappen beton		4,00	st	2056	48																				
27 Daken																									
2713 Luifel aluminium																									
Vervangen luifel aluminium		1,00	m2	2044	36																				
28 Hoofddraagconstructies																									
2811 Staalconstructie verzinkt	Gymzaal																								
Reinigen	Graffiti, bekladding	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen staalconstructie		1,00	m1	2061																					
31 Buitenwandopeningen																									
3120 Raamdorpel aluminium	Exterieur																								
Vervangen raamdorpel aluminium		120,00	m1	2048	40																				
3120 Zonwering screens	Exterieur																								
Vervangen zonwering		155,00	m1	2033	25														■						
3120 Kozijn buiten aluminium																									
Vervangen kozijn aluminium		350,00	m2	2048	40																				
Reinigen kozijn aluminium		350,00	m2	2020	6	■						■						■						■	
3120 Beglazing HR++																									
Vervangen beglazing HR++		298,00	m2	2048	40																				
3122 Draai/val/uitzet raam aluminium																									
Vervangen raam aluminium		17,00	st	2048	40																				
3131 Buitendeur aluminium																									
Vervangen buitendeur aluminium		12,00	st	2048	40																				
Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		12,00	st	2028	20									■											
32 Binnenwandopeningen																									
3230 Kozijnen binnen hout	Verkeersruimte																								
Destructief onderzoek	Deformatie, scheefstand	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen kozijn hout		1011,00	m2	2048	40																				
3231 Binnendeur hout + kunststof toplaag	Verkeersruimte																								
Herstellen	Ontbrekende (onder-)delen	1,00	pst	2020		■																			

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Herstellen hang en sluitwerk binnendeuren		123,00	st	2020	3
	Vervangen binnendeur hout + kunststof toplaag		123,00	st	2048	40
3231	Binnendeur schuifdeur hout	Verkeersruimte				
	Herstellen	Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen	1,00	pst	2020	
	Vervangen schuifdeur zachthout		1,00	st	2038	48
37	**Dakopeningen**					
3720	Dakluik	Overig (techniek)				
	Vervangen dakluik		1,00	st	2038	30
3721	Lichtkoepel kunststof (500 x 2000 mm)	Dak				
	Vervangen lichtkoepel		5,00	st	2038	30
41	**Buitenwandafwerkingen**					
4111	Gevelafwerking voegwerk platvol	Exterieur				
	Vervangen voegwerk platvol		1930,00	m2	2056	48
42	**Binnenwandafwerkingen**					
4211	Binnenwandafwerking spuitwerk	Overig (berging)				
	Vervangen wandafwerking spuitwerk		170,00	m2	2056	48
4212	Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Lokaal				
	Vervangen behangwerk		1800,00	m2	2038	30
4212	Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Kantoor				
	Vervangen behangwerk		490,00	m2	2038	30
4212	Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Verkeersruimte				
	Vervangen behangwerk		114,00	m2	2038	30
4212	Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Aula				
	Vervangen behangwerk		124,00	m2	2038	30
4212	Binnenwandafwerking tegels	Natte ruimten				
	Vervangen wandafwerking wandtegels		770,00	m2	2056	48
43	**Vloerafwerkingen**					
4321	Vloerafwerking linoleum	Aula				
	Vervangen vloerafwerking linoleum		90,00	m2	2038	30
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		90,00	m2	2020	3
4321	Vloerafwerking sportvloer	Gymzaal				
	Vervangen vloerafwerking sportvloer		287,00	m2	2038	30
	Vervangen belijning		287,00	m2	2028	10
4321	Vloerafwerking kunsthars (gietvloer)	Natte ruimten				
	Vervangen vloerafwerking kunsthars (gietvloer)		440,00	m2	2038	30
4321	Vloerafwerking schoonloopmat	Verkeersruimte				
	Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	pst	2020	
	Vervangen vloerafwerking schoonloopmat		45,00	m2	2026	15
4321	Vloerafwerking linoleum	Verkeersruimte				

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Vervangen vloerafwerking linoleum		714,00	m2	2038	30																			■	
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		714,00	m2	2020	3	■			■			■			■			■			■				
4321	Vloerafwerking linoleum	Kantoor																								
	Vervangen vloerafwerking linoleum		345,00	m2	2038	30																			■	
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		345,00	m2	2020	3	■			■			■			■			■			■				
4321	Vloerafwerking linoleum	Lokaal																								
	Vervangen vloerafwerking linoleum		930,00	m2	2038	30																			■	
	Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		930,00	m2	2020	3	■			■			■			■			■			■				
45	**Plafondafwerkingen**																									
4510	Buitenplafond volkern																									
	Vervangen buitenplafond volkern		85,00	m2	2056	48																				
4510	Buitenplafond hout																									
	Vervangen buitenplafond hout		29,00	m2	2048	40																				
4511	Plafondafwerking mineraal	Gymzaal																								
	Vervangen plafondafwerking mineraal		280,00	m2	2048	40																				
4512	Systeemplafond	Natte ruimten																								
	Vervangen systeemplafond		140,00	m2	2048	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		140,00	m2	2020		■																			
4512	Systeemplafond	Lokaal																								
	Vervangen systeemplafond		1015,00	m2	2048	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		1015,00	m2	2020		■																			
4512	Systeemplafond	Verkeersruimte																								
	Vervangen systeemplafond		640,00	m2	2048	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		640,00	m2	2020		■																			
4512	Systeemplafond	Kantoor																								
	Vervangen systeemplafond		350,00	m2	2048	40																				
	Herstellen / uitwisselen plafondplaat		350,00	m2	2020		■																			
4521	Plafondafwerking spuitwerk	Overig (berging)																								
	Vervangen spuitwerk plafond		130,00	m2	2056	48																				
46	**Schilderwerk**																									
4622	Binnenschilderwerk behangwerk	Lokaal																								
	Groot schilderwerk stucwerk		1800,00	m2	2028	12									■											
4622	Binnenschilderwerk behangwerk	Verkeersruimte																								
	Groot schilderwerk stucwerk		284,00	m2	2028	12									■											
4622	Binnenschilderwerk behangwerk	Aula																								
	Groot schilderwerk stucwerk		104,00	m2	2028	12									■											
4622	Binnenschilderwerk behangwerk	Kantoor																								
	Groot schilderwerk stucwerk		490,00	m2	2023	12				■												■				
4622	Binnenschilderwerk spuitwerk	Overig (berging)																								
	Groot schilderwerk stucwerk		170,00	m2	2028	12									■											

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout	Verkeersruimte																								
	Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend		1011,00	m2	2028	12									■											
4645	Binnenschilderwerk plafond spuitwerk	Overig (berging)																								
	Groot schilderwerk plafond spuitwerk		130,00	m2	2028	12									■											
47	**Dakafwerkingen**																									
4711	Dakbedekking kunststof	Dak																								
	Vervangen dakbedekking kunststof		1113,00	m2	2048	40																				
	Verduurzamen: 4.1 PV-Panelen (152 st.)		1,00	pst	2028										■											
4711	Dakbedekking kunststof	Dak																								
	Vervangen dakbedekking kunststof		264,00	m2	2048	40																				
4711	Dakbedekking kunststof	Dak																								
	Vervangen dakbedekking kunststof		252,00	m2	2048	40																				
4711	Dakbedekking kunststof	Dak																								
	Vervangen dakbedekking kunststof		25,00	m2	2048	40																				
4711	Dakbedekking kunststof	Dak																								
	Vervangen dakbedekking kunststof		29,00	m2	2048	40																				
4711	Randstrook kunststof	Dak																								
	Vervangen randstrook kunststof		250,00	m1	2048	40																				
4711	Loodslabben plat dak	Dak																								
	Vervangen loodslabben plat dak		92,00	m1	2056	48																				
4712	Golfplaat metaal (damwandprof)	Dak																								
	Vervangen stalen golfplaat damwandprofiel		88,00	m2	2056	48																				
51	**Warmteopwekking**																									
5121	CV-pomp individueel	Overig (techniek)																								
	Vervangen CV-pomp individueel		3,00	st	2029	20										■										
5121	CV-pomp individueel	Overig (techniek)																								
	Vervangen CV-pomp individueel		3,00	st	2029	20										■										
5121	CV-ketel HR	Overig (techniek)																								
	Vervangen cv-ketel HR		3,00	st	2028	18									■											
5121	CV-ketel HR	Overig (techniek)																								
	Vervangen cv-ketel HR		1,00	st	2028	18									■											
52	**Afvoeren**																									
5212	Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig)	Dak																								
	Vervangen hemelwaterafvoer pluvia		1,00	m1	2048	40																				
53	**Water**																									
5310	Waterleidingnet algemeen																									
	Verwijderen "dode leiding"	Zogenoemde "dode leiding" bij drinkwaterleiding	1,00	pst	2020			■																		
	Vervangen waterleidingnet algemeen		1,00	pst	2056	48																				
5321	Close-in boiler	Aula, personeelsruimte																								
	Vervangen boiler close-in		1,00	st	2028	18									■											

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg


Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
5321	Close-in boiler	Lokaal				
	Vervangen boiler close-in		1,00	st	2028	18
5321	Close-in boiler	Overig (berging)				
	Vervangen boiler close-in		2,00	st	2028	18
5322	Voorraadboiler indirect verwarmd 500 l	Overig (techniek)				
	Herstellen	Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen	1,00	pst	2020	
	Vervangen voorraadboilers		1,00	st	2026	15
55	**Koudeopwekking**					
5512	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW	Dak				
	Vervangen splitsysteem		1,00	st	2026	15
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 40	Overig (techniek)				
	Vervangen inregelafsluiter		5,00	st	2028	15
56	**Warmtedistributie**					
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 40	Overig (techniek)				
	Vervangen klepafsluiter		1,00	st	2028	15
5610	Afsluiter warmtedistributie 5/4"-2"	Overig (techniek)				
	Vervangen klepafsluiter		17,00	st	2028	15
5610	CV-expansievat	Overig (techniek)				
	Vervangen CV-expansievat collectief		1,00	st	2022	12
5611	Radiatoren					
	Vervangen radiator		114,00	st	2044	40
5630	Luchtafscheider	Overig (techniek)				
	Vervangen luchtafscheider		1,00	st	2028	18
5630	Vuilfiter CV installatie	Overig (techniek)				
	Reinigen	Corrosie	1,00	pst	2020	
	Leidingen lucht algemeen		1,00	pst	2028	18
57	**Luchtbehandeling**					
5721	Dakventilator algemeen	Dak				
	Vervangen dakventilator		4,00	st	2023	15
5721	Dakventilator algemeen	Dak				
	Vervangen dakventilator		5,00	st	2023	15
	Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet toiletten		5,00	pst	2020	
5721	Dakventilator algemeen	Dak				
	Vervangen dakventilator		1,00	st	2023	15
5721	Dakventilator algemeen	Dak				
	Vervangen dakventilator		1,00	st	2023	15
5721	Dakventilator algemeen	Dak				
	Vervangen dakventilator		1,00	st	2023	15
5771	Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 2,8 - 5,6 m3/s	Overig (techniek)				

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Vervangen luchtbehandelingskast toevoer		1,00	st	2033	25														■						
Verduurzamen: aanbrengen gebouwbeheersysteem		1,00	pst	2020		■																			
Verduurzamen: meting luchtsnelheden & omgevings temperatuur		1,00	pst	2021			■																		
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet leslokalen		1,00	pst	2020		■																			
Verduurzamen: aanbrengen CO-regeling per lokaal incl. aanpassen toeren regeling		1,00	pst	2033															■						
5771 Luchtkanalen ventilatie																									
Reinigen luchtkanalen		2899,00	bvo	2021	8		■								■								■		
58 Regeling klimaat en sanitair																									
5820 Centrale regelkast CV-installatie	Overig (techniek)																								
Vervangen verdeelkast		1,00	st	2044	40																				
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen																									
6111 Groepenkast	Overig (techniek)																								
Vervangen groepenkast inclusief bedrading		1,00	st	2044	40																				
6111 Noodverlichtingsinstallatie totaal																									
Vervangen noodverlichting		24,00	st	2028	18									■											
Vervangen accu's		24,00	st	2039	4																				■
62 Krachtstroom																									
6221 Verdeelkast	Lokaal																								
Vervangen verdeelkast (laagspanning)		1,00	st	2044	40																				
63 Verlichting																									
6311 Elektra armaturen buitenlamp	Exterieur																								
Reiningen	Vervuiling	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen armaturen buitenlamp		8,00	st	2028	18									■											
Vervangen lampen buiten		8,00	st	2018	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6311 Elektra armaturen binnenlamp																									
Verduurzamen: 3.2. Energiezuinige HF / LED verlichting icm aanwezigheidsdetectie		1,00	pst	2028										■											
Vervangen armaturen binnenlamp		570,00	st	2028	18									■											
Vervangen lampen binnen		570,00	st	2018	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6311 Elektra schakelmateriaal																									
Herstellen	Schakelmateriaal niet deugdelijk bevestigd	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen schakelmateriaal		1,00	pst	2044	36																				
64 Communicatie																									
6422 Huistelefoon-installatie	Kantoor																								
Vervangen huistelefooninstallatie		1,00	st	2028	15									■											
65 Beveiliging																									
6511 Brandmeldinstallatie totaal																									
Vervangen brandmeldinstallatie besturingskast		1,00	st	2026	15							■													

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Vervangen brandmeldinstallatie centrale, paneel en ontruimingspaneel		1,00	st	2026	15
	Vervangen brandmeldinstallatie flitslicht		1,00	st	2026	15
	Vervangen brandmeldinstallatie handmelder		10,00	st	2026	15
	Vervangen brandmeldinstallatie meldsirene		9,00	st	2026	15
	Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder		31,00	st	2026	15
	Vervangen brandmeldinstallatie accu		1,00	st	2022	5
6513	Brandslang haspel	Verkeersruimte				
	Keuren	Ontbrekende keurings sticker brandmeldinstallatie (wetgeving)	1,00	st	2020	
	Vervangen brandslang haspel		9,00	st	2028	18
6513	Poederblusser	Lokaal				
	Vervangen poederblusser		2,00	st	2023	12
6520	CCTV-camera systeem	Kantoor				
	Vervangen CCTV-camera systeem		5,00	st	2027	10
6521	Inbraakalarminstallatie algemeen					
	Vervangen inbraakalarminstallatie		2899,00	bvo	2028	18
66	**Transport**					
6612	Personenlift (Hydraulische lift)					
	Vervangen aandrijving		1,00	st	2028	18
	Vervangen besturing		1,00	st	2023	15
	Vervangen binnenbekleding		1,00	st	2043	35
	Vervangen lift tableau in cabine		1,00	st	2038	30
	Vervangen liftdeur in cabine		1,00	st	2038	30
	Vervangen liftdeur op bouwlaag		2,00	st	2038	30
	Vervangen tableau op bouwlaag		2,00	st	2038	30
	Reviseren aandrijving		1,00	st	2027	9
	Reviseren liftdeur in cabine		1,00	st	2023	15
	Reviseren liftdeur op bouwlaag		2,00	st	2023	15
67	**Gebouwbeheersvoorzieningen**					
6710	Valbeveiliging algemeen	Dak				
	Vervangen valbeveiliging		1,00	pst	2033	25
73	**Vaste keukenvoorzieningen**					
7311	Keukenblok < 1.5 m.	Lokaal (1.18 en 1.26)				
	Vervangen keukenblok <=1.5 m		2,00	st	2032	24
7311	Keukenblok > 2.0 m.	Aula, personeelsruimte				
	Vervangen keukenblok >=2.0 m		2,00	st	2032	24
7312	Afzuigkap keukenblok algemeen	Lokaal (1.26)				
	Vervangen afzuigkap		1,00	st	2027	10

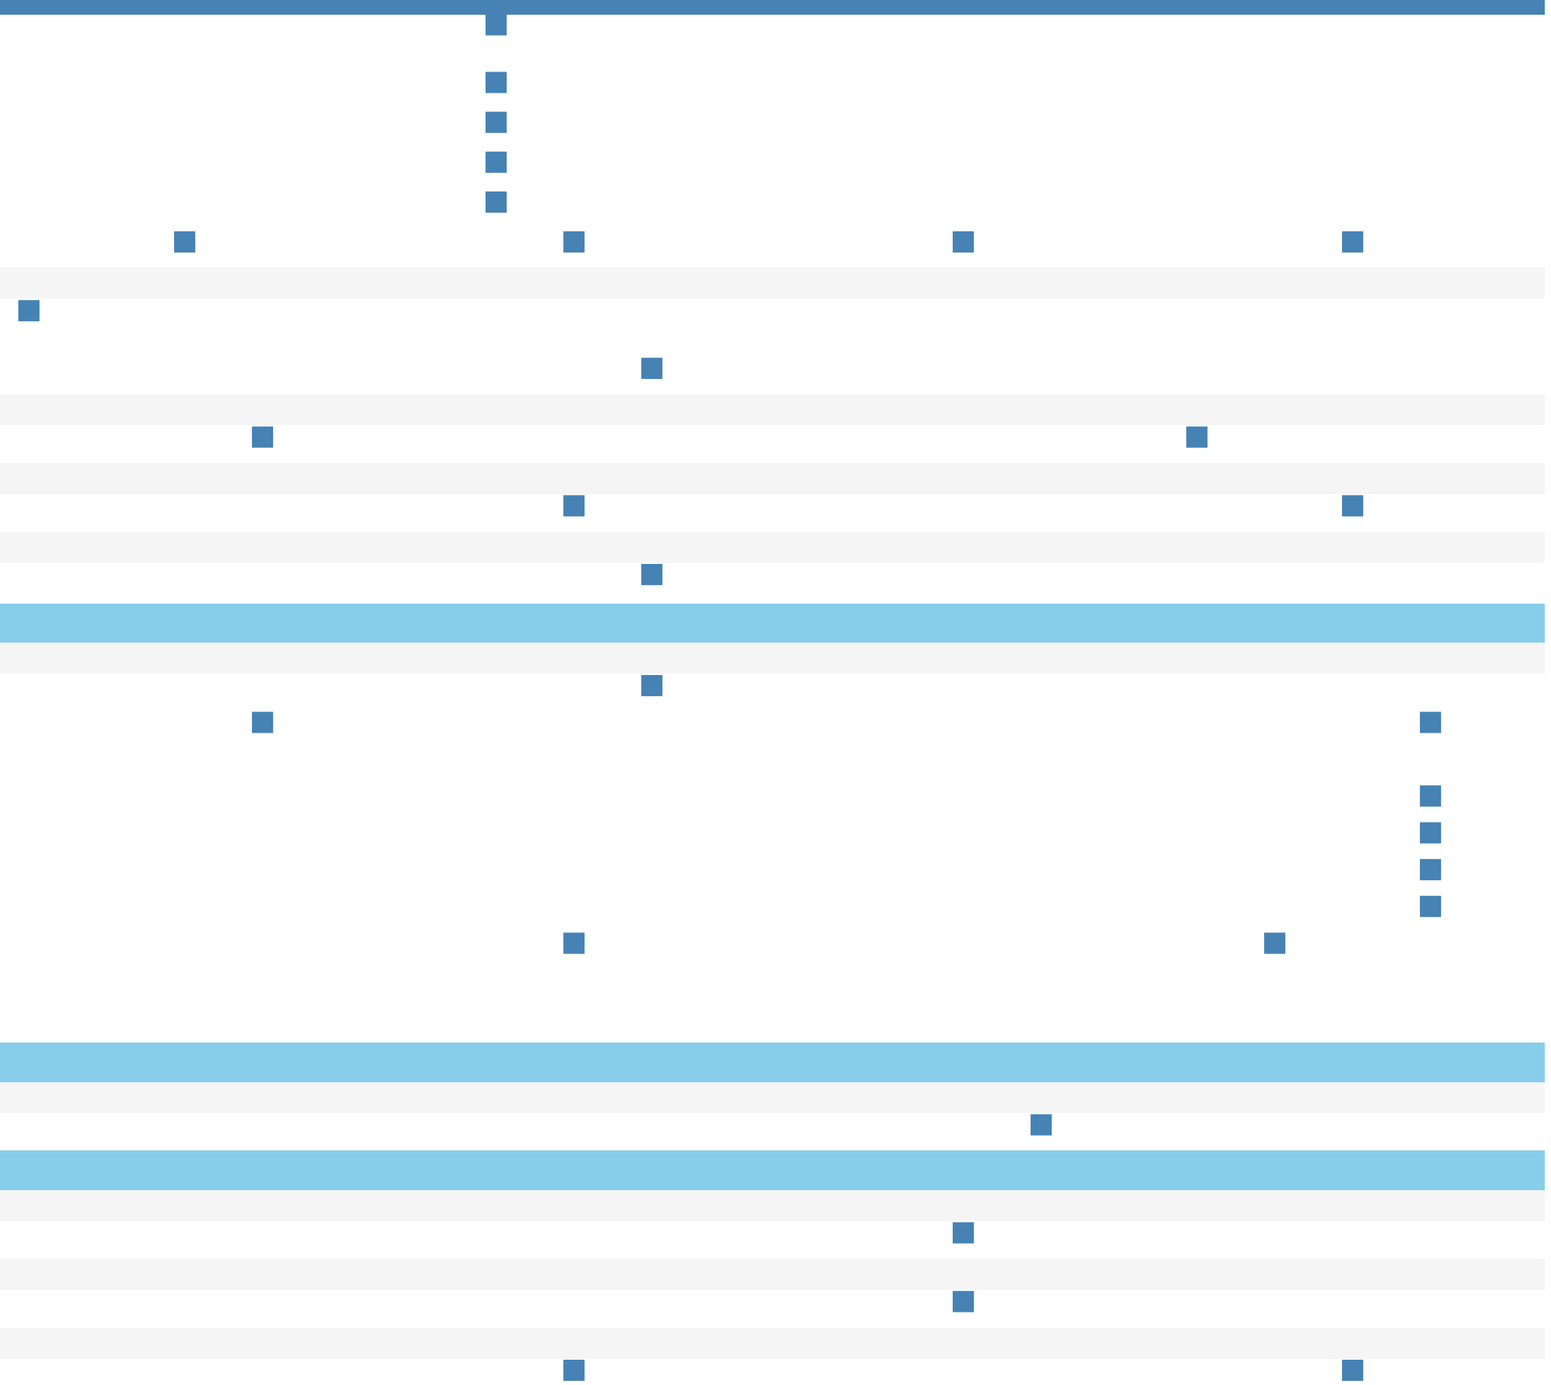

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
74 Vaste sanitairvoorzieningen																									
7410 Sanitaire kitvoeg	Natte ruimte																								
Vervangen kitvoeg binnenwand		330,00	m1	2024	15					■															■
7411 Wastafelcombinatie algemeen	Natte ruimte																								
Vervangen wastafelcombinatie		12,00	st	2033	25														■						
7411 Toilet wandcloset	Natte ruimte																								
Vervangen toilet		22,00	st	2033	25														■						
7411 Wastrogcombinatie RVS	Natte ruimte																								
Vervangen wastrogcombinatie		4,00	st	2033	25														■						
7411 Douchecombinatie algemeen	Natte ruimte, gymzaal																								
Vervangen douchecombinatie		7,00	st	2033	25														■						
7411 Uitstortgootsteen	Overig (berging)																								
Vervangen uitstortgootsteen		4,00	st	2033	25														■						
90 Terrein																									
9022 Opstallen rijwielstalling	Terrein																								
Vervangen overkapping		16,00	m2	2033	25														■						
9032 Terreinafscheiding hekwerk metaal	Terrein																								
Vervangen terreinafscheiding hekwerk metaal		47,00	m1	2056	48																				
9034 Toegangspoort metaal	Terrein																								
■ Herstellen	Hang & sluitwerk, corrosie	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen poort staal		2,00	st	2056	48																				
9041 Terreinverharding betontegels	Terrein																								
■ Herstellen	Verzakking, kuilvorming	1,00	pst	2020		■																			
■ Reinigen	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2020		■																			
Herstraten/herstellen betontegels		2140,00	m2	2028	10									■											■
9041 Terreinverharding rubbertegels	Terrein																								
Vervangen rubbertegels		40,00	m2	2038	30																				■
9071 Terreinmeubilering bank algemeen	Terrein																								
Vervangen bank		3,00	st	2038	30																				■
9074 Terreinmeubilering vlaggenmast algemeen	Terrein																								
Vervangen vlaggenmast		3,00	st	2038	30																				■
9081 Terreinmeubilering rijwielstaanders	Terrein																								
Vervangen rijwielstaanders		8,00	st	2038	30																				■
99 Algemeen																									
9999 Herinspectie <adviesbureau>																									
Herinspectie <adviesbureau>		1,00	pst	2022	3			■			■			■			■			■			■		
9999 Inspectie volgens NEN 3140																									
OC - Inspectie conform NEN 3140 - Hoppenbrouwers Elektrotechniek BV		1,00	pst	2020	5	■					■					■					■				
9999 Klachten onderhoud bouwkundig																									
Klachten onderhoud bouwkundig		2899,00	bvo	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9999 Klachten onderhoud installaties																									

92147-1 (S3) • VSO Parcours
Generaal Smutslaan 9 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	Klachten onderhoud installaties algemeen		2899,00	bvo	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9999	Onderhoudscontracten (en keuringen)																									
	Buitenriolering algemeen doorspuiten		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	gaskeuring		1,00	pst	2020	4	■				■				■				■				■			
	Halogeenlamp vervangen		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lichtstraat alg. div. mat. reinigen		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - brandmeld- en ontruimingsinst. - Hoppenbrouwers		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - inbraaksignaleringssysteem - Hoppenbrouwers		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - lift		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC- Meldkamer (abonnement) - Hoppenbrouwers		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - Noodverl. & vluchtwegsign. - Hoppenbrouwers		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - Noodverl., vluchtwegsign. & accu's - Hoppenbrouwers		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - W-installaties - H. de Bont B.V.		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	PL-lampen/buizen > 8W vervangen		1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	TL-buizen vervangen		29,85	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Tl-buizen vervangen (gymzaal)		64,00	pst	2020	4	■				■				■				■				■			
