Planning 20 - Jaren

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen

Generaal Smutslaan 11
5021 XA Tilburg

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.


Printdatum: 22-9-2020

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
21 Buitenwanden																									
2110 Loodslabben opgaand werk																									
Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen loodslabben opgaand werk		40,00	m1	2060	48																				
22 Binnenwanden																									
2213 Paneelwand																									
Vervangen paneelwand		59,40	m2	2031	15												■								
2221 Binnenwand schoonmetselwerk																									
Vervangen schoonwerk metselwerk		980,00	m2	2070	60																				
24 Trappen en hellingen																									
2410 Binnentrap beton																									
Vervangen binnentrappen beton		2,00	st	2056	48																				
27 Daken																									
2713 Prefab luifel metaal																									
Herstellen	Doorbuiging	1,00	pst	2020		■																			
Vervangen prefab luifel metaal		12,00	m2	2044	30																				
31 Buitenwandopeningen																									
3120 Zonwering uitvalscherm compleet elektrisch																									
Vervangen uitvalscherm		18,00	m1	2040	25																				
3120 Ventilatierooster aluminium																									
Vervangen ventilatie rooster aluminium		68,00	st	2023	48				■																
3120 Ventilatie plafond / gevel rooster staal																									
Vervangen ventilatie rooster staal		156,00	st	2060	48																				
3120 Zonwering screens elektrisch																									
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2020			■																		
Vervangen zonwering screen		210,00	m1	2040	25																				
3120 Raamdorpel aluminium																									
Aanbrengen	Ontbrekende (onder-)delen	1,00	pst	2020			■																		
Vervangen raamdorpel aluminium		152,00	m1	2048	40																				
3120 Kozijn buiten aluminium																									
Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2020			■																		
Herstellen	Bevestiging secundair, manco	1,00	pst	2020			■																		
Herstellen	Gebreken aan kitwerken	1,00	pst	2020			■																		
Herstellen d.m.v. waxen (na reinigen)	Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk	1,00	pst	2020			■																		
Vervangen kozijn aluminium		390,00	m2	2048	40																				
Reinigen kozijn aluminium		390,00	m2	2022	6			■					■						■						
3120 Beglazing HR++																									
Vervangen beglazing HR++		320,00	m2	2048	40																				
3122 Draai/val/uitzet raam aluminium																									
Vervangen raam aluminium		78,00	st	2048	40																				


92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
3131 Buitendeur aluminium					
Vervangen buitendeur aluminium		21,00	st	2048	40
Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		21,00	st	2034	20
3140 Schuifpui buiten aluminium					
Vervangen schuifpui aluminium inclusief beglazing		1,00	st	2060	40
32 Binnenwandopeningen					
3230 Kozijnen binnen hout					
Herstellen tijdens schilderbeurt	Beschadiging kozijn	1,00	pst	2029	
Vervangen kozijn hout		637,00	m2	2048	40
3231 Binnendeur hout					
Herstellen hang en sluitwerk binnendeuren		245,00	st	2021	3
Vervangen binnendeur hout		245,00	st	2048	40
37 Dakopeningen					
3721 Lichtstraat aluminium + glas	Schoolgebouw				
Herstellen	Openstaande verbindingen	1,00	pst	2020	
Vervangen lichtstraat aluminium + glas		9,60	m2	2044	30
41 Buitenwandafwerkingen					
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol					
Vervangen voegwerk platvol		1100,00	m2	2060	48
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol	Binnenwanden				
Vervangen voegwerk platvol		980,00	m2	2060	48
4111 Gevelafwerking stucwerk					
Vervangen stucwerk		444,00	m2	2044	30
42 Binnenwandafwerkingen					
4211 Binnenwandafwerking spuitwerk	Sporthal				
Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	pst	2028	
Vervangen wandafwerking spuitwerk		132,00	m2	2048	48
4212 Wandafwerking tegels	Keuken school				
Vervangen wandafwerking wandtegels		5,20	m2	2060	48
4212 Wandafwerking tegels	Schoolgebouw, natte ruimten				
Herstellen	Beschadiging	1,00	pst	2020	
Vervangen wandafwerking wandtegels		82,00	m2	2060	48
4212 Wandafwerking tegels	Gymzaal, natte ruimten				
Herstellen	Scheuren niet constructief	1,00	pst	2020	
Vervangen wandafwerking wandtegels		106,00	m2	2060	48
4212 Wandafwerking tegels	Lokaal, overig				
Vervangen wandafwerking wandtegels		28,00	m2	2060	48
4212 Binnenwandafwerking behangwerk (Scan)	Schoolgebouw				
Vervangen behangwerk		3064,00	m2	2044	30

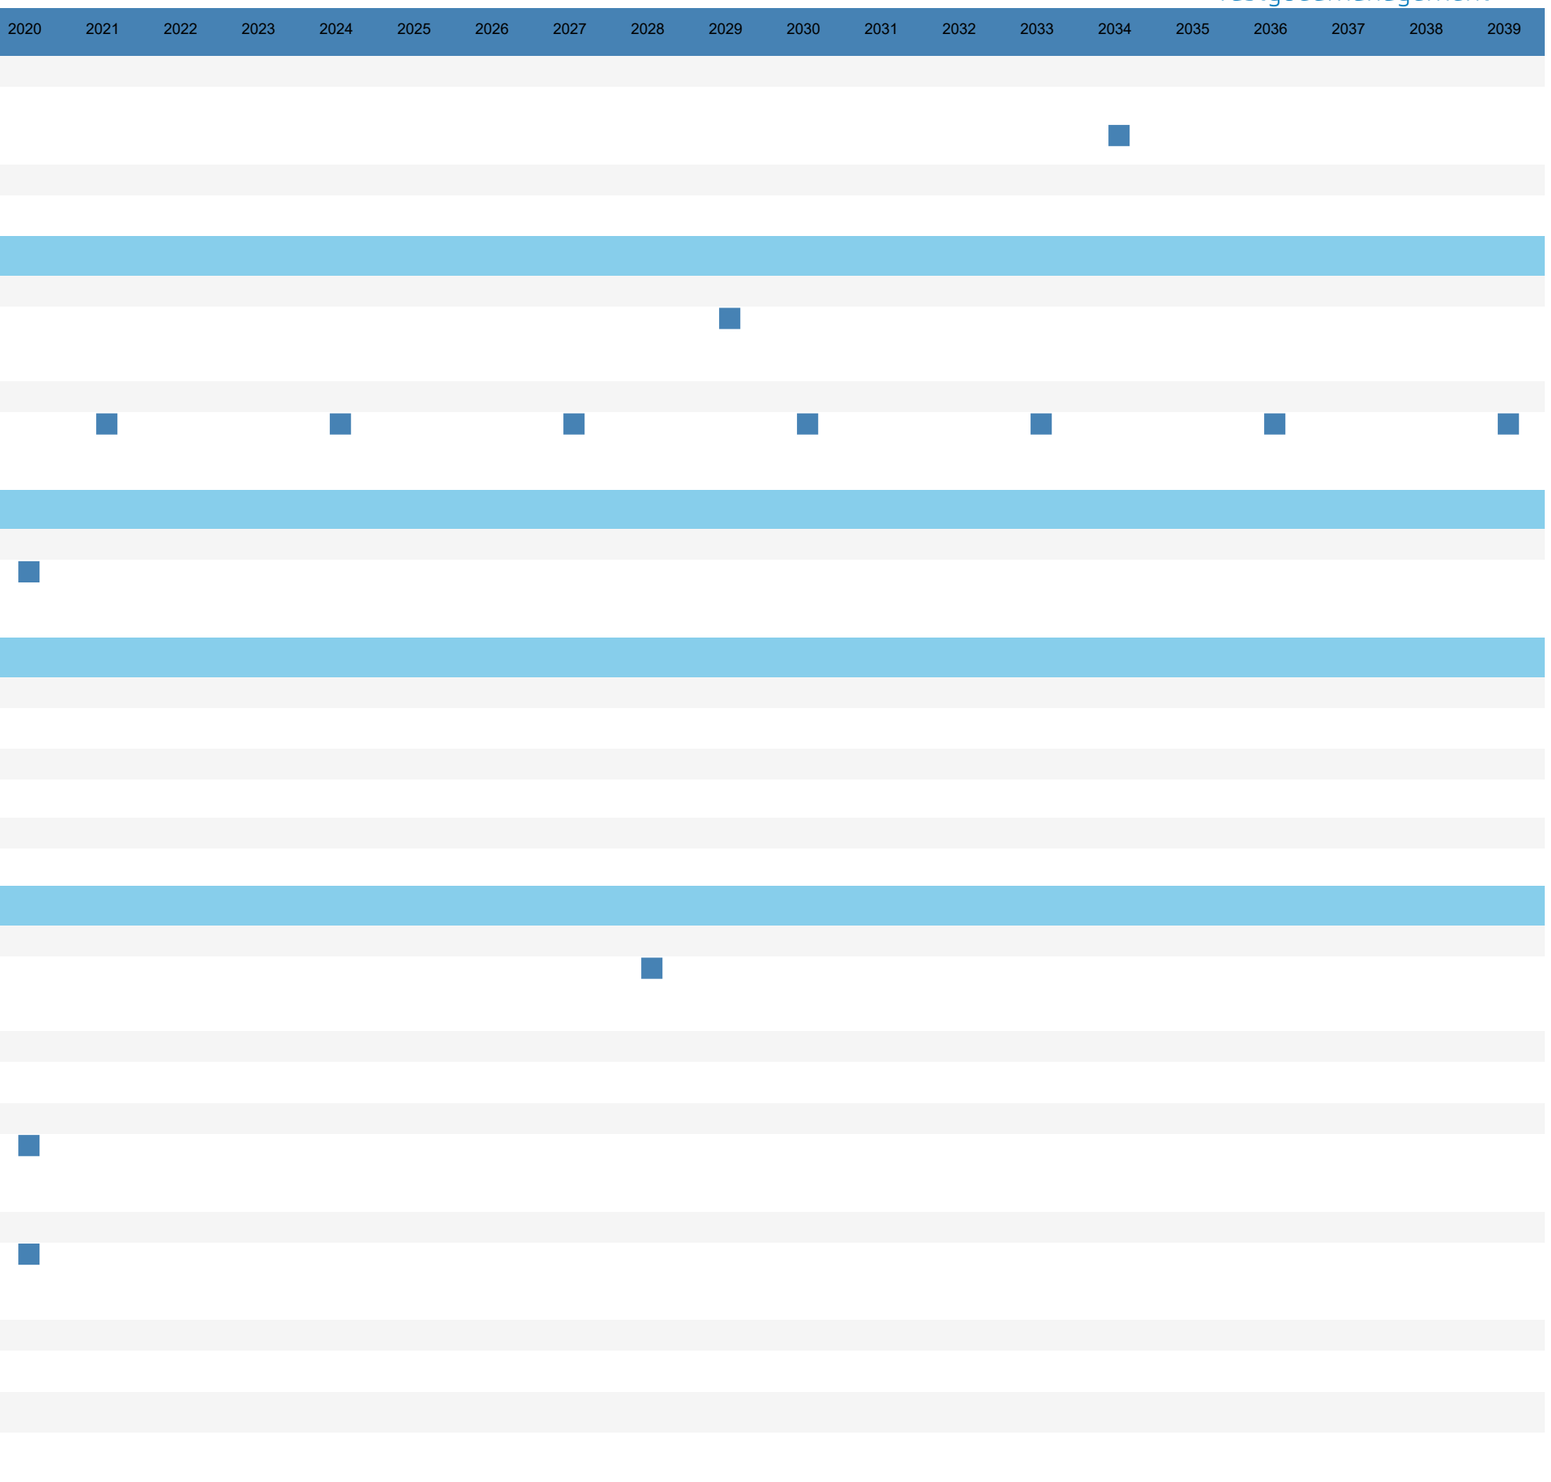


92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
43 Vloerafwerkingen					
4321 Vloerafwerking sportvloer	Schoolgebouw, speelhal				
Vervangen vloerafwerking sportvloer		85,00	m2	2044	30
Vervangen belijning		85,00	m2	2027	10
4321 Vloerafwerking sportvloer	Sporthal				
Vervangen vloerafwerking sportvloer		385,00	m2	2044	30
Vervangen belijning		385,00	m2	2027	10
4321 Vloerafwerking schoonloopmat	Schoolgebouw				
Vervangen vloerafwerking schoonloopmat		56,00	m2	2031	15
4321 Vloerafwerking schoonloopmat	Sporthal				
Vervangen vloerafwerking schoonloopmat		12,00	m2	2024	15
4321 Vloerafwerking linoleum	Lokaal				
Vervangen vloerafwerking linoleum		1204,00	m2	2034	30
Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		1204,00	m2	2021	3
4321 Vloerafwerking linoleum	Verkeersruimten				
Vervangen vloerafwerking linoleum		470,00	m2	2034	30
Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		470,00	m2	2021	3
4321 Vloerafwerking linoleum	Overig (berging/techniek)				
Vervangen vloerafwerking linoleum		60,00	m2	2034	30
Reinigen en sealen vloerafwerking linoleum		60,00	m2	2021	3
4321 Vloerafwerking tapijt	Kantoor				
Vervangen tapijt		332,00	m2	2044	30
4321 Vloerafwerking kunsthars (gietvloer)	Natte ruimten en keuken				
Vervangen vloerafwerking kunsthars (gietvloer)		111,00	m2	2029	30
4321 Vloerafwerking kunsthars (gietvloer)	Technische ruimte school				
Vervangen vloerafwerking kunsthars		21,00	m2	2029	30
4322 Vloerafwerking tegels	Sporthal				
Vervangen vloerafwerking tegels		130,00	m2	2060	48
45 Plafondafwerkingen					
4511 Plafondafwerking multiplex	Buitenplafond onderdoorgang				
Vervangen plafondafwerking multiplex		192,00	m2	2060	48
4512 Systeemplafond					
Vervangen systeemplafond		2664,00	m2	2048	40
Herstellen / uitwisselen plafondplaat		2664,00	m2	2020	
46 Schilderwerk					
4621 Buitenschilderwerk stucwerk					
Groot schilderwerk stucwerk		444,00	m2	2029	12
4622 Binnenschilderwerk hout dekkend					
Groot schilderwerk hout dekkend		124,00	m2	2029	12
4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig)					

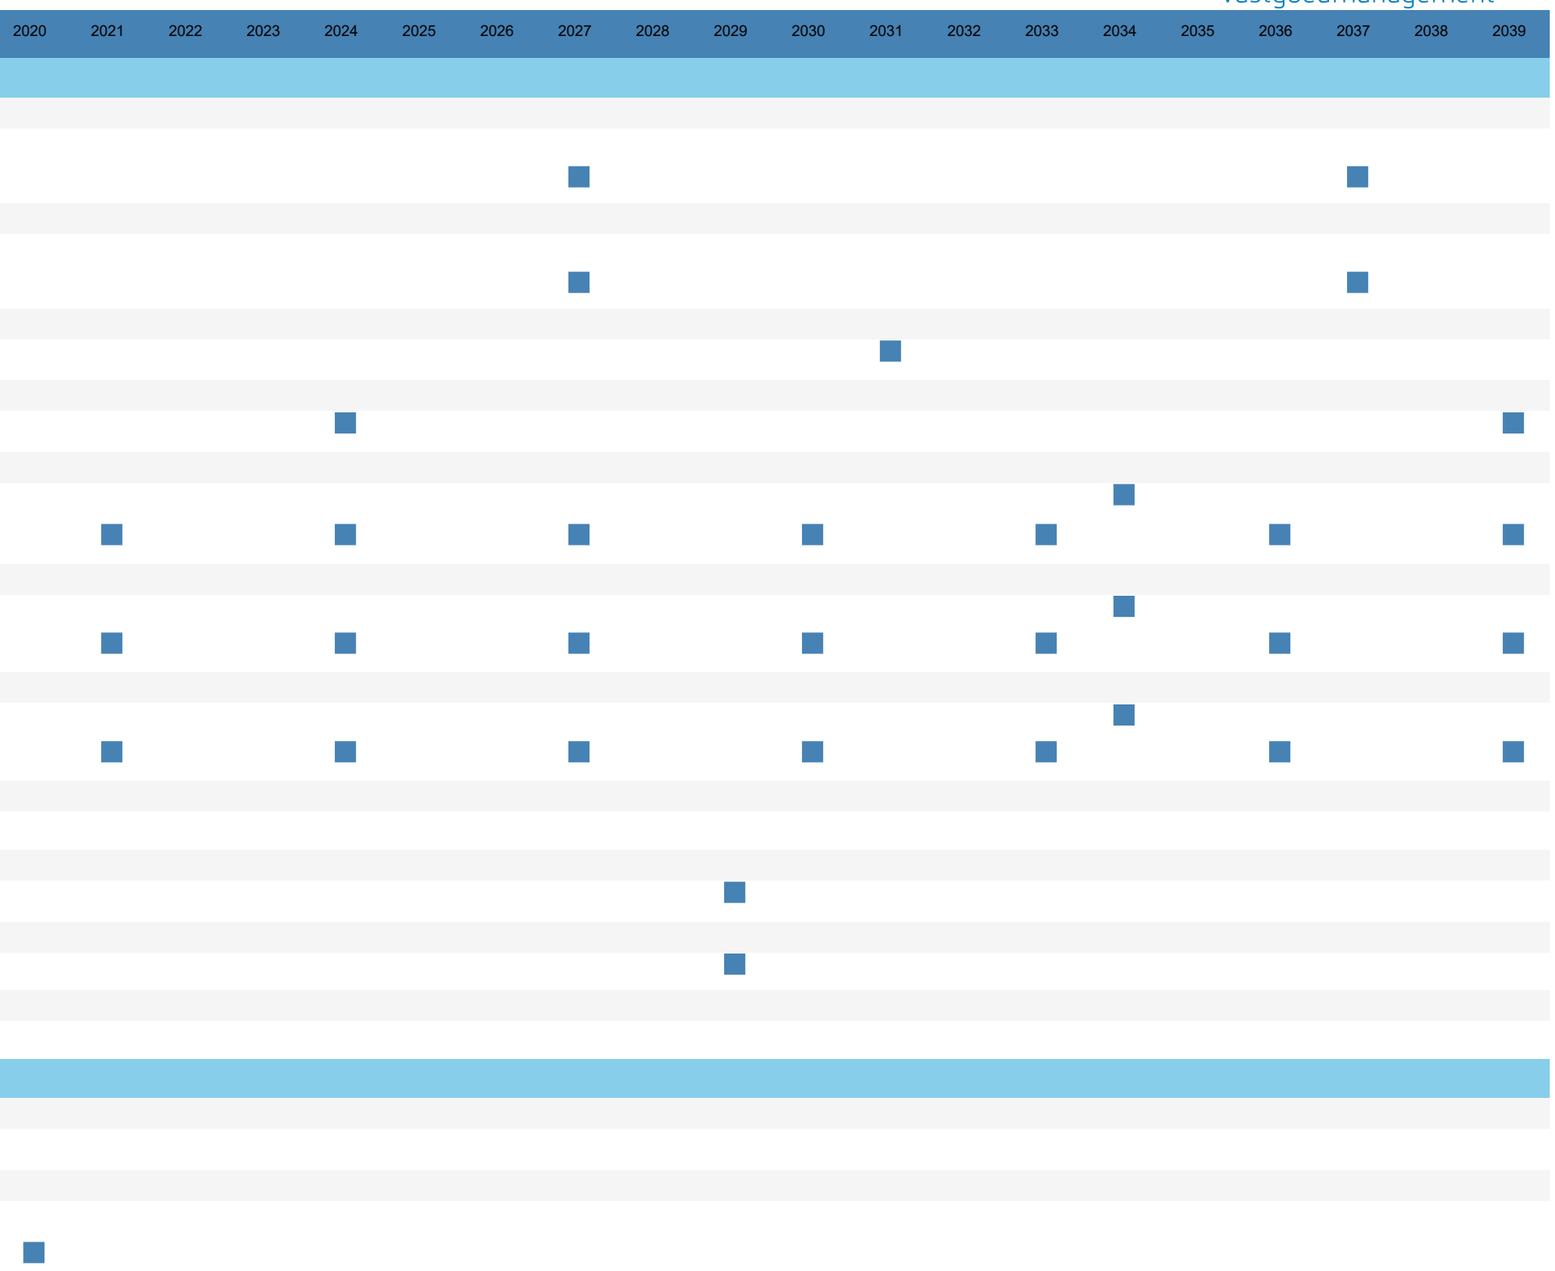

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		245,00	st	2029	12
4622	Binnenschilderwerk behangwerk					
	Groot schilderwerk stucwerk		3064,00	m2	2023	12
4622	Binnenschilderwerk spuitwerk	Sporthal				
	Groot schilderwerk stucwerk		132,00	m2	2029	12
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend					
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		637,00	m2	2029	12
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend					
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend		192,00	m2	2023	6
47	**Dakafwerkingen**					
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Schoolgebouw				
	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2020	
	Vervangen daktrim aluminium		372,00	m1	2032	20
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Sporthal				
	Vervangen daktrim aluminium		108,00	m1	2025	20
4711	Dakbedekking bitumen + grindballast	Schoolgebouw				
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		608,00	m2	2052	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		608,00	m2	2032	20
	Vervangen grind		608,00	m2	2052	40
4711	Dakbedekking bitumen	Schoolgebouw				
	Vervangen dakbedekking bitumen		1072,00	m2	2041	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		1072,00	m2	2021	20
	Verduurzamen: 4.1 PV-Panelen (184 st.)		1,00	pst	2021	
4711	Dakbedekking bitumen + grindballast	Sporthal				
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		183,00	m2	2052	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		183,00	m2	2032	20
	Vervangen grind		183,00	m2	2052	40
4711	Dakbedekking bitumen	Sporthal				
	Vervangen dakbedekking bitumen		280,00	m2	2045	40
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen		280,00	m2	2025	20
51	**Warmteopwekking**					
5121	CV-pomp individueel	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen CV-pomp individueel		1,00	st	2034	20
5121	CV-pomp individueel	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen CV-pomp individueel		1,00	st	2034	20
5121	CV-pomp individueel	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen CV-pomp individueel		1,00	st	2034	20
5121	CV-pomp individueel	Overig (berging/techniek)				
	Vervangen CV-pomp individueel		3,00	st	2028	20




92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5121 CV-ketel HR	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen cv-ketel HR		3,00	st	2028	18									■											
5121 CV-ketel HR	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen cv-ketel HR		2,00	st	2028	18									■											
52 Afvoeren																									
5211 Hemelwaterafvoer pvc																									
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		65,00	m1	2041	24																				
5212 Hemelwaterafvoer pluvia (inpandig)	Schoolgebouw																								
Vervangen hemelwaterafvoer pluvia		18,00	m1	2033	40														■						
53 Water																									
5321 Boiler elektrisch 80 liter	Sporthal																								
Vervangen boiler elektrisch 80 l		1,00	st	2028	18									■											
5321 Boiler elektrisch 80 liter	Schoolgebouw																								
Vervangen boiler elektrisch 80 l		1,00	st	2028	18									■											
5321 Close-in boiler	Schoolgebouw																								
Vervangen boiler close-in		4,00	st	2028	18									■											
55 Koudeopwekking																									
5512 Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW	Schoolgebouw																								
Vervangen splitsysteem		2,00	st	2023	15				■															■	
56 Warmtedistributie																									
5610 Inregelafsluiter warmtedistrib. < DN 20	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen inregelafsluiter		2,00	st	2023	15				■															■	
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen inregelafsluiter		2,00	st	2023	15				■															■	
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 40	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen inregelafsluiter		2,00	st	2023	15				■															■	
5610 Inregelafsluiter warmtedistributie DN 65	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen inregelafsluiter		1,00	st	2023	15				■															■	
5610 CV-expansievat collectief	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen CV-expansievat collectief		1,00	st	2026	12							■												■	
5610 CV-expansievat collectief	Overig (berging/techniek)																								
Vervangen CV-expansievat collectief		1,00	st	2026	12							■												■	
5611 Radiatoren	Schoolgebouw																								
Vervangen radiator		96,00	st	2041	40																				
5630 Luchtafscheider	Overig (berging/techniek)																								
Leidingen lucht algemeen		1,00	pm	2042	25																				

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
57 Luchtbehandeling					
5721 Dakventilator algemeen	Dak Sporthal				
Vervangen dakventilator		3,00	st	2029	15
5721 Dakventilator algemeen	Dak Schoolgebouw				
Vervangen dakventilator		3,00	st	2023	15
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet toileten		3,00	pst	2020	
5721 Dakventilator algemeen	Dak Schoolgebouw				
Vervangen dakventilator		5,00	st	2023	15
5721 Dakventilator algemeen	Dak Schoolgebouw				
Vervangen dakventilator		2,00	st	2023	15
5771 Luchtkanalen ventilatie					
Reinigen luchtkanalen		2900,00	bvo	2021	8
5771 Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s	Dak schoolgebouw				
Vervangen luchtbehandelingskast toevoer		2,00	st	2042	25
Verduurzamen: meting luchtsnelheden & omgevings temperatuur		2,00	pst	2021	
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet leslokalen		2,00	pst	2020	
Verduurzamen: aanbrengen CO-regeling per lokaal incl. aanpassen toeren regeling		2,00	pst	2033	
Verduurzamen: aanbrengen gebouwbeheersysteem		1,00	pst	2020	
5771 Luchtbehandelingskast toevoer 0,6 - 1,4 m3/s	Dak schoolgebouw				
Vervangen luchtbehandelingskast toevoer		2,00	st	2042	25
Verduurzamen: meting luchtsnelheden & omgevings temperatuur		2,00	pst	2021	
Verduurzamen: vergroten ventilatiedebiet leslokalen		2,00	pst	2020	
Verduurzamen: aanbrengen CO-regeling per lokaal incl. aanpassen toeren regeling		2,00	pst	2033	
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen					
6111 Noodverlichtingsinstallatie totaal	Schoolgebouw				
Vervangen noodverlichting / pictogrammen		49,00	st	2024	18
Vervangen accu's		49,00	st	2020	4
6171 Bliksembeveilingsinstallatie	Schoolgebouw				
Vervangen bliksembeveiliging-installatie		1,00	pst	2035	18
62 Krachtstroom					
6221 Verdeelkast (regelkast techniek)	Overig (berging/techniek)				
Vervangen verdeelkast (laagspanning)		2,00	st	2045	40
6221 Verdeelkast (hoofd)	Schoolgebouw				
Vervangen verdeelkast (laagspanning)		1,00	st	2045	40

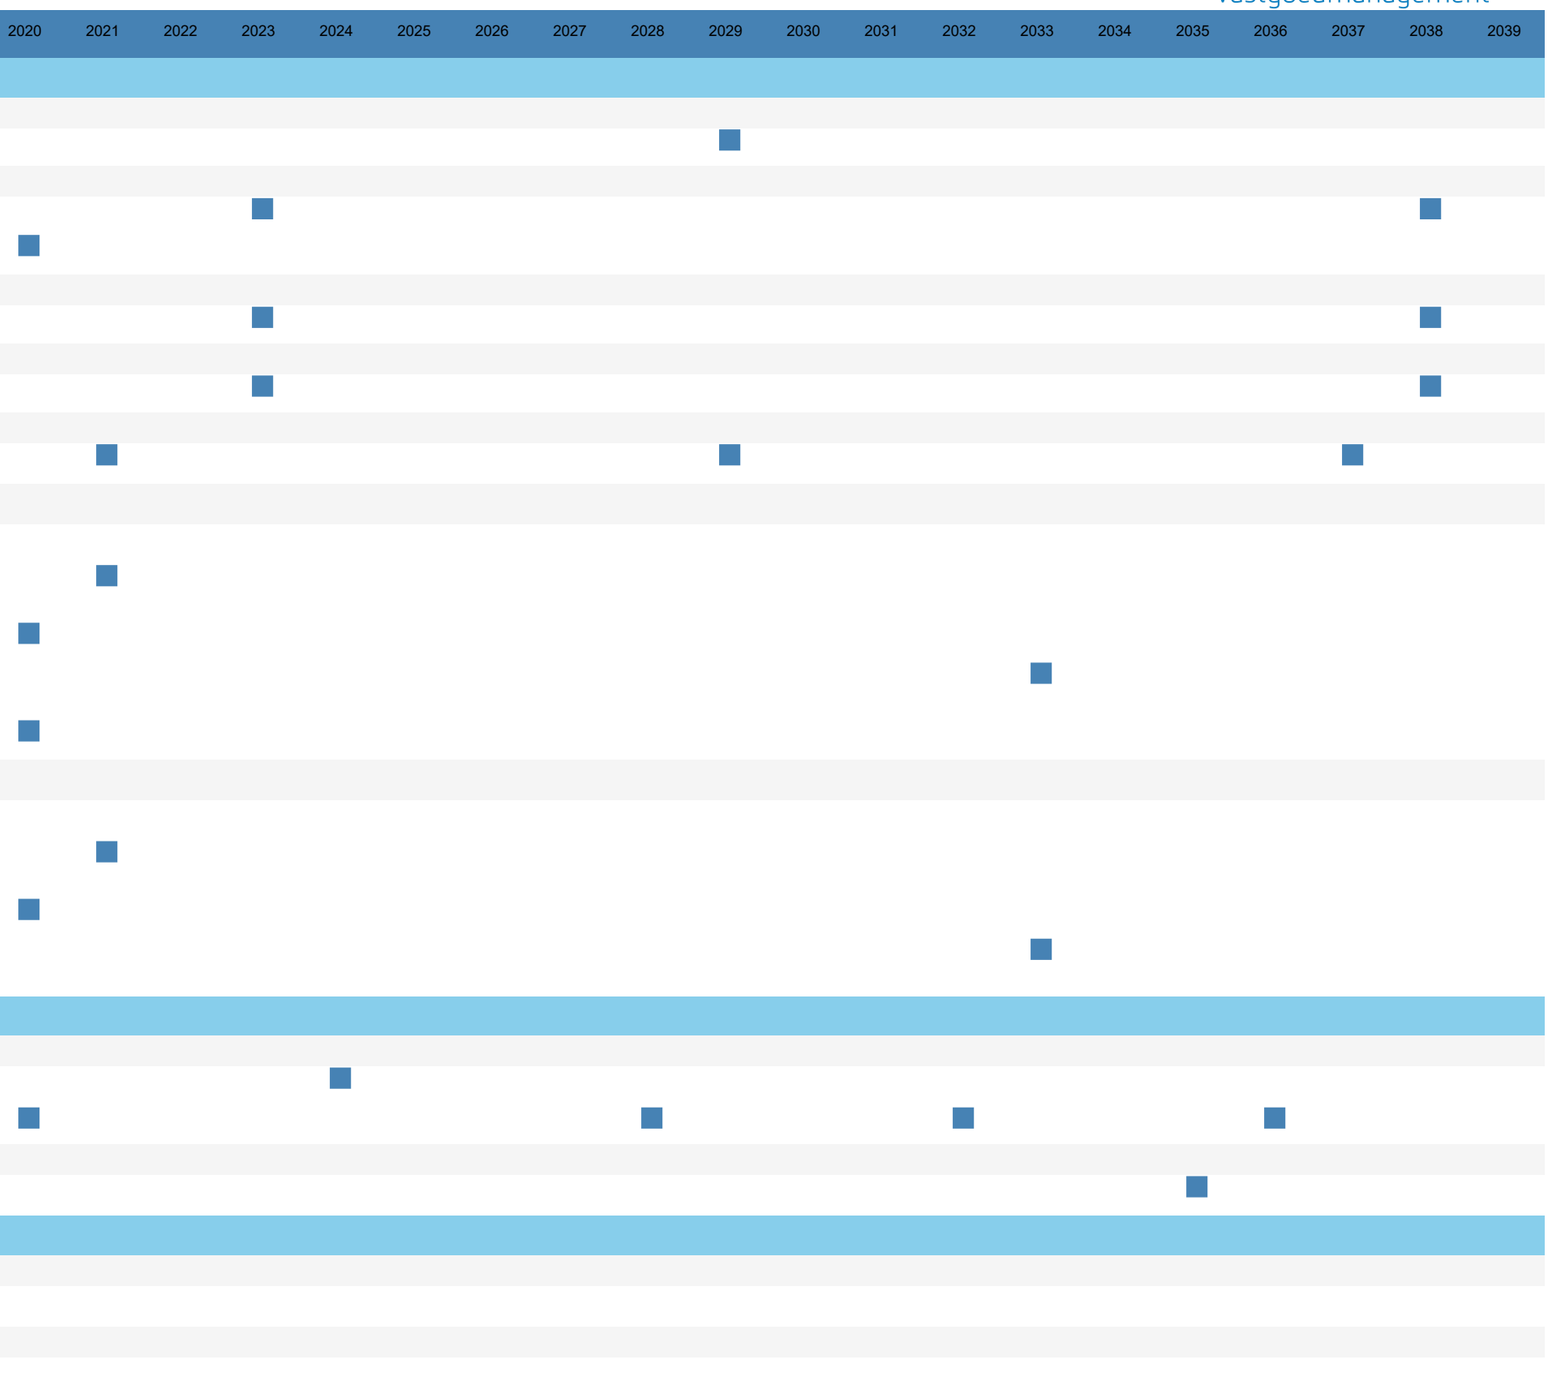

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
63 Verlichting																									
6311 Elektra armaturen binnenlamp	Schoolgebouw																								
Verduurzamen: 3.2. Energiezuinige HF verlichting icm. veegschakeling, daglicht		1,00	pst	2023					■																
Vervangen armaturen binnenlamp		762,00	st	2023	18				■																
Vervangen lampen binnen		762,00	st	2019	2		■				■		■		■		■		■		■		■		■
6311 Elektra armaturen buitenlamp																									
Vervangen armaturen buitenlamp		15,00	st	2023	18				■																
Vervangen lampen buiten		15,00	st	2019	2		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
64 Communicatie																									
6422 Huistelefoon-installatie	Schoolgebouw																								
Vervangen huistelefooninstallatie		1,00	pst	2023	15				■															■	
65 Beveiliging																									
6511 Brandmeldinstallatie totaal	Schoolgebouw																								
Vervangen	Gebreken secundaire	1,00	pst	2019																					
Vervangen brandmeldinstallatie besturingskast		1,00	st	2032	15													■							
Vervangen brandmeldinstallatie centrale, paneel en ontruimingspaneel		1,00	st	2032	15													■							
Vervangen brandmeldinstallatie flitslicht		9,00	st	2032	15													■							
Vervangen brandmeldinstallatie handmelder		17,00	st	2042	25																				
Vervangen brandmeldinstallatie meldsirene		33,00	st	2032	15													■							
Vervangen brandmeldinstallatie nevenindicator		60,00	st	2032	15													■							
Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder		2,00	st	2022	5			■					■										■		
Vervangen brandmeldinstallatie accu																									
6513 Poederblusser	Schoolgebouw																								
Vervangen poederblusser		5,00	st	2024	12					■											■				
6513 Brandslang haspel	Schoolgebouw																								
Vervangen brandslang haspel		10,00	st	2024	18					■															
6521 Inbraakalarminstallatie algemeen	Schoolgebouw																								
Vervangen inbraakalarminstallatie		2900,00	bvo	2024	18					■															
66 Transport																									
6612 Personenlift (Hydraulische lift)	Schoolgebouw																								
Vervangen aandrijving		1,00	st	2023	18				■																
Vervangen besturing		1,00	st	2020	15		■														■				
Vervangen binnenbekleding		1,00	st	2040	35																				
Vervangen lift tableau in cabine		1,00	st	2035	30																■				
Vervangen liftdeur in cabine		1,00	st	2035	30																■				
Vervangen liftdeur op bouwlaag		3,00	st	2035	30																■				
Vervangen tableau op bouwlaag		3,00	st	2035	30																■				
Reviseren aandrijving		1,00	st	2032	9													■							

Code	Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy
	Reviseren liftdeur in cabine		1,00	st	2020	15
	Reviseren liftdeur op bouwlaag		1,00	st	2020	15
73	**Vaste keukenvoorzieningen**					
7311	Keukenblok > 2.0 m.					
	Vervangen keukenblok >=2.0 m		2,00	st	2039	24
7311	Keukenblok 1.5-2.0 m.					
	Vervangen keukenblok 1.5-2.0 m		3,00	st	2039	24
74	**Vaste sanitairvoorzieningen**					
7410	Sanitaire kitvoeg	Natte ruimten				
	Vervangen kitvoeg binnenwand		325,00	m1	2023	15
7411	Wastafelcombinatie algemeen	Natte ruimten				
	Vervangen wastafelcombinatie		35,00	st	2030	25
7411	Toilet wand/staan closet	Natte ruimten				
	Vervangen toilet		40,00	st	2030	25
7411	Sanitair toilet-schot	Natte ruimten				
	Herstellen	Ontbreken van onderdeel dat functionaliteit niet aantast	1,00	pst	2019	
	Vervangen douche-cabine		12,00	st	2029	24
7411	Douchecombinatie algemeen	Natte ruimten				
	Vervangen douchecombinatie		12,00	st	2030	25
90	**Terrein**					
9022	Overkapping rijwielstalling	Terrein, fietsenstalling / opslag				
	Vervangen overkapping		35,00	m2	2040	25
9031	Tuinmuur metselwerk					
	Nader onderzoek en herstellen	Scheuren constructief	1,00	pst	2020	
	Vervangen metselwerk		80,00	m2	2070	60
9031	Tuinmuur afwerklaag voegwerk					
	Herstellen	Erosie, verwering, verzanding	1,00	pst	2020	
	Vervangen voegwerk		160,00	m2	2036	50
9032	Terreinafscheiding hekwerk metaal	Terrein				
	Nader onderzoek en herstel	Deformatie, scheefstand	1,00	pst	2020	
	Reinigen	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2020	
	Vervangen terreinafscheiding hekwerk metaal		120,00	m1	2030	48
9041	Terreinverharding kunstgras sportveld	Terrein				
	Vervangen kunstgras		126,00	m2	2031	15
9041	Terreinverharding betontegels	Terrein, speelplaats				
	Herstraten/herstellen betontegels		2000,00	m2	2024	10
9071	Terreinmeubilering bank	Terrein				
	Vervangen bank		9,00	st	2044	30
9081	Terreinmeubilering rijwielstaanders	Terrein, fietsenstalling				
	Vervangen rijwielstaanders		7,00	st	2044	30

92151-1 (S3) • SBO Zonnesteen
Generaal Smutslaan 11 • Tilburg

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
99	**Algemeen**																								
9999	Onderhoudscontracten (en keuringen)																								
	Gasleiding controle	1,00	pst	2015	4				■				■				■				■				■
	Luchtbeh.kast filters vervangen	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - afvalinzameling - BAT	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - beveiligingsinstallatie inbraak - van Hees Elektrotech.	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - brandblusapparatuur en noodverlichting - Saval	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - dakonderhoud - Dakdekkers gebr. Beelen	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - E-installatie - van Hees Elektrotechniek	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - Klim-gim apparaten - Schilte	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - onderhoud alu. Koz. - van de Gevel Totaal Service	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - Plateaulift - ThijssenKrup monoliften	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - Serviceovereenkosmt BMI - van Hees Elektrotech.	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - speeltoestellen (speelplaats) - YALP	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - toestellen gymzaal - Janssen & Fritsen	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - van Ginkel Professionele Reinigingsservice	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OC - vervangen accu's noodverlichting - Saval	1,00	pst	2017	5			■					■					■					■		
	OC - W-installaties - Immens installatietechniek B.V.	1,00	pst	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Zandbak zand vervangen	1,00	M2	2015	2		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
9999	Klachten onderhoud installaties																								
	Klachten onderhoud installaties algemeen	2900,00	bvo	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9999	Klachten onderhoud bouwkundig																								
	Klachten onderhoud bouwkundig	2900,00	bvo	2019	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9999	Inspectie volgens NEN 3140																								
	OC - Inspectie conform NEN 3140 - Van Hees	1,00	pst	2020	5	■					■					■					■				
9999	Herinspectie <adviesbureau>																								
	Herinspectie <adviesbureau>	1,00	pst	2022	3			■			■			■			■			■			■		
