Projectplanning bouwteam en realisatie P&R Breukelen

Id	Taak	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Opvolgende taken	% voltooid
1	Definitieve gunning opdracht 16815: Bouwteam P+R Breukelen	0 dagen	maa 27-12-21	maa 27-12-21		3	100%
2	**Start bouwteamfase**	**287 dagen**	**maa 10-1-22**	**maa 20-2-23**			**0%**
3	Voorbereiding	1 wk	maa 10-1-22	vri 14-1-22	1	4	0%
4	Opstellen Voorontwerp (VO)	6 wkn	maa 17-1-22	vri 25-2-22	3	5	0%
5	Bestuurlijke besluitvorming	8 wkn	maa 28-2-22	maa 25-4-22	4	6;10	0%
6	Opstellen Definitief Ontwerp (DO)	6 wkn	din 26-4-22	don 9-6-22	5	7;11	0%
7	Aanvraag omgevingsvergunning	1 dag	vri 10-6-22	vri 10-6-22	6	8	0%
8	Verlening omgevingsvergunning (6wkn)	6 wkn	maa 13-6-22	vri 22-7-22	7	9	0%
9	Bezwaartermijn omgevingsvergunning (8wkn)	8 wkn	maa 25-7-22	vri 16-9-22	8	16;10	0%
10	Oplevering bouwrijp kavel	1 dag	maa 19-9-22	maa 19-9-22	5;9	16	0%
11	Contractonderhandelingen realisatie	6 wkn	vri 10-6-22	don 21-7-22	6	12	0%
12	Ondertekening Basisovereenkomst (UAV-gc 2005)	1 dag	vri 22-7-22	vri 22-7-22	11	13;14;15	0%
13	**Realisatiefase**	**151 dagen**	**maa 25-7-22**	**maa 20-2-23**	**12**		**0%**
14	Opstellen UO (incl acceptatie)	5 wkn	maa 25-7-22	vri 26-8-22	12	16	0%
15	Werkvoorbereiding en inkoop	5 wkn	maa 25-7-22	vri 26-8-22	12	16	0%
16	Bouw	20 wkn	din 20-9-22	maa 6-2-23	10;9;14;15	17BE-2 wkn;18	0%
17	Vooroplevering	2 dagen	din 24-1-23	woe 25-1-23	16BE-2 wkn	18	0%
18	Oplevering	1 dag	din 7-2-23	din 7-2-23	16;17	19	0%
19	Restpunten weggewerkt	8 dagen	woe 8-2-23	vri 17-2-23	18	20	0%
20	Acceptatie	1 dag	maa 20-2-23	maa 20-2-23	19		0%

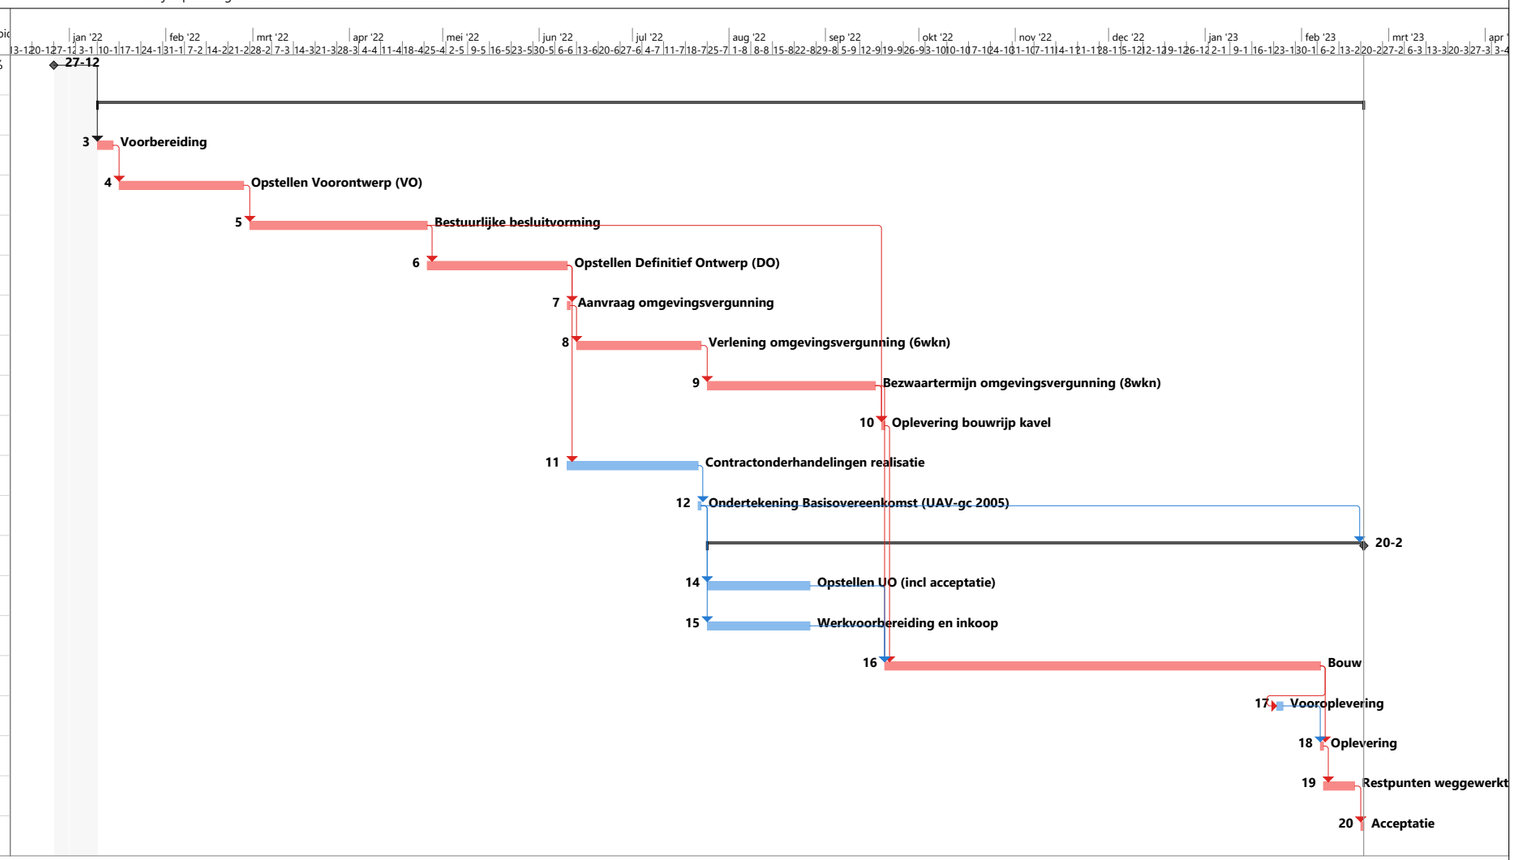

Project: P+R Breukelen
Datum: don 29-7-21

Taak		Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Alleen duur		Alleen begindatum		Externe mijlpaal		Kritieke splitsing	
Splitsing		Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Alleen einddatum		Deadline		Voortgang	
Mijlpaal		Inactieve taken		Handmatig taak		Handmatige samenvatting		Externe taken		Kritiek		Voortgang, handmatig	
