bam

Bouw en Techniek

Regio Noord

GRONINGEN tel (050) 556 50 50

werknummer: Regio Noord
schemanummer: K130067-EDC-Overallplanning
versie: v4
datum: 10-1-2022
status: Realisatie
opgesteld door: AMi / HLu

Nieuwbouw Eemsdeltacampus

Uitvoeringsfase

Overallplanning

soort schema: **Definitief**

Nr	Omschrijving	Start	Eind	Duur	Hoeveelheid
1	**Ruwbouw**	**10-1-2022**	**3-5-2022**	**80d**	
2	**Bouwdeel A - Hart**	**10-1-2022**	**20-1-2022**	**3d**	
3	**bovenbouw**	**10-1-2022**	**20-1-2022**	**3d**	
4	monteren ondersteuning	10-1-2022	14-1-2022	5d	
5	aanbrengen wapening	10-1-2022	14-1-2022	5d	
6	storten betonvloer 160 m3 incl E	20-1-2022	20-1-2022	1d	
7	**Bouwdeel E1 - Sportgebouw**	**19-4-2022**	**22-4-2022**	**4d**	
8	**Constructie bovenbouw**	**19-4-2022**	**22-4-2022**	**4d**	
9	Opbouwen staalcontructie tribune E1	19-4-2022	22-4-2022	4d	
10	**Bouwdeel E2 - Sportgebouw**	**25-4-2022**	**3-5-2022**	**6d**	
11	**Constructie bovenbouw**	**25-4-2022**	**3-5-2022**	**6d**	
12	Opbouwen staalcontructie tribune E2	25-4-2022	3-5-2022	6d	
13	**Bouwdeel G - Kunst & Cultuur en Science**	**10-1-2022**	**17-1-2022**	**3d**	
14	**constructie bovenbouw**	**10-1-2022**	**17-1-2022**	**3d**	
15	aanbrengen kzst wanden	10-1-2022	14-1-2022	2d	
16	aanbrengen prefab beton	17-1-2022	17-1-2022	1d	
17	**Gevel en Dak**	**22-11-2021**	**29-6-2022**	**114d**	
18	**Bouwdeel A - Hart**	**7-2-2022**	**16-6-2022**	**89d**	
19	**Gevel en dak**	**7-2-2022**	**14-4-2022**	**39d**	
20	Vliesgevels plaatsen	7-2-2022	18-3-2022	30d	
21	Aanbrengen dakopstanden en hsb betimmeringen	21-2-2022	31-3-2022	25d	
22	Aanbrengen dampremmer	7-3-2022	18-3-2022	8d	
23	Aanbrengen isolatie	21-3-2022	1-4-2022	9d	
24	Aanbrengen dakbedekking	29-3-2022	14-4-2022	12d	
25	Luifel aftimmeringen	7-2-2022	11-3-2022	18d	
26	Aanbrengen dampremmer	14-3-2022	18-3-2022	4d	
27	Aanbrengen isolatie	21-3-2022	24-3-2022	3d	
28	Aanbrengen dakbedekking	25-3-2022	5-4-2022	8d	
29	HSB elementen onder tribune	7-2-2022	11-2-2022	5d	
30	Aanbrengen schuin dak onder tribune	14-2-2022	1-3-2022	10d	
31	Aanbrengen dakbedekking onder tribune	1-3-2022	8-3-2022	5d	
32	**Gevelbekleding**	**7-2-2022**	**16-6-2022**	**89d**	
33	Inplakken fundering	7-2-2022	11-2-2022	5d	
34	Aanbrengen kantplanken onder deurkozijnen	14-2-2022	18-2-2022	5d	
35	Aanbrengen kantplanken vliesgevels	21-3-2022	5-4-2022	12d	
36	Aanbrengen resysta vlonderplanken	11-4-2022	2-6-2022	35d	
37	Aanbrengen resysta tribune delen	3-5-2022	16-6-2022	30d	
38	**Bouwdeel B - Theda**	**10-1-2022**	**21-3-2022**	**51d**	
39	**Gevel en Dak**	**10-1-2022**	**21-3-2022**	**32d**	
40	Inmeten Brago	24-1-2022	24-1-2022	1d	
41	aanbrengen Brago kanalen	8-3-2022	21-3-2022	10d	
42	verwijderen dakrand veiligheid	10-1-2022	14-1-2022	5d	
43	**Gevelbekleding**	**10-1-2022**	**18-2-2022**	**30d**	
44	aanbrengen gevelbekleding aluminium	10-1-2022	28-1-2022	15d	
45	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resita gevel 1	10-1-2022	21-1-2022	10d	
46	aanbrengen planten geleiders	24-1-2022	4-2-2022	10d	
47	aanbrengen tillman roosters	7-2-2022	11-2-2022	5d	
48	HWA s aanbrengen	14-2-2022	18-2-2022	5d	
49	demontage trappentorens na afbouw	31-1-2022	4-2-2022	5d	
50	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	7-2-2022	18-2-2022	10d	
51	**Bouwdeel C - George**	**10-1-2022**	**4-4-2022**	**61d**	
52	**Gevel en Dak**	**24-1-2022**	**4-4-2022**	**37d**	
53	Inmeten Brago	24-1-2022	24-1-2022	1d	
54	aanbrengen LBK installatie C	22-3-2022	4-4-2022	10d	
55	**Gevelbekleding**	**10-1-2022**	**4-3-2022**	**40d**	
56	aanbrengen gevelbekleding aluminium gevel	24-1-2022	4-2-2022	10d	
57	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resyta	10-1-2022	4-2-2022	20d	
58	aanbrengen planten geleiders	31-1-2022	11-2-2022	10d	
59	aanbrengen tillman roosters	7-2-2022	11-2-2022	5d	
60	hoekprofilen tbv HWA aanbrengen ter hoogte resista	7-2-2022	11-2-2022	5d	
61	HWA s aanbrengen	14-2-2022	18-2-2022	5d	
62	demontage trappentorens na afbouw	21-2-2022	25-2-2022	5d	
63	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	28-2-2022	4-3-2022	5d	
64	**Bouwdeel D - Werkplaats**	**22-11-2021**	**11-3-2022**	**70d**	
65	**Gevel en Dak**	**22-11-2021**	**18-2-2022**	**34d**	
66	Plaatsen buiten aluminium kozijnen	10-1-2022	28-1-2022	15d	
67	aanbrengen LBK installatie D	10-1-2022	18-2-2022	30d	
68	aanbrengen EPDM op isolatie	22-11-2021	24-12-2021	25d	
69	aanbrengen cempanel sheddaken	10-1-2022	27-1-2022	14d	
70	**Gevelbekleding**	**7-2-2022**	**11-3-2022**	**25d**	
71	aanbrengen gevelbekleding aluminium	7-2-2022	4-3-2022	20d	
72	aanbrengen tillman roosters	7-3-2022	11-3-2022	5d	
73	**Bouwdeel E1 - Sportgebouw**	**10-1-2022**	**15-4-2022**	**70d**	
74	**Gevel en dak**	**10-1-2022**	**11-2-2022**	**11d**	
75	Plaatsen buiten aluminium kozijnen	10-1-2022	28-1-2022	15d	
76	Aanbrengen cempanel op voorzijde tribune trap	10-1-2022	21-1-2022	10d	
77	aanbrengen alutrix	10-1-2022	21-1-2022	10d	
78	aanbrengen folie/isolatie	24-1-2022	4-2-2022	10d	
79	aanbrengen EPDM	31-1-2022	11-2-2022	10d	
80	Dakranden betimmering aanbrengen	10-1-2022	28-1-2022	15d	
81	**Gevelbekleding**	**10-1-2022**	**15-4-2022**	**70d**	
82	aanbrengen kantplank	10-1-2022	28-1-2022	15d	
83	Opbouwen steigers	10-1-2022	21-1-2022	10d	
84	aanbrengen zonwering	17-1-2022	21-1-2022	5d	
85	aanbrengen gevelbekleding horizontale delen resysta gevel 1 bg	24-1-2022	4-2-2022	10d	
86	aanbrengen gevelbekleding horizontale delen resysta gevel 2 bg	7-2-2022	18-2-2022	10d	
87	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resysta gevel 1 verdieping	21-2-2022	4-3-2022	10d	
88	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resysta gevel 2 verdieping	7-3-2022	18-3-2022	10d	
89	hoekprofielen tbv HWA aanbrengen ter hoogte resista	21-3-2022	25-3-2022	5d	
90	Pluvia aanbrengen	28-3-2022	1-4-2022	5d	
91	demontage trappentorens na afbouw	4-4-2022	8-4-2022	5d	
92	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	11-4-2022	15-4-2022	5d	
93	**Bouwdeel E2 - Sportgebouw**	**13-12-2021**	**29-6-2022**	**128d**	
94	**Gevel en dak**	**13-12-2021**	**29-6-2022**	**103d**	
95	**dak E2 noord betondak**	**20-12-2021**	**29-6-2022**	**123d**	
96	aanbrengen noodlaag dak noord	20-12-2021	24-12-2021	5d	
97	Aanbrengen druklaag onder WP	10-1-2022	14-1-2022	5d	
98	montage steiger dak noord	17-1-2022	28-1-2022	10d	
99	voorbereiding gevel tbv resysta noord incl overstek	31-1-2022	11-3-2022	30d	
100	aanbrengen resysta noord incl overstek	14-3-2022	15-4-2022	25d	
101	Demontage steiger dak noord deel tpv installatie	19-4-2022	25-4-2022	5d	
102	aanbrengen pootjes tbv frame waterpomp	7-2-2022	11-2-2022	5d	
103	aanbrengen dakbedekking installatie dak Noord	14-2-2022	3-5-2022	10d	
104	Aanbrengen warmtepompen E dak noord	14-2-2022	18-2-2022	5d	
105	Aanbrengen leidingwerk + aansluiten WP	17-2-2022	13-5-2022	60d	
106	Aanbrengen tracing	16-5-2022	20-5-2022	5d	
107	Aansluiten regeltechniek	23-5-2022	8-6-2022	10d	
108	Isoleren en aanbrengen stucco	23-5-2022	22-6-2022	20d	
109	Inbedrijfstellen warmtepomp	23-6-2022	29-6-2022	5d	
110	Aanbrengen LBK's en aansluiten WP E dak noord	5-5-2022	25-5-2022	15d	
111	Isoleren leidingwerk	30-5-2022	7-6-2022	5d	
112	**dak E2 zuid betondak**	**10-1-2022**	**28-6-2022**	**117d**	
113	aanbrengen noodlaag dak zuid	10-1-2022	21-1-2022	10d	
114	montage steiger dak zuid	24-1-2022	4-2-2022	10d	
115	voorbereiding gevel tbv resysta noord incl overstek	7-2-2022	11-3-2022	25d	
116	aanbrengen resista noord incl overstek	14-3-2022	25-4-2022	30d	
117	Demontage steiger dak zuid	26-4-2022	2-5-2022	4d	
118	aanbrengen dakbedekking installatie dak zuid	3-5-2022	9-5-2022	5d	
119	Aanbrengen LBK E dak zuid	10-5-2022	13-5-2022	4d	
120	Aanbrengen installatie tbv LBK's en warmtepompen E dak noord	16-5-2022	28-6-2022	28d	
121	**dak E2 cannelure dak (hoog)**	**13-12-2021**	**11-3-2022**	**55d**	
122	aanbrengen alutrix	13-12-2021	17-1-2022	15d	
123	aanbrengen isolatie	10-1-2022	21-1-2022	10d	
124	aanbrengen EPDM incl pluvia	17-1-2022	4-2-2022	15d	
125	aanbrengen zonnepanelen	7-2-2022	25-2-2022	15d	
126	aanbrengen dakveiligheid	28-2-2022	11-3-2022	10d	
127	**Gevelbekleding**	**10-1-2022**	**31-5-2022**	**98d**	
128	Aanbrengen cempanel op voorzijde entree trap	10-1-2022	21-1-2022	10d	
129	aanbrengen kantplank	10-1-2022	21-1-2022	10d	
130	aanbrengen gevelbekleding horizontale delen resita gevel 1 noord bg	24-1-2022	4-2-2022	10d	
131	aanbrengen gevelbekleding horizontale delen resita zuid bg	7-2-2022	18-2-2022	10d	
132	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resita gevel 1 noord verdieping	21-2-2022	25-3-2022	25d	
133	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resita gevel 2 zuid verdieping	28-3-2022	29-4-2022	23d	
134	aanbrengen zonwering	14-2-2022	18-2-2022	5d	
135	Demontage steiger Gevel 1 noord	28-3-2022	1-4-2022	5d	
136	Demontage steiger Gevel 2 zuid	2-5-2022	6-5-2022	5d	
137	aanbrengen aluminium gevelbekleding (achterzijde)	21-2-2022	9-3-2022	13d	
138	hoekprofielen tbv HWA aanbrengen ter hoogte resista	2-5-2022	6-5-2022	5d	
139	HWA s aanbrengen	9-5-2022	13-5-2022	5d	
140	demontage trappentorens na afbouw	16-5-2022	20-5-2022	5d	
141	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	23-5-2022	31-5-2022	5d	

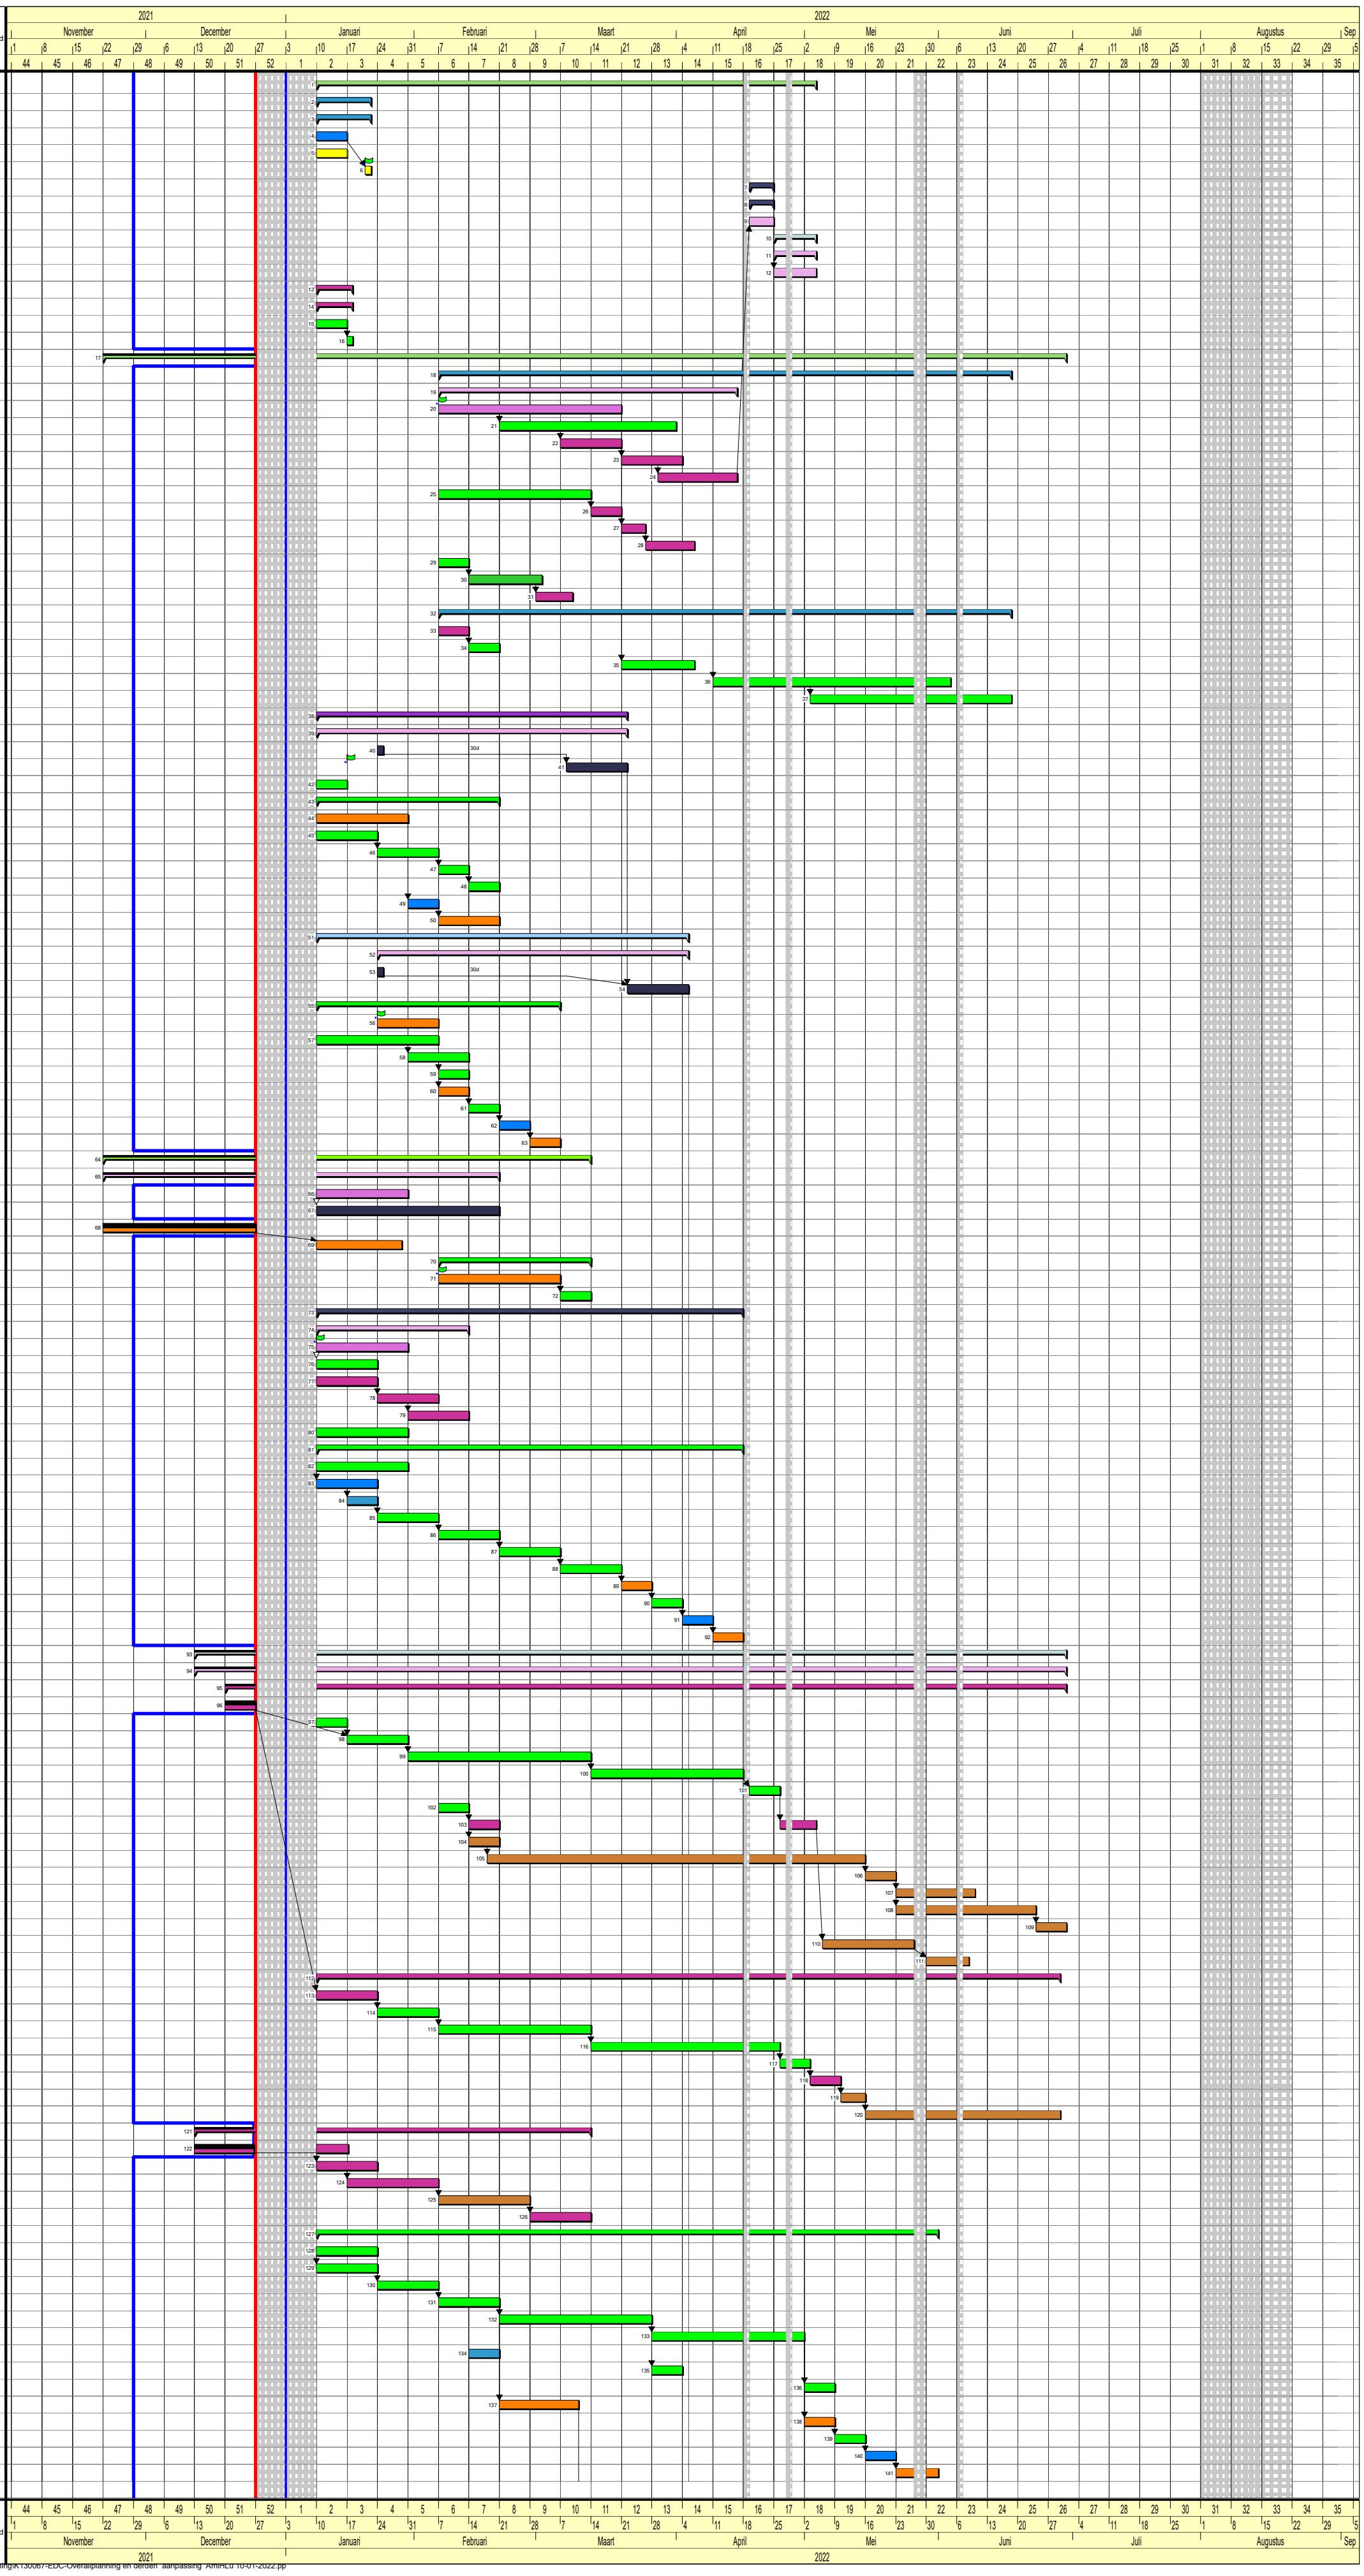

bam
Bouw en Techniek
Regio Noord
GRONINGEN tel (050) 556 50 50

werknummer: Regio Noord
schemanummer: K130067-EDC-Overallplanning
versie: v4
datum: 10-1-2022
status: Realisatie
opgesteld door: AMi / HLu

soort schema: **Definitief**

Nieuwbouw Eemsdeltacampus

Uitvoeringsfase

Overallplanning

Nr	Omschrijving	Start	Eind	Duur	Hoeveelheid
142	Plaatsen buiten aluminium kozijnen	31-1-2022	18-2-2022	15d	
143	afwerken/folies HSB gevel 1	10-1-2022	28-1-2022	15d	
144	**Bouwdeel F - Rudolph**	**24-1-2022**	**19-4-2022**	**61d**	
145	**Gevel en Dak**	**24-1-2022**	**19-4-2022**	**45d**	
146	Inmeten Brago	24-1-2022	24-1-2022	1d	
147	Montage Brago	5-4-2022	19-4-2022	10d	
148	**Gevelbekleding**	**24-1-2022**	**25-3-2022**	**45d**	
149	aanbrengen gevelbekleding aluminium	31-1-2022	25-2-2022	20d	
150	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resysta	24-1-2022	25-2-2022	25d	
151	aanbrengen planten geleiders	28-2-2022	11-3-2022	10d	
152	aanbrengen tillman roosters	14-3-2022	18-3-2022	5d	
153	hoekprofilen tbv HWA aanbrengen ter hoogte resista	14-3-2022	18-3-2022	5d	
154	HWA s aanbrengen	21-3-2022	25-3-2022	5d	
155	demontage trappentorens na afbouw	28-2-2022	4-3-2022	5d	
156	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	7-3-2022	11-3-2022	5d	
157	**Bouwdeel G - Kunst & Cultuur en Science**	**10-1-2022**	**1-6-2022**	**99d**	
158	**Gevel en Dak**	**10-1-2022**	**5-5-2022**	**69d**	
159	aanbrengen HSB gevelelementen incl entrosol	10-1-2022	28-1-2022	7d	30
160	afwerken/folies HSB incl entrosol	27-1-2022	16-2-2022	15d	
161	leveren/ plaatsen inplakstukken entrosolvloer	17-2-2022	18-2-2022	2d	
162	aanbrengen dakbedekking op entrosol vloer	21-2-2022	25-2-2022	5d	
163	Aanbrengen cempanel op binnenzijde dakopbouw	28-2-2022	7-3-2022	6d	
164	aanbrengen LBK	8-3-2022	8-3-2022	1d	
165	Inmeten Brago	9-3-2022	9-3-2022	1d	
166	Aanbrengen Brago	21-4-2022	5-5-2022	10d	
167	Aanbrengen lichtstraat	24-1-2022	1-2-2022	7d	
168	aanbrengen veiligheidsnetten onder dakvloer	1-2-2022	3-2-2022	3d	
169	aanbrengen dakplaten	4-2-2022	8-2-2022	3d	ca. 1200m2
170	aanbrengen alutrix	9-2-2022	15-2-2022	5d	
171	Aanbrengen lichtkap	9-2-2022	15-2-2022	5d	
172	aanbrengen folie/isolatie	9-2-2022	15-2-2022	5d	
173	aanbrengen EPDM op isolatie tot over goot	9-2-2022	15-2-2022	5d	
174	aanbrengen veldak gevel 1 zijde	16-2-2022	1-3-2022	10d	
175	aanbrengen veldak gevel 2 zijde	2-3-2022	15-3-2022	10d	
176	aanbrengen gootconstructie vanuit hoogwerker	9-2-2022	15-2-2022	5d	
177	afwerken dakranden / dakgoten vanuit hoogwerker	23-2-2022	8-3-2022	10d	
178	verwijderen dakrand veiligheid gevel 1	2-3-2022	4-3-2022	3d	
179	verwijderen dakrand veiligheid gevel 2	16-3-2022	18-3-2022	3d	
180	**Gevelbekleding**	**31-1-2022**	**1-6-2022**	**84d**	
181	Plaatsen buiten aluminium kozijnen	31-1-2022	1-3-2022	22d	
182	aanbrengen kanlplank incl inplakken fundatie.	31-1-2022	11-2-2022	10d	
183	aanbrengen zonwering gevel	8-2-2022	18-2-2022	9d	
184	aanbrengen gevelbekleding aluminium gevel	7-3-2022	8-4-2022	25d	
185	aanbrengen gevelbekleding verticale delen resita gevel	18-3-2022	22-4-2022	25d	
186	aanbrengen planten geleiders	25-4-2022	9-5-2022	10d	
187	aanbrengen tillman roosters	10-5-2022	16-5-2022	5d	
188	HWA s aanbrengen	10-5-2022	16-5-2022	5d	
189	demontage trappentorens na afbouw	17-5-2022	23-5-2022	5d	
190	invullen geveldelen na verwijderen trappentorens na afbouw	24-5-2022	1-6-2022	5d	
191	**Bouwdeel H - Kas**	**16-2-2022**	**28-4-2022**	**50d**	
192	**Ruwbouw KAS**	**16-2-2022**	**28-4-2022**	**50d**	
193	Grondwerk	16-2-2022	17-2-2022	2d	
194	Betonwerk fundatie	18-2-2022	24-2-2022	5d	
195	Betonwerk vloer	4-3-2022	10-3-2022	5d	
196	Aanbrengen staalconstructie	11-3-2022	15-3-2022	3d	
197	Aanbrengen dakbeplating en dakranden	16-3-2022	29-3-2022	10d	
198	Aanbrengen Kas incl. zonwering	30-3-2022	12-4-2022	10d	
199	Gevelbekleding aanbrengen Resysta	21-3-2022	15-4-2022	20d	
200	Gevelbekleding binnen (Fraisk)	13-4-2022	28-4-2022	10d	
201	**Bouwdeel I - Kapschuur**	**14-2-2022**	**28-4-2022**	**52d**	
202	**Ruwbouw Kapschuur**	**14-2-2022**	**28-4-2022**	**52d**	
203	Heiwerk	14-2-2022	18-2-2022	5d	
204	Grondwerk	21-2-2022	22-2-2022	2d	
205	Betonwerk fundatie	23-2-2022	1-3-2022	5d	
206	Betonwerk vloer	9-3-2022	15-3-2022	5d	
207	Aanbrengen houtconstructie	16-3-2022	18-3-2022	3d	
208	Anbrengen HSB elementen	21-3-2022	8-4-2022	15d	
209	aanbrengen dak en gevelbekleding Resysta	30-3-2022	28-4-2022	20d	
210	**Bouwdeel J - Fietsenberging**	**17-1-2022**	**11-3-2022**	**40d**	
211	**Ruwbouw Fietsenberging**	**17-1-2022**	**11-3-2022**	**40d**	
212	Grondwerk	17-1-2022	18-1-2022	2d	
213	Betonwerk fundatie	19-1-2022	25-1-2022	5d	
214	Betonwerk vloer	2-2-2022	8-2-2022	5d	
215	Aanbrengen staalconstructie	9-2-2022	11-2-2022	3d	
216	Aanbrengen dakbeplating en dakranden	14-2-2022	28-2-2022	11d	
217	aanbrengen dak en gevelbekleding Resysta	21-2-2022	11-3-2022	15d	
218	**Afbouw**	**2-11-2021**	**29-7-2022**	**179d**	
219	**Bouwdeel A - Hart**	**21-2-2022**	**21-7-2022**	**104d**	
220	**Afbouw Bouwdeel A - Algemeen**	**21-2-2022**	**10-6-2022**	**75d**	
221	Brandwerend schilderen staalconstructie	21-2-2022	18-3-2022	17d	
222	Aanbrengen hoofdtraceés installatietechniek A	21-2-2022	18-3-2022	20d	
223	Aanbrengen isolatie en vloerverwarming	21-3-2022	1-4-2022	10d	
224	Aanbrengen cementgebonden anhydrietvloer	4-4-2022	8-4-2022	5d	
225	Instagen dilllataties (indien nodig)	19-4-2022	19-4-2022	1d	
226	Drooogtijd anhydrietvloer	11-4-2022	10-6-2022	40d	
227	**Afbouw Begane Grond**	**21-3-2022**	**21-7-2022**	**84d**	**1515**
228	Aanbrengen kalkzandsteen borstwering	21-3-2022	1-4-2022	10d	
229	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	4-4-2022	22-4-2022	14d	
230	Stucwerk	25-4-2022	6-5-2022	9d	
231	Montage plafonds	25-4-2022	21-7-2022	60d	
232	Aanbrengen plantenbakken	7-7-2022	21-7-2022	11d	
233	Behangwerk / schilderwerk	2-6-2022	14-6-2022	8d	
234	Montage binnendeuren naar alle bouwdelen	15-6-2022	21-6-2022	5d	
235	Diverse afimmeringen	22-6-2022	6-7-2022	11d	
236	Bekleden wanden	7-7-2022	21-7-2022	11d	
237	Afmontage installaties	15-6-2022	24-6-2022	8d	
238	Leggen tegels	9-5-2022	22-6-2022	30d	
239	**Bouwdeel B - Theda**	**2-11-2021**	**10-5-2022**	**124d**	
240	**Afbouw Bouwdeel B - Algemeen**	**10-1-2022**	**13-1-2022**	**4d**	
241	Aanbrengen lift	10-1-2022	13-1-2022	4d	
242	**afbouw te verdieping**	**9-11-2021**	**25-3-2022**	**89d**	
243	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	9-11-2021	15-11-2021	5d	
244	Beplaten met gips éénzijdig	16-11-2021	22-11-2021	5d	
245	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	16-11-2021	25-11-2021	8d	
246	Sluiten MS-wanden	26-11-2021	10-12-2021	10d 6.4u	
247	Dichtzetten naden / schroefgaten	6-12-2021	10-12-2021	5d	
248	Montage plafond	20-12-2021	14-1-2022	10d	
249	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	10-1-2022	14-1-2022	5d	
250	Montage interieur elementen B3 en B5	10-1-2022	21-1-2022	10d	
251	Behangwerk / schilderwerk	17-1-2022	4-2-2022	15d	
252	Diverse afimmeringen	17-1-2022	4-2-2022	15d	
253	Bekleden wanden met berkenfineer	7-2-2022	25-2-2022	15d	
254	Afmontage installaties	7-2-2022	25-2-2022	15d	
255	Montage binnendeuren	21-2-2022	25-2-2022	5d	
256	Leggen vloerbedekking	28-2-2022	11-3-2022	10d	
257	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	14-3-2022	25-3-2022	10d	
258	**Afbouw begane grond**	**2-11-2021**	**8-4-2022**	**104d**	**1160m2**
259	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	2-11-2021	25-11-2021	5d	
260	Beplaten met gips éénzijdig	9-11-2021	29-11-2021	5d	
261	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	9-11-2021	19-11-2021	9d	
262	Sluiten MS-wanden	22-11-2021	10-12-2021	15d	
263	Dichtzetten naden / schroefgaten	10-1-2022	21-1-2022	10d	
264	Montage plafond	17-1-2022	28-1-2022	10d	
265	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	17-1-2022	21-1-2022	5d	
266	Montage interieur element naar hart B4	17-1-2022	28-1-2022	10d	
267	Behangwerk / schilderwerk	31-1-2022	18-2-2022	15d	
268	Diverse afimmeringen	31-1-2022	18-2-2022	15d	
269	Bekleden wanden met berkenfineer	21-2-2022	11-3-2022	15d	
270	Afmontage installaties	21-2-2022	11-3-2022	15d	
271	Montage binnendeuren	7-3-2022	11-3-2022	5d	
272	Leggen vloerbedekking	14-3-2022	25-3-2022	10d	
273	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	28-3-2022	8-4-2022	10d	
274	**Afbouw 2e verdieping**	**2-11-2021**	**10-5-2022**	**124d**	**1160m2**
275	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	2-11-2021	19-11-2021	14d	
276	Beplaten met gips éénzijdig	22-11-2021	3-12-2021	10d	
277	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	6-12-2021	17-12-2021	10d	
278	Sluiten MS-wanden	20-12-2021	14-1-2022	10d	
279	Dichtzetten naden / schroefgaten	17-1-2022	28-1-2022	10d	
280	Montage plafonds	31-1-2022	18-2-2022	15d	
281	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	31-1-2022	4-2-2022	5d	
282	Montage interieur elementen B1 en B2	31-1-2022	11-2-2022	10d	
283	Behangwerk / schilderwerk	14-2-2022	4-3-2022	15d	

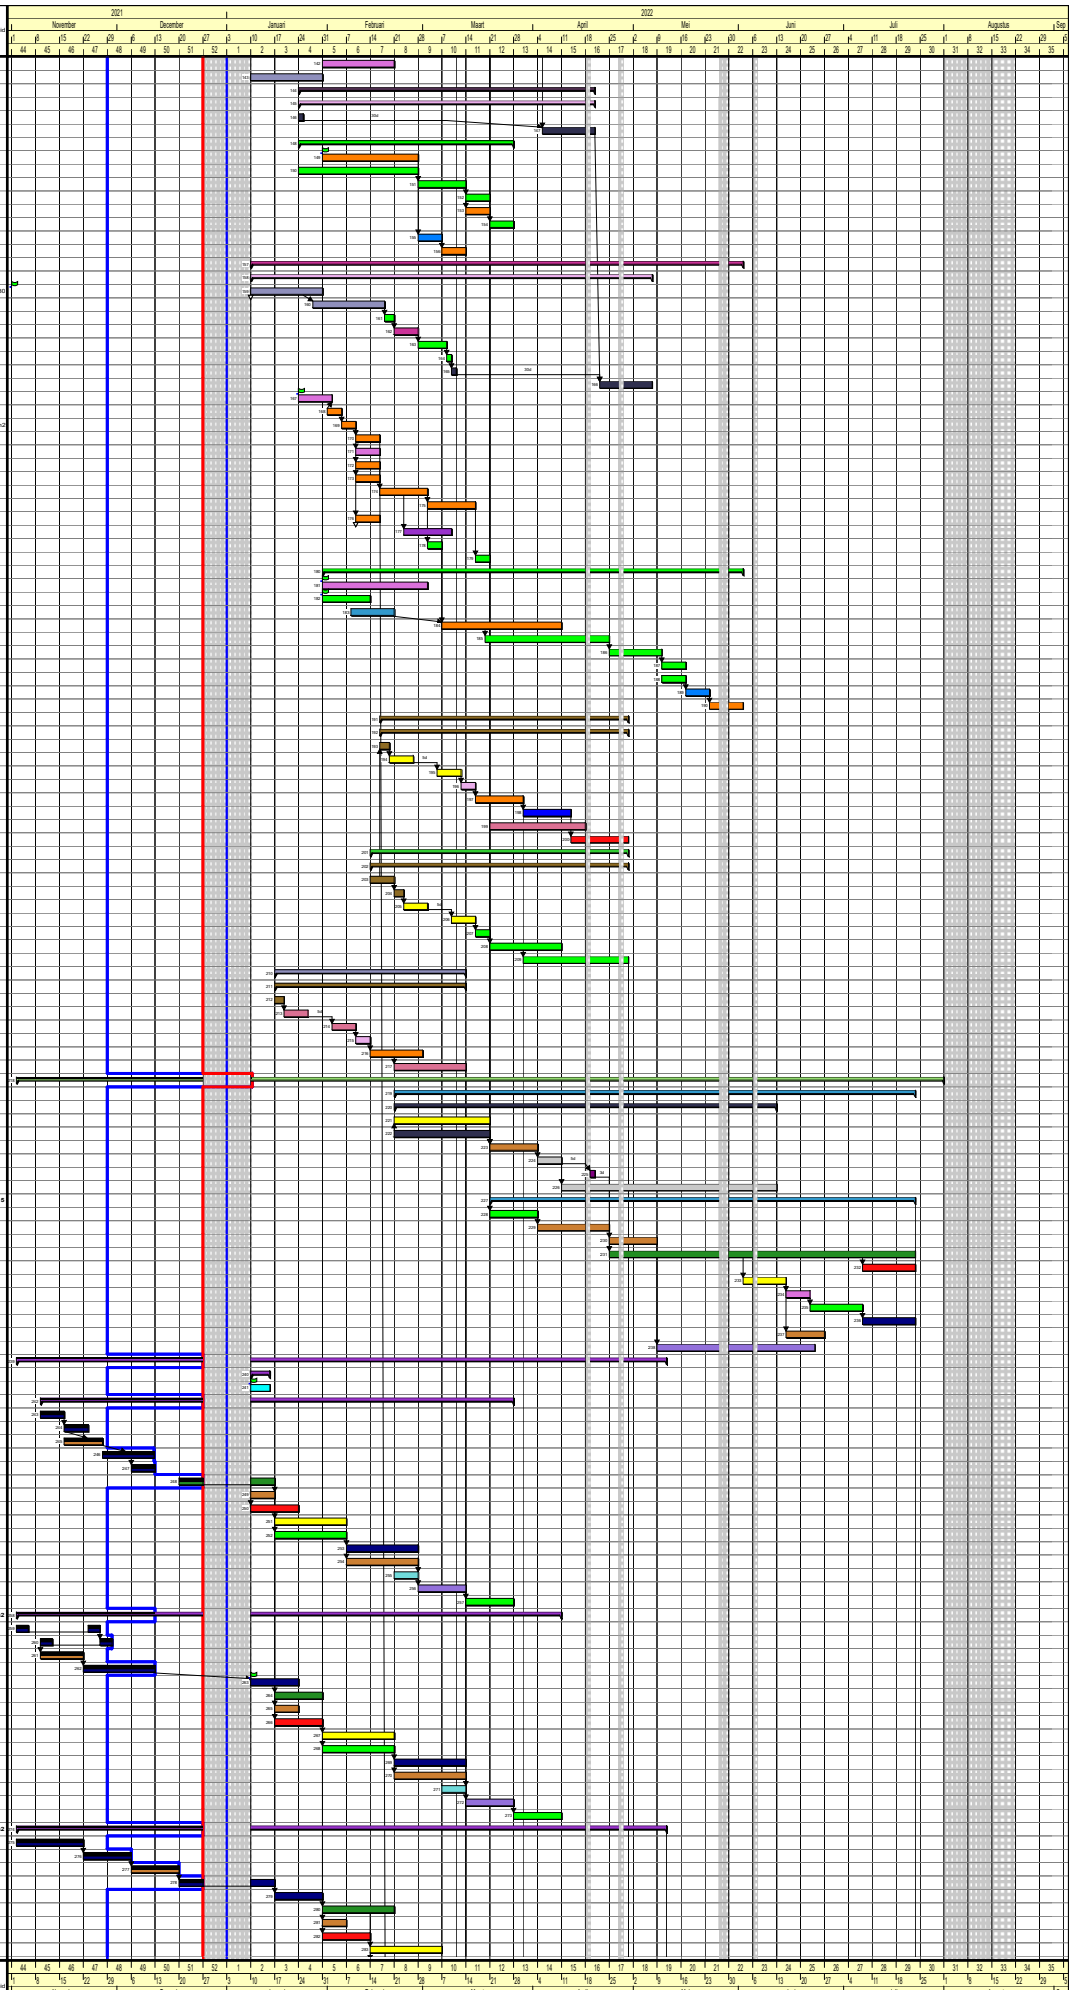

bam
Bouw en Techniek

Regio Noord

GRONINGEN tel (050) 556 50 50

werknummer: Regio Noord
schemanummer: K130067-EDC-Overallplanning
versie: v4
datum: 10-1-2022
status: Realisatie
opgesteld door: AMi / HLu

Nieuwbouw Eemsdeltacampus
Uitvoeringsfase
Overallplanning

soort schema: **Definitief**

Nr	Omschrijving	Start	Eind	Duur	Hoeveelheid
284	Diverse aftimmeringen	14-2-2022	4-3-2022	15d	
285	Bekleden wanden met berkenfineer	7-3-2022	25-3-2022	15d	
286	Afmontage installaties	7-3-2022	25-3-2022	15d	
287	Montage binnendeuren	21-3-2022	25-3-2022	5d	
288	Leggen vloerbedekking	28-3-2022	8-4-2022	10d	
289	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	11-4-2022	25-4-2022	10d	
290	I-O testen regelkast en LBK	26-4-2022	10-5-2022	10d	
291	**Bouwdeel C - George**	**13-12-2021**	**2-6-2022**	**110d**	
292	**Afbouw Bouwdeel C - Algemeen**	**20-1-2022**	**24-1-2022**	**3d**	
293	Aanbrengen lift	20-1-2022	24-1-2022	3d	
294	**Afbouw beganegrond**	**13-12-2021**	**5-5-2022**	**92d**	
295	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	13-12-2021	14-1-2022	15d	
296	Beplaten met gips éénzijdig	17-1-2022	25-1-2022	7d	
297	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	26-1-2022	1-2-2022	5d	
298	Sluiten MS-wanden	2-2-2022	15-2-2022	10d	
299	Dichtzetten naden / schroefgaten	16-2-2022	22-2-2022	5d	
300	Montage plafond	23-2-2022	8-3-2022	10d	
301	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	23-2-2022	1-3-2022	5d	
302	Montage interieur elementen C1	23-2-2022	8-3-2022	10d	
303	Behangwerk / schilderwerk	9-3-2022	22-3-2022	10d	
304	Diverse aftimmeringen	9-3-2022	22-3-2022	10d	
305	Bekleden wanden met berkenfineer	23-3-2022	5-4-2022	10d	
306	Afmontage installaties	23-3-2022	5-4-2022	10d	
307	Montage binnendeuren	30-3-2022	5-4-2022	5d	
308	Leggen vloerbedekking	6-4-2022	20-4-2022	10d	
309	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	21-4-2022	5-5-2022	10d	
310	**Afbouw 1e verdieping**	**17-1-2022**	**2-6-2022**	**95d**	**1160m2**
311	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	17-1-2022	28-1-2022	10d	
312	Beplaten met gips éénzijdig	31-1-2022	11-2-2022	10d	
313	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	14-2-2022	18-2-2022	5d	
314	Sluiten MS-wanden	14-2-2022	25-2-2022	10d	
315	Dichtzetten naden / schroefgaten	28-2-2022	4-3-2022	5d	
316	Montage plafond	7-3-2022	18-3-2022	10d	
317	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	7-3-2022	11-3-2022	5d	
318	Montage interieur element trap naar Hart C3	7-3-2022	14-3-2022	6d	
319	Montage interieur element C2 en C5	15-3-2022	18-3-2022	4d	
320	Behangwerk / schilderwerk	21-3-2022	1-4-2022	10d	
321	Diverse aftimmeringen	21-3-2022	1-4-2022	10d	
322	Bekleden wanden met berkenfineer	4-4-2022	15-4-2022	10d	
323	Afmontage installaties	4-4-2022	15-4-2022	10d	
324	Montage binnendeuren	11-4-2022	15-4-2022	5d	
325	Leggen vloerbedekking	19-4-2022	3-5-2022	10d	
326	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	4-5-2022	17-5-2022	10d	
327	I-O testen regelkast en LBK	18-5-2022	2-6-2022	10d	
328	**Bouwdeel D - Werkplaats**	**24-1-2022**	**17-5-2022**	**80d**	
329	**Afbouw beganegrond**	**24-1-2022**	**17-5-2022**	**80d**	
330	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	24-1-2022	28-1-2022	5d	
331	Aanbrengen kanelen zichtwerk	24-1-2022	4-2-2022	10d	
332	Beplaten met gips éénzijdig	31-1-2022	4-2-2022	5d	
333	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	7-2-2022	11-2-2022	5d	
334	Sluiten MS-wanden	14-2-2022	18-2-2022	5d	
335	Dichtzetten naden / schroefgaten	21-2-2022	25-2-2022	5d	
336	Montage plafond	21-3-2022	25-3-2022	5d	
337	Behangwerk / schilderwerk	28-3-2022	1-4-2022	5d	
338	Montage binnendeuren	4-4-2022	8-4-2022	5d	
339	Montage interieur element D1	21-3-2022	25-3-2022	5d	
340	Montage lascabines	4-4-2022	8-4-2022	5d	
341	Diverse aftimmeringen	21-3-2022	1-4-2022	10d	
342	Bekleden wanden met berkenfineer	28-3-2022	8-4-2022	10d	
343	Afmontage installaties	4-4-2022	15-4-2022	10d	
344	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	19-4-2022	3-5-2022	10d	
345	I-O testen regelkast en LBK	4-5-2022	17-5-2022	10d	
346	**Bouwdeel E1 - Sportgebouw**	**19-11-2021**	**6-7-2022**	**149d**	
347	**Afbouw bouwdeel E1 - Algemeen**	**19-11-2021**	**8-4-2022**	**91d**	
348	Aanbrengen hoofdtracés installatietechniek E-1	19-11-2021	28-1-2022	41d	
349	Aanbrengen anhydrietvloer	31-1-2022	4-2-2022	5d	
350	Inzagen dillataties	7-2-2022	11-2-2022	5d	
351	Droogtijd anhydrietvloer	7-2-2022	1-4-2022	40d	
352	Aanbrengen lift	28-3-2022	8-4-2022	10d	
353	**Afbouw begane grond**	**14-2-2022**	**14-6-2022**	**82d**	
354	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	14-2-2022	25-2-2022	10d	
355	Beplaten met gips éénzijdig	21-2-2022	4-3-2022	10d	
356	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	28-2-2022	11-3-2022	10d	
357	Sluiten MS-wanden	7-3-2022	18-3-2022	10d	
358	Dichtzetten naden / schroefgaten	14-3-2022	24-3-2022	9d	
359	Aanbrengen geluidswerende deur (Alara)	14-3-2022	18-3-2022	5d	
360	steiger montage tpv tribune	14-3-2022	18-3-2022	5d	
361	Montage plafonds	21-3-2022	15-4-2022	20d	
362	steiger demontage tpv tribune	11-4-2022	15-4-2022	5d	
363	Behangwerk / schilderwerk	4-4-2022	15-4-2022	10d	
364	Aanbrengen wandbank gardarobes	19-4-2022	26-4-2022	6d	
365	Montage binnendeuren	19-4-2022	25-4-2022	5d	
366	Diverse aftimmeringen	21-3-2022	8-4-2022	15d	
367	Bekleden wanden	21-3-2022	8-4-2022	15d	
368	Plaatsen glaswand (Maars)	11-4-2022	15-4-2022	5d	
369	Plaatsen spiegelwand	19-4-2022	26-4-2022	6d	
370	Montage interieur elementen E1	4-4-2022	15-4-2022	10d	
371	Montage interieur elementen E2	19-4-2022	13-5-2022	18d	
372	Afmontage installaties	21-3-2022	8-4-2022	15d	
373	Leggen vloerbedekking	6-5-2022	30-5-2022	15d	
374	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	31-5-2022	14-6-2022	10d	
375	**Afbouw 1e verdieping**	**28-2-2022**	**6-7-2022**	**88d**	
376	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	28-2-2022	11-3-2022	10d	
377	Beplaten met gips éénzijdig	14-3-2022	25-3-2022	10d	
378	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	14-3-2022	25-3-2022	10d	
379	Sluiten MS-wanden	21-3-2022	1-4-2022	10d	
380	Dichtzetten naden / schroefgaten	28-3-2022	7-4-2022	9d	
381	Montage plafonds	4-4-2022	6-5-2022	23d	
382	Behangwerk / schilderwerk	19-4-2022	29-4-2022	8d	
383	Montage binnendeuren	2-5-2022	6-5-2022	5d	
384	Diverse aftimmeringen	4-4-2022	15-4-2022	10d	
385	Bekleden wanden met berkenfineer	19-4-2022	13-5-2022	18d	
386	Afmontage installaties	4-4-2022	15-4-2022	10d	
387	Leggen vloerbedekking	18-5-2022	8-6-2022	13d	
388	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	9-6-2022	22-6-2022	10d	
389	I-O testen regelkast en LBK	23-6-2022	6-7-2022	10d	
390	**Bouwdeel E2 - Sportgebouw**	**10-1-2022**	**28-7-2022**	**139d**	
391	**Afbouw bouwdeel E2 - Algemeen**	**10-1-2022**	**25-4-2022**	**75d**	
392	Aanbrengen hoofdtracés installatietechniek E-2	10-1-2022	4-2-2022	20d	
393	Aanbrengen isolatie vloerverwarming	7-2-2022	10-2-2022	4d	
394	Aanbreng vloerverwarming	11-2-2022	18-2-2022	6d	
395	Aanbrengen anhydrietvloer	21-2-2022	25-2-2022	5d	
396	Inzagen dillataties	7-3-2022	11-3-2022	5d	
397	Aanbrengen zandcement vloeren	28-2-2022	9-3-2022	8d	
398	Droogtijd anhydrietvloer	28-2-2022	25-4-2022	40d	
399	**Afbouw begane grond**	**7-3-2022**	**28-7-2022**	**99d**	
400	stellen vloerpotten Bosan	7-3-2022	11-3-2022	5d	
401	aanbrengen installaties aan plafond	14-3-2022	8-4-2022	20d	
402	aanbrengen HSB en plafondafwerking	21-3-2022	15-4-2022	20d	
403	Dichtzetten naden	19-4-2022	3-5-2022	10d	
404	Aanbrengen plafond	3-5-2022	23-5-2022	15d	
405	Behangwerk / schilderwerk	24-5-2022	7-6-2022	8d	
406	Plaatsen sanitaire scheidingswanden	8-6-2022	14-6-2022	5d	
407	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	15-6-2022	28-6-2022	10d	
408	I-O testen regelkast en LBK	29-6-2022	12-7-2022	10d	
409	Monteren binnendeuren	18-5-2022	10-6-2022	15d	
410	Monteren Hormann deuren	28-3-2022	1-4-2022	5d	
411	Monteren Trenomat wanden	10-6-2022	30-6-2022	15d	
412	aanbrengen wandbekleding/-afwerking	4-4-2022	17-5-2022	30d	
413	Voormontage Bosan	31-5-2022	2-6-2022	3d	
414	Aanbrengen wandbank gardarobes	8-6-2022	15-6-2022	6d	
415	aanbrengen tribune betimmering	4-4-2022	10-5-2022	25d	
416	afwerken kleed-/was-/sanitaire ruimten	19-4-2022	17-5-2022	20d	
417	afmonteren installaties	19-4-2022	19-5-2022	22d	
418	aanbrengen sportvloer	20-5-2022	9-6-2022	12d	
419	Afmontage Bosan	8-7-2022	28-7-2022	15d	
420	Montage boulderwand	10-3-2022	23-3-2022	10d	
421	**Bouwdeel F - Rudolph**	**25-11-2021**	**9-5-2022**	**106d**	
422	**Afbouw Bouwdeel F - Algemeen**	**14-1-2022**	**19-1-2022**	**4d**	
423	Aanbrengen lift	14-1-2022	19-1-2022	4d	
424	**Afbouw beganegrond**	**25-11-2021**	**25-3-2022**	**77d**	
425	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	25-11-2021	1-12-2021	5d	

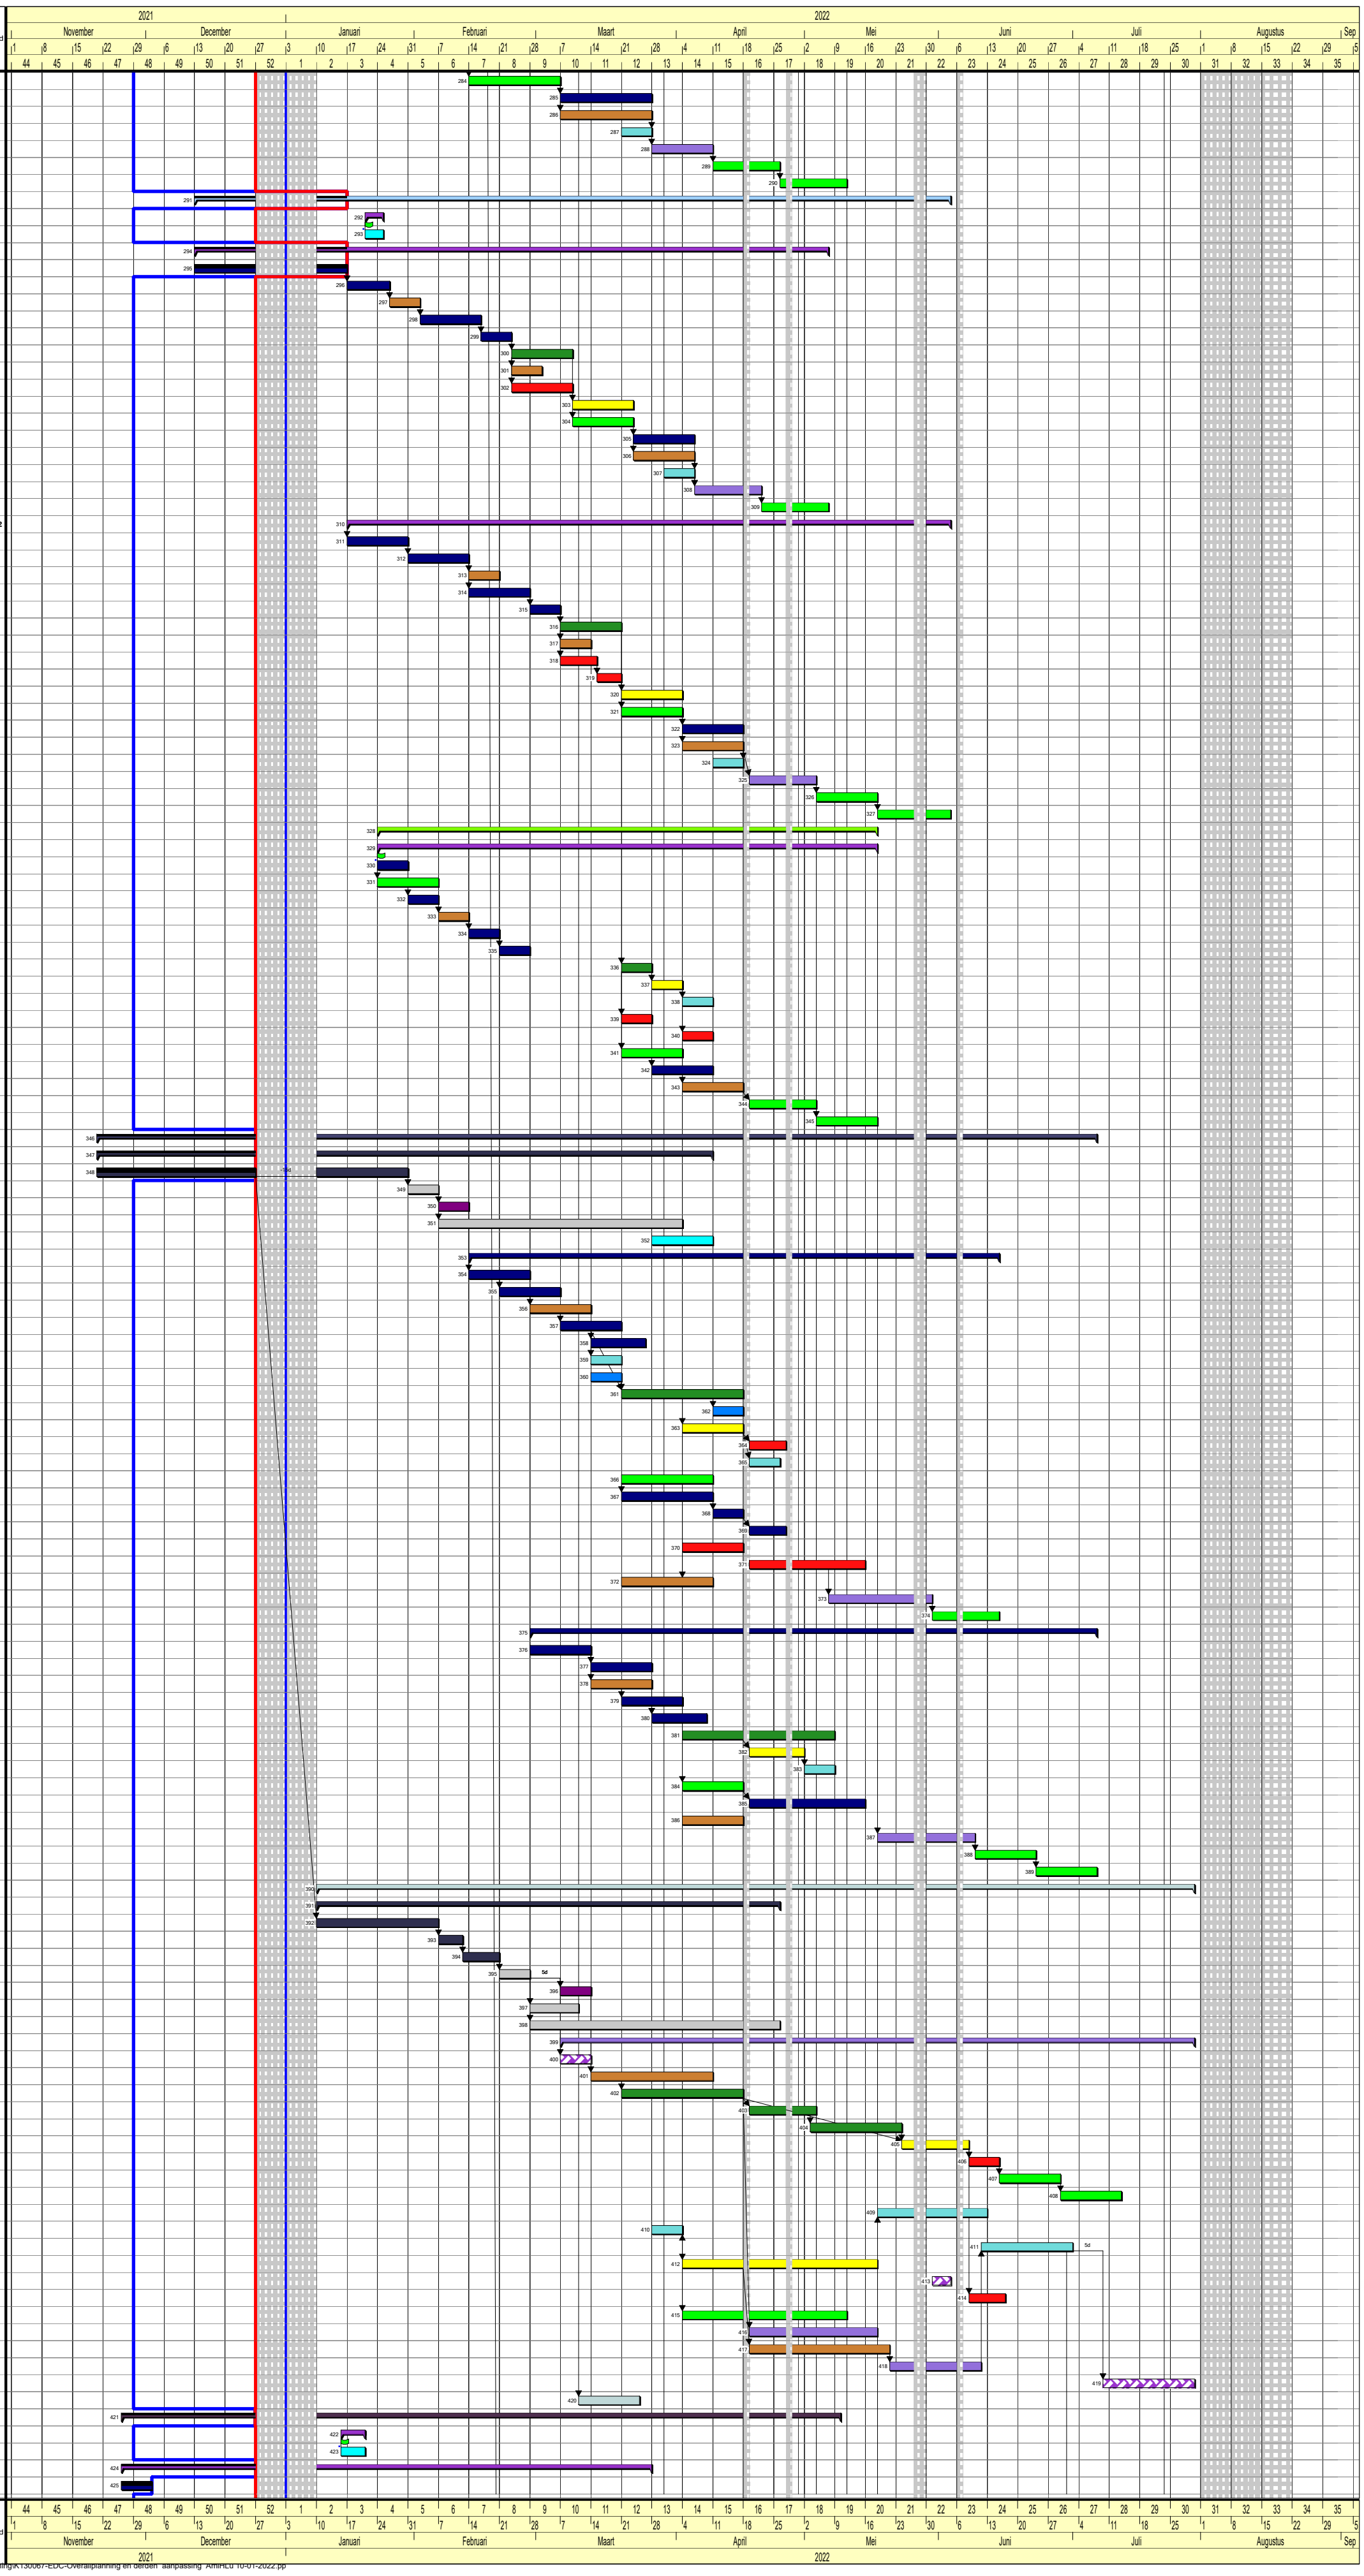

project ref: C:\Users\herbert.lubbers\Royal BAM Group nv\K130067 - Eemsdeltacampus Appingedam - General\04. Planning\Contractplanning\K130067-EDC-Overallplanning en derden aanpassing AMiHLu 10-01-2022.pp

bam
Bouw en Techniek

Regio Noord

GRONINGEN tel (050) 556 50 50

werknummer: **Regio Noord**
schemanummer: **K130067-EDC-Overallplanning**
versie: **v4**
datum: **10-1-2022**
status: **Realisatie**
opgesteld door: **AMi / HLu**

Nieuwbouw Eemsdeltacampus

Uitvoeringsfase

Overallplanning

soort schema: **Definitief**

Nr	Omschrijving	Start	Eind	Duur	Hoeveelheid
426	Beplaten met gips éénzijdig	2-12-2021	10-12-2021	7d	
427	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	13-12-2021	17-12-2021	5d	
428	Sluiten MS-wanden	20-12-2021	24-12-2021	5d	
429	Dichtzetten naden / schroefgaten	10-1-2022	14-1-2022	5d	
430	Afmontage Espero	31-1-2022	4-2-2022	5d	
431	Montage plafond	17-1-2022	28-1-2022	10d	
432	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	17-1-2022	21-1-2022	5d	
433	Montage interieur elementen F5	17-1-2022	28-1-2022	10d	
434	Montage binnendeuren	24-1-2022	28-1-2022	5d	
435	Behangwerk / schilderwerk	31-1-2022	11-2-2022	10d	
436	Diverse aftimmeringen	31-1-2022	11-2-2022	10d	
437	Bekleden wanden met berkenfineer	14-2-2022	25-2-2022	10d	
438	Afmontage installaties	14-2-2022	25-2-2022	10d	
439	Montage binnendeuren	21-2-2022	25-2-2022	5d	
440	Leggen vloerbedekking	28-2-2022	11-3-2022	10d	
441	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	14-3-2022	25-3-2022	10d	
442	**Afbouw 1e verdieping**	**2-12-2021**	**15-4-2022**	**87d**	**1160m2**
443	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	2-12-2021	10-12-2021	7d	
444	Beplaten met gips éénzijdig	13-12-2021	24-12-2021	10d	
445	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	10-1-2022	14-1-2022	5d	
446	Sluiten MS-wanden	17-1-2022	28-1-2022	10d	
447	Dichtzetten naden / schroefgaten	24-1-2022	4-2-2022	10d	
448	Montage plafond	7-2-2022	18-2-2022	10d	
449	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	7-2-2022	11-2-2022	5d	
450	Montage interieur element naar hart F3	7-2-2022	18-2-2022	10d	
451	Montage interieur element F1	7-2-2022	18-2-2022	10d	
452	Montage binnendeuren	14-2-2022	18-2-2022	5d	
453	Behangwerk / schilderwerk	21-2-2022	4-3-2022	10d	
454	Diverse aftimmeringen	21-2-2022	4-3-2022	10d	
455	Bekleden wanden met berkenfineer	7-3-2022	18-3-2022	10d	
456	Afmontage installaties	7-3-2022	18-3-2022	10d	
457	Montage binnendeuren	14-3-2022	18-3-2022	5d	
458	Leggen vloerbedekking	21-3-2022	1-4-2022	10d	
459	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	4-4-2022	15-4-2022	10d	
460	**Afbouw 2e verdieping**	**13-12-2021**	**9-5-2022**	**94d**	**1160m2**
461	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	13-12-2021	14-1-2022	15d	
462	Beplaten met gips éénzijdig	10-1-2022	21-1-2022	10d	
463	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	24-1-2022	28-1-2022	5d	
464	Sluiten MS-wanden	31-1-2022	11-2-2022	10d	
465	Dichtzetten naden / schroefgaten	31-1-2022	11-2-2022	10d	
466	Montage plafonds	14-2-2022	4-3-2022	15d	
467	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	14-2-2022	18-2-2022	5d	
468	Montage interieur elementen F2	14-2-2022	25-2-2022	10d	
469	Montage binnendeuren	28-2-2022	4-3-2022	5d	
470	Behangwerk / schilderwerk	25-2-2022	10-3-2022	10d	
471	Diverse aftimmeringen	25-2-2022	10-3-2022	10d	
472	Bekleden wanden met berkenfineer	11-3-2022	24-3-2022	10d	
473	Afmontage installaties	11-3-2022	24-3-2022	10d	
474	Montage binnendeuren	18-3-2022	24-3-2022	5d	
475	Leggen vloerbedekking	25-3-2022	7-4-2022	10d	
476	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	8-4-2022	22-4-2022	10d	
477	I-O testen regelkast en LBK	25-4-2022	9-5-2022	10d	
478	**Bouwdeel G - Kunst & Cultuur en Science**	**31-1-2022**	**29-7-2022**	**125d**	
479	**Afbouw Bouwdeel G - algemeen**	**31-1-2022**	**25-3-2022**	**40d**	
480	Aanbrengen hoofdtracés installatietechniek G	31-1-2022	18-2-2022	15d	
481	Aanbrengen anhydrietvloer	21-2-2022	25-2-2022	5d	
482	Inzagen dillataties	28-2-2022	4-3-2022	5d	
483	Aanbrengen lift	14-3-2022	25-3-2022	10d	
484	Plaatsen trappen	18-2-2022	24-2-2022	5d	
485	brandwerend schilderwerk staalconstructie	14-2-2022	4-3-2022	12d	
486	**Afbouw beganegrond**	**7-3-2022**	**4-7-2022**	**81d**	
487	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	7-3-2022	18-3-2022	10d	
488	Beplaten met gips éénzijdig	21-3-2022	1-4-2022	10d	
489	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	4-4-2022	8-4-2022	5d	
490	Sluiten MS-wanden	11-4-2022	26-4-2022	11d	
491	Dichtzetten naden / schroefgaten	19-4-2022	26-4-2022	6d	
492	Montage plafond	28-4-2022	13-5-2022	12d	
493	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	28-4-2022	4-5-2022	5d	
494	Montage interieur elementen G1	28-4-2022	13-5-2022	12d	
495	Montage binnendeuren	9-5-2022	13-5-2022	5d	
496	Behangwerk / schilderwerk	16-5-2022	25-5-2022	8d	
497	Diverse aftimmeringen	16-5-2022	25-5-2022	8d	
498	Bekleden wanden met berkenfineer	19-5-2022	1-6-2022	8d	
499	Afmontage installaties	19-5-2022	1-6-2022	8d	
500	Montage binnendeuren	24-5-2022	1-6-2022	5d	
501	Leggen vloerbedekking	2-6-2022	20-6-2022	12d	
502	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	21-6-2022	4-7-2022	10d	
503	**Afbouw 1e verdieping**	**21-3-2022**	**29-7-2022**	**90d**	**1160m2**
504	Plaatsen C-profielen MS-wanden incl. bi-kozijnen	21-3-2022	8-4-2022	15d	
505	Beplaten met gips éénzijdig	4-4-2022	14-4-2022	9d	
506	Aanbrengen installatie onderdelen i/d wand	15-4-2022	29-4-2022	9d	
507	Sluiten MS-wanden	22-4-2022	4-5-2022	8d	
508	Montage ophangconstructie Espero	22-4-2022	29-4-2022	5d	
509	Dichtzetten naden / schroefgaten	22-4-2022	6-5-2022	10d	
510	Montage plafond	9-5-2022	23-5-2022	11d	
511	Luchtkanalen plaatsen tpv lokaalscheidende wanden	9-5-2022	13-5-2022	5d	
512	Afmontage Espero	16-5-2022	20-5-2022	5d	
513	Montage binnendeuren	16-5-2022	20-5-2022	5d	
514	Montage interieur element trap naar Hart G3	9-5-2022	16-5-2022	6d	
515	Montage interieur element G2 en G5	17-5-2022	20-5-2022	4d	
516	Behangwerk / schilderwerk	24-5-2022	8-6-2022	9d	
517	Diverse aftimmeringen	24-5-2022	8-6-2022	9d	
518	Bekleden wanden met berkenfineer	1-6-2022	14-6-2022	9d	
519	Afmontage installaties	1-6-2022	14-6-2022	9d	
520	Montage binnendeuren	8-6-2022	14-6-2022	5d	
521	Leggen vloerbedekking	21-6-2022	4-7-2022	10d	
522	Inregelen installatie I-O testen naregelingen	5-7-2022	18-7-2022	10d	
523	I-O testen regelkast en LBK	18-7-2022	29-7-2022	10d	
524	**Bouwdeel H - Kas**	**30-3-2022**	**7-6-2022**	**45d**	
525	**Afbouw KAS**	**30-3-2022**	**7-6-2022**	**45d**	
526	Montage wanden	30-3-2022	12-4-2022	10d	
527	Installatie	6-4-2022	20-4-2022	10d	
528	Montage plafonds	21-4-2022	19-5-2022	20d	
529	Diverse aftimmeringen en afmontage	20-5-2022	7-6-2022	10d	
530	**Bouwdeel I - Kapschuur**	**29-4-2022**	**19-5-2022**	**15d**	
531	**Afbouw Kapschuur**	**29-4-2022**	**19-5-2022**	**15d**	
532	afwerken en aanbrengen E&W onderdelen	29-4-2022	12-5-2022	10d	
533	Aanbrengen rolhek	13-5-2022	19-5-2022	5d	
534	**Bouwdeel J - Fietsenberging**	**14-3-2022**	**25-3-2022**	**10d**	
535	**Afbouw Fietsenberging**	**14-3-2022**	**25-3-2022**	**10d**	
536	afwerken en aanbrengen E installaties	14-3-2022	25-3-2022	10d	
537	Sportinrichting - gebouw E - Sport	30-6-2022	20-7-2022	15d	
538	Inrichting Kunst & Sience - Gebouw G	5-7-2022	29-8-2022	40d	
539	Inrichting Keuken - Gebouwen: C - George	4-5-2022	1-7-2022	40d	
	- incl. koelcel				
540	Inrichting Keuken - Gebouwen: E - Sport	10-5-2022	7-7-2022	40d	
	- incl. vaste inrichting gymzalen				
	- incl. truss tbv dans/theaterzaal				
541	Inrichting werkplaats - Gebouw D - Werkplaats	18-5-2022	15-7-2022	40d	
	- incl. hefbrug				
	- incl. poetsbrug				
	- incl. vaste machines				
	Terrein en terreininrichting				
542	Demobilisatie bouwterrein	26-7-2022	29-8-2022	10d	
543	**opnemen en afhandelen restpunten**	**28-3-2022**	**29-8-2022**	**91d**	
544	A- Hart	22-7-2022	25-8-2022	10d	
545	B - Theda	11-5-2022	24-5-2022	10d	
546	C - George	4-7-2022	15-7-2022	10d	
547	D - Werkplaats	18-7-2022	29-7-2022	10d	
548	E1 en E2 - Sportgebouw	7-7-2022	20-7-2022	10d	
549	F - Rudolph	8-4-2022	22-4-2022	10d	
550	G - Kunst&Cultuur en Science	26-7-2022	29-8-2022	10d	
551	H - Kas	8-6-2022	21-6-2022	10d	
552	I - kapschuur	20-5-2022	7-6-2022	10d	
553	J - Fietsenberging	28-3-2022	8-4-2022	10d	
554	Oplevering	29-8-2022	29-8-2022		

Onderdeel;Bouwdelen

Samenvattingsregel; B - Theda; 45 interieur elementen; Bosan; A - Hart; 50 Luchtkanalen; I - Kapschuur; 32 Krepla; 05 Gjaltema Steigerbouw; 24 Holland cladding; J - Fietsenberging; Overall; 21 Beton Techniek Noord; C - George; 46 Firestop; E1 - Sport; D - Werkplaats; 42 Dekvloeren; 25 Staalconstructie Hofman; 38 De Haan westerhof; 17 Zagen dilataties; 50/60/70 Installaties; 00 Verhardingstijd; E2 - Sport; 24 HSB wanden; 44 Plafonds; G - Kunst&Cultuur en Science; F - Rudolph; 46 / 48 behang en schilderwerk; H - Kas; BAM Bouw en Techniek Bouwkundig; 12 Grondwerk - Dusseldorp; 44 Metalstudwanden; 30 Aluminium kozijnen; 48 Vloerbedekking; 33 Jalving dakdekker; 17 Kassenbouwer; 80 Liften; 24 Dakplaten; SROI; 30 Binnendeuren

project ref: C:\Users\herbert.lubbers\Royal BAM Group nv\K130067 - Eemsdeltacampus Appingedam - General\04. Planning\Contractplanning\K130067-EDC-Overallplanning en derden aanpassing AmiHLu 10-01-2022.pp
