Penitentiare Inrichting Vught

Status: Voorstel
Project: Opstellen Bestek PZI/MAI
Doc.nr: 7361.93.BF.BE.P.001.c.PdG
Datum: 12 april 2023
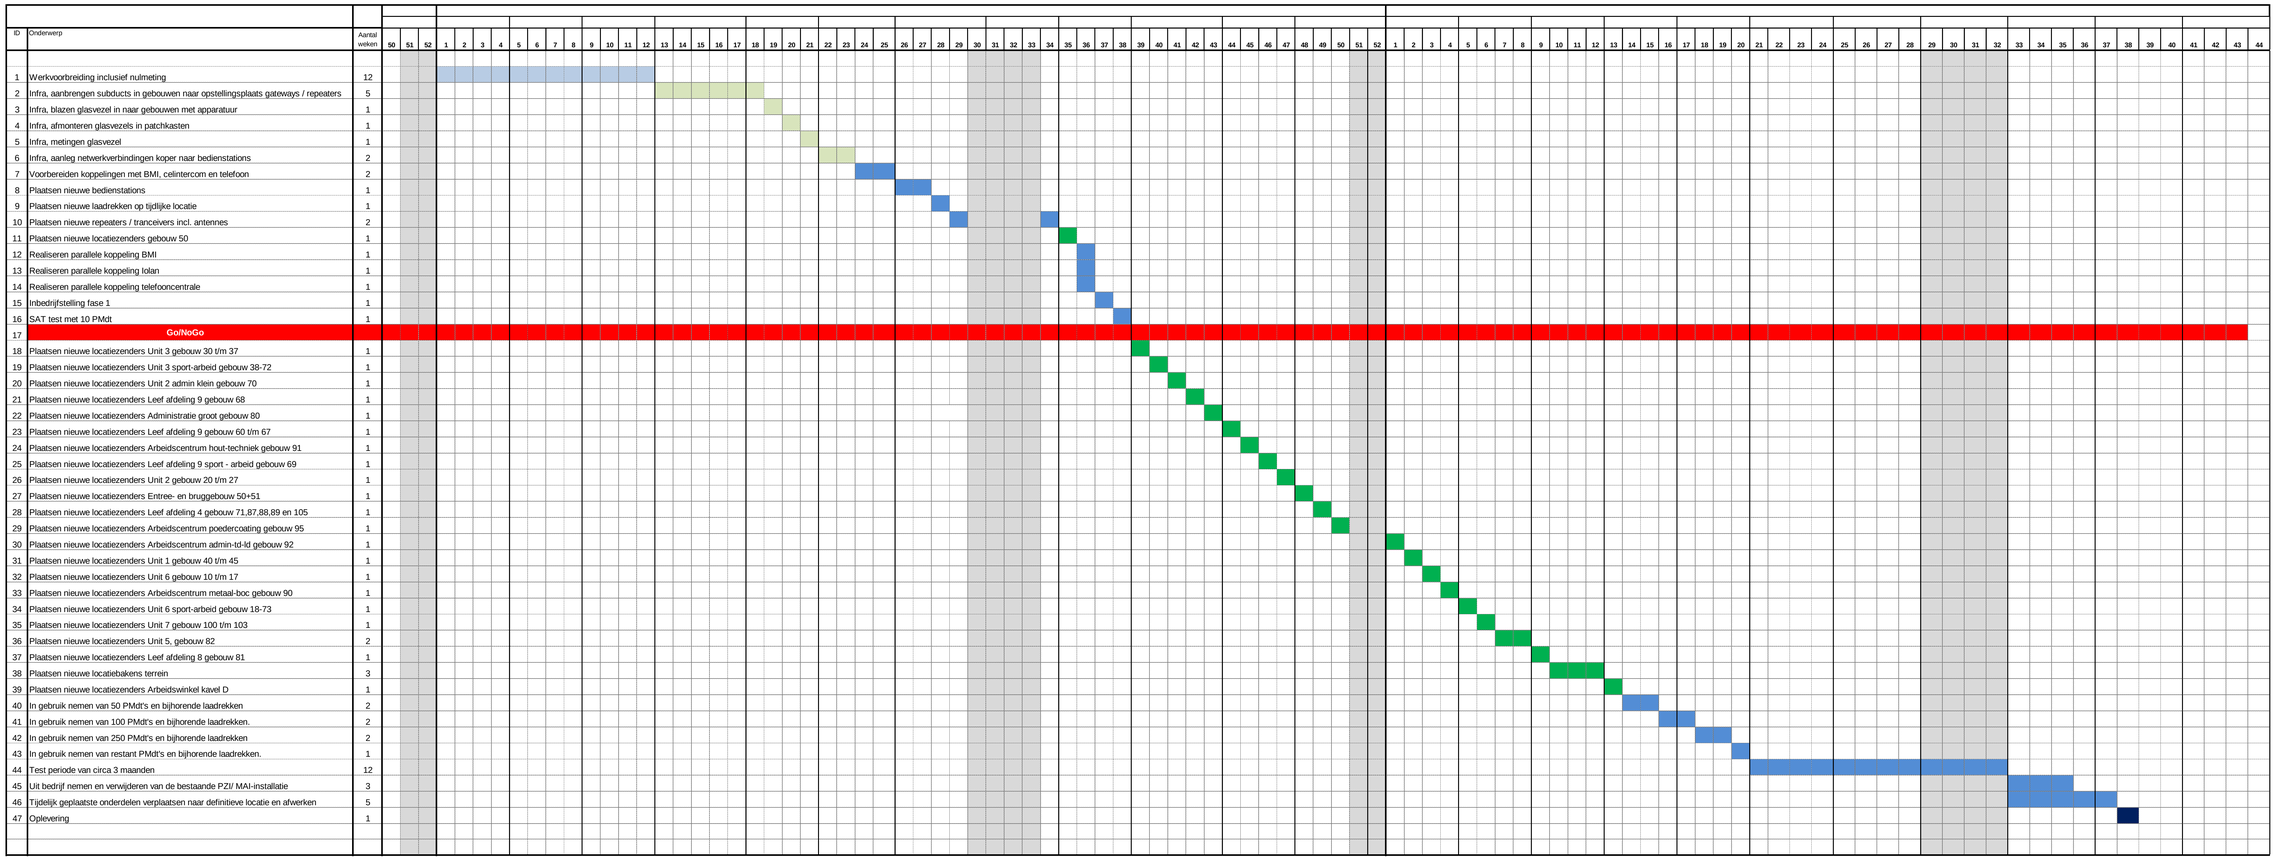
ID	Onderwerp	Aantal weken
1	Werkvoorbreiding inclusief nulmeting	12
2	Infra, aanbrengen subducts in gebouwen naar opstellingsplaats gateways / repeaters	5
3	Infra, blazen glasvezel in naar gebouwen met apparatuur	1
4	Infra, afmonteren glasvezels in patchkasten	1
5	Infra, metingen glasvezel	1
6	Infra, aanleg netwerkverbindingen koper naar bedienstations	2
7	Voorbereiden koppelingen met BMI, celintercom en telefoon	2
8	Plaatsen nieuwe bedienstations	1
9	Plaatsen nieuwe laadrekken op tijdlijke locatie	1
10	Plaatsen nieuwe repeaters / tranceivers incl. antennes	2
11	Plaatsen nieuwe locatiezenders gebouw 50	1
12	Realiseren parallele koppeling BMI	1
13	Realiseren parallele koppeling Iolan	1
14	Realiseren parallele koppeling telefooncentrale	1
15	Inbedrijfstelling fase 1	1
16	SAT test met 10 PMdt	1
17	**Go/NoGo**	
18	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 3 gebouw 30 t/m 37	1
19	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 3 sport-arbeid gebouw 38-72	1
20	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 2 admin klein gebouw 70	1
21	Plaatsen nieuwe locatiezenders Leef afdeling 9 gebouw 68	1
22	Plaatsen nieuwe locatiezenders Administratie groot gebouw 80	1
23	Plaatsen nieuwe locatiezenders Leef afdeling 9 gebouw 60 t/m 67	1
24	Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidscentrum hout-techniek gebouw 91	1
25	Plaatsen nieuwe locatiezenders Leef afdeling 9 sport - arbeid gebouw 69	1
26	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 2 gebouw 20 t/m 27	1
27	Plaatsen nieuwe locatiezenders Entree- en bruggebouw 50+51	1
28	Plaatsen nieuwe locatiezenders Leef afdeling 4 gebouw 71,87,88,89 en 105	1
29	Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidscentrum poedercoating gebouw 95	1
30	Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidscentrum admin-td-ld gebouw 92	1
31	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 1 gebouw 40 t/m 45	1
32	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 6 gebouw 10 t/m 17	1
33	Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidscentrum metaal-boc gebouw 90	1
34	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 6 sport-arbeid gebouw 18-73	1
35	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 7 gebouw 100 t/m 103	1
36	Plaatsen nieuwe locatiezenders Unit 5, gebouw 82	2
37	Plaatsen nieuwe locatiezenders Leef afdeling 8 gebouw 81	1
38	Plaatsen nieuwe locatiebakens terrein	3
39	Plaatsen nieuwe locatiezenders Arbeidswinkel kavel D	1
40	In gebruik nemen van 50 PMdt's en bijhorende laadrekken	2
41	In gebruik nemen van 100 PMdt's en bijhorende laadrekken.	2
42	In gebruik nemen van 250 PMdt's en bijhorende laadrekken	2
43	In gebruik nemen van restant PMdt's en bijhorende laadrekken.	1
44	Test periode van circa 3 maanden	12
45	Uit bedrijf nemen en verwijderen van de bestaande PZI/ MAI-installatie	3
46	Tijdelijk geplaatste onderdelen verplaatsen naar definitieve locatie en afwerken	5
47	Oplevering	1
