

BOVENAANZICHT

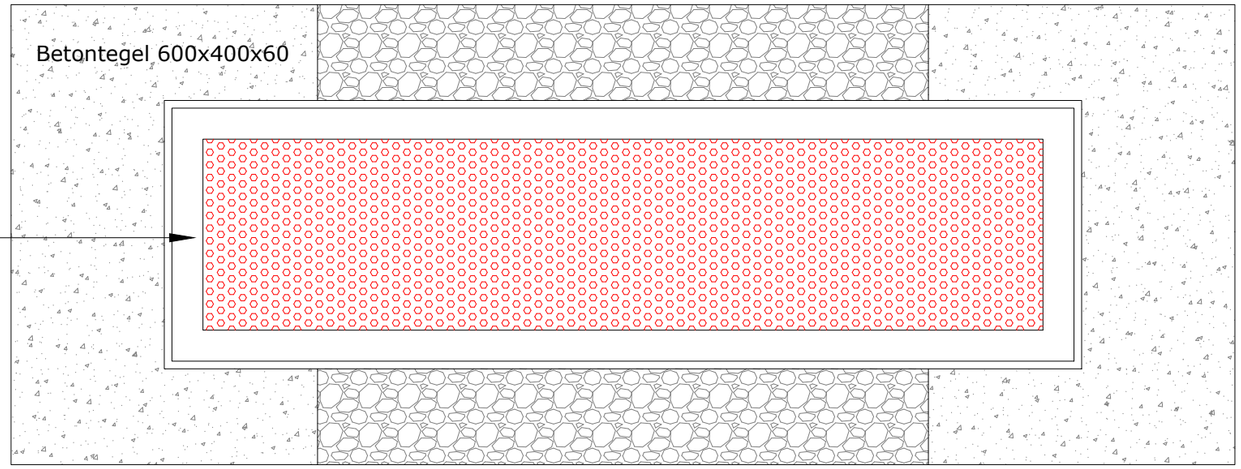

6 Aanbrengen compriband voor plaatsing van RVS kast op de fundatie

VOORAANZICHT

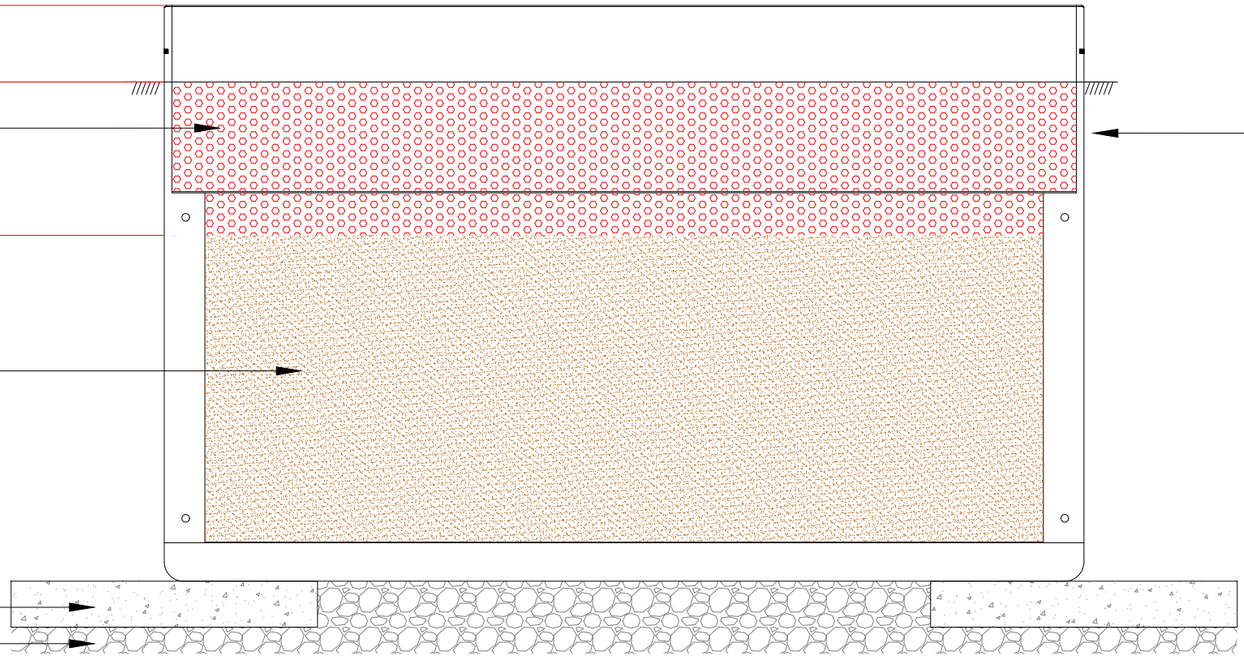

Fundatie koppelgaten

1 Aanbrengen laag gebroken puin of zand (afhankelijk van stabiliteit ondergrond)

2 Aanbrengen betontegels 640x400x60 (waterpas maken d.m.v. laseren)

3 Fundatie afvullen met schoon droog rivierzand

4 Fundatie afvullen met 20cm vochtverende korrels (Anti-hygroscopisch)

5 Fundatie 10cm uit laten steken boven maaiveld of tegelplateau

Opdrachtgever	GEMEENTE UTRECHT				
PLAATSINGSINSTRUCTIE Ondergrondse RVS koppelfundatie met vochtwerende korrels					
gecorrigeerd	-	-			
getekend	J.W. Bagerman	10-04-2025	formaat A3	schaal n.v.t.	
gecontroleerd	M. van Laar	10-04-2025	blad 1 in 3 bladen		
vrijgegeven	H. Hoeflake	10-04-2025	status Definitief	versie 2.0	teknr IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0

Gemeente Utrecht

IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0.dwg

1.1 Plaatsen Schakel en verdeelinrichting

A) De voedingskast die geplaats te worden conform de voorschriften

Fundatie bijlage IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0_blad 1:
- Aanbrengen laag gebroken puin of zand (afhankelijk van stabiliteit ondergrond).
- 5-10cm schoonzand op de bodem aanbrengen en aan stampen/verdichten.
- Aanbrengen betontegels 640x400x60 (waterpas maken d.m.v. laseren).
- Fundatie afvullen met 20cm schoon droog rivierzand
- Fundatie afvullen tot maaiveld met vochtverende Hygroscopische korrels 20cm.
- Fundatie ± 10cm uit laten steken boven maaiveld of tegelplateau aangegeven op sticker “maaiveldhoogte’ voorzijde fundatie.
- Aan de voorzijde kast 3 rijen straatwerk opnemen van tegels 300x300x45mm opgesloten in betonbanden 50x150x1000mm


B) Plaatsen OVL-kast op de fundatie:


- Aanbrengen van compriband op de fundatie rand
- Kast plaatsen op de fundatie en vastzetten met RVS-koppelbouten + ringen.

C) Bij plaatsing van een OVL-kast op aanwijzing van de gemeente:

- Bij plaatsing van een OVL-kast tegen een wand/muur dient de kast uitgevoerd te worden met het enkelvoudig schuin dak van 30 graden en hoogte 20 cm aflopen naar de voorzijde.
- Bij Plaatsing op cruciale locatie op aanwijzing van de gemeente de toepassing van het puntdak. Dit dak is uitgevoerd met een schuin/punt dak van 120 graden hoek in het midden Aflopend naar de voorzijde en achterzijde, waarbij de hoogte van het dak 10cm betreft.

Opdrachtgever	GEMEENTE UTRECHT				Gemeente Utrecht
PLAATSINGSINSTRUCTIE OVL-Kast Gemeente Utrecht					
gecorrigeerd	-	-			
getekend	J.W. Bagerman	10-04-2025	formaat A3	schaal n.v.t.	
gecontroleerd	M. van Laar	10-04-2025	blad 2 in 3 bladen		
vrijgegeven	H. Hoeflake	10-04-2025	status Definitief	versie 2.0	teknr IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0

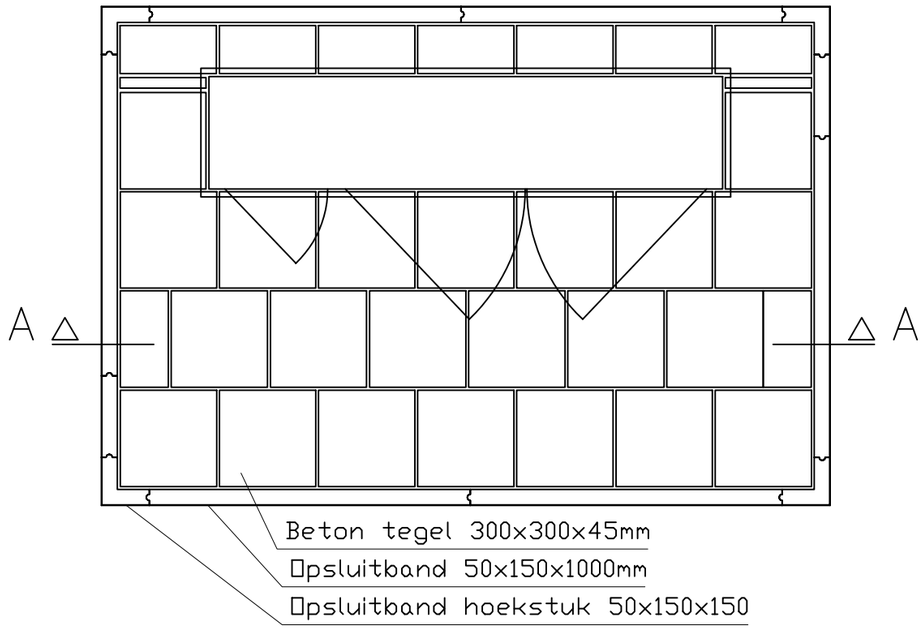

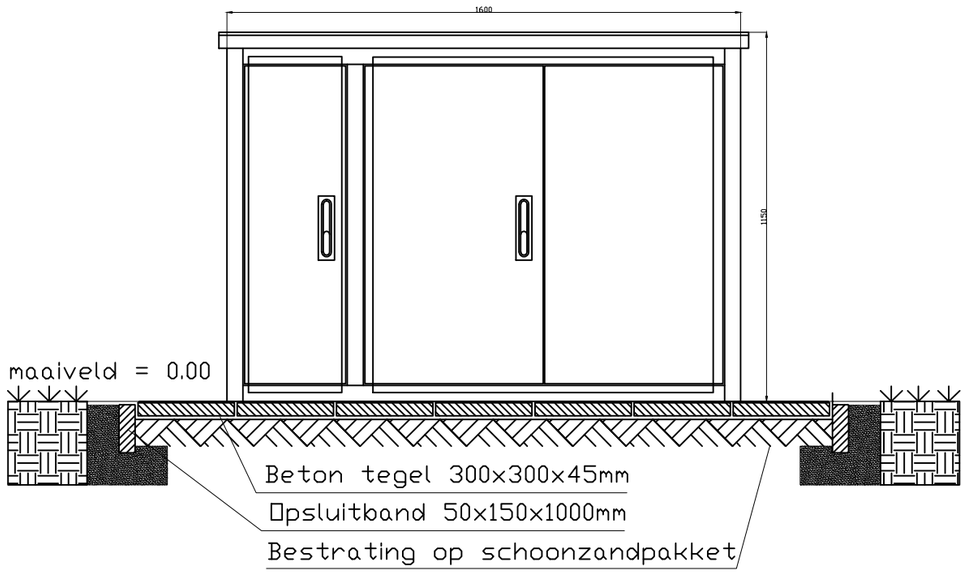

DWARSDOORSNEDE A-A

Opdrachtgever	GEMEENTE UTRECHT				
VOORBEELD Tegelplateau OVL-Kast Gemeente Utrecht					
gecorrigeerd	-	-			
getekend	J.W. Bagerman	10-04-2025	formaat A3	schaal n.v.t.	
gecontroleerd	M. van Laar	10-04-2025	blad 3 in 3 bladen		
vrijgegeven	H. Hoeflake	10-04-2025	status Definitief	versie 2.0	teknr IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0

Gemeente Utrecht

IT240304-PL-FUN-KST-UO-2.0.dwg
