Statusdatum: maa 23-2-26
Printdatum: maa 23-2-26

Baggeren regulier 2026

Actieve taken

Id		Taaknaam	Rolhouder	Verantw	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
0		**Baggeren Regulier 2026**			**2%**	**295,4w**	**maa 3-11-25**	**din 10-2-32**
1		**Baggeren Regulier 2026 DGO**			**10%**	**295,4w**	**maa 3-11-25**	**din 10-2-32**
2		**Resource-inset**			**0%**	**295,4w**	**maa 3-11-25**	**din 10-2-32**
9		**10_Initiatieffase**			**89%**	**13,4w**	**maa 3-11-25**	**din 17-2-26**
10		Start Initiatieffase			0%	0w	maa 3-11-25	maa 3-11-25
11	✓	**Scope**			**100%**	**7w**	**maa 3-11-25**	**vri 19-12-25**
18	✓	**Updaten Programmacontract (intern)**			**100%**	**9w**	**maa 3-11-25**	**vri 16-1-26**
23	✓	**Voorbereiden uitvraag IB**			**100%**	**8w**	**maa 3-11-25**	**vri 9-1-26**
27	✓	**Kredietaanvraag**			**100%**	**9,4w**	**maa 1-12-25**	**din 17-2-26**
33		**Gate 1**			**0%**	**4w**	**maa 19-1-26**	**vri 13-2-26**
34		Voorbereiden	MPB	OG	0%	2w	maa 19-1-26	vri 30-1-26
35		Doorlopen	PM	OG	0%	2w	maa 2-2-26	vri 13-2-26
36		Akkoord	PM	OG	0%	0w	vri 13-2-26	vri 13-2-26
37		**Risicoreservering 10_Initiatieffase**			**0%**	**0w**	**vri 13-2-26**	**vri 13-2-26**
42		Einde Initiatieffase			0%	0w	din 17-2-26	din 17-2-26
43		**30_Definitiefase**			**1%**	**27w**	**woe 18-2-26**	**din 15-9-26**
44		Start Definitiefase deel 1 van 2			67%	1,2w	woe 18-2-26	woe 25-2-26
45		**Aanbesteding (Uitvraag IB)**			**0%**	**12,8w**	**don 26-2-26**	**din 26-5-26**
46		Versturen uitnodigingen / publicatie	CM	OG	0%	0,6w	don 26-2-26	maa 2-3-26
47		Inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	38vd	maa 2-3-26	don 9-4-26
48		Versturen (laatste) nota van inlichtingen	CM	OG	0%	1,4w	woe 18-3-26	don 26-3-26
49		Einde inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	0w	don 9-4-26	don 9-4-26
50		Beoordeling aanbiedingen door projectteam	CM	OG	0%	2w	vri 10-4-26	don 23-4-26
51		Opstellen en vaststellen voorlopig gunningsadvies	CM	OG	0%	1,4w	vri 24-4-26	maa 4-5-26
52		Stand-still periode	CM	OG	0%	22vd	maa 4-5-26	din 26-5-26
53		Definitieve gunning	CM	OG	0%	0w	din 26-5-26	din 26-5-26
54		**Voorbereiden Ontwerpfase IB**			**0%**	**7w**	**woe 27-5-26**	**din 14-7-26**
55		Concept PMP (Project Management Plan) opstellen P.3	MPB	ON	0%	2w	woe 27-5-26	din 9-6-26
56		Eerste review concept PMP P.3	MPB	OG	0%	1w	woe 10-6-26	din 16-6-26
57		Organiseren Projectstartup (PSU)	CM	ON	0%	1w	woe 10-6-26	din 16-6-26
58		PMP definitief maken en opleveren P.3	MPB	ON	0%	1w	woe 17-6-26	din 23-6-26
59		PMP definitieve versie beoordelen P.3	MPB	OG	0%	1w	woe 24-6-26	din 30-6-26
60		Organiseren Risicosessie (door IB)	MPB	ON	0%	1w	woe 17-6-26	din 23-6-26
61		Concept Risicodossier opstellen P.4	MPB	ON	0%	1w	woe 24-6-26	din 30-6-26
62		Organiseren Validatie & Verificatiesessie (door IB)	CM	ON	0%	1w	woe 1-7-26	din 7-7-26
63		Review Concept Risicodossier P.4	MPB	OG	0%	1w	woe 1-7-26	din 7-7-26
64		Risicodossier definitief opleveren P.4	MPB	ON	0%	1w	woe 8-7-26	din 14-7-26
65		Voorbereiden Ontwerpfase IB gereed			0%	0w	din 14-7-26	din 14-7-26
66		**Voorbereiden Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			**0%**	**4w**	**woe 15-7-26**	**din 1-9-26**
67		Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	2w	woe 15-7-26	din 28-7-26
68		Opstellen en klaarzetten Brief 1: Inpeilen en bemonsteren	OM	OG	0%	2w	woe 29-7-26	din 1-9-26
69		Overheden informeren start inpeilen	OM	OG	0%	1w	woe 29-7-26	din 25-8-26
70		Voorbereiden Brief 1 gereed			0%	0w	din 1-9-26	din 1-9-26
71		**V&G Plan**			**0%**	**5w**	**woe 15-7-26**	**din 8-9-26**
72		Aanleveren V&G plan door IB P.6	TM	ON	0%	2w	woe 15-7-26	din 28-7-26
73		Review V&G plan P.6	TM	OG	0%	2w	woe 29-7-26	din 1-9-26
74		V&G plan definitief maken P.6	TM	ON	0%	1w	woe 2-9-26	din 8-9-26
75		V&G plan gereed			0%	0w	din 8-9-26	din 8-9-26
76		**Meetplan**			**0%**	**6w**	**woe 15-7-26**	**din 15-9-26**
77		Concept meetplan inpeilen opleveren P.7	TM	ON	0%	2w	woe 15-7-26	din 28-7-26
78		Review meetplan P.7	TM	OG	0%	2w	woe 29-7-26	din 1-9-26
79		Definitief maken meetplan P.7	TM	ON	0%	2w	woe 2-9-26	din 15-9-26
80		Meetplan gereed			0%	0w	din 15-9-26	din 15-9-26
81		**Risicoreservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0w**	**din 15-9-26**	**din 15-9-26**
86		Einde Definitiefase deel 1 van 2			0%	0w	din 15-9-26	din 15-9-26
87		**Baggeren Regulier 2026 DG3**			**0%**	**237w**	**din 15-9-26**	**din 23-9-31**
88		**30_Definitiefase**			**0%**	**28w**	**din 15-9-26**	**din 13-4-27**
89		Start Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 15-9-26	din 15-9-26
90		**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			**0%**	**2w**	**woe 16-9-26**	**din 29-9-26**
91		Versturen Brief 1: Inpeilen en en Bemonsteren			0%	2w	woe 16-9-26	din 29-9-26
92		Versturen Brief 1 gereed			0%	0w	din 29-9-26	din 29-9-26
93		**Inpeilen**			**0%**	**14w**	**woe 30-9-26**	**din 19-1-27**
94		Inpeilen	TM	ON	0%	10w	woe 30-9-26	din 8-12-26
95		Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5w	woe 30-9-26	din 3-11-26
96		Aanleveren peilverschillen P.8	TM	ON	0%	5w	woe 30-9-26	din 3-11-26
97		Review peilverschillen P.8	TM	OG	0%	5w	woe 7-10-26	din 10-11-26
98		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 14-10-26	din 10-11-26
99		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	OG	0%	4w	woe 21-10-26	din 17-11-26
100		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 28-10-26	din 24-11-26
101		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.12	TM	ON	0%	2w	woe 25-11-26	din 8-12-26
102		Review baggernoodzaak kaart P.12	TM	OG	0%	2w	woe 9-12-26	din 5-1-27
103		Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 25-11-26	din 8-12-26
104		Review geodatabase per DG P.13	TM	OG	0%	2w	woe 9-12-26	din 5-1-27
105		VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2w	woe 6-1-27	din 19-1-27
106		Inpeilen gereed			0%	0w	din 19-1-27	din 19-1-27
107		**Veldinventarisatie**			**0%**	**11w**	**woe 30-9-26**	**din 15-12-26**
108		Veldinventarisatie (Veldwerk) P.14	OM	ON	0%	4w	woe 30-9-26	din 27-10-26
109		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	2w	woe 28-10-26	din 10-11-26
110		Beoordelen concept veldinventarisatie P.14	OM	OG	0%	2w	woe 11-11-26	din 24-11-26
111		Definitief opleveren veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	1w	woe 25-11-26	din 1-12-26
112		Opleveren issuelijst en toetsmmingentabel P.15, P.16	OM	ON	0%	2w	woe 2-12-26	din 15-12-26
113		Veldinventarisatie gereed			0%	0w	din 15-12-26	din 15-12-26
114		**SSK-Raming**			**0%**	**8w**	**woe 20-1-27**	**din 16-3-27**
115		Opstellen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 20-1-27	din 2-2-27
116		Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 3-2-27	din 16-2-27
117		Aanpassen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 17-2-27	din 2-3-27
118		Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 3-3-27	din 16-3-27
119		SSK-raming gereed			0%	0w	din 16-3-27	din 16-3-27
120		**Gate 2**			**0%**	**4w**	**woe 17-3-27**	**din 13-4-27**
121		Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1w	woe 17-3-27	din 23-3-27
122		Gate doorlopen	PM	OG	0%	3w	woe 24-3-27	din 13-4-27
123		Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 13-4-27	din 13-4-27
124		**Risico-reservering 30_Definitiefase**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 13-4-27**	**din 13-4-27**
129		DG1 | Einde | 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 13-4-27	din 13-4-27
130		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**118w**	**din 13-4-27**	**din 16-10-29**
131		Start Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 13-4-27	din 13-4-27
132		**Kaarten Overheid**			**0%**	**14w**	**woe 14-4-27**	**din 20-7-27**
133		Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit P.18	OM	ON	0%	4w	woe 14-4-27	din 11-5-27
134		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10w	woe 12-5-27	din 20-7-27
135		Kaarten Overheid gereed			0%	0w	din 20-7-27	din 20-7-27
136		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**19w**	**woe 14-4-27**	**din 14-9-27**
137		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1w	woe 14-4-27	din 20-4-27
138		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 21-4-27	din 18-5-27
139		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4w	woe 19-5-27	din 15-6-27
140		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 16-6-27	din 29-6-27
141		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2w	woe 30-6-27	din 13-7-27
142		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 14-7-27	din 17-8-27
143		Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie) gereed			0%	0w	din 17-8-27	din 17-8-27
144		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	4w	woe 18-8-27	din 14-9-27
145		Einde | Opdracht naar Aquon en vooronderzoek			0%	0w	din 14-9-27	din 14-9-27
148		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**21w**	**woe 15-9-27**	**din 22-2-28**
149		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	15w	woe 15-9-27	din 11-1-28
150		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 12-1-28	din 8-2-28
151		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 9-2-28	din 22-2-28
152		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 12-1-28	din 8-2-28
153		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 9-2-28	din 22-2-28
154		Bemonsteren & Analyseren gereed			0%	0w	din 22-2-28	din 22-2-28
155		**Verdeling Deelgebieden regulier 2026 t/m 2030 (door aannemers)**			**0%**	**9,2w**	**woe 8-9-27**	**woe 10-11-27**
156		Aanleveren documenten aan aannemers	CM	OG	0%	1d	woe 8-9-27	woe 8-9-27
157		Bijeenkomst door OG	CM	OG	0%	1w	don 16-9-27	woe 22-9-27
158		Nadere afstemming aannemers	CM	OG	0%	2w	don 23-9-27	woe 6-10-27
159		Opstellen PVA door aannemers	CM	OG	0%	4w	don 23-9-27	woe 20-10-27
160		Bijeenkomst door OG	CM	OG	0%	1w	don 21-10-27	woe 27-10-27
161		Toetsen PVA	CM	OG	0%	2w	don 21-10-27	woe 3-11-27
162		Aanpassen PVA	CM	OG	0%	1w	don 4-11-27	woe 10-11-27
163		Verdeling Deelgebieden gereed	CM	OG	0%	0w	woe 10-11-27	woe 10-11-27
164		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**12w**	**woe 23-2-28**	**din 16-5-28**
165		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 23-2-28	din 7-3-28
166		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 8-3-28	din 21-3-28
167		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 22-3-28	din 18-4-28
168		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 19-4-28	din 16-5-28
169		Verkennend Asbestonderzoek gereed			0%	0w	din 16-5-28	din 16-5-28
170		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**14w**	**woe 23-2-28**	**din 30-5-28**
171		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 23-2-28	din 7-3-28
172		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 8-3-28	din 21-3-28
173		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 22-3-28	din 18-4-28
174		Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 19-4-28	din 2-5-28
175		Analyseren monsters IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 3-5-28	din 16-5-28
176		Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2w	woe 17-5-28	din 30-5-28
177		Afperkend onderzoek gereed			0%	0w	din 30-5-28	din 30-5-28
178		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**22w**	**woe 23-2-28**	**din 25-7-28**
179		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**8w**	**woe 23-2-28**	**din 18-4-28**
180		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	6w	woe 23-2-28	din 4-4-28
181		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 5-4-28	din 18-4-28
182		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**6w**	**woe 17-5-28**	**din 27-6-28**
183		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 17-5-28	din 30-5-28
184		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 31-5-28	din 13-6-28
185		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 14-6-28	din 27-6-28
186		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4w**	**woe 31-5-28**	**din 27-6-28**
187		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 31-5-28	din 13-6-28
188		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 14-6-28	din 27-6-28
189		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4w**	**woe 28-6-28**	**din 25-7-28**
190		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 28-6-28	din 11-7-28
191		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 12-7-28	din 25-7-28
192		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed			0%	0w	din 25-7-28	din 25-7-28
193		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**5w**	**woe 26-7-28**	**din 19-9-28**
194		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.13, P.19	TM	ON	0%	2w	woe 26-7-28	din 29-8-28
195		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.13, P.19	TM	OG	0%	1w	woe 30-8-28	din 5-9-28
196		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2w	woe 6-9-28	din 19-9-28
197		Uitvoeringsscope gereed			0%	0w	din 19-9-28	din 19-9-28
198		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**18w**	**woe 6-9-28**	**din 23-1-29**
199		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4w	woe 6-9-28	din 3-10-28
200		Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.20	OM	ON	0%	4w	woe 20-9-28	din 17-10-28
201		Afstemmen kwaliteit + kosten overheden	OM	OG	0%	8w	woe 18-10-28	din 12-12-28
202		Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4w	woe 13-12-28	din 23-1-29
203		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed			0%	0w	din 23-1-29	din 23-1-29
204		**SSK-Raming**			**0%**	**20w**	**woe 20-9-28**	**din 20-2-29**
205		Risicosessie	MPB	ON	0%	2w	woe 20-9-28	din 3-10-28
206		Opstellen rapport risicosessie P.4	MPB	ON	0%	2w	woe 4-10-28	din 17-10-28
207		Opstellen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 13-12-28	din 9-1-29
208		Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 10-1-29	din 23-1-29
209		Aanpassen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 24-1-29	din 6-2-29
210		Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 7-2-29	din 20-2-29

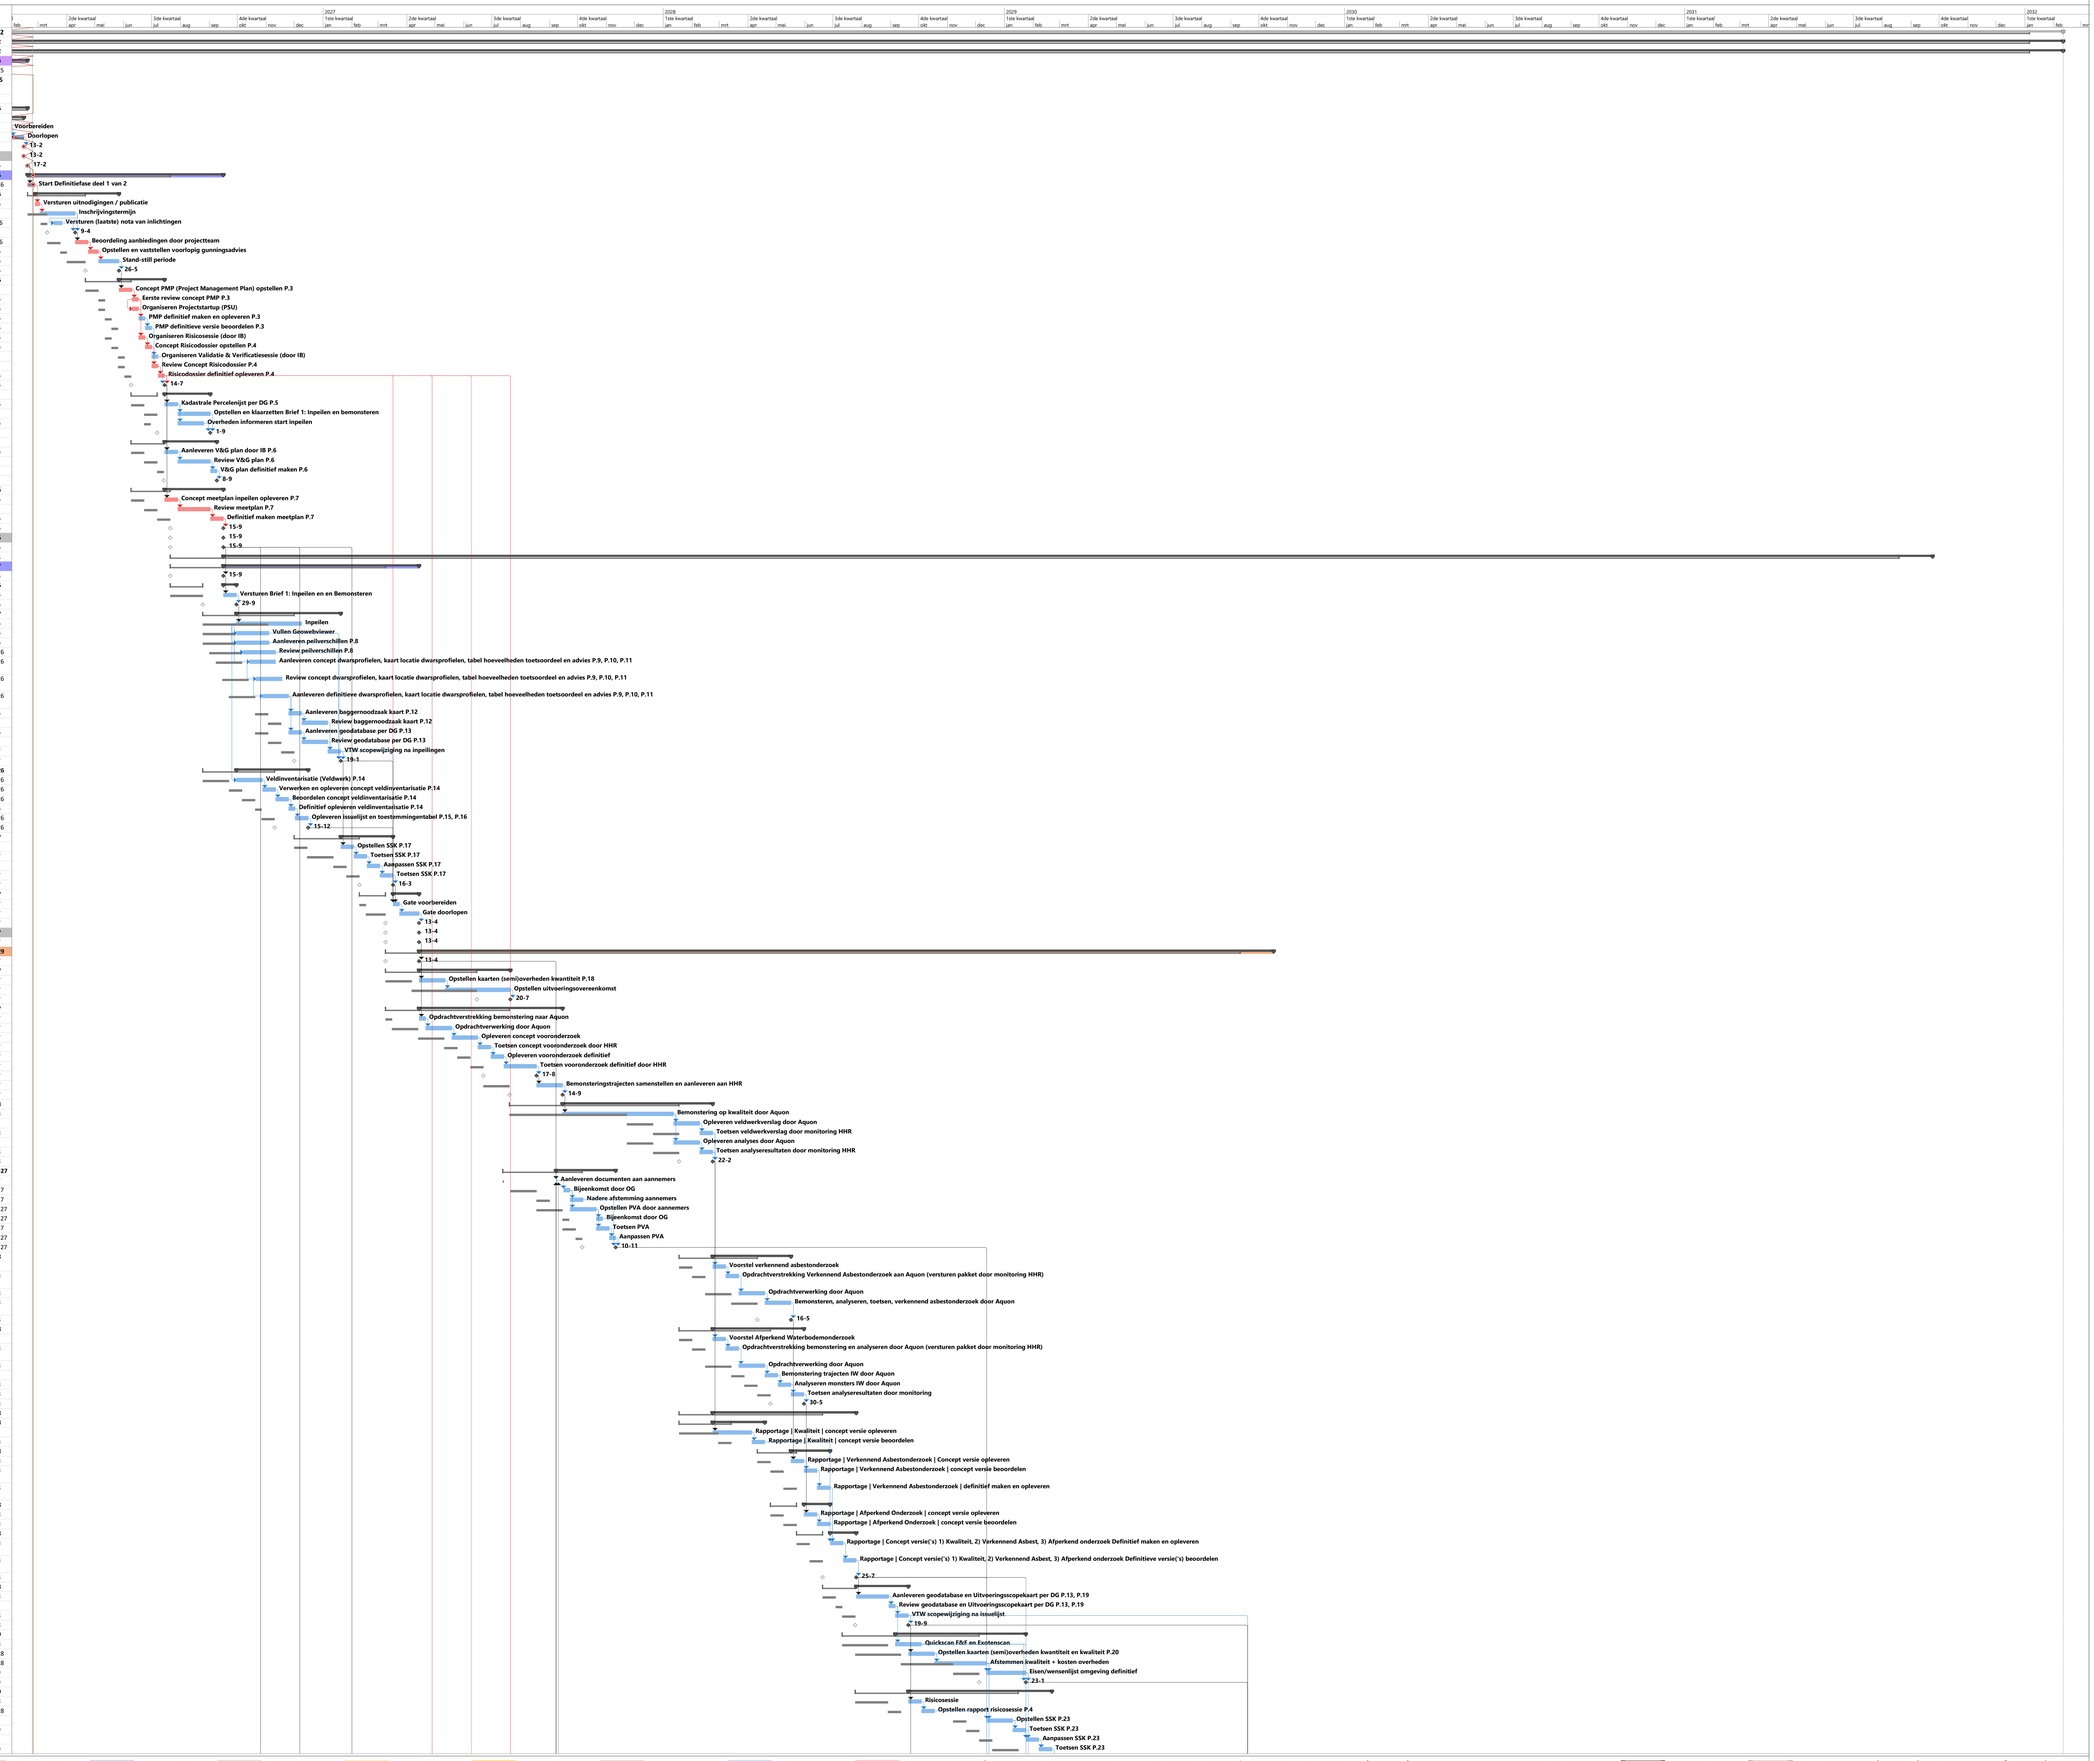

10_Initiatieffase | 30_Definitiefase | 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp | 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding | 60_Uitvoeringsfase, Realisatie | 65_Nazorgfase | Conditionering | Risicoreservering | Taak | Kritiek | Mijlpaal | Basislijn | Mijlpaal van basislijn | Samenvattingstaak van basislijn | Voortgang | Samenvatting | Projectsamenvatting | Deadline OK | Deadline NOK

Statusdatum: maa 23-2-26
Printdatum: maa 23-2-26

Baggeren regulier 2026

Actieve taken

Id	Taaknaam	Rolhouder	Verantw.	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
211	SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed			0%	0d	din 20-2-29	din 20-2-29
212	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			0%	5w	**woe 20-9-28**	**din 24-10-28**
213	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	2w	woe 20-9-28	din 3-10-28
214	Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	3w	woe 4-10-28	din 24-10-28
215	Communicatie Omgeving Brief 2 gereed			0%	0w	din 24-10-28	din 24-10-28
216	**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			0%	15w	**woe 13-12-28**	**din 10-4-29**
217	Opstellen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	ON	0%	2w	woe 13-12-28	din 9-1-29
218	Toetsen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	OG	0%	2w	woe 10-1-29	din 23-1-29
219	V&G-plan Ontwerp gereed P.22	CM	ON	0%	2w	woe 24-1-29	din 6-2-29
220	Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	ON	0%	2w	woe 24-1-29	din 6-2-29
221	Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	OG	0%	2w	woe 7-2-29	din 20-2-29
222	Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.21	CM	ON	0%	2w	woe 21-2-29	din 6-3-29
223	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 6-3-29	din 6-3-29
224	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 7-3-29	din 20-3-29
225	Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	2w	woe 14-3-29	din 27-3-29
226	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2w	woe 21-3-29	din 3-4-29
227	Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1w	woe 4-4-29	din 10-4-29
228	Prijsvorming Voorbereiding gereed			0%	0w	din 10-4-29	din 10-4-29
229	**Kredietaanvraag**			0%	9w	**ven 21-2-29**	**din 24-4-29**
230	Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2w	ven 21-2-29	din 6-3-29
231	RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1w	ven 7-3-29	din 13-3-29
232	Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2w	ven 14-3-29	din 27-3-29
233	Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4w	ven 28-3-29	din 24-4-29
234	Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0w	din 24-4-29	din 24-4-29
235	**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			0%	20w	**woe 11-4-29**	**din 18-9-29**
236	Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20w	woe 11-4-29	din 18-9-29
237	Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	16w	woe 11-4-29	din 21-8-29
238	Beoordelen werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 22-8-29	din 4-9-29
239	Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 5-9-29	din 18-9-29
240	Voorbereiding gereed			0%	0w	din 18-9-29	din 18-9-29
241	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			0%	4w	**woe 11-4-29**	**din 8-5-29**
242	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	1w	woe 11-4-29	din 17-4-29
243	Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	3w	woe 18-4-29	din 8-5-29
244	Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 gereed			0%	0w	din 8-5-29	din 8-5-29
245	**Gate 4**			0%	4w	**woe 19-9-29**	**din 16-10-29**
246	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3w	woe 19-9-29	din 9-10-29
247	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1w	woe 10-10-29	din 16-10-29
248	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
249	**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 16-10-29**	**din 16-10-29**
250	Deterministische milpaal	MPB	ON	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
251	Buffer-reservering	MPB	ON	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
252	Risico-reservering	RM	ON	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
253	Probabilistische milpaal	PM	OG	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
254	Einde Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
255	**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			0%	5w	**din 16-10-29**	**din 20-11-29**
256	Start Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
257	**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			0%	5w	**din 16-10-29**	**din 20-11-29**
258	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 16-10-29	din 16-10-29
259	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2w	woe 17-10-29	din 30-10-29
260	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting P.24	CM	ON	0%	2w	woe 31-10-29	din 13-11-29
261	Nadere aanneemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1w	woe 14-11-29	din 20-11-29
262	Prijsvorming Uitvoering gereed			0%	0w	din 20-11-29	din 20-11-29
263	**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 20-11-29**	**din 20-11-29**
264	Einde Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 20-11-29	din 20-11-29
265	**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			0%	81w	**din 20-11-29**	**din 23-9-31**
266	Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 20-11-29	din 20-11-29
267	**Realisatie**			0%	56w	**woe 21-11-29**	**din 4-2-31**
268	DG1 Realisatie	CM	OG	0%	49w	woe 21-11-29	din 3-12-30
269	Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.26	TM	ON	0%	49w	woe 5-12-29	din 17-12-30
270	Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2w	woe 18-12-30	din 14-1-31
271	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 15-1-31	din 28-1-31
272	Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1w	woe 29-1-31	din 4-2-31
273	Realisatie gereed			0%	0w	din 4-2-31	din 4-2-31
274	**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			0%	26w	**woe 5-2-31**	**din 26-8-31**
275	Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26w	woe 5-2-31	din 26-8-31
276	Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6w	woe 5-2-31	din 18-3-31
277	Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4w	woe 19-3-31	din 15-4-31
278	Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed			0%	0w	din 15-4-31	din 15-4-31
279	Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	CM	OG	0%	2w	woe 16-4-31	din 29-4-31
280	**Afronden contracten overheid**			0%	2w	**woe 15-1-31**	**din 28-1-31**
281	Financiele afronding met gemeenten P.27	MPB	ON	0%	2w	woe 15-1-31	din 28-1-31
282	Afronden Contracten overheid gereed			0%	0w	din 28-1-31	din 28-1-31
283	**Afronden contractuele verplichtingen IB**			0%	16w	**woe 16-4-31**	**din 26-8-31**
284	Opstellen overdrachtsdossier P.28	TM	ON	0%	4w	woe 16-4-31	din 13-5-31
285	Opstellen nacalculatie P.29	MPB	ON	0%	4w	woe 16-4-31	din 13-5-31
286	Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4w	woe 14-5-31	din 10-6-31
287	Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2w	woe 23-7-31	din 26-8-31
288	Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 23-7-31	din 26-8-31
289	Afronden contractuele verplichtingen IB gereed			0%	0w	din 26-8-31	din 26-8-31
290	**Gate 6**			0%	4w	**woe 27-8-31**	**din 23-9-31**
291	Voorbereiden	MPB	ON	0%	3w	woe 27-8-31	din 16-9-31
292	Doorlopen	PM	ON	0%	1w	woe 17-9-31	din 23-9-31
293	Akkoord	PM	ON	0%	0w	din 23-9-31	din 23-9-31
294	**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			0%	0w	**din 23-9-31**	**din 23-9-31**
295	Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 23-9-31	din 23-9-31
296	**Baggeren Regulier 2026 DG4**			0%	237w	**din 27-10-26**	**din 4-11-31**
297	**30_Definitiefase**			0%	28w	**din 27-10-26**	**din 25-5-27**
298	Start Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 27-10-26	din 27-10-26
299	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			0%	2w	**woe 28-10-26**	**din 10-11-26**
300	Versturen Brief 1: Inpeilen en en Bemonsteren			0%	2w	woe 28-10-26	din 10-11-26
301	Versturen Brief 1 gereed			0%	0w	din 10-11-26	din 10-11-26
302	**Inpeilen**			0%	14w	**woe 11-11-26**	**din 2-3-27**
303	Inpeilen	TM	ON	0%	10w	woe 11-11-26	din 2-2-27
304	Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5w	woe 11-11-26	din 15-12-26
305	Aanleveren peilverschillen P.8	TM	ON	0%	5w	woe 11-11-26	din 15-12-26
306	Review peilverschillen P.8	TM	OG	0%	5w	woe 18-11-26	din 5-1-27
307	Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 25-11-26	din 5-1-27
308	Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	OG	0%	4w	woe 2-12-26	din 12-1-27
309	Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 9-12-26	din 19-1-27
310	Aanleveren baggernoodzaak kaart P.12	TM	ON	0%	2w	woe 20-1-27	din 2-2-27
311	Review baggernoodzaak kaart P.12	TM	OG	0%	2w	woe 3-2-27	din 16-2-27
312	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 20-1-27	din 2-2-27
313	Review geodatabase per DG P.13	TM	OG	0%	2w	woe 3-2-27	din 16-2-27
314	VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2w	woe 17-2-27	din 2-3-27
315	Inpeilen gereed			0%	0w	din 2-3-27	din 2-3-27
316	**Veldinventarisatie**			0%	11w	**woe 11-11-26**	**din 9-2-27**
317	Veldinventarisatie (Veldwerk) P.14	OM	ON	0%	4w	woe 11-11-26	din 8-12-26
318	Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	2w	woe 9-12-26	din 5-1-27
319	Beoordelen concept veldinventarisatie P.14	OM	OG	0%	2w	woe 6-1-27	din 19-1-27
320	Definitief opleveren veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	1w	woe 20-1-27	din 26-1-27
321	Opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.15, P.16	OM	ON	0%	2w	woe 27-1-27	din 9-2-27
322	Veldinventarisatie gereed			0%	0w	din 9-2-27	din 9-2-27
323	**SSK-Raming**			0%	8w	**woe 3-3-27**	**din 27-4-27**
324	Opstellen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 3-3-27	din 16-3-27
325	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 17-3-27	din 30-3-27
326	Aanpassen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 31-3-27	din 13-4-27
327	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 14-4-27	din 27-4-27
328	SSK-raming gereed			0%	0w	din 27-4-27	din 27-4-27
329	**Gate 2**			0%	4w	**woe 28-4-27**	**din 25-5-27**
330	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1w	woe 28-4-27	din 4-5-27
331	Gate doorlopen	PM	OG	0%	3w	woe 5-5-27	din 25-5-27
332	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 25-5-27	din 25-5-27
333	**Risico-reservering 30_Definitiefase**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 25-5-27**	**din 25-5-27**
334	DG1 | Einde | 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 25-5-27	din 25-5-27
335	**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			0%	118w	**din 25-5-27**	**din 27-11-29**
336	Start Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 25-5-27	din 25-5-27
337	**Kaarten Overheid**			0%	14w	**woe 26-5-27**	**din 21-9-27**
338	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit P.18	OM	ON	0%	4w	woe 26-5-27	din 22-6-27
339	Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10w	woe 23-6-27	din 21-9-27
340	Kaarten Overheid gereed			0%	0w	din 21-9-27	din 21-9-27
341	**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			0%	19w	**woe 26-5-27**	**din 26-10-27**
342	Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1w	woe 26-5-27	din 1-6-27
343	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 2-6-27	din 29-6-27
344	Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4w	woe 30-6-27	din 17-8-27
345	Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 18-8-27	din 31-8-27
346	Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2w	woe 1-9-27	din 14-9-27
347	Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 15-9-27	din 28-9-27
348	Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie) gereed			0%	0w	din 28-9-27	din 28-9-27
349	Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	4w	woe 29-9-27	din 26-10-27
350	Einde | Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek			0%	0w	din 26-10-27	din 26-10-27
351	**Bemonsteren & Analyseren**			0%	21w	**woe 27-10-27**	**din 4-4-28**
352	Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	15w	woe 27-10-27	din 22-2-28
353	Opleveren veldverslag door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 23-2-28	din 21-3-28
354	Toetsen veldverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 22-3-28	din 4-4-28
355	Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 23-2-28	din 21-3-28
356	Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 22-3-28	din 4-4-28
357	Bemonsteren & Analyseren gereed			0%	0w	din 4-4-28	din 4-4-28
358	**Verkennend Asbestonderzoek**			0%	12w	**woe 5-4-28**	**din 27-6-28**
359	Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 5-4-28	din 18-4-28
360	Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 19-4-28	din 2-5-28
361	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 3-5-28	din 30-5-28
362	Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 31-5-28	din 27-6-28
363	Verkennend Asbestonderzoek gereed			0%	0w	din 27-6-28	din 27-6-28
364	**Afperkend Waterbodemonderzoek**			0%	14w	**woe 5-4-28**	**din 11-7-28**
365	Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 5-4-28	din 18-4-28
366	Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 19-4-28	din 2-5-28
367	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 3-5-28	din 30-5-28
368	Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 31-5-28	din 13-6-28
369	Analyseren monsters IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 14-6-28	din 27-6-28
370	Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2w	woe 28-6-28	din 11-7-28
371	Afperkend onderzoek gereed			0%	0w	din 11-7-28	din 11-7-28
372	**Rapportage Waterbodemonderzoek**			0%	22w	**woe 5-4-28**	**din 26-9-28**
373	**Rapportage | Kwaliteit**			0%	8w	**woe 5-4-28**	**din 30-5-28**
374	Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	6w	woe 5-4-28	din 16-5-28
375	Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 17-5-28	din 30-5-28
376	**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			0%	6w	**woe 28-6-28**	**din 29-8-28**
377	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 28-6-28	din 11-7-28
378	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 12-7-28	din 25-7-28
379	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 26-7-28	din 29-8-28
380	**Rapportage Afperkend onderzoek**			0%	4w	**woe 12-7-28**	**din 29-8-28**
381	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 12-7-28	din 25-7-28
382	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 26-7-28	din 29-8-28
383	**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			0%	4w	**woe 30-8-28**	**din 26-9-28**

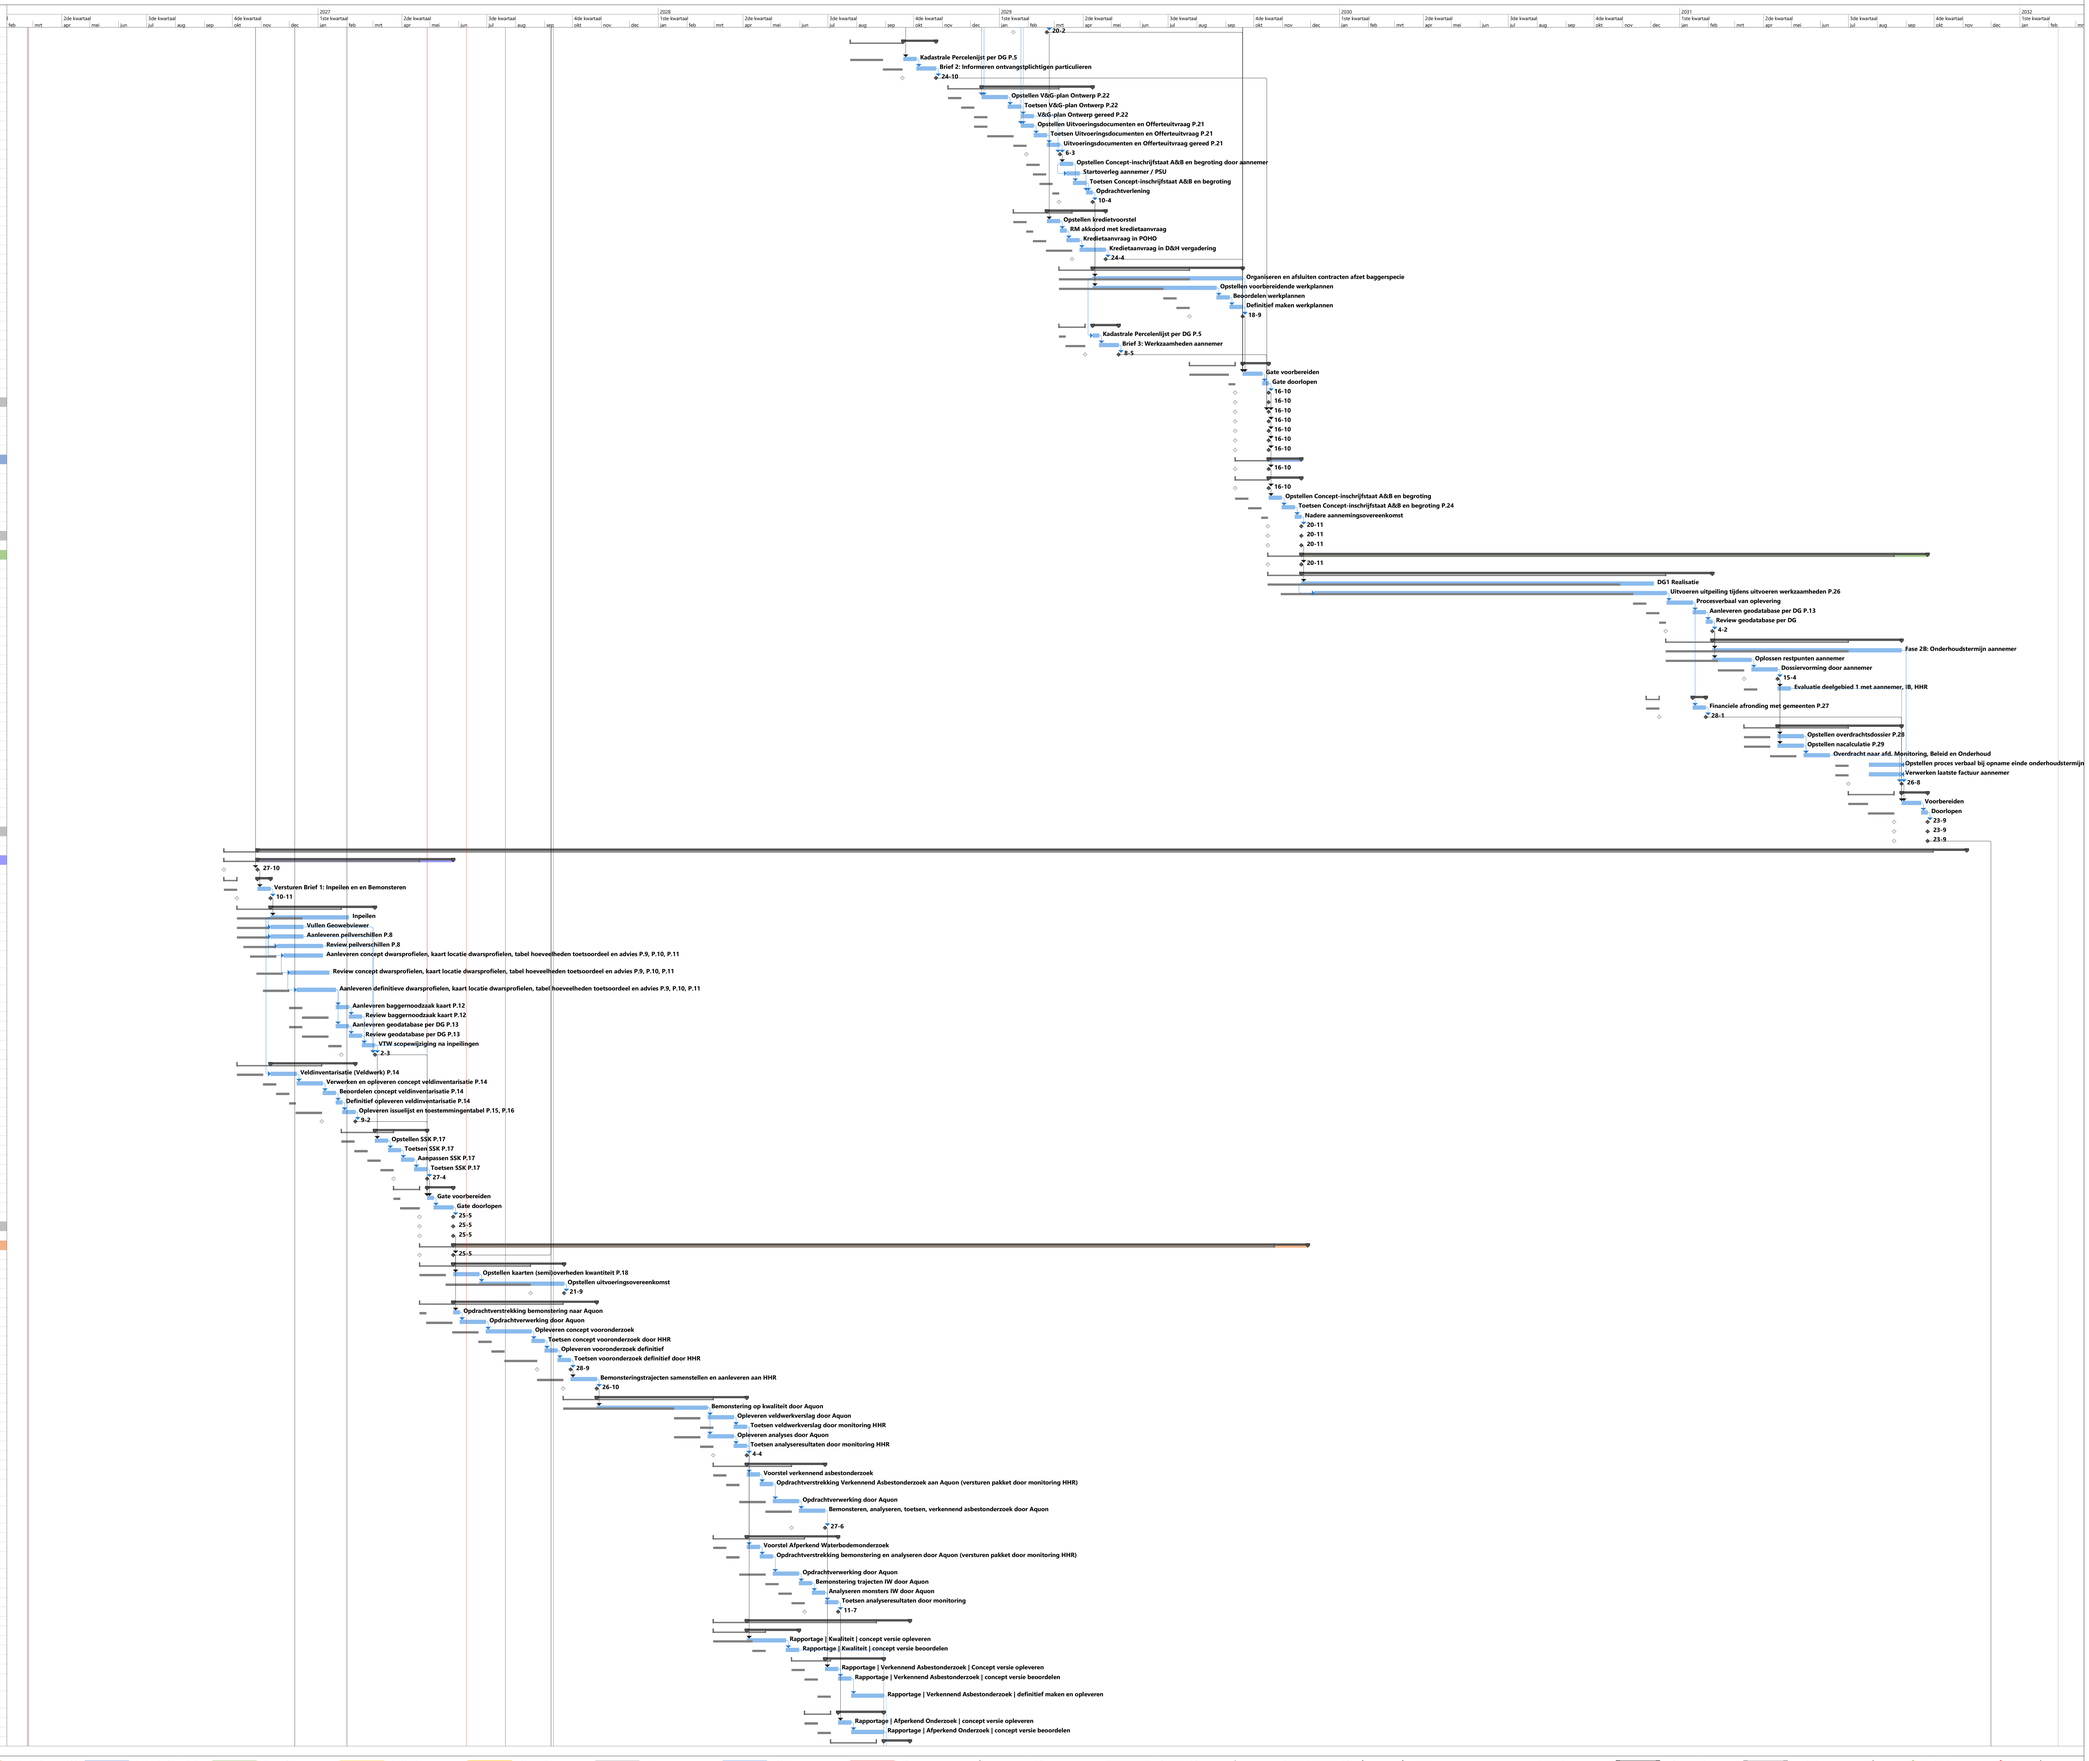

10_Initiatieffase | 30_Definitiefase | 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp | 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding | 60_Uitvoeringsfase, Realisatie | 65_Nazorgfase | Conditionering | Risicoreservering | Taak | Kritiek | Milpaal | Basislijn | Milpaal van basislijn | Samenvattingstaak van basislijn | Voortgang | Samenvatting | Projectsamenvatting | Deadline OK | Deadline NOK

Statusdatum: maa 23-2-26
Printdatum: maa 23-2-26

Baggeren regulier 2026

Actieve taken

Id	Taaknaam	Rolhouder	Verantw	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
398	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	wo 30-8-28	din 12-9-28
399	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2w	wo 13-9-28	din 26-9-28
400	Rapportage Waterbodemonderzoek gereed			0%	0w	din 26-9-28	din 26-9-28
401	**Uitvoeringsscope**			**0%**	**5w**	**woe 27-9-28**	**din 31-10-28**
402	Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.13, P.19	TM	ON	0%	2w	wo 27-9-28	din 10-10-28
403	Review geodatabase en Uitvoeringscopekaart per DG P.13, P.19	TM	OG	0%	1w	wo 11-10-28	din 17-10-28
404	VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2w	wo 18-10-28	din 31-10-28
405	Uitvoeringscope gereed			0%	0w	din 31-10-28	din 31-10-28
406	**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**18w**	**wo 18-10-28**	**din 6-3-29**
407	Quickscan F&F en Exotencan	OM	OG	0%	4w	wo 18-10-28	din 14-11-28
408	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.20	OM	ON	0%	4w	wo 1-11-28	din 28-11-28
409	Afstemmen kwaliteit + kosten overheden	OM	OG	0%	8w	wo 29-11-28	din 6-2-29
410	Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4w	wo 7-2-29	din 6-3-29
411	Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed			0%	0w	din 6-3-29	din 6-3-29
412	**SSK-Raming**			**0%**	**20w**	**wo 1-11-28**	**din 3-4-29**
413	Risicosessie	MPB	ON	0%	2w	wo 1-11-28	din 14-11-28
414	Opstellen rapport risicosessie P.4	MPB	ON	0%	2w	wo 15-11-28	din 28-11-28
415	Opstellen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	wo 7-2-29	din 20-2-29
416	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	wo 21-2-29	din 6-3-29
417	Aanpassen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	wo 7-3-29	din 20-3-29
418	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	wo 21-3-29	din 3-4-29
419	SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed			0%	0d	din 3-4-29	din 3-4-29
420	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**5w**	**woe 1-11-28**	**din 5-12-28**
421	Kadastrale Perceelnijst per DG P.5	OM	ON	0%	2w	wo 1-11-28	din 14-11-28
422	Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	3w	wo 15-11-28	din 5-12-28
423	Communicatie Omgeving Brief 2 gereed			0%	0w	din 5-12-28	din 5-12-28
424	**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**11w**	**woe 7-2-29**	**din 22-5-29**
425	Opstellen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	ON	0%	2w	wo 7-2-29	din 20-2-29
426	Toetsen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	OG	0%	2w	wo 21-2-29	din 6-3-29
427	V&G-plan Ontwerp gereed P.22	CM	ON	0%	2w	wo 7-3-29	din 20-3-29
428	Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	ON	0%	2w	wo 7-3-29	din 20-3-29
429	Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	OG	0%	2w	wo 21-3-29	din 3-4-29
430	Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.21	CM	ON	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
431	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 17-4-29	din 17-4-29
432	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2w	wo 18-4-29	din 1-5-29
433	Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	2w	wo 25-4-29	din 8-5-29
434	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2w	wo 2-5-29	din 15-5-29
435	Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1w	wo 16-5-29	din 22-5-29
436	Prijsvorming Voorbereiding gereed			0%	0w	din 22-5-29	din 22-5-29
437	**Kredietaanvraag**			**0%**	**9w**	**woe 4-4-29**	**din 5-6-29**
438	Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2w	wo 4-4-29	din 17-4-29
439	RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1w	wo 18-4-29	din 24-4-29
440	Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2w	wo 25-4-29	din 8-5-29
441	Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4w	wo 9-5-29	din 5-6-29
442	Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0w	din 5-6-29	din 5-6-29
443	**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20w**	**woe 23-5-29**	**din 30-10-29**
444	Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20w	wo 23-5-29	din 30-10-29
445	Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	16w	wo 23-5-29	din 2-10-29
446	Beoordelen werkplannen	TM	OG	0%	2w	wo 3-10-29	din 16-10-29
447	Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2w	wo 17-10-29	din 30-10-29
448	Voorbereiding gereed			0%	0w	din 30-10-29	din 30-10-29
449	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**4w**	**woe 23-5-29**	**din 19-6-29**
450	Kadastrale Perceelnijst per DG P.5	OM	ON	0%	1w	wo 23-5-29	din 29-5-29
451	Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	3w	wo 30-5-29	din 19-6-29
452	Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 gereed			0%	0w	din 19-6-29	din 19-6-29
453	**Gate 4**			**0%**	**4w**	**woe 31-10-29**	**din 27-11-29**
454	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3w	wo 31-10-29	din 20-11-29
455	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1w	wo 21-11-29	din 27-11-29
456	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 27-11-29	din 27-11-29
457	**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 27-11-29**	**din 27-11-29**
462	Einde Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 27-11-29	din 27-11-29
463	**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**5w**	**din 27-11-29**	**din 15-1-30**
464	Start Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 27-11-29	din 27-11-29
465	**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**5w**	**din 27-11-29**	**din 15-1-30**
466	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 27-11-29	din 27-11-29
467	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2w	wo 28-11-29	din 11-12-29
468	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting P.24	CM	ON	0%	2w	wo 12-12-29	din 8-1-30
469	Nadere aanmeningsovereenkomst	CM	OG	0%	1w	wo 9-1-30	din 15-1-30
470	Prijsvorming Uitvoering gereed			0%	0w	din 15-1-30	din 15-1-30
471	**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 15-1-30**	**din 15-1-30**
476	Einde Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 15-1-30	din 15-1-30
477	**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86w**	**din 15-1-30**	**din 4-11-31**
478	Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 15-1-30	din 15-1-30
479	**Realisatie**			**0%**	**56w**	**woe 16-1-30**	**din 18-3-31**
480	DG1 Realisatie	CM	OG	0%	49w	wo 16-1-30	din 28-1-31
481	Uitvoeren uitpeling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.26	TM	ON	0%	49w	wo 30-1-30	din 11-2-31
482	Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2w	wo 12-2-31	din 25-2-31
483	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	wo 26-2-31	din 11-3-31
484	Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1w	wo 12-3-31	din 18-3-31
485	Realisatie gereed			0%	0w	din 18-3-31	din 18-3-31
486	**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26w**	**woe 19-3-31**	**din 7-10-31**
487	Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26w	wo 19-3-31	din 7-10-31
488	Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6w	wo 19-3-31	din 29-4-31
489	Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4w	wo 30-4-31	din 27-5-31
490	Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed			0%	0w	din 27-5-31	din 27-5-31
491	Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	CM	OG	0%	2w	woe 28-5-31	din 10-6-31
492	**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2w**	**wo 26-2-31**	**din 11-3-31**
493	Financiele afronding met gemeenten P.27	MPB	ON	0%	2w	wo 26-2-31	din 11-3-31
494	Afronden Contracten overheid gereed			0%	0w	din 11-3-31	din 11-3-31
495	**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**16w**	**woe 28-5-31**	**din 7-10-31**
496	Opstellen overdrachtsdossier P.28	TM	ON	0%	4w	woe 28-5-31	din 24-6-31
497	Opstellen nacalculatie P.29	MPB	ON	0%	4w	woe 28-5-31	din 24-6-31
498	Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4w	woe 25-6-31	din 22-7-31
499	Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2w	woe 24-9-31	din 7-10-31
500	Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 24-9-31	din 7-10-31
501	Afronden contractuele verplichtingen IB gereed			0%	0w	din 7-10-31	din 7-10-31
502	**Gate 6**			**0%**	**4w**	**woe 8-10-31**	**din 4-11-31**
503	Voorbereiden	MPB	ON	0%	3w	woe 8-10-31	din 28-10-31
504	Doorlopen	PM	ON	0%	1w	woe 29-10-31	din 4-11-31
505	Akkoord	PM	ON	0%	0w	din 4-11-31	din 4-11-31
506	**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0w**	**din 4-11-31**	**din 4-11-31**
511	Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 4-11-31	din 4-11-31
512	**Baggeren Regulier 2026 DG2**			**0%**	**235w**	**din 8-12-26**	**din 2-12-31**
513	**30_Definitiefase**			**0%**	**28w**	**din 8-12-26**	**din 6-7-27**
514	Start Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 8-12-26	din 8-12-26
515	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			**0%**	**2w**	**wo 9-12-26**	**din 5-1-27**
516	Versturen Brief 1: Inpeilen en en Bemonsteren			0%	2w	wo 9-12-26	din 5-1-27
517	Versturen Brief 1 gereed			0%	0w	din 5-1-27	din 5-1-27
518	**Inpeilen**			**0%**	**14w**	**woe 6-1-27**	**din 13-4-27**
519	Inpeilen	TM	ON	0%	10w	wo 6-1-27	din 16-3-27
520	Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5w	wo 6-1-27	din 9-2-27
521	Aanleveren peilverschillen P.8	TM	ON	0%	5w	wo 6-1-27	din 9-2-27
522	Review peilverschillen P.8	TM	OG	0%	5w	wo 13-1-27	din 16-2-27
523	Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	wo 20-1-27	din 16-2-27
524	Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	OG	0%	4w	wo 27-1-27	din 23-2-27
525	Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	wo 3-2-27	din 2-3-27
526	Aanleveren baggernoodzaak kaart P.12	TM	ON	0%	2w	wo 3-3-27	din 16-3-27
527	Review baggernoodzaak kaart P.12	TM	OG	0%	2w	wo 17-3-27	din 30-3-27
528	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	wo 3-3-27	din 16-3-27
529	Review geodatabase per DG P.13	TM	OG	0%	2w	wo 17-3-27	din 30-3-27
530	VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2w	wo 31-3-27	din 13-4-27
531	Ingeilen gereed			0%	0w	din 13-4-27	din 13-4-27
532	**Veldinventarisatie**			**0%**	**11w**	**woe 6-1-27**	**din 23-3-27**
533	Veldinventarisatie (Veldwerk) P.14	OM	ON	0%	4w	woe 6-1-27	din 2-2-27
534	Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	2w	wo 3-2-27	din 16-2-27
535	Beoordelen concept veldinventarisatie P.14	OM	OG	0%	2w	wo 17-2-27	din 2-3-27
536	Definitief opleveren veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	1w	wo 3-3-27	din 9-3-27
537	Opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.15, P.16	OM	ON	0%	2w	wo 10-3-27	din 23-3-27
538	Veldinventarisatie gereed			0%	0w	din 23-3-27	din 23-3-27
539	**SSK-Raming**			**0%**	**8w**	**woe 14-4-27**	**din 8-6-27**
540	Opstellen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 14-4-27	din 27-4-27
541	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 28-4-27	din 11-5-27
542	Aanpassen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	wo 12-5-27	din 25-5-27
543	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	wo 26-5-27	din 8-6-27
544	SSK-raming gereed			0%	0w	din 8-6-27	din 8-6-27
545	**Gate 2**			**0%**	**4w**	**woe 9-6-27**	**din 6-7-27**
546	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1w	woe 9-6-27	din 15-6-27
547	Gate doorlopen	PM	OG	0%	3w	woe 16-6-27	din 6-7-27
548	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 6-7-27	din 6-7-27
549	**Risico-reservering 30_Definitiefase**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 6-7-27**	**din 6-7-27**
554	DG1 | Einde | 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 6-7-27	din 6-7-27
555	**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**116w**	**din 6-7-27**	**din 8-1-30**
556	Start Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 6-7-27	din 6-7-27
557	**Kaarten Overheid**			**0%**	**14w**	**woe 7-7-27**	**din 2-11-27**
558	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit P.18	OM	ON	0%	4w	wo 7-7-27	din 24-8-27
559	Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10w	wo 25-8-27	din 2-11-27
560	Kaarten Overheid gereed			0%	0w	din 2-11-27	din 2-11-27
561	**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**17w**	**wo 7-7-27**	**din 23-11-27**
562	Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1w	wo 7-7-27	din 13-7-27
563	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 14-7-27	din 31-8-27
564	Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4w	woe 1-9-27	din 28-9-27
565	Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2w	wo 29-9-27	din 12-10-27
566	Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2w	woe 13-10-27	din 26-10-27
567	Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 27-10-27	din 9-11-27
568	Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie) gereed			0%	0w	din 9-11-27	din 9-11-27
569	Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2w	woe 10-11-27	din 23-11-27
572	Einde | Opdracht naar Aquon			0%	0w	din 23-11-27	din 23-11-27
573	**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**21w**	**woe 24-11-27**	**din 2-5-28**
574	Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	15w	woe 24-11-27	din 21-3-28
575	Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 22-3-28	din 18-4-28
576	Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	wo 19-4-28	din 2-5-28
577	Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 22-3-28	din 18-4-28
578	Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	wo 19-4-28	din 2-5-28
579	Bemonsteren & Analyseren gereed			0%	0w	din 2-5-28	din 2-5-28
580	**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**12w**	**woe 3-5-28**	**din 25-7-28**
581	Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 3-5-28	din 16-5-28
582	Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	wo 17-5-28	din 30-5-28
583	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	wo 31-5-28	din 27-6-28
584	Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4w	wo 28-6-28	din 25-7-28
585	Verkennend Asbestonderzoek gereed			0%	0w	din 25-7-28	din 25-7-28
586	**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**14w**	**woe 3-5-28**	**din 29-8-28**
587	Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 3-5-28	din 16-5-28
588	Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	wo 17-5-28	din 30-5-28
589	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	wo 31-5-28	din 27-6-28

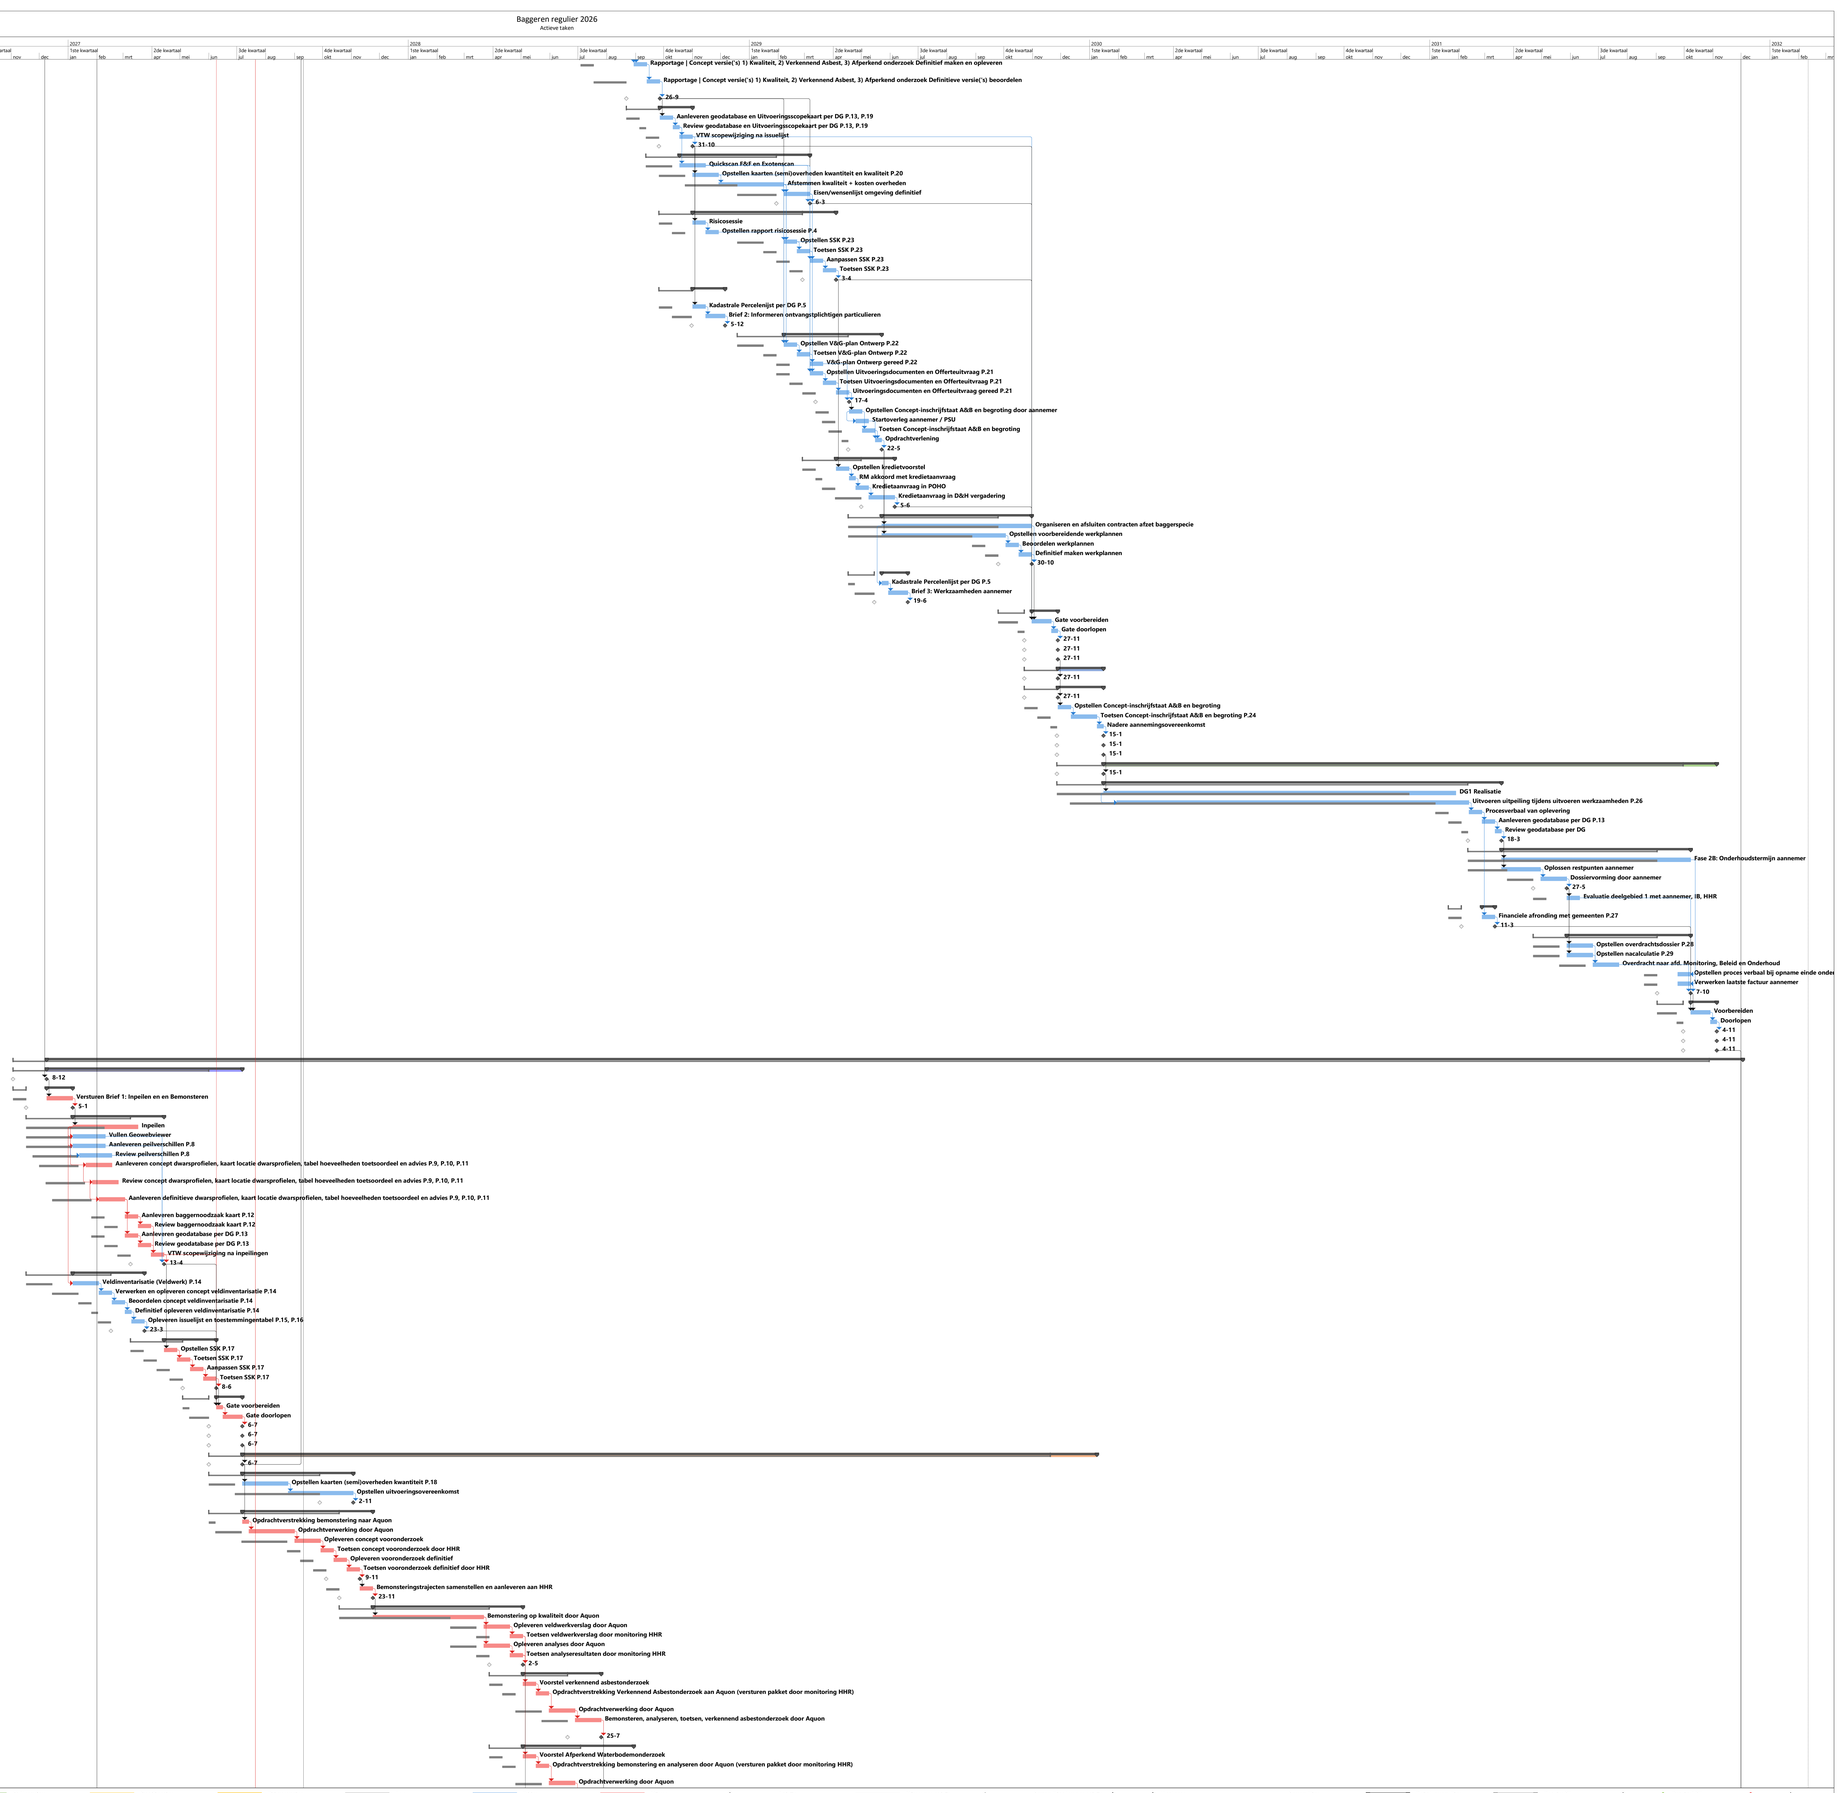

10_Initiatieffase · 30_Definitiefase · 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp · 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding · 60_Uitvoeringsfase, Realisatie · 65_Nazorgfase · Conditionering · Risicoreservering · Taak · Kritiek · Mijlpaal · Basislijn · Mijlpaal van basislijn · Samenvattingstaak van basislijn · Voortgang · Samenvatting · Projectsamenvatting · Deadline OK · Deadline NOK

Statusdatum: maa 23-2-26
Printdatum: maa 23-2-26

Baggeren regulier 2026

Actieve taken

Id	Taaknaam	Rolhouder	Verantw.	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
590	Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 28-6-28	din 11-7-28
591	Analyseren monsters IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 12-7-28	din 25-7-28
592	Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2w	woe 26-7-28	din 29-8-28
593	Afperkend onderzoek gereed			0%	0w	din 29-8-28	din 29-8-28
594	**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**22w**	**woe 3-5-28**	**din 24-10-28**
595	**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**8w**	**woe 3-5-28**	**din 27-6-28**
596	Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	6w	woe 3-5-28	din 13-6-28
597	Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 14-6-28	din 27-6-28
598	**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**6w**	**woe 26-7-28**	**din 26-9-28**
599	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 26-7-28	din 29-8-28
600	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 30-8-28	din 12-9-28
601	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 13-9-28	din 26-9-28
602	**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4w**	**woe 30-8-28**	**din 26-9-28**
603	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 30-8-28	din 12-9-28
604	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 13-9-28	din 26-9-28
605	**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4w**	**woe 27-9-28**	**din 24-10-28**
606	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 27-9-28	din 10-10-28
607	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 11-10-28	din 24-10-28
608	Rapportage Waterbodemonderzoek gereed			0%	0w	din 24-10-28	din 24-10-28
609	**Uitvoeringsscope**			**0%**	**5w**	**woe 25-10-28**	**din 28-11-28**
610	Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.13, P.19	TM	ON	0%	2w	woe 25-10-28	din 7-11-28
611	Review geodatabase en Uitvoeringscopekaart per DG P.13, P.19	TM	OG	0%	1w	woe 8-11-28	din 14-11-28
612	VTW scopewijziging na issue|list	MPB	OG	0%	2w	woe 15-11-28	din 28-11-28
613	Uitvoeringscope gereed			0%	0w	din 28-11-28	din 28-11-28
614	**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**18w**	**woe 15-11-28**	**din 3-4-29**
615	Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4w	woe 15-11-28	din 12-12-28
616	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.20	OM	ON	0%	4w	woe 29-11-28	din 9-1-29
617	Afstemmen kwaliteit + kosten overheden	OM	OG	0%	8w	woe 10-1-29	din 6-3-29
618	Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4w	woe 7-3-29	din 3-4-29
619	Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed			0%	0w	din 3-4-29	din 3-4-29
620	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**5w**	**woe 29-11-28**	**din 16-1-29**
621	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	2w	woe 29-11-28	din 12-12-28
622	Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	3w	woe 13-12-28	din 16-1-29
623	Communicatie Omgeving Brief 2 gereed			0%	0w	din 16-1-29	din 16-1-29
624	**SSK-Raming**			**0%**	**20w**	**woe 29-11-28**	**din 1-5-29**
625	Risicosessie	MPB	ON	0%	2w	woe 29-11-28	din 12-12-28
626	Opstellen rapport risicosessie P.4	MPB	ON	0%	2w	woe 13-12-28	din 9-1-29
627	Opstellen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 7-3-29	din 20-3-29
628	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 21-3-29	din 3-4-29
629	Aanpassen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
630	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 18-4-29	din 1-5-29
631	SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed			0%	0d	din 1-5-29	din 1-5-29
632	**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**15w**	**woe 7-3-29**	**din 19-6-29**
633	Opstellen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	ON	0%	2w	woe 7-3-29	din 20-3-29
634	Toetsen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	OG	0%	2w	woe 21-3-29	din 3-4-29
635	V&G-plan Ontwerp gereed P.22	CM	ON	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
636	Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	ON	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
637	Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	OG	0%	2w	woe 18-4-29	din 1-5-29
638	Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.21	CM	ON	0%	2w	woe 2-5-29	din 15-5-29
639	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 15-5-29	din 15-5-29
640	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 16-5-29	din 29-5-29
641	Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	2w	woe 23-5-29	din 5-6-29
642	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2w	woe 30-5-29	din 12-6-29
643	Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1w	woe 13-6-29	din 19-6-29
644	Prijsvorming Voorbereiding gereed			0%	0w	din 19-6-29	din 19-6-29
645	**Kredietaanvraag**			**0%**	**9w**	**woe 2-5-29**	**din 3-7-29**
646	Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2w	woe 2-5-29	din 15-5-29
647	RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1w	woe 16-5-29	din 22-5-29
648	Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2w	woe 23-5-29	din 5-6-29
649	Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4w	woe 6-6-29	din 3-7-29
650	Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0w	din 3-7-29	din 3-7-29
651	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**4w**	**woe 20-6-29**	**din 17-7-29**
652	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	1w	woe 20-6-29	din 26-6-29
653	Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	3w	woe 27-6-29	din 17-7-29
654	Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 gereed			0%	0w	din 17-7-29	din 17-7-29
655	**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20w**	**woe 20-6-29**	**din 27-11-29**
656	Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20w	woe 20-6-29	din 27-11-29
657	Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	16w	woe 20-6-29	din 30-10-29
658	Beoordelen werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 31-10-29	din 13-11-29
659	Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 14-11-29	din 27-11-29
660	Voorbereiding gereed			0%	0w	din 27-11-29	din 27-11-29
661	**Gate 4**			**0%**	**4w**	**woe 28-11-29**	**din 8-1-30**
662	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3w	woe 28-11-29	din 18-12-29
663	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1w	woe 19-12-29	din 8-1-30
664	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 8-1-30	din 8-1-30
665	**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 8-1-30**	**din 8-1-30**
670	Einde Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 8-1-30	din 8-1-30
671	**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**5w**	**din 8-1-30**	**din 12-2-30**
672	Start Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 8-1-30	din 8-1-30
673	**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**5w**	**din 8-1-30**	**din 12-2-30**
674	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 8-1-30	din 8-1-30
675	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2w	woe 9-1-30	din 22-1-30
676	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting P.24	CM	ON	0%	2w	woe 23-1-30	din 5-2-30
677	Nadere aanmemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1w	woe 6-2-30	din 12-2-30
678	Prijsvorming Uitvoering gereed			0%	0w	din 12-2-30	din 12-2-30
679	**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 12-2-30**	**din 12-2-30**
684	Einde Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 12-2-30	din 12-2-30
685	**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86w**	**din 12-2-30**	**din 2-12-31**
686	Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 12-2-30	din 12-2-30
687	**Realisatie**			**0%**	**56w**	**woe 13-2-30**	**din 15-4-31**
688	DG1 Realisatie	CM	OG	0%	49w	woe 13-2-30	din 25-2-31
689	Uitvoeren uitspelling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.26	TM	ON	0%	49w	woe 27-2-30	din 11-3-31
690	Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2w	woe 12-3-31	din 25-3-31
691	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 26-3-31	din 8-4-31
692	Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1w	woe 9-4-31	din 15-4-31
693	Realisatie gereed			0%	0w	din 15-4-31	din 15-4-31
694	**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26w**	**woe 16-4-31**	**din 4-11-31**
695	Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26w	woe 16-4-31	din 4-11-31
696	Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6w	woe 16-4-31	din 27-5-31
697	Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4w	woe 28-5-31	din 24-6-31
698	Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed			0%	0w	din 24-6-31	din 24-6-31
699	Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	CM	OG	0%	2w	woe 25-6-31	din 8-7-31
700	**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2w**	**woe 26-3-31**	**din 8-4-31**
701	Financiele afronding met gemeenten P.27	MPB	ON	0%	2w	woe 26-3-31	din 8-4-31
702	Afronden Contracten overheid gereed			0%	0w	din 8-4-31	din 8-4-31
703	**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**16w**	**woe 25-6-31**	**din 4-11-31**
704	Opstellen overdrachtsdossier P.28	TM	ON	0%	4w	woe 25-6-31	din 22-7-31
705	Opstellen nacalculatie P.29	MPB	ON	0%	4w	woe 25-6-31	din 22-7-31
706	Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4w	woe 23-7-31	din 9-9-31
707	Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2w	woe 22-10-31	din 4-11-31
708	Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 22-10-31	din 4-11-31
709	Afronden contractuele verplichtingen IB gereed			0%	0w	din 4-11-31	din 4-11-31
710	**Gate 6**			**0%**	**4w**	**woe 5-11-31**	**din 2-12-31**
711	Voorbereiden	MPB	ON	0%	3w	woe 5-11-31	din 25-11-31
712	Doorlopen	PM	ON	0%	1w	woe 26-11-31	din 2-12-31
713	Akkoord	PM	ON	0%	0w	din 2-12-31	din 2-12-31
714	**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0w**	**din 2-12-31**	**din 2-12-31**
719	Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 2-12-31	din 2-12-31
720	**Baggeren Regulier 2026 DG1**			**0%**	**237w**	**din 2-2-27**	**din 10-2-32**
721	**30_Definitiefase**			**0%**	**49w**	**din 2-2-27**	**din 7-7-27**
722	Start Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 2-2-27	din 2-2-27
723	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			**0%**	**2w**	**woe 3-2-27**	**din 16-2-27**
724	Versturen Brief 1: Inpeilen en en Bemonsteren			0%	2w	woe 3-2-27	din 16-2-27
725	Versturen Brief 1 gereed			0%	0w	din 16-2-27	din 16-2-27
726	**Inpeilen**			**0%**	**14w**	**woe 17-2-27**	**din 25-5-27**
727	Inpeilen	TM	ON	0%	2w	woe 17-2-27	din 2-3-27
728	Vullen Geowebviewer	TM	ON	0%	5w	woe 17-2-27	din 23-3-27
729	Aanleveren peilverschillen P.8	TM	ON	0%	5w	woe 17-2-27	din 23-3-27
730	Review peilverschillen P.8	TM	OG	0%	5w	woe 24-2-27	din 30-3-27
731	Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 3-3-27	din 30-3-27
732	Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	OG	0%	4w	woe 10-3-27	din 6-4-27
733	Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.9, P.10, P.11	TM	ON	0%	4w	woe 17-3-27	din 13-4-27
734	Aanleveren baggernoodzaak kaart P.12	TM	ON	0%	2w	woe 14-4-27	din 27-4-27
735	Review baggernoodzaak kaart P.12	TM	OG	0%	2w	woe 28-4-27	din 11-5-27
736	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 14-4-27	din 27-4-27
737	Review geodatabase per DG P.13	TM	OG	0%	2w	woe 28-4-27	din 11-5-27
738	VTW scopewijziging na inpeilingen	TM	OG	0%	2w	woe 12-5-27	din 25-5-27
739	Ingeilen gereed			0%	0w	din 25-5-27	din 25-5-27
740	**Veldinventarisatie**			**0%**	**11w**	**woe 17-2-27**	**din 4-5-27**
741	Veldinventarisatie (Veldwerk) P.14	OM	ON	0%	4w	woe 17-2-27	din 16-3-27
742	Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	2w	woe 17-3-27	din 30-3-27
743	Beoordelen concept veldinventarisatie P.14	OM	OG	0%	2w	woe 31-3-27	din 13-4-27
744	Definitief opleveren veldinventarisatie P.14	OM	ON	0%	1w	woe 14-4-27	din 20-4-27
745	Opleveren issue|lijst en toestemmingentabel P.15, P.16	OM	ON	0%	2w	woe 21-4-27	din 4-5-27
746	Veldinventarisatie gereed			0%	0w	din 4-5-27	din 4-5-27
747	**SSK-Raming**			**0%**	**8w**	**woe 26-5-27**	**din 20-7-27**
748	Opstellen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 26-5-27	din 8-6-27
749	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 9-6-27	din 22-6-27
750	Aanpassen SSK P.17	MPB	ON	0%	2w	woe 23-6-27	din 6-7-27
751	Toetsen SSK P.17	MPB	OG	0%	2w	woe 7-7-27	din 20-7-27
752	SSK-raming gereed			0%	0w	din 20-7-27	din 20-7-27
753	**Gate 2**			**0%**	**4w**	**woe 21-7-27**	**din 7-9-27**
754	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	1w	woe 21-7-27	din 17-8-27
755	Gate doorlopen	PM	OG	0%	3w	woe 18-8-27	din 7-9-27
756	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 7-9-27	din 7-9-27
757	**Risico-reservering 30_Definitiefase**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 7-9-27**	**din 7-9-27**
762	DG1 | Einde | 30_Definitiefase deel 2 van 2			0%	0w	din 7-9-27	din 7-9-27
763	**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**103w**	**din 7-9-27**	**din 6-11-29**
764	Start Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 7-9-27	din 7-9-27
765	**Kaarten Overheid**			**0%**	**14w**	**woe 8-9-27**	**din 14-12-27**
766	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit P.18	OM	ON	0%	4w	woe 8-9-27	din 5-10-27
767	Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	10w	woe 6-10-27	din 14-12-27
768	Kaarten Overheid gereed			0%	0w	din 14-12-27	din 14-12-27
769	**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**17w**	**woe 8-9-27**	**din 18-1-28**
770	Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1w	woe 8-9-27	din 14-9-27
771	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 15-9-27	din 12-10-27
772	Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 13-10-27	din 26-10-27
773	Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 27-10-27	din 9-11-27
774	Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2w	woe 10-11-27	din 23-11-27
775	Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2w	woe 24-11-27	din 7-12-27
776	Vooronderzoek NEN5717 (Bureaustudie) gereed			0%	0w	din 7-12-27	din 7-12-27
777	Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	4w	woe 8-12-27	din 18-1-28
780	Einde | Opdracht naar Aquon			0%	0w	din 18-1-28	din 18-1-28
781	**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**8w**	**woe 19-1-28**	**din 14-3-28**

10_Initiatieffase · 30_Definitiefase · 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp · 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding · 60_Uitvoeringsfase, Realisatie · 65_Nazorgfase · Conditionering · Risicoreservering · Taak · Kritiek · Mijlpaal · Basislijn · Mijlpaal van basislijn · Samenvattingstaak van basislijn · Voortgang · Samenvatting · Projectsamenvatting · Deadline OK · Deadline NOK

Statusdatum: maa 23-2-26
Printdatum: maa 23-2-26

Baggeren regulier 2026

Actieve taken

Id	Taaknaam	Rolhouder	Verantw.	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
782	Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 19-1-28	din 15-2-28
783	Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 16-2-28	din 29-2-28
784	Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 1-3-28	din 14-3-28
785	Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 16-2-28	din 29-2-28
786	Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2w	woe 1-3-28	din 14-3-28
787	Bemonsteren & Analyseren gereed			0%	0w	din 14-3-28	din 14-3-28
788	**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**12w**	**woe 15-3-28**	**din 6-6-28**
789	Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 15-3-28	din 28-3-28
790	Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 29-3-28	din 11-4-28
791	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 12-4-28	din 9-5-28
792	Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4w	woe 10-5-28	din 6-6-28
793	Verkennend Asbestonderzoek gereed			0%	0w	din 6-6-28	din 6-6-28
794	**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**12w**	**woe 15-3-28**	**din 6-6-28**
795	Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2w	woe 15-3-28	din 28-3-28
796	Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2w	woe 29-3-28	din 11-4-28
797	Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 12-4-28	din 25-4-28
798	Bemonstering trajecten IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 26-4-28	din 9-5-28
799	Analyseren monsters IW door Aquon	TM	OG	0%	2w	woe 10-5-28	din 23-5-28
800	Toetsen analyseresultaten door monitoring	TM	OG	0%	2w	woe 24-5-28	din 6-6-28
801	Afperkend onderzoek gereed			0%	0w	din 6-6-28	din 6-6-28
802	**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**22w**	**woe 15-3-28**	**din 5-9-28**
803	**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**6w**	**woe 15-3-28**	**din 25-4-28**
804	Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	4w	woe 15-3-28	din 11-4-28
805	Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 12-4-28	din 25-4-28
806	**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**6w**	**woe 7-6-28**	**din 18-7-28**
807	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 7-6-28	din 20-6-28
808	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 21-6-28	din 4-7-28
809	Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 5-7-28	din 18-7-28
810	**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4w**	**woe 7-6-28**	**din 4-7-28**
811	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 7-6-28	din 20-6-28
812	Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 21-6-28	din 4-7-28
813	**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4w**	**woe 19-7-28**	**din 5-9-28**
814	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2w	woe 19-7-28	din 22-8-28
815	Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2w	woe 23-8-28	din 5-9-28
816	Rapportage Waterbodemonderzoek gereed			0%	0w	din 5-9-28	din 5-9-28
817	**Uitvoeringsscope**			**0%**	**5w**	**woe 6-9-28**	**din 10-10-28**
818	Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.13, P.19	TM	ON	0%	2w	woe 6-9-28	din 19-9-28
819	Review geodatabase en Uitvoeringscopekaart per DG P.13, P.19	TM	OG	0%	1w	woe 20-9-28	din 26-9-28
820	VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2w	woe 27-9-28	din 10-10-28
821	Uitvoeringsscope gereed			0%	0w	din 10-10-28	din 10-10-28
822	**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**18w**	**woe 27-9-28**	**din 13-2-29**
823	Quickscan F&E en Exotenscan	OM	OG	0%	4w	woe 27-9-28	din 24-10-28
824	Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.20	OM	ON	0%	4w	woe 11-10-28	din 7-11-28
825	Afstemmen kwaliteit + kosten overheden	OM	OG	0%	8w	woe 8-11-28	din 16-1-29
826	Eisen/wensenlijst omgeving definitief	OM	OG	0%	4w	woe 17-1-29	din 13-2-29
827	Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed			0%	0w	din 13-2-29	din 13-2-29
828	**SSK-Raming**			**0%**	**20w**	**woe 11-10-28**	**din 13-3-29**
829	Risicosessie	MPB	ON	0%	2w	woe 11-10-28	din 24-10-28
830	Opstellen rapport risicosessie P.4	MPB	ON	0%	2w	woe 25-10-28	din 7-11-28
831	Opstellen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 17-1-29	din 30-1-29
832	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 31-1-29	din 13-2-29
833	Aanpassen SSK P.23	MPB	ON	0%	2w	woe 14-2-29	din 27-2-29
834	Toetsen SSK P.23	MPB	OG	0%	2w	woe 28-2-29	din 13-3-29
835	SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosesie gereed			0%	0d	din 13-3-29	din 13-3-29
836	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**5w**	**woe 11-10-28**	**din 14-11-28**
837	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	2w	woe 11-10-28	din 24-10-28
838	Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	3w	woe 25-10-28	din 14-11-28
839	Communicatie Omgeving Brief 2 gereed			0%	0w	din 14-11-28	din 14-11-28
840	**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**15w**	**woe 17-1-29**	**din 1-5-29**
841	Opstellen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	ON	0%	2w	woe 17-1-29	din 30-1-29
842	Toetsen V&G-plan Ontwerp P.22	CM	OG	0%	2w	woe 31-1-29	din 13-2-29
843	V&G-plan Ontwerp gereed P.22	CM	ON	0%	2w	woe 14-2-29	din 27-2-29
844	Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	ON	0%	2w	woe 14-2-29	din 27-2-29
845	Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.21	CM	OG	0%	2w	woe 28-2-29	din 13-3-29
846	Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.21	CM	ON	0%	2w	woe 14-3-29	din 27-3-29
847	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 27-3-29	din 27-3-29
848	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 28-3-29	din 10-4-29
849	Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
850	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	ON	0%	2w	woe 11-4-29	din 24-4-29
851	Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1w	woe 25-4-29	din 1-5-29
852	Prijsvorming Voorbereiding gereed			0%	0w	din 1-5-29	din 1-5-29
853	**Kredietaanvraag**			**0%**	**9w**	**woe 14-3-29**	**din 15-5-29**
854	Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2w	woe 14-3-29	din 27-3-29
855	RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1w	woe 28-3-29	din 3-4-29
856	Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2w	woe 4-4-29	din 17-4-29
857	Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4w	woe 18-4-29	din 15-5-29
858	Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0w	din 15-5-29	din 15-5-29
859	**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20w**	**woe 2-5-29**	**din 9-10-29**
860	Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20w	woe 2-5-29	din 9-10-29
861	Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	16w	woe 2-5-29	din 11-9-29
862	Beoordelen werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 12-9-29	din 25-9-29
863	Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2w	woe 26-9-29	din 9-10-29
864	Voorbereiding gereed			0%	0w	din 9-10-29	din 9-10-29
865	**Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**4w**	**woe 2-5-29**	**din 29-5-29**
866	Kadastrale Percelenlijst per DG P.5	OM	ON	0%	1w	woe 2-5-29	din 8-5-29
867	Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	3w	woe 9-5-29	din 29-5-29
868	Communicatie Omgevingsmanagement Brief 3 gereed			0%	0w	din 29-5-29	din 29-5-29
869	**Gate 4**			**0%**	**4w**	**woe 10-10-29**	**din 6-11-29**
870	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3w	woe 10-10-29	din 30-10-29
871	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1w	woe 31-10-29	din 6-11-29
872	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 6-11-29	din 6-11-29
873	**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 6-11-29**	**din 6-11-29**
878	Einde Uitvoeringsfase, Ontwerp			0%	0w	din 6-11-29	din 6-11-29
879	**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**5w**	**din 6-11-29**	**din 11-12-29**
880	Start Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 6-11-29	din 6-11-29
881	**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**5w**	**din 6-11-29**	**din 11-12-29**
882	Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0w	din 6-11-29	din 6-11-29
883	Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2w	woe 7-11-29	din 20-11-29
884	Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting P.24	CM	ON	0%	2w	woe 21-11-29	din 4-12-29
885	Nadere aanneemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1w	woe 5-12-29	din 11-12-29
886	Prijsvorming Uitvoering gereed			0%	0w	din 11-12-29	din 11-12-29
887	**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**	**MPB**	**ON**	**0%**	**0w**	**din 11-12-29**	**din 11-12-29**
892	Einde Uitvoeringsfase, Voorbereiding			0%	0w	din 11-12-29	din 11-12-29
893	**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86w**	**din 11-12-29**	**din 14-10-31**
894	Start 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 11-12-29	din 11-12-29
895	**Realisatie**			**0%**	**56w**	**woe 12-12-29**	**din 25-2-31**
896	DG1 Realisatie	CM	OG	0%	49w	woe 12-12-29	din 7-1-31
897	Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.26	TM	ON	0%	49w	woe 9-1-30	din 21-1-31
898	Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2w	woe 22-1-31	din 4-2-31
899	Aanleveren geodatabase per DG P.13	TM	ON	0%	2w	woe 5-2-31	din 18-2-31
900	Review geodatabase per DG	TM	OG	0%	1w	woe 19-2-31	din 25-2-31
901	Realisatie gereed			0%	0w	din 25-2-31	din 25-2-31
902	**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26w**	**woe 26-2-31**	**din 16-9-31**
903	Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26w	woe 26-2-31	din 16-9-31
904	Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6w	woe 26-2-31	din 8-4-31
905	Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4w	woe 9-4-31	din 6-5-31
906	Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed			0%	0w	din 6-5-31	din 6-5-31
907	Evaluatie deelgebied 1 met aannemer, IB, HHR	CM	OG	0%	2w	woe 7-5-31	din 20-5-31
908	**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2w**	**woe 5-2-31**	**din 18-2-31**
909	Financiele afronding met gemeenten P.27	MPB	ON	0%	2w	woe 5-2-31	din 18-2-31
910	Afronden Contracten overheid gereed			0%	0w	din 18-2-31	din 18-2-31
911	**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**16w**	**woe 7-5-31**	**din 16-9-31**
912	Opstellen overdrachtsdossier P.28	TM	ON	0%	4w	woe 7-5-31	din 3-6-31
913	Opstellen nacalculatie P.29	MPB	ON	0%	4w	woe 7-5-31	din 3-6-31
914	Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4w	woe 4-6-31	din 1-7-31
915	Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2w	woe 3-9-31	din 16-9-31
916	Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2w	woe 3-9-31	din 16-9-31
917	Afronden contractuele verplichtingen IB gereed			0%	0w	din 16-9-31	din 16-9-31
918	**Gate 6**			**0%**	**4w**	**woe 17-9-31**	**din 14-10-31**
919	Voorbereiden	MPB	ON	0%	3w	woe 17-9-31	din 7-10-31
920	Doorlopen	PM	ON	0%	1w	woe 8-10-31	din 14-10-31
921	Akkoord	PM	ON	0%	0w	din 14-10-31	din 14-10-31
922	**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0w**	**din 14-10-31**	**din 14-10-31**
927	Einde 60_Uitvoeringsfase, Realisatie			0%	0w	din 14-10-31	din 14-10-31
928	**65_Afrondingsfase, Nazorg**			**0%**	**8w**	**din 2-12-31**	**din 10-2-32**
929	Start 65_Afrondingsfase, Nazorg			0%	0w	din 2-12-31	din 2-12-31
930	**Interne afronding**			**0%**	**4w**	**woe 3-12-31**	**din 13-1-32**
931	Evaluatie van het projectresultaat	PM	OG	0%	2w	woe 3-12-31	din 16-12-31
932	Definitief maken nacalculatie	MPB	OG	0%	2w	woe 17-12-31	din 13-1-32
933	Interne afronding gereed			0%	0w	din 13-1-32	din 13-1-32
934	**Gate 7**			**0%**	**4w**	**woe 14-1-32**	**din 10-2-32**
935	Gate voorbereiden	MPB	OG	0%	3w	woe 14-1-32	din 3-2-32
936	Gate doorlopen	PM	OG	0%	1w	woe 4-2-32	din 10-2-32
937	Gate akkoord	PM	OG	0%	0w	din 10-2-32	din 10-2-32
938	**Risicoreservering 65_Afrondingsfase, Nazorg**			**0%**	**0w**	**din 10-2-32**	**din 10-2-32**
943	Einde 65_Afrondingsfase, Nazorg			0%	0w	din 10-2-32	din 10-2-32

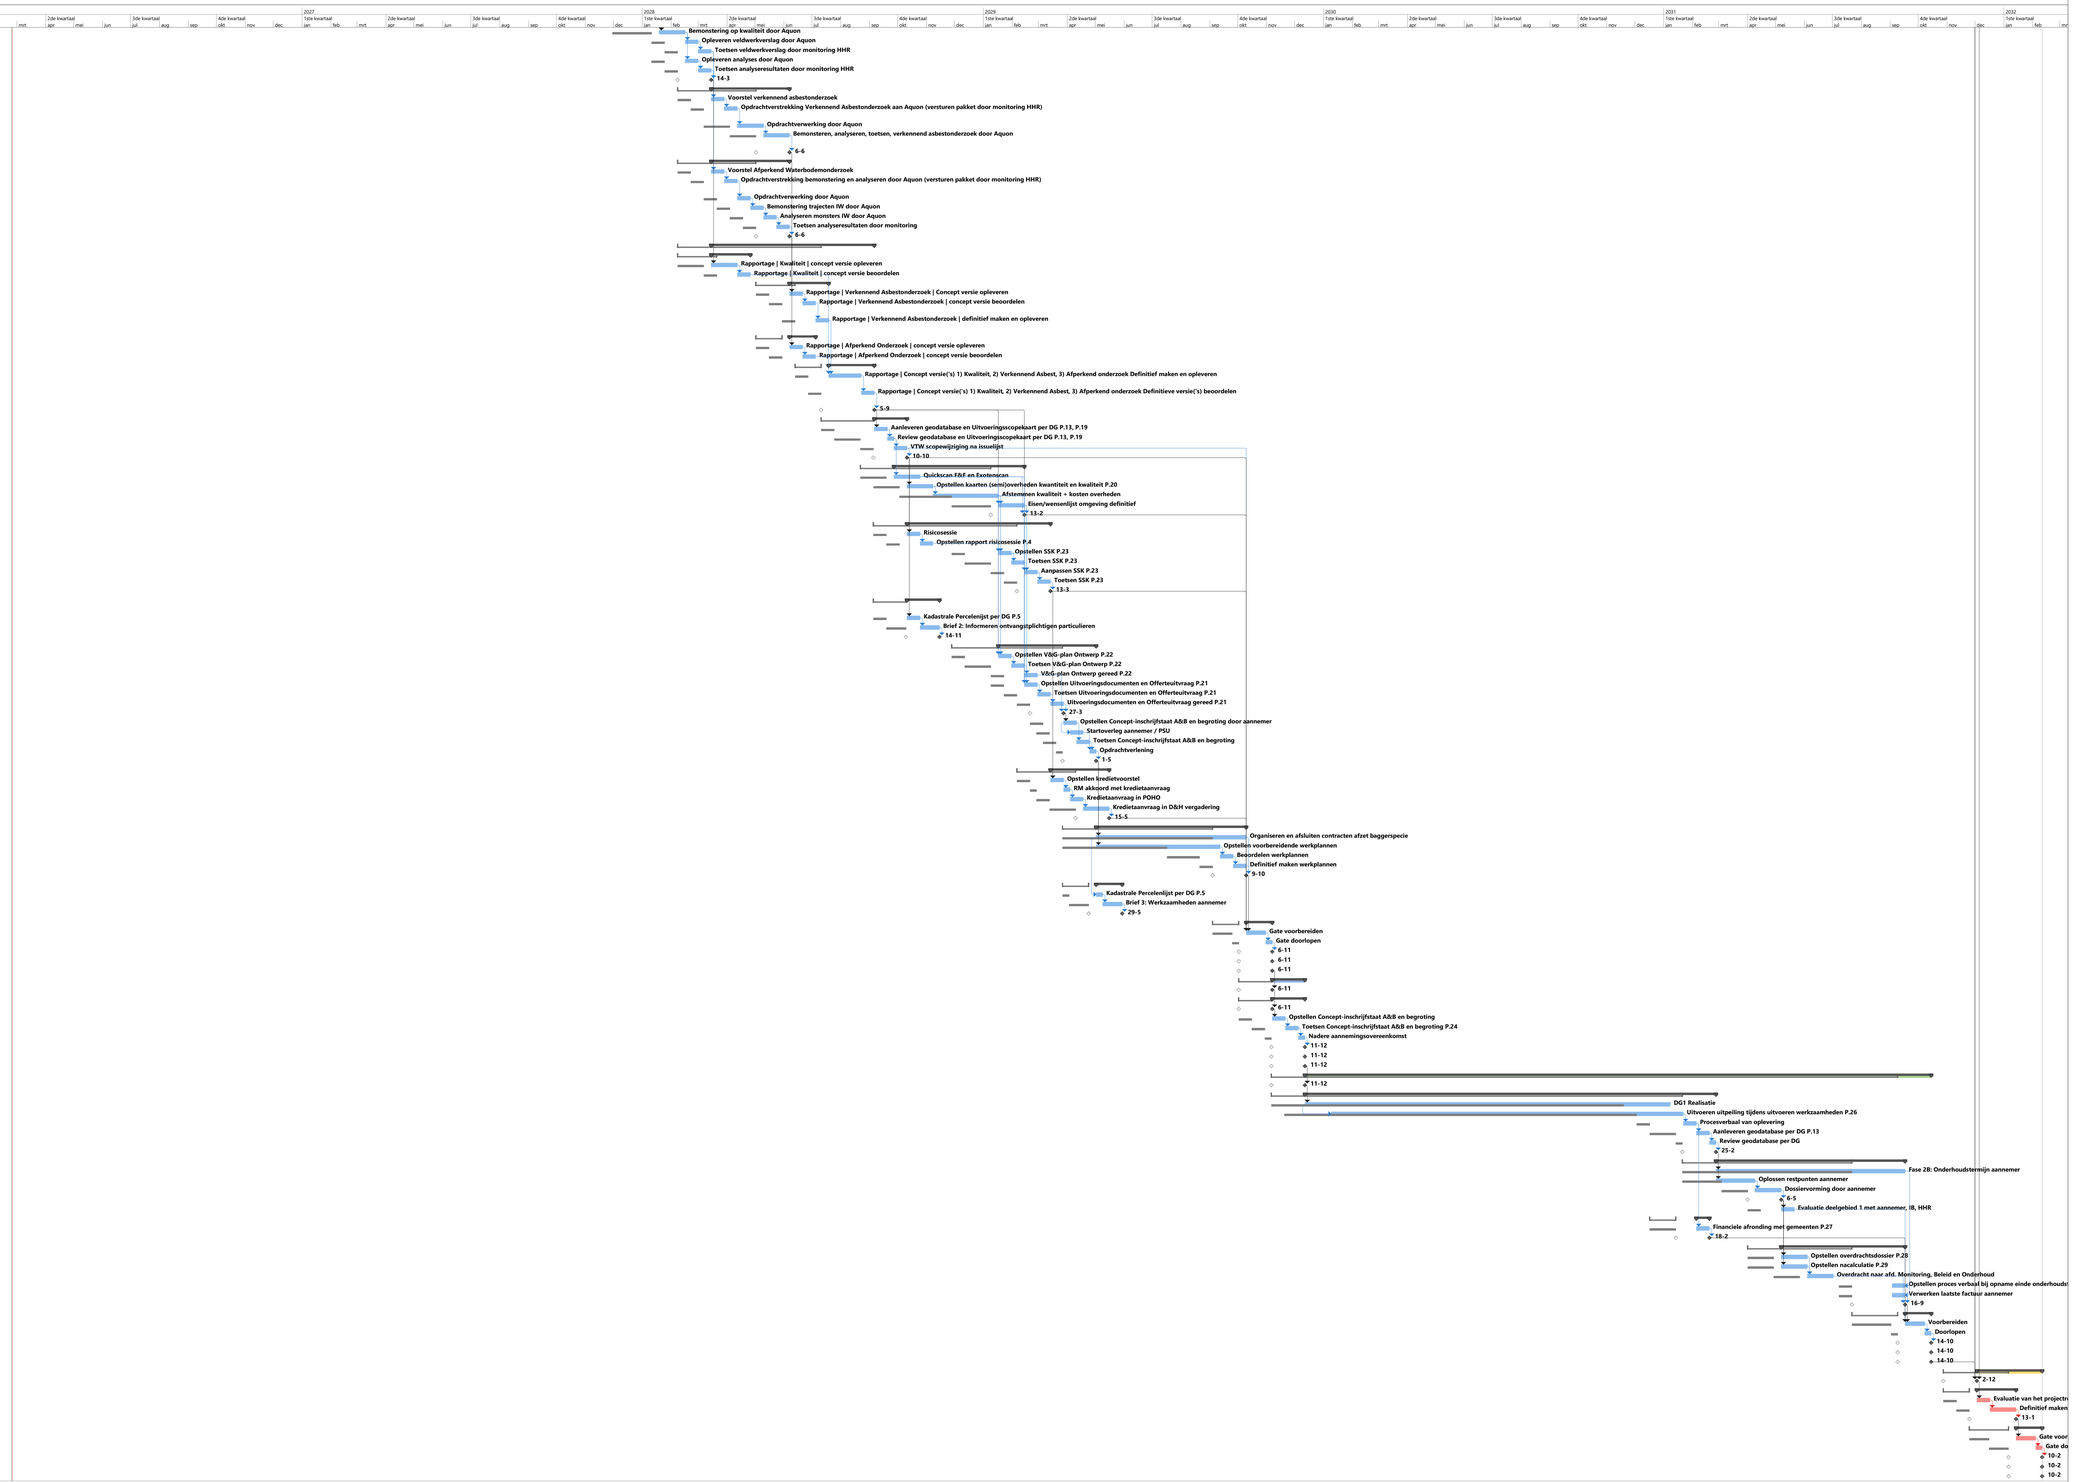

10_Initiatieffase | 30_Definitiefase | 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp | 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding | 60_Uitvoeringsfase, Realisatie | 65_Nazorgfase | Conditionering | Risicoreservering | Taak | Kritiek | Mijlpaal | Basislijn | Mijlpaal van basislijn | Samenvattingstaak van basislijn | Voortgang | Samenvatting | Projectsamenvatting | Deadline OK | Deadline NOK
