Hilversum Mediastad

Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	***MINCKELERSSTRAAT***			
2	***Algemeen Projectmanagement (overkoepelend)***	***159 dagen***	***maa 13-10-25***	***don 4-6-26***
3	***Overleggen***	***1 dag***	***maa 25-5-26***	***maa 25-5-26***
4	Kernteamoverleg	1 dag		
5	Technischteam overleg	1 dag		
6	Bereikbaarheidsoverleg (Melvin, bereikabarheidsoverleg intern, gebiedsoverleg)	1 dag		
7	***Bestuurlijke traject***	***35 dagen***	***woe 11-2-26***	***woe 1-4-26***
11	***inkooptraject - marktconsultatie (openbaar)***	***112 dagen***	***maa 13-10-25***	***din 31-3-26***
12	***Fase 4, Contractfase***	***51 dagen***	***maa 13-10-25***	***maa 5-1-26***
16	***Fase 5, Aanbestedingsfase Openbaar***	**35 dagen**	**woe 11-2-26**	**din 31-3-26**
22	***inkooptraject - ingenieursdiensten EU - ondergrondse gracht***	***109 dagen***	***maa 5-1-26***	***don 4-6-26***
23	***Fase 4, Contractfase***	***31 dagen***	***maa 5-1-26***	***maa 16-2-26***
26	***Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - diensten (DNR)***	**78 dagen**	**maa 16-2-26**	**don 4-6-26**
27	Publicatie van de opdracht	0 wkn	maa 16-2-26	maa 16-2-26
28	1e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 1e nota van inlichtingen	5 wkn	din 17-2-26	maa 23-3-26
29	2e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 2e nota van inlichtingen	2 wkn	din 24-3-26	maa 6-4-26
30	Aanbesteding	0 wkn	maa 20-4-26	maa 20-4-26
31	Beoordelen inschrijvingen	3 wkn	din 21-4-26	maa 11-5-26
32	Ontmoeting inschrijvers - beoordelingscommissie	0 wkn	maa 11-5-26	maa 11-5-26
33	Versturen voorgenomen gunningsbesluit	0 wkn	don 14-5-26	don 14-5-26
34	Versturen definitief gunningsbesluit	0 wkn	don 4-6-26	don 4-6-26
35	***Project 1 - Conditionerende werkzaamheden (tbv Gracht)***	***885 dagen***	***don 25-2-27***	***don 30-1-31***
36	**Fase 1, Verkenning**	**20 dagen**	**maa 26-4-27**	**vri 21-5-27**
37	Bepalen conditionerende onderzoeken	4 wkn	maa 26-4-27	vri 21-5-27
38	**Fase 2, Ontwerpfase**	**280 dagen**	**don 25-2-27**	**woe 10-5-28**
39	Opstellen indelingstekeningen ondergrond	8 wkn	maa 24-5-27	vri 20-8-27
40	Vooroverleg kabels en leidingen	4 wkn	don 25-2-27	woe 24-3-27
41	Aanschrijven en start verleggingsprocedure kabels en leidingeigenaren	26 wkn	don 25-3-27	woe 27-10-27
42	Werkvoorbereiding Kabels en leidingeigenaren taak	26 wkn	don 28-10-27	woe 10-5-28
43	**Fase 6, realisatie derden**	**510 dagen**	**don 15-2-29**	**don 30-1-31**
44	Werkvak 1 - Anthony Fokkerweg	12 wkn	don 15-2-29	don 10-5-29
45	Werkvak 2 - Anthony Fokkerweg - Kamerlingh Onnesweg	4 wkn	don 30-8-29	don 27-9-29
46	Werkvak 3 - Kamerlingh Onnesweg	12 wkn	don 22-11-29	don 14-2-30
47	Werkvak 4 - Kamerlingh Onnesweg - Jan van der Heijdenstraat	12 wkn	don 14-3-30	don 6-6-30
48	Werkvak 5 - Jan van der Heijdenstraat	12 wkn	don 6-6-30	woe 2-10-30
49	Werkvak 6 - Jan van der Heijdenstraat - Kleine Drift	12 wkn	don 24-10-30	don 30-1-31
50	***Project 2 - Realisatie ondergrondse gracht***	***1505 dagen***	***maa 28-4-25***	***woe 7-1-32***
51	**Fase 1, Verkenning**	**172 dagen**	**maa 28-4-25**	**woe 11-2-26**
52	bepalen scope ondegrondse gracht	26 wkn	maa 28-4-25	vri 28-11-25
53	akkoord voortgang	0 dagen	woe 11-2-26	woe 11-2-26
54	**Fase 2, Ontwerpfase**	**280 dagen**	**woe 11-2-26**	**vri 23-4-27**
55	***Voorlopig ontwerp***	***170 dagen***	***woe 11-2-26***	***vri 6-11-26***
56	Opstellen overzichttekeningen ondergrondse gracht	12 wkn	woe 11-2-26	din 5-5-26
57	Opstellen van berekeningen en funderingsonderzoek	16 wkn	woe 6-5-26	vri 25-9-26
58	Overleg bereikbaarheid Hilversum	16 wkn	woe 6-5-26	vri 25-9-26
59	Opstellen BLVC kaders	4 wkn	woe 6-5-26	din 2-6-26
60	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	4 wkn	maa 28-9-26	vri 23-10-26
61	Besluitvorming VO fase	2 wkn	maa 26-10-26	vri 6-11-26
62	***Definitief ontwerp***	***110 dagen***	***maa 9-11-26***	***vri 23-4-27***
63	Uitwerking gracht	16 wkn	maa 9-11-26	vri 12-3-27
64	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	4 wkn	maa 15-3-27	vri 9-4-27
65	Besluitvorming DO fase	2 wkn	maa 12-4-27	vri 23-4-27
66	**Fase 3, Onderzoeksfase - Vergunningen**	**308 dagen**	**maa 13-4-26**	**woe 16-6-27**
67	***Onderzoeken***	***82 dagen***	***maa 4-5-26***	***vri 25-9-26***
68	Proefsleuven maken incl verwerken tekening	8 wkn	maa 4-5-26	vri 26-6-26
69	Inspecties uitvoeren en verwerken	8 wkn	maa 4-5-26	vri 26-6-26
70	Flora / Fauna, inventarisatie	8 wkn	woe 6-5-26	din 30-6-26
71	Ecologisch werkprotocol, opstartfase (evt. extra onderzoeken)	4 wkn	woe 1-7-26	vri 28-8-26
72	Bodemonderzoek + rapportage (Bodem, verharding en grondwater)	16 wkn	woe 6-5-26	vri 25-9-26
73	Geo-hydrologisch check t.b.v. bemalingsonderzoeken / advies	8 wkn	woe 6-5-26	din 30-6-26
74	Archeologie	4 wkn	woe 6-5-26	din 2-6-26
75	***Vergunningen***	***275 dagen***	***maa 13-4-26***	***woe 16-6-27***
76	Vooroverleg team omgevingsvergunningen	8 wkn	maa 13-4-26	vri 5-6-26
77	Vergunningen tbv hebben en houden van de ondergrondse gracht	12 wkn	don 25-3-27	woe 16-6-27
78	***Fase 4, Contractfase***	***71 dagen***	***maa 15-11-27***	***maa 6-3-28***
79	Aanbestedingsdossier + leidraad opstellen, concept	12 wkn	maa 15-11-27	vri 18-2-28
80	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	vri 18-2-28	vri 18-2-28
81	Aanbestedingsdossier + leidraad definitief	2 wkn	din 22-2-28	maa 6-3-28
82	**Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - bouwteam**	**287 dagen**	**maa 6-3-28**	**woe 11-4-29**
83	Publicatie van de opdracht	0 wkn	maa 6-3-28	maa 6-3-28
84	1e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 1e nota van inlichtingen	8 wkn	din 7-3-28	maa 1-5-28
85	2e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 2e nota van inlichtingen	3 wkn	din 2-5-28	maa 22-5-28
86	Aanbesteding	0 wkn	woe 31-5-28	woe 31-5-28

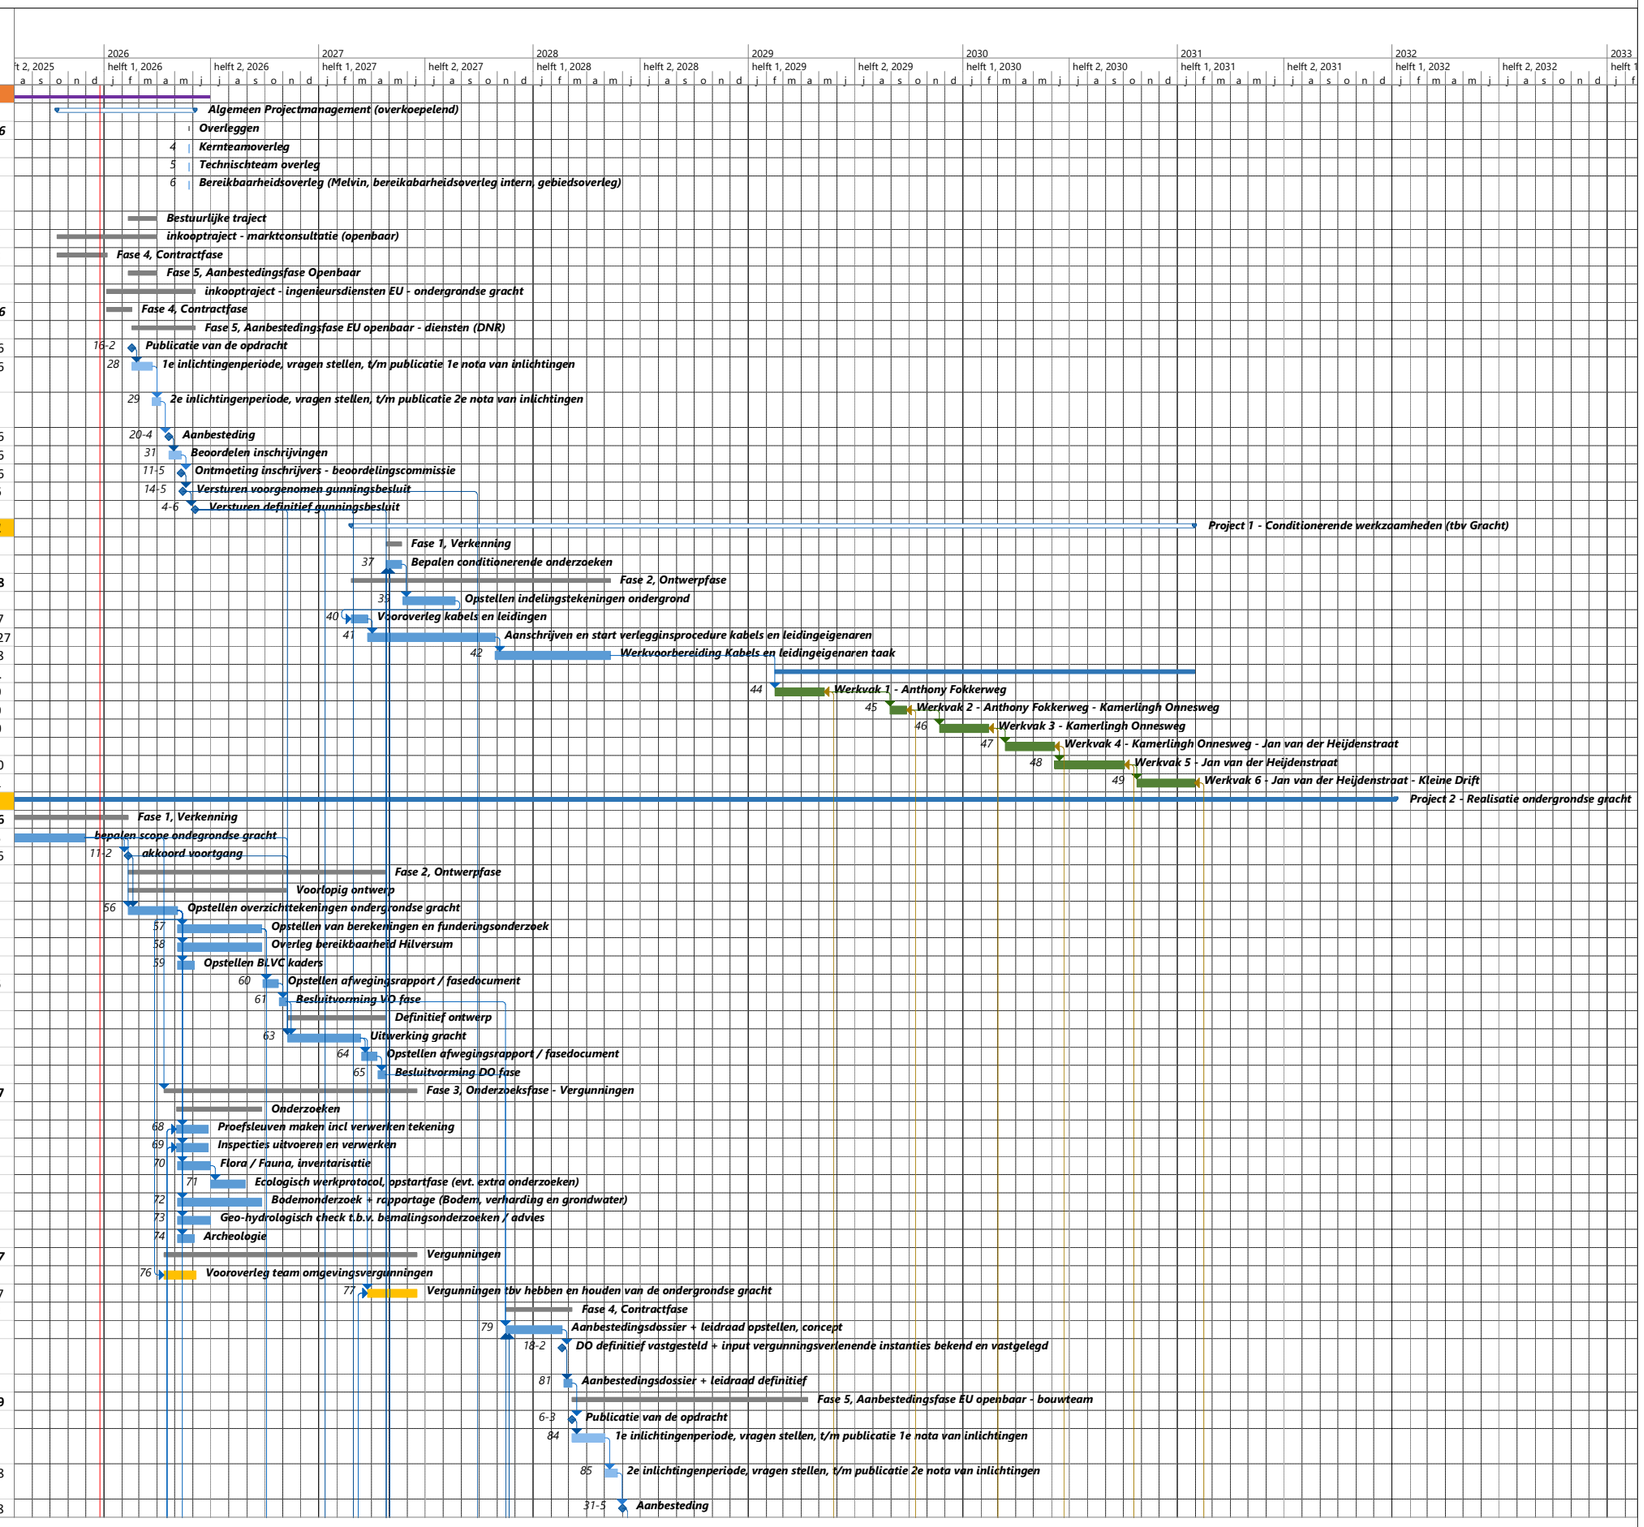

Planning tbv aanbesteding I-diensten

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Hilversum Mediastad

Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
87	Beoordelen inschrijvingen	3 wkn	don 1-6-28	woe 21-6-28
88	Ontmoeting inschrijvers - beoordelingscommissie	0 wkn	woe 21-6-28	woe 21-6-28
89	Versturen voorgenomen gunningsbesluit	0 wkn	woe 16-8-28	woe 16-8-28
90	Versturen definitief gunningsbesluit	0 wkn	woe 13-9-28	woe 13-9-28
91	***Bouwteamfase***	***140 dagen***	***don 14-9-28***	***woe 11-4-29***
92	voorbereiden en opstarten bouwteamfase	4 wkn	don 14-9-28	woe 11-10-28
93	Uitwerking DO-UO	16 wkn	don 12-10-28	woe 14-2-29
94	Prijsvorming (aannemeringsbegroting)	4 wkn	don 15-2-29	woe 14-3-29
95	Besluitvorming Gemeente Hilversum	4 wkn	don 15-3-29	woe 11-4-29
96	Opdrachtverstrekking uitvoering	0 wkn	woe 11-4-29	woe 11-4-29
97	**Fase 6, realisatie ondergrondse gracht**	**715 dagen**	**don 12-4-29**	**woe 7-1-32**
98	opstarten aannemer	4 wkn	don 12-4-29	woe 9-5-29
99	leverantie betonnen elementen (start eerste elementen)	12 wkn	don 12-4-29	woe 4-7-29
100	***Werkvak 1 - Anthony Fokkerweg***	***115 dagen***	***don 10-5-29***	***woe 21-11-29***
101	Aanleg ondergrondse gracht	20 wkn	don 10-5-29	woe 26-9-29
102	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	don 27-9-29	woe 21-11-29
103	***Werkvak 2 - Anthony Fokkerweg - Kamerlingh Onnesweg***	***150 dagen***	***don 27-9-29***	***woe 8-5-30***
104	Aanleg ondergrondse gracht	20 wkn	don 27-9-29	woe 13-2-30
105	definitieve inrichting buitenruimte	12 wkn	don 14-2-30	woe 8-5-30
106	***Werkvak 3 - Kamerlingh Onnesweg (Kruising)***	***120 dagen***	***don 14-2-30***	***woe 4-9-30***
107	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	don 14-2-30	woe 5-6-30
108	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	don 6-6-30	woe 4-9-30
109	***Werkvak 4 - Kamerlingh Onnesweg - Jan van der Heijdenstraat***	***95 dagen***	***don 6-6-30***	***woe 20-11-30***
110	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	don 6-6-30	woe 25-9-30
111	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	don 26-9-30	woe 20-11-30
112	***Werkvak 5 - Jan van der Heijdenstraat (kruising)***	***140 dagen***	***don 26-9-30***	***woe 23-4-31***
113	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	don 26-9-30	woe 29-1-31
114	definitieve inrichting buitenruimte	12 wkn	don 30-1-31	woe 23-4-31
115	***Werkvak 6 - Jan van der Heijdenstraat - Kleine Drift***	***210 dagen***	***don 30-1-31***	***woe 7-1-32***
116	Aanleg ondergrondse gracht	26 wkn	don 30-1-31	woe 3-9-31
117	definitieve inrichting buitenruimte (excl Prof Kochstraat anders 8 wk extra)	16 wkn	don 4-9-31	woe 7-1-32
118	eindinspectie	2 wkn	don 4-9-31	woe 17-9-31
119	Oplevering	0 wkn	woe 1-10-31	woe 1-10-31
120	Overdracht werkzaamheden	4 wkn	don 2-10-31	woe 29-10-31
121	***Project 3 - Renovatie Zuidelijke rioolbuis***	***598 dagen***	***maa 30-6-25***	***maa 6-3-28***
122	**Fase 1, Verkenning**	**80 dagen**	**maa 30-6-25**	**vri 21-11-25**
123	bepalen renovatie zuidelijke buis - Jordi & Jaap	16 wkn	maa 30-6-25	vri 21-11-25
124	**Fase 2, Ontwerpfase**	**110 dagen**	**maa 24-11-25**	**vri 8-5-26**
125	Opstellen overzichttekeningen relining tracé	8 wkn	maa 24-11-25	vri 30-1-26
126	Voorstel verwijderen en amoveren putten	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26
127	Overleg bereikbaarheid Hilversum	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26
128	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	6 wkn	maa 2-3-26	vri 10-4-26
129	Besluitvorming, vervolgtraject contract -/ uitvoeringsfase	4 wkn	maa 13-4-26	vri 8-5-26
130	**Fase 3, Onderzoeksfase - Vergunningen**	**120 dagen**	**maa 5-1-26**	**vri 19-6-26**
131	***Onderzoeken***	***100 dagen***	***maa 5-1-26***	***vri 22-5-26***
132	Proefsleuven maken incl verwerken tekening	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26
133	Inspecties uitvoeren en verwerken	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26
134	Vewijderen van doorstekende leidingen	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26
135	Flora / Fauna, inventarisatie	8 wkn	maa 2-2-26	vri 27-3-26
136	Ecologisch werkprotocol, opstartfase (evt. extra onderzoeken)	0 dagen	vri 27-3-26	vri 27-3-26
137	Bodemonderzoek + rapportage	16 wkn	maa 2-2-26	vri 22-5-26
138	Geo-hydrologisch check t.b.v. bemalingsonderzoeken / advies	8 wkn	maa 2-2-26	vri 27-3-26
139	Archeologie	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26
140	BLVC Kaderplan opstellen	4 wkn	maa 2-3-26	vri 27-3-26
141	***Vergunningen***	***60 dagen***	***maa 30-3-26***	***vri 19-6-26***
142	Vergunningen algemeen (rioolvergunning, werken aan de weg, TVM)	12 wkn	maa 30-3-26	vri 19-6-26
143	***Fase 4, Contractfase***	***31 dagen***	***maa 11-5-26***	***maa 22-6-26***
144	Aanbestedingsdossier + leidraad opstellen, concept	4 wkn	maa 11-5-26	vri 5-6-26
145	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	vri 5-6-26	vri 5-6-26
146	Aanbestedingsdossier + leidraad definitief	2 wkn	din 9-6-26	maa 22-6-26
147	**Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - bouwteam**	**245 dagen**	**maa 22-6-26**	**maa 31-5-27**
148	Publicatie van de opdracht	0 wkn	maa 22-6-26	maa 22-6-26
149	1e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 1e nota van inlichtingen	8 wkn	din 23-6-26	don 17-9-26
150	2e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 2e nota van inlichtingen	3 wkn	vri 18-9-26	don 8-10-26
151	Aanbesteding	0 wkn	maa 19-10-26	maa 19-10-26
152	Beoordelen inschrijvingen	3 wkn	din 20-10-26	maa 9-11-26
153	Ontmoeting inschrijvers - beoordelingscommissie	0 wkn	maa 9-11-26	maa 9-11-26
154	Versturen voorgenomen gunningsbesluit	0 wkn	maa 30-11-26	maa 30-11-26
155	Versturen definitief gunningsbesluit	0 wkn	maa 11-1-27	maa 11-1-27
156	***Bouwteamfase***	***100 dagen***	***din 12-1-27***	***maa 31-5-27***
157	voorbereiden en opstarten bouwteamfase	4 wkn	din 12-1-27	maa 8-2-27
158	Uitwerking DO-UO	8 wkn	din 9-2-27	maa 5-4-27
159	Prijsvorming (aannemeringsbegroting)	4 wkn	din 6-4-27	maa 3-5-27
160	Besluitvorming Gemeente Hilversum	4 wkn	din 4-5-27	maa 31-5-27
161	Opdrachtverstrekking uitvoering	0 wkn	maa 31-5-27	maa 31-5-27
162	**Fase 6, realisatie**	**200 dagen**	**din 1-6-27**	**maa 6-3-28**

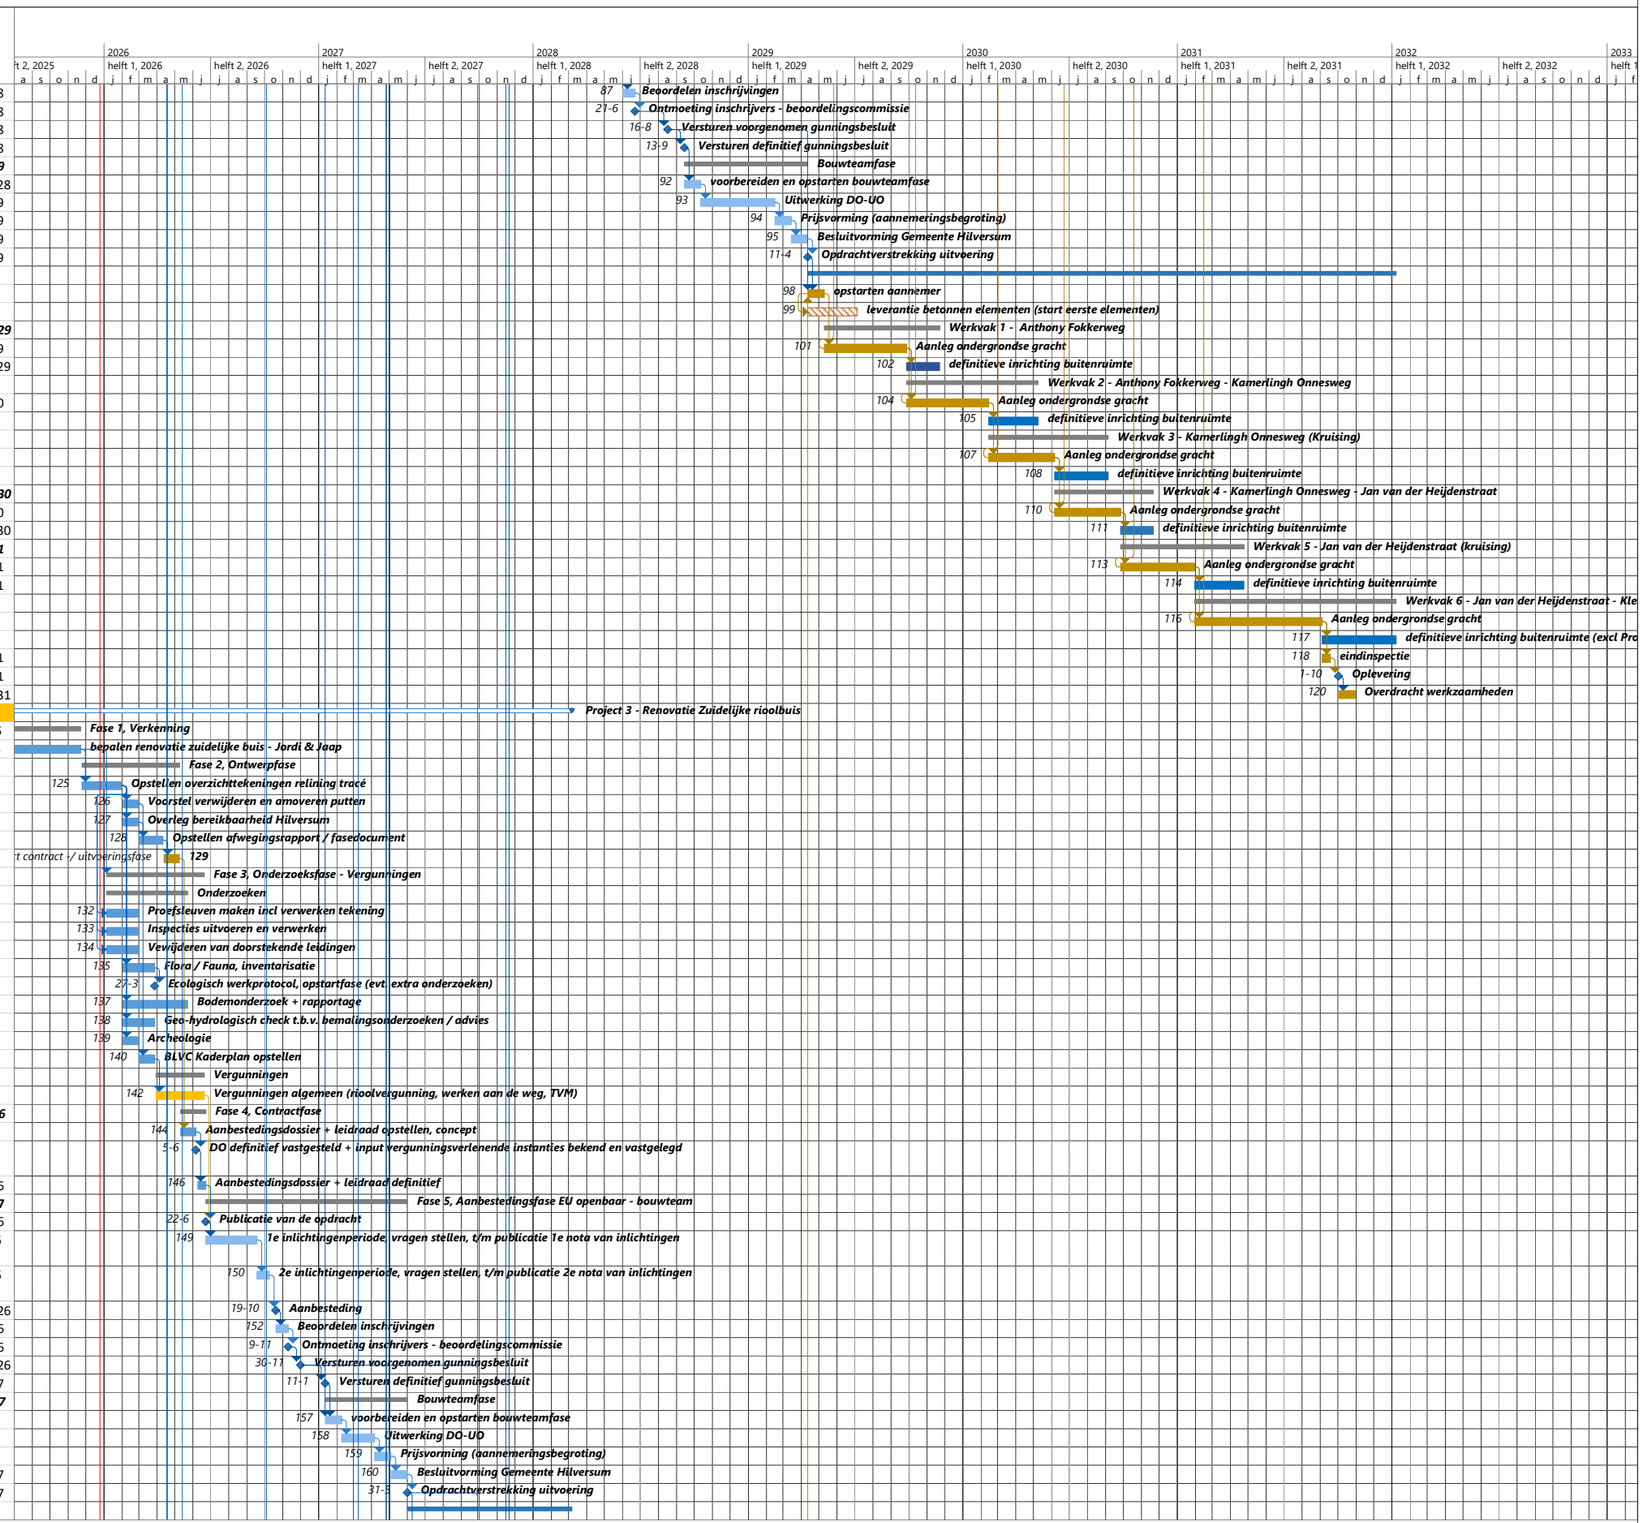

Planning tbv aanbesteding I-diensten

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Hilversum Mediastad

Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
163	opstarten aannemer	4 wkn	din 28-9-27	maa 25-10-27
164	leverantie liner	12 wkn	din 1-6-27	maa 27-9-27
165	opstellen werkput 1 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 26-10-27	maa 15-11-27
166	opstellen werkput 2 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 16-11-27	maa 6-12-27
167	opstellen werkput 3 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 7-12-27	maa 27-12-27
168	opstellen werkput 4 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 28-12-27	maa 17-1-28
169	eindinspectie	1 wk	din 18-1-28	maa 24-1-28
170	Oplevering	0 wkn	maa 7-2-28	maa 7-2-28
171	Overdracht werkenzaamheden	4 wkn	din 8-2-28	maa 6-3-28
172	***Project 4 - Energie transistie (voorbereiding LT net)***	***467 dagen***	***don 1-1-26***	***vri 21-1-28***
173	stap 1 - haalbaarheidsstudie met systeemconcept (EXTERN, Fyran)	18 wkn	don 1-1-26	don 7-5-26
174	Stap 2 - Samenwerkingsovereenkomst afsluiten SOK	16 wkn	vri 8-5-26	din 29-9-26
175	Stap 3 - inrichten publiek Warmtebedrijf (EXTERN)	26 wkn	woe 30-9-26	din 13-4-27
176	**Fase 2, Ontwerpfase**	**300 dagen**	**maa 28-9-26**	**vri 21-1-28**
177	***Voorlopig ontwerp***	***140 dagen***	***maa 28-9-26***	***vri 23-4-27***
178	Nadere uitwerking systeemontwerp	8 wkn	woe 30-9-26	din 24-11-26
179	Opstellen overzichttekeningen energienet (derden) - KAN PAS STARTEN NA VASTKLIKKEN VO FASE GRACHT	12 wkn	maa 28-9-26	vri 18-12-26
180	Opstellen van berekeningen	8 wkn	maa 4-1-27	vri 26-2-27
181	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	6 wkn	maa 1-3-27	vri 9-4-27
182	Besluitvorming VO fase	0 wkn	vri 23-4-27	vri 23-4-27
183	***Definitief ontwerp***	***160 dagen***	***maa 26-4-27***	***vri 21-1-28***
184	Uitwerking LT net met Gracht	12 wkn	maa 26-4-27	vri 20-8-27
185	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	6 wkn	maa 23-8-27	vri 1-10-27
186	Besluitvorming DO fase	0 wkn	vri 15-10-27	vri 15-10-27
187	Aanvraag vergunning tbv hebben en houden van de leiding	12 wkn	maa 18-10-27	vri 21-1-28
188	***Fase 4, Contractfase***	***40 dagen***	***maa 18-10-27***	***vri 10-12-27***
189	Aanbestedingsdossier + schrijven bestekposten	6 wkn	maa 18-10-27	vri 26-11-27
190	Aanbestedingsdossier gereed	2 wkn	maa 29-11-27	vri 10-12-27
191	***Project 5 - Mobiliteit + Groen (voorbereiding Mobiliteit)***	***492 dagen***	***maa 1-12-25***	***vri 4-2-28***
192	**Fase 2, Ontwerpfase**	**442 dagen**	**maa 1-12-25**	**vri 12-11-27**
193	Welke uitgangspunten voor bovengronds ontwerp 50/30 etc	101 dagen	maa 1-12-25	maa 4-5-26
194	***Schetsontwerp***	***80 dagen***	***din 5-5-26***	***don 24-9-26***
195	Opstellen schetsontwerp buitenruimte	8 wkn	din 5-5-26	maa 29-6-26
196	Participatie omgeving	8 wkn	din 30-6-26	don 24-9-26
197	***Voorlopig ontwerp***	***100 dagen***	***maa 28-9-26***	***vri 26-2-27***
198	Opstellen overzichttekeningen	12 wkn	maa 28-9-26	vri 18-12-26
199	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	maa 4-1-27	vri 26-2-27
200	Besluitvorming VO fase	0 wkn	vri 26-2-27	vri 26-2-27
201	***Definitief ontwerp***	***160 dagen***	***maa 1-3-27***	***vri 12-11-27***
202	Uitwerking buitenruimte en nadere detaillering	24 wkn	maa 1-3-27	vri 17-9-27
203	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	maa 20-9-27	vri 12-11-27
204	Besluitvorming DO fase	0 wkn	vri 12-11-27	vri 12-11-27
205	***Fase 4, Contractfase***	***51 dagen?***	***vri 12-11-27***	***vri 4-2-28***
206	Aanbestedingsdossier + schrijven bestekposten	8 wkn	maa 15-11-27	vri 21-1-28
207	Aanbestedingsdossier gereed	2 wkn	maa 24-1-28	vri 4-2-28
208		1 dag?	vri 12-11-27	vri 12-11-27

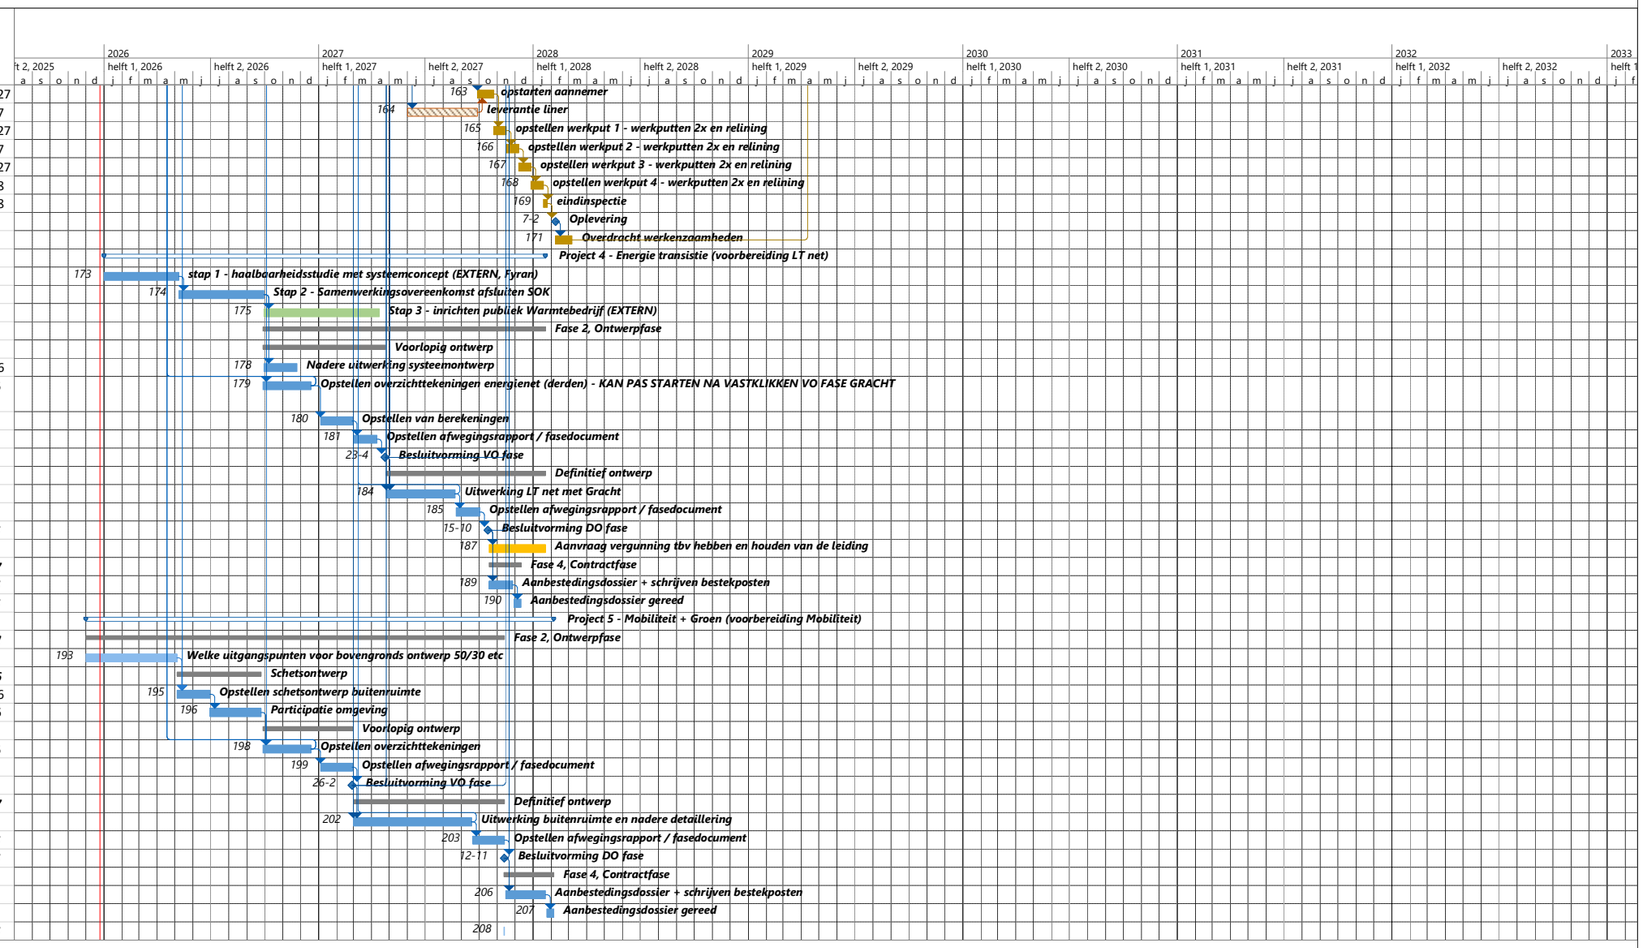

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Planning tbv aanbesteding I-diensten
