Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid
1	***MINCKELERSSTRAAT***				
2	***Algemeen Projectmanagement (overkoepelend)***	***159 dagen***	***maa 13-10-25***	***don 4-6-26***	***28%***
3	***Overleggen***	***1 dag***	***maa 25-5-26***	***maa 25-5-26***	***0%***
4	Kernteamoverleg	1 dag			0%
5	Technischteam overleg	1 dag			0%
6	Bereikbaarheidsoverleg	1 dag			0%
7	***Bestuurlijke traject***	***52 dagen***	***maa 19-1-26***	***woe 1-4-26***	***0%***
8	PHO	0 dagen	maa 19-1-26	maa 19-1-26	0%
9	College				0%
10	Raad	0 dagen	woe 1-4-26	woe 1-4-26	0%
11	***inkooptraject - marktconsultatie (openbaar)***	***101 dagen***	***maa 13-10-25***	***maa 16-3-26***	***53%***
12	***Fase 4, Contractfase***	***51 dagen***	***maa 13-10-25***	***maa 5-1-26***	***100%***
16	***Fase 5, Aanbestedingsfase Openbaar***	***41 dagen***	***maa 19-1-26***	***maa 16-3-26***	***0%***
22	***inkooptraject - ingenieursdiensten EU - ondergrondse gracht***	***109 dagen***	***maa 5-1-26***	***don 4-6-26***	***0%***
23	***Fase 4, Contractfase***	***31 dagen***	***maa 5-1-26***	***maa 16-2-26***	***0%***
26	***Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - diensten (DNR)***	***78 dagen***	***maa 16-2-26***	***don 4-6-26***	***0%***
35	***Project 1 - Conditionerende werkzaamheden (tbv Gracht)***	***908 dagen***	***don 25-2-27***	***din 4-3-31***	***0%***
36	**Fase 1, Verkenning**	**20 dagen**	**don 27-5-27**	**woe 23-6-27**	**0%**
37	Bepalen conditionerende onderzoeken	4 wkn	don 27-5-27	woe 23-6-27	0%
38	**Fase 2, Ontwerpfase**	**280 dagen**	**don 25-2-27**	**woe 10-5-28**	**0%**
39	Opstellen indelingstekeningen ondergrond	8 wkn	don 24-6-27	woe 22-9-27	0%
40	Vooroverleg kabels en leidingen	4 wkn	don 25-2-27	woe 24-3-27	0%
41	Aanschrijven en start verlegginsprocedure kabels en leidingeigenaren	26 wkn	don 25-3-27	woe 27-10-27	0%
42	Werkvoorbereiding Kabels en leidingeigenaren taak	26 wkn	don 28-10-27	woe 10-5-28	0%
43	**Fase 6, realisatie derden**	**510 dagen**	**din 20-3-29**	**din 4-3-31**	**0%**
44	Werkvak 1 - Anthony Fokkerweg	12 wkn	din 20-3-29	din 12-6-29	0%
45	Werkvak 2 - Anthony Fokkerweg - Kamerlingh Onnesweg	4 wkn	din 2-10-29	din 30-10-29	0%
46	Werkvak 3 - Kamerlingh Onnesweg	12 wkn	din 25-12-29	din 19-3-30	0%
47	Werkvak 4 - Kamerlingh Onnesweg - Jan van der Heijdenstraat	12 wkn	din 16-4-30	din 9-7-30	0%
48	Werkvak 5 - Jan van der Heijdenstraat	12 wkn	maa 12-8-30	vri 1-11-30	0%
49	Werkvak 6 - Jan van der Heijdenstraat - Kleine Drift	12 wkn	din 26-11-30	din 4-3-31	0%
50	***Project 2 - Realisatie ondergrondse gracht***	***1528 dagen***	***maa 28-4-25***	***maa 9-2-32***	***0%***
51	**Fase 1, Verkenning**	**155 dagen**	**maa 28-4-25**	**maa 19-1-26**	**0%**
52	bepalen scope ondegrondse gracht	26 wkn	maa 28-4-25	vri 28-11-25	0%
53	akkoord voortgang	0 dagen	maa 19-1-26	maa 19-1-26	0%
54	**Fase 2, Ontwerpfase**	**280 dagen**	**maa 19-1-26**	**woe 31-3-27**	**0%**
55	***Voorlopig ontwerp***	***170 dagen***	***maa 19-1-26***	***woe 14-10-26***	***0%***
56	Opstellen overzichttekeningen ondergrondse gracht	12 wkn	maa 19-1-26	vri 10-4-26	0%
57	Opstellen van berekeningen en funderingsonderzoek	16 wkn	maa 13-4-26	woe 2-9-26	0%
58	Overleg bereikbaarheid Hilversum	4 wkn	maa 13-4-26	vri 8-5-26	0%
59	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	4 wkn	don 3-9-26	woe 30-9-26	0%
60	Besluitvorming VO fase	2 wkn	don 1-10-26	woe 14-10-26	0%
61	***Definitief ontwerp***	***110 dagen***	***don 15-10-26***	***woe 31-3-27***	***0%***
62	Uitwerking gracht	16 wkn	don 15-10-26	woe 17-2-27	0%
63	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	4 wkn	don 18-2-27	woe 17-3-27	0%
64	Besluitvorming DO fase	2 wkn	don 18-3-27	woe 31-3-27	0%
65	**Fase 3, Onderzoeksfase - Vergunningen**	**308 dagen**	**maa 13-4-26**	**woe 16-6-27**	**0%**
66	***Onderzoeken***	***80 dagen***	***maa 13-4-26***	***woe 2-9-26***	***0%***
67	Proefsleuven maken incl verwerken tekening	8 wkn	maa 4-5-26	vri 26-6-26	0%
68	Inspecties uitvoeren en verwerken	8 wkn	maa 4-5-26	vri 26-6-26	0%
69	Flora / Fauna, inventarisatie	8 wkn	maa 13-4-26	vri 5-6-26	0%
70	Ecologisch werkprotocol, opstartfase (evt. extra onderzoeken)	4 wkn	maa 8-6-26	vri 3-7-26	0%
71	Bodemonderzoek + rapportage (Bodem, verharding en grondwater)	16 wkn	maa 13-4-26	woe 2-9-26	0%
72	Geo-hydrologisch check t.b.v. bemalingsonderzoeken / advies	8 wkn	maa 13-4-26	vri 5-6-26	0%
73	Archeologie	4 wkn	maa 13-4-26	vri 8-5-26	0%
74	***Vergunningen***	***275 dagen***	***maa 13-4-26***	***woe 16-6-27***	***0%***
75	Vooroverleg team omgevingsvergunningen	8 wkn	maa 13-4-26	vri 5-6-26	0%
76	Vergunningen werken aan de weg	12 wkn	don 25-3-27	woe 16-6-27	0%
77	***Fase 4, Contractfase***	***71 dagen***	***don 16-12-27***	***don 6-4-28***	***0%***
78	Aanbestedingsdossier + leidraad opstellen, concept	12 wkn	don 16-12-27	woe 22-3-28	0%
79	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	woe 22-3-28	woe 22-3-28	0%
80	Aanbestedingsdossier + leidraad definitief	2 wkn	vri 24-3-28	don 6-4-28	0%
81	**Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - bouwteam**	**287 dagen**	**don 6-4-28**	**maa 14-5-29**	**0%**
82	Publicatie van de opdracht	0 wkn	don 6-4-28	don 6-4-28	0%
83	1e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 1e nota van inlichtingen	8 wkn	vri 7-4-28	don 1-6-28	0%
84	2e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 2e nota van inlichtingen	3 wkn	vri 2-6-28	don 22-6-28	0%
85	Aanbesteding	0 wkn	maa 3-7-28	maa 3-7-28	0%
86	Beoordelen inschrijvingen	3 wkn	din 4-7-28	maa 28-8-28	0%
87	Ontmoeting inschrijvers - beoordelingscommissie	0 wkn	maa 28-8-28	maa 28-8-28	0%
88	Versturen voorgenomen gunningsbesluit	0 wkn	maa 18-9-28	maa 18-9-28	0%
89	Versturen definitief gunningsbesluit	0 wkn	maa 16-10-28	maa 16-10-28	0%
90	***Bouwteamfase***	***140 dagen***	***din 17-10-28***	***maa 14-5-29***	***0%***
91	voorbereiden en opstarten bouwteamfase	4 wkn	din 17-10-28	maa 13-11-28	0%
92	Uitwerking DO-UO	16 wkn	din 14-11-28	maa 19-3-29	0%
93	Prijsvorming (aannemeringsbegroting)	4 wkn	din 20-3-29	maa 16-4-29	0%
94	Besluitvorming Gemeente Hilversum	4 wkn	din 17-4-29	maa 14-5-29	0%

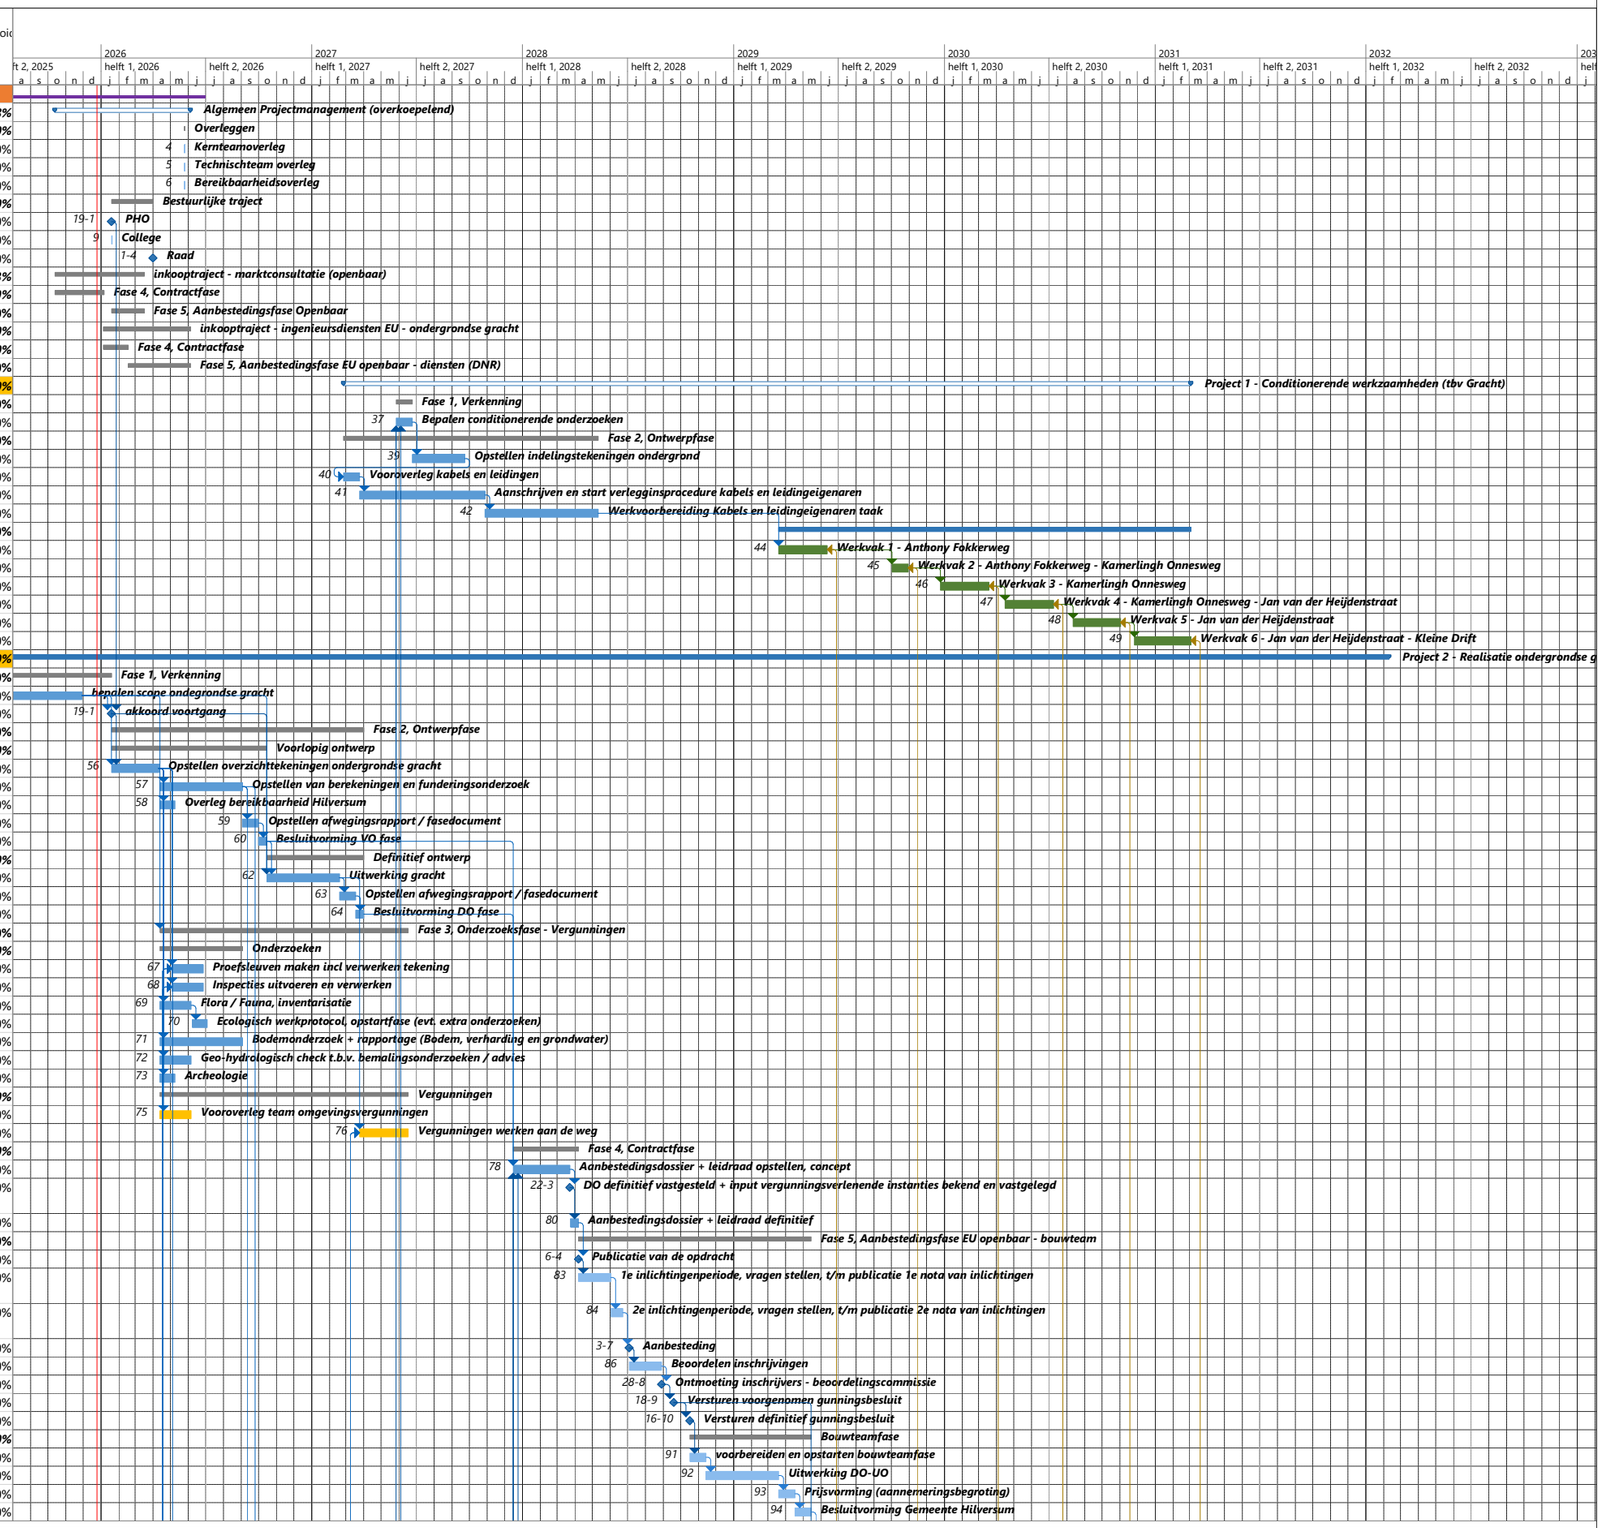

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Planning in bewerking voor intern gebruik - CONCEPT

Hilversum Mediastad

Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid
95	Opdrachtverstrekking uitvoering	0 wkn	maa 14-5-29	maa 14-5-29	0%
96	**Fase 6, realisatie ondergrondse gracht**	**715 dagen**	**din 15-5-29**	**maa 9-2-32**	**0%**
97	opstarten aannemer	4 wkn	din 15-5-29	maa 11-6-29	0%
98	leverantie betonnen elementen (start eerste elementen)	12 wkn	din 15-5-29	maa 10-9-29	0%
99	***Werkvak 1 - Anthony Fokkerweg***	***115 dagen***	***din 12-6-29***	***maa 7-1-30***	***0%***
100	Aanleg ondergrondse gracht	20 wkn	din 12-6-29	maa 29-10-29	0%
101	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	din 30-10-29	maa 7-1-30	0%
102	***Werkvak 2 - Anthony Fokkerweg - Kamerlingh Onnesweg***	***150 dagen***	***din 30-10-29***	***maa 10-6-30***	***0%***
103	Aanleg ondergrondse gracht	20 wkn	din 30-10-29	maa 18-3-30	0%
104	definitieve inrichting buitenruimte	12 wkn	din 19-3-30	maa 10-6-30	0%
105	***Werkvak 3 - Kamerlingh Onnesweg (Kruising)***	***119 dagen***	***din 19-3-30***	***vri 4-10-30***	***0%***
106	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	din 19-3-30	maa 8-7-30	0%
107	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	maa 12-8-30	vri 4-10-30	0%
108	***Werkvak 4 - Kamerlingh Onnesweg - Jan van der Heijdenstraat***	***96 dagen***	***din 9-7-30***	***maa 6-1-31***	***0%***
109	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	din 9-7-30	maa 28-10-30	0%
110	definitieve inrichting buitenruimte	8 wkn	din 29-10-30	maa 6-1-31	0%
111	***Werkvak 5 - Jan van der Heijdenstraat (kruising)***	***140 dagen***	***din 29-10-30***	***maa 26-5-31***	***0%***
112	Aanleg ondergrondse gracht	16 wkn	din 29-10-30	maa 3-3-31	0%
113	definitieve inrichting buitenruimte	12 wkn	din 4-3-31	maa 26-5-31	0%
114	***Werkvak 6 - Jan van der Heijdenstraat - Kleine Drift***	***210 dagen***	***din 4-3-31***	***maa 9-2-32***	***0%***
115	Aanleg ondergrondse gracht	26 wkn	din 4-3-31	maa 6-10-31	0%
116	definitieve inrichting buitenruimte (excl Prof Kochstraat anders 8 wk extra)	16 wkn	din 7-10-31	maa 9-2-32	0%
117	eindinspectie	2 wkn	din 7-10-31	maa 20-10-31	0%
118	Oplevering	0 wkn	maa 3-11-31	maa 3-11-31	0%
119	Overdracht werkzaamheden	4 wkn	din 4-11-31	maa 1-12-31	0%
120	***Project 3 - Renovatie Zuidelijke rioolbuis***	***598 dagen***	***maa 30-6-25***	***maa 6-3-28***	***0%***
121	**Fase 1, Verkenning**	**80 dagen**	**maa 30-6-25**	**vri 21-11-25**	**0%**
122	bepalen renovatie zuidelijke buis - Jordi & Jaap	16 wkn	maa 30-6-25	vri 21-11-25	0%
123	**Fase 2, Ontwerpfase**	**110 dagen**	**maa 24-11-25**	**vri 8-5-26**	**0%**
124	Opstellen overzichttekeningen relining tracé	8 wkn	maa 24-11-25	vri 30-1-26	0%
125	Voorstel verwijderen en amoveren putten	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26	0%
126	Overleg bereikbaarheid Hilversum	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26	0%
127	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	6 wkn	maa 2-3-26	vri 10-4-26	0%
128	Besluitvorming, vervolgtraject contract -/ uitvoeringsfase	4 wkn	maa 13-4-26	vri 8-5-26	0%
129	**Fase 3, Onderzoeksfase - Vergunningen**	**100 dagen**	**maa 5-1-26**	**vri 22-5-26**	**0%**
130	***Onderzoeken***	***100 dagen***	***maa 5-1-26***	***vri 22-5-26***	***0%***
131	Proefsleuven maken incl verwerken tekening	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26	0%
132	Inspecties uitvoeren en verwerken	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26	0%
133	Vewijderen van doorstekende leidingen	8 wkn	maa 5-1-26	vri 27-2-26	0%
134	Flora / Fauna, inventarisatie	8 wkn	maa 2-2-26	vri 27-3-26	0%
135	Ecologisch werkprotocol, opstartfase (evt. extra onderzoeken)	0 dagen	vri 27-3-26	vri 27-3-26	0%
136	Bodemonderzoek + rapportage	16 wkn	maa 2-2-26	vri 22-5-26	0%
137	Geo-hydrologisch check t.b.v. bemalingsonderzoeken / advies	8 wkn	maa 2-2-26	vri 27-3-26	0%
138	Archeologie	4 wkn	maa 2-2-26	vri 27-2-26	0%
139	BLVC Kaderplan opstellen	4 wkn	maa 2-3-26	vri 27-3-26	0%
140	***Vergunningen***	***40 dagen***	***maa 30-3-26***	***vri 22-5-26***	***0%***
141	Vergunningen werken aan de weg	8 wkn	maa 30-3-26	vri 22-5-26	0%
142	***Fase 4, Contractfase***	***31 dagen***	***maa 11-5-26***	***maa 22-6-26***	***0%***
143	Aanbestedingsdossier + leidraad opstellen, concept	4 wkn	maa 11-5-26	vri 5-6-26	0%
144	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	vri 5-6-26	vri 5-6-26	0%
145	Aanbestedingsdossier + leidraad definitief	2 wkn	din 9-6-26	maa 22-6-26	0%
146	**Fase 5, Aanbestedingsfase EU openbaar - bouwteam**	**245 dagen**	**maa 22-6-26**	**maa 31-5-27**	**0%**
147	Publicatie van de opdracht	0 wkn	maa 22-6-26	maa 22-6-26	0%
148	1e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 1e nota van inlichtingen	8 wkn	din 23-6-26	don 17-9-26	0%
149	2e inlichtingenperiode, vragen stellen, t/m publicatie 2e nota van inlichtingen	3 wkn	vri 18-9-26	don 8-10-26	0%
150	Aanbesteding	0 wkn	maa 19-10-26	maa 19-10-26	0%
151	Beoordelen inschrijvingen	3 wkn	din 20-10-26	maa 9-11-26	0%
152	Ontmoeting inschrijvers - beoordelingscommissie	0 wkn	maa 9-11-26	maa 9-11-26	0%
153	Versturen voorgenomen gunningsbesluit	0 wkn	maa 30-11-26	maa 30-11-26	0%
154	Versturen definitief gunningsbesluit	0 wkn	maa 11-1-27	maa 11-1-27	0%
155	***Bouwteamfase***	***100 dagen***	***din 12-1-27***	***maa 31-5-27***	***0%***
156	voorbereiden en opstarten bouwteamfase	4 wkn	din 12-1-27	maa 8-2-27	0%
157	Uitwerking DO-UO	8 wkn	din 9-2-27	maa 5-4-27	0%
158	Prijsvorming (aannemeringsbegroting)	4 wkn	din 6-4-27	maa 3-5-27	0%
159	Besluitvorming Gemeente Hilversum	4 wkn	din 4-5-27	maa 31-5-27	0%
160	Opdrachtverstrekking uitvoering	0 wkn	maa 31-5-27	maa 31-5-27	0%
161	**Fase 6, realisatie**	**200 dagen**	**din 1-6-27**	**maa 6-3-28**	**0%**
162	opstarten aannemer	4 wkn	din 28-9-27	maa 25-10-27	0%
163	leverantie liner	12 wkn	din 1-6-27	maa 27-9-27	0%
164	opstellen werkput 1 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 26-10-27	maa 15-11-27	0%
165	opstellen werkput 2 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 16-11-27	maa 6-12-27	0%
166	opstellen werkput 3 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 7-12-27	maa 27-12-27	0%
167	opstellen werkput 4 - werkputten 2x en relining	3 wkn	din 28-12-27	maa 17-1-28	0%
168	eindinspectie	1 wk	din 18-1-28	maa 24-1-28	0%
169	Oplevering	0 wkn	maa 7-2-28	maa 7-2-28	0%
170	Overdracht werkenzaamheden	4 wkn	din 8-2-28	maa 6-3-28	0%

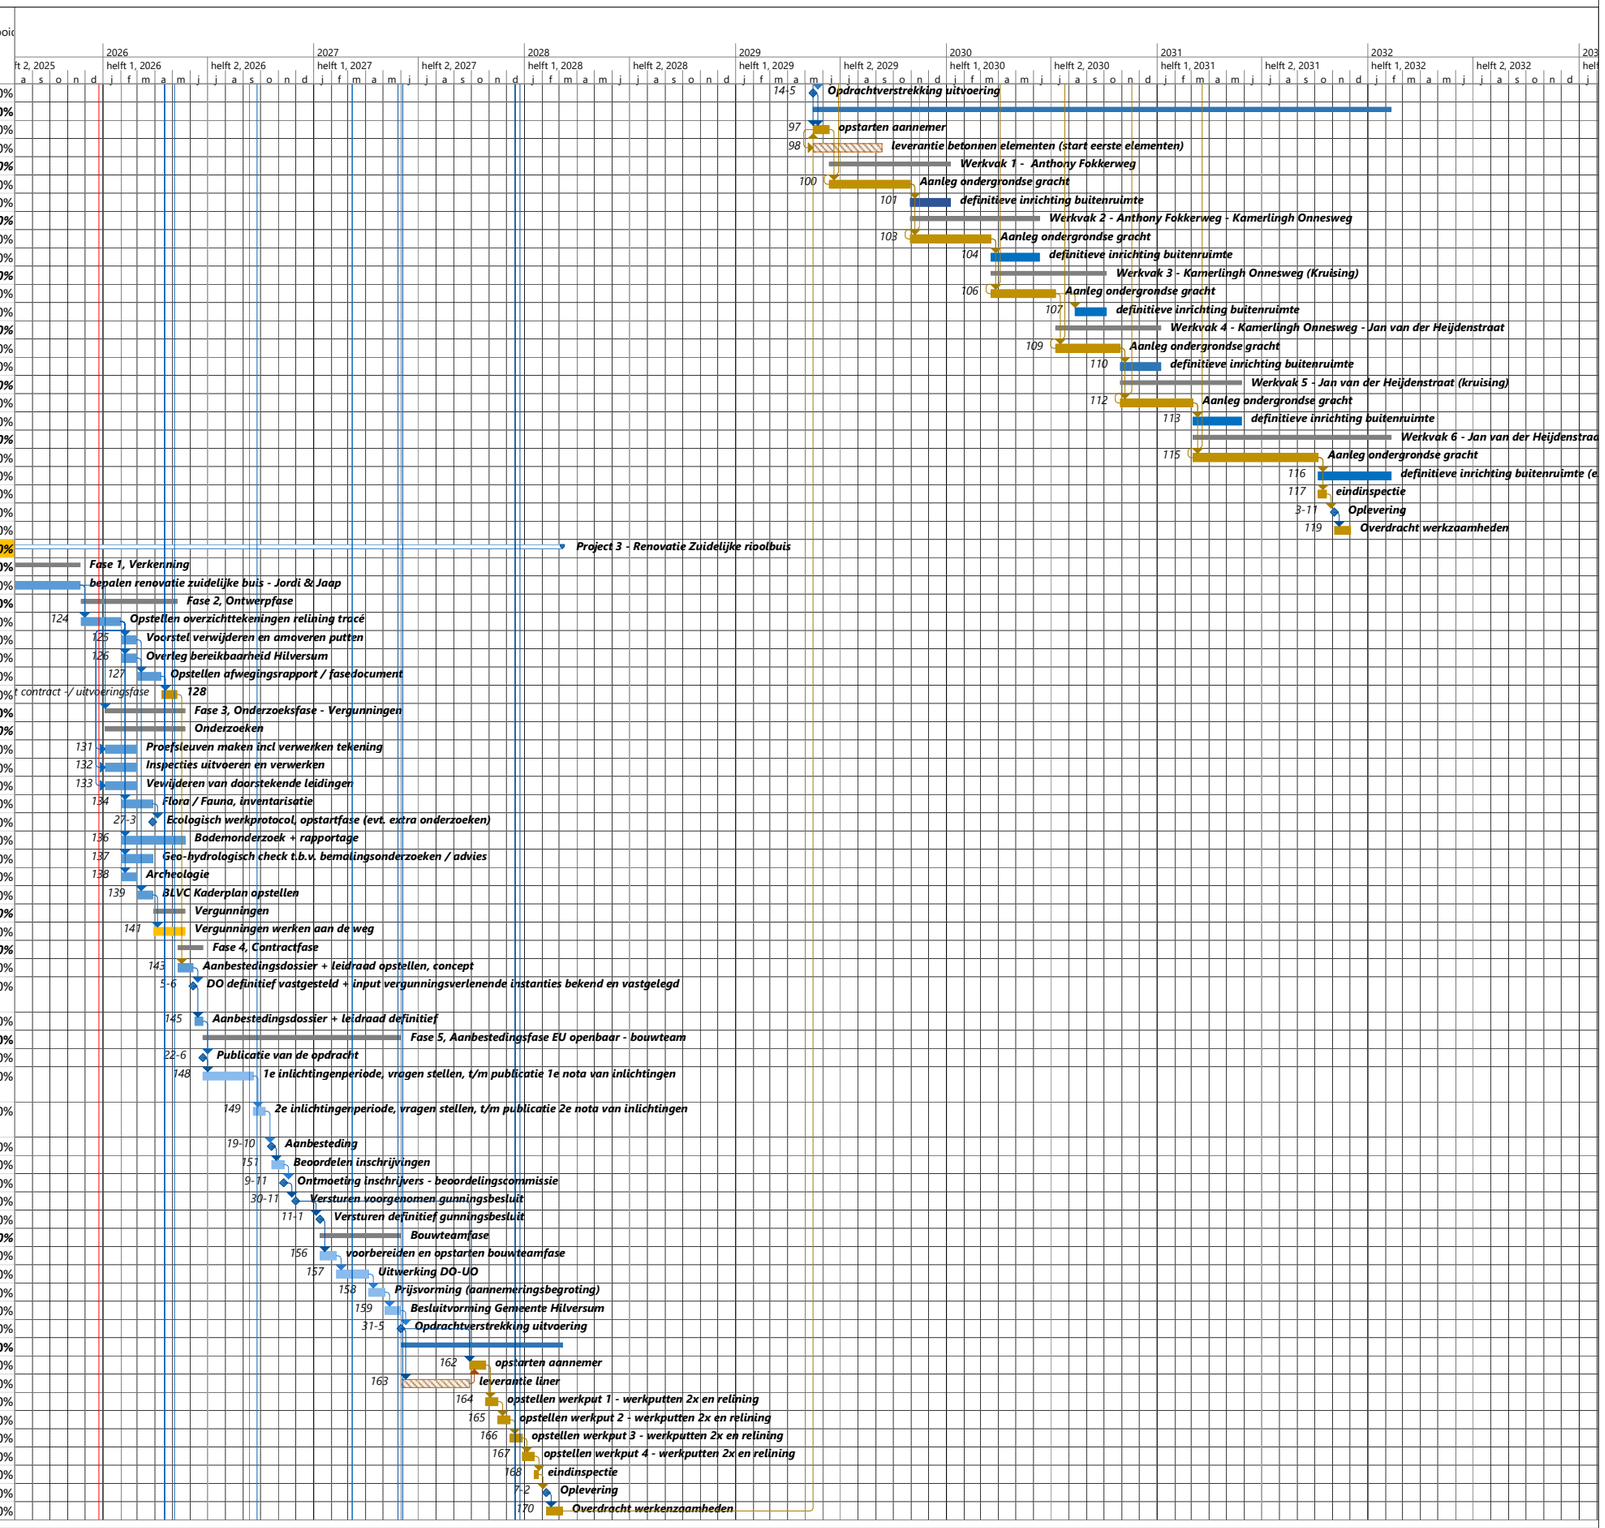

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Planning in bewerking voor intern gebruik - CONCEPT

Hilversum Mediastad

Realisatie ondergrondse gracht Minckelersstraat
Projectplanning

Versie 2, d.d. 13-01-2026

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	% voltooid
171	***Project 4 - Energie transistie (voorbereiding LT net)***	***351 dagen***	***don 3-9-26***	***don 9-3-28***	***0%***
172	**Fase 2, Ontwerpfase**	**300 dagen**	**don 3-9-26**	**woe 15-12-27**	**0%**
173	***Voorlopig ontwerp***	***180 dagen***	***don 3-9-26***	***woe 26-5-27***	***0%***
174	Opstellen overzichttekeningen energienet (derden) - KAN PAS STARTEN NA VASTKLIKKEN VO FASE GRACHT	12 wkn	don 3-9-26	woe 25-11-26	0%
175	Opstellen van berekeningen	16 wkn	don 26-11-26	woe 31-3-27	0%
176	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	don 1-4-27	woe 26-5-27	0%
177	Besluitvorming VO fase	0 wkn	woe 26-5-27	woe 26-5-27	0%
178	***Definitief ontwerp***	***120 dagen***	***don 27-5-27***	***woe 15-12-27***	***0%***
179	Uitwerking LT net met Gracht	16 wkn	don 27-5-27	woe 20-10-27	0%
180	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	don 21-10-27	woe 15-12-27	0%
181	Besluitvorming DO fase	0 wkn	woe 15-12-27	woe 15-12-27	0%
182	***Fase 4, Contractfase***	***51 dagen***	***don 16-12-27***	***don 9-3-28***	***0%***
183	Aanbestedingsdossier + schrijven bestekposten	8 wkn	don 16-12-27	woe 23-2-28	0%
184	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	woe 23-2-28	woe 23-2-28	0%
185	Aanbestedingsdossier gereed	2 wkn	vri 25-2-28	don 9-3-28	0%
186	***Project 5 - Mobiliteit + Groen (voorbereiding Mobiliteit)***	***492 dagen***	***maa 1-12-25***	***vri 4-2-28***	***0%***
187	**Fase 2, Ontwerpfase**	**441 dagen**	**maa 1-12-25**	**don 11-11-27**	**0%**
188	Welke uitgangspunten voor bovengronds ontwerp 50/30 etc	101 dagen	maa 1-12-25	maa 4-5-26	0%
189	***Schetsontwerp***	***80 dagen***	***din 5-5-26***	***don 24-9-26***	***0%***
190	Opstellen schetsontwerp buitenruimte	8 wkn	din 5-5-26	maa 29-6-26	0%
191	Participatie omgeving	8 wkn	din 30-6-26	don 24-9-26	0%
192	***Voorlopig ontwerp***	***100 dagen***	***vri 25-9-26***	***don 25-2-27***	***0%***
193	Opstellen overzichttekeningen	12 wkn	vri 25-9-26	don 17-12-26	0%
194	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	vri 18-12-26	don 25-2-27	0%
195	Besluitvorming VO fase	0 wkn	don 25-2-27	don 25-2-27	0%
196	***Definitief ontwerp***	***160 dagen***	***vri 26-2-27***	***don 11-11-27***	***0%***
197	Uitwerking buitenruimte en nadere detaillering	24 wkn	vri 26-2-27	don 16-9-27	0%
198	Opstellen afwegingsrapport / fasedocument	8 wkn	vri 17-9-27	don 11-11-27	0%
199	Besluitvorming DO fase	0 wkn	don 11-11-27	don 11-11-27	0%
200	***Fase 4, Contractfase***	***51 dagen?***	***vri 12-11-27***	***vri 4-2-28***	***0%***
201	Aanbestedingsdossier + schrijven bestekposten	8 wkn	vri 12-11-27	don 20-1-28	0%
202	DO definitief vastgesteld + input vergunningsverlenende instanties bekend en vastgelegd	0 wkn	don 20-1-28	don 20-1-28	0%
203	Aanbestedingsdossier gereed	2 wkn	maa 24-1-28	vri 4-2-28	0%
204		1 dag?	vri 12-11-27	vri 12-11-27	0%

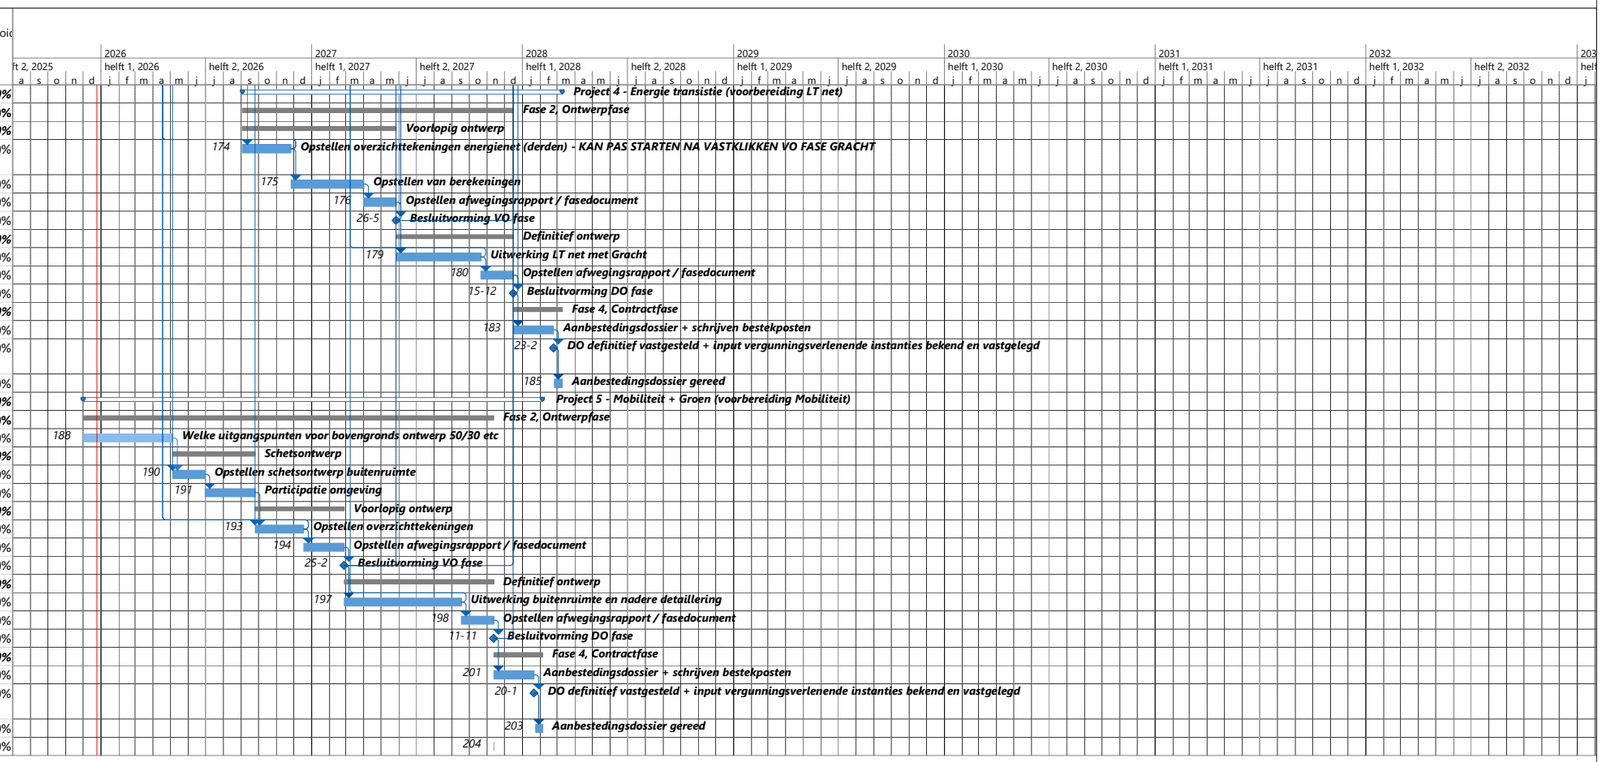

Projectmanager: A. Ceylan
Planner: J. Peters en D. Hagen
Bestand: 20251224_Planning Minckelersstraat

Planning in bewerking voor intern gebruik - CONCEPT
