ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Successors
1		**1 deelproject 1 (leefafdelingen)**	**760 days**	**Sun 1-6-25**	**Fri 28-4-28**		
2		1.1 Cellenblokken G/H	196 days	Sun 1-6-25	Fri 27-2-26		3
3		1.2 Cellenblokken C/D	185 days	Mon 2-3-26	Fri 13-11-26	2	4;10
4		1.3 Cellenblokken A/B/J	183 days	Mon 16-11-26	Wed 28-7-27	3	5;47FF
5		1.4 Cellenblokken E/F/I	197 days	Thu 29-7-27	Fri 28-4-28	4	14SS;49FF;48SS
6		**2 deelproject 2 (buitenruimte)**	**905 days?**	**Fri 15-5-26**	**Thu 1-11-29**		**34**
7		2.1 aanbesteding	5,5 mons	Fri 15-5-26	Thu 15-10-26		8
8		2.2 voorbereiding	10 wks	Fri 16-10-26	Thu 24-12-26	7	10;25;26
9		**2.3 Gevels**	**704 days**	**Fri 25-12-26**	**Wed 5-9-29**		
10		2.3.1 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 3	50 days	Fri 25-12-26	Thu 4-3-27	8;3	11
11		2.3.2 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 4	50 days	Fri 5-3-27	Thu 13-5-27	10	12
12		2.3.3 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 5	50 days	Fri 14-5-27	Thu 22-7-27	11	13
13		2.3.4 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 6	50 days	Fri 23-7-27	Thu 30-9-27	12	
14		2.3.5 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 11	50 days	Thu 29-7-27	Wed 6-10-27	5SS	15
15		2.3.6 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 12	50 days	Thu 7-10-27	Wed 15-12-27	14	16
16		2.3.7 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 9	50 days	Thu 16-12-27	Wed 23-2-28	15	17
17		2.3.8 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 10	50 days	Thu 24-2-28	Wed 3-5-28	16	18
18		2.3.9 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 7	50 days	Thu 4-5-28	Wed 12-7-28	17	19
19		2.3.10 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 8	50 days	Thu 13-7-28	Wed 20-9-28	18	20
20		2.3.11 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 1	50 days	Thu 21-9-28	Wed 29-11-28	19	21
21		2.3.12 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 2	50 days	Thu 30-11-28	Wed 7-2-29	20	22
22		2.3.13 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 14	50 days	Thu 8-2-29	Wed 18-4-29	21	23
23		2.3.14 Gevelwerkzaamheden buitenplaats 13	50 days	Thu 19-4-29	Wed 27-6-29	22	24
24		2.3.15 Gevelwerkzaamheden entreegebied	50 days	Thu 28-6-29	Wed 5-9-29	23	27
25		2.4 Dakwerkzaamheden (volgt gevelwerkzaamheden)	1 day?	Fri 25-12-26	Fri 25-12-26	8	27
26		2.5 Ringmuur	120 days	Fri 25-12-26	Thu 10-6-27	8	27
27		2.6 oplevering	0 days	Thu 1-11-29	Thu 1-11-29	25;26;24	34
28		**3 deelproject 3 (beveiliging)**	**916 days?**	**Mon 1-6-26**	**Mon 3-12-29**		
29		3.1 aanbesteding	5,5 mons	Mon 1-6-26	Fri 30-10-26		30
30		3.2 voorbereiding	10 wks	Mon 2-11-26	Fri 8-1-27	29	
31		3.3 Eén-op-één vervangen beveiligingsinstallaties	1 day?	Mon 1-2-27	Mon 1-2-27		34
32		3.4 Uitbreiding CCTV	1 day?	Mon 1-2-27	Mon 1-2-27		34
33		3.5 Vervangen PZI	1 day?	Mon 1-2-27	Mon 1-2-27		34
34		3.6 oplevering	0 days	Mon 3-12-29	Mon 3-12-29	31;32;33;6;35;27	
35		**4 deelproject 4 (binnenruimte)**	**894 days?**	**Wed 1-7-26**	**Mon 3-12-29**		**34**
36		4.1 aanbesteding	5,5 mons	Wed 1-7-26	Tue 1-12-26		37
37		4.2 voorbereiding	10 wks	Wed 2-12-26	Tue 9-2-27	36	71;72;70;39;62;63;6
38		**4.3 gebouwdeel Wg & Wh**	**320 days**	**Wed 10-2-27**	**Tue 2-5-28**		**50**
39		**4.3.1 gebouwdeel Wh+koude gang AB en CD**	**170 days**	**Wed 10-2-27**	**Tue 5-10-27**	**37**	
40		4.3.1.1 begane grond	20 wks	Wed 10-2-27	Tue 29-6-27		41FS-4 wks
41		4.3.1.2 1e verdieping	18 wks	Wed 2-6-27	Tue 5-10-27	40FS-4 wks	42FS-4 wks
42		**4.3.2 gebouwdeel Wg+koude gang GH en EF**	**170 days**	**Wed 8-9-27**	**Tue 2-5-28**	41FS-4 wks	
43		4.3.2.1 begane grond	20 wks	Wed 8-9-27	Tue 25-1-28		44FS-4 wks
44		4.3.2.2 1e verdieping	18 wks	Wed 29-12-27	Tue 2-5-28	43FS-4 wks	
45		**4.4 vervanging glasdaken leefafdelingen**	**318 days**	**Wed 10-2-27**	**Fri 28-4-28**	**37**	
46		4.4.1 afdeling C/D	6 wks	Wed 10-2-27	Tue 23-3-27	37	47FF
47		4.4.2 afdeling A/B	6 wks	Thu 17-6-27	Wed 28-7-27	46FF;4FF	
48		4.4.3 afdeling G/H	6 wks	Thu 29-7-27	Wed 8-9-27	5SS	49FF
49		4.4.4 afdeling E/F	6 wks	Mon 20-3-28	Fri 28-4-28	5FF;48FF	
50		**4.5 gebouwdeel V**	**270 days**	**Wed 3-5-28**	**Tue 15-5-29**	**38**	**73;65**
51		**4.5.1 begane grond**	**150 days**	**Wed 3-5-28**	**Tue 28-11-28**		**55;58**
52		4.5.1.1 entréegebied	10 wks	Wed 3-5-28	Tue 11-7-28		53
53		4.5.1.2 ???	10 wks	Wed 12-7-28	Tue 19-9-28	52	54
54		4.5.1.3 ???	10 wks	Wed 20-9-28	Tue 28-11-28	53	
55		**4.5.2 1e verdieping**	**120 days**	**Wed 29-11-28**	**Tue 15-5-29**	**51**	
56		4.5.2.1 fase1	12 wks	Wed 29-11-28	Tue 20-2-29		57
57		4.5.2.2 fase2	12 wks	Wed 21-2-29	Tue 15-5-29	56	
58		**4.5.3 2e verdieping**	**120 days**	**Wed 29-11-28**	**Tue 15-5-29**	**51**	**73**
59		4.5.3.1 fase1	12 wks	Wed 29-11-28	Tue 20-2-29		60
60		4.5.3.2 fase2	12 wks	Wed 21-2-29	Tue 15-5-29	59	
61		4.5.4 3e verdieping	20 wks	Wed 3-5-28	Tue 19-9-28	37	73
62		4.6 gebouwdeel Kg	12 wks	Wed 10-2-27	Tue 4-5-27	37	73
63		4.7 gebouwdeel Kh	6 wks	Wed 10-2-27	Tue 23-3-27	37	73
64		4.8 Switchover periode warmte installaties	153 days	Mon 2-4-29	Wed 31-10-29		73
65		**4.9 gebouwdeel SP**	**140 days**	**Wed 16-5-29**	**Tue 27-11-29**	**50**	
66		4.9.1 gebouwdeel S	8 wks	Wed 16-5-29	Tue 10-7-29		67
67		4.9.2 gebouwdeel P2	10 wks	Wed 11-7-29	Tue 18-9-29	66	68
68		4.9.3 gebouwdeel P1	10 wks	Wed 19-9-29	Tue 27-11-29	67	73
69		**4.10 gebouwdeel overstijgende werkzaamheden**	**734 days?**	**Wed 10-2-27**	**Mon 3-12-29**		
70		4.10.1 Werktuigbouwkundige installaties	1 day?	Wed 10-2-27	Wed 10-2-27	37	73
71		4.10.2 Eletrotechnische installaties (m.u.v. cellenblok)	1 day?	Wed 10-2-27	Wed 10-2-27	37	73
72		4.10.3 Brand-technische voorz. (volgt gebouwdelen)	1 day?	Wed 10-2-27	Wed 10-2-27	37	73
73		4.10.4 oplevering	1 day	Mon 3-12-29	Mon 3-12-29	62;58;72;71;50;68;7	
74		**5 Overige**					
75		5.1 Perimeter (HERAS)					

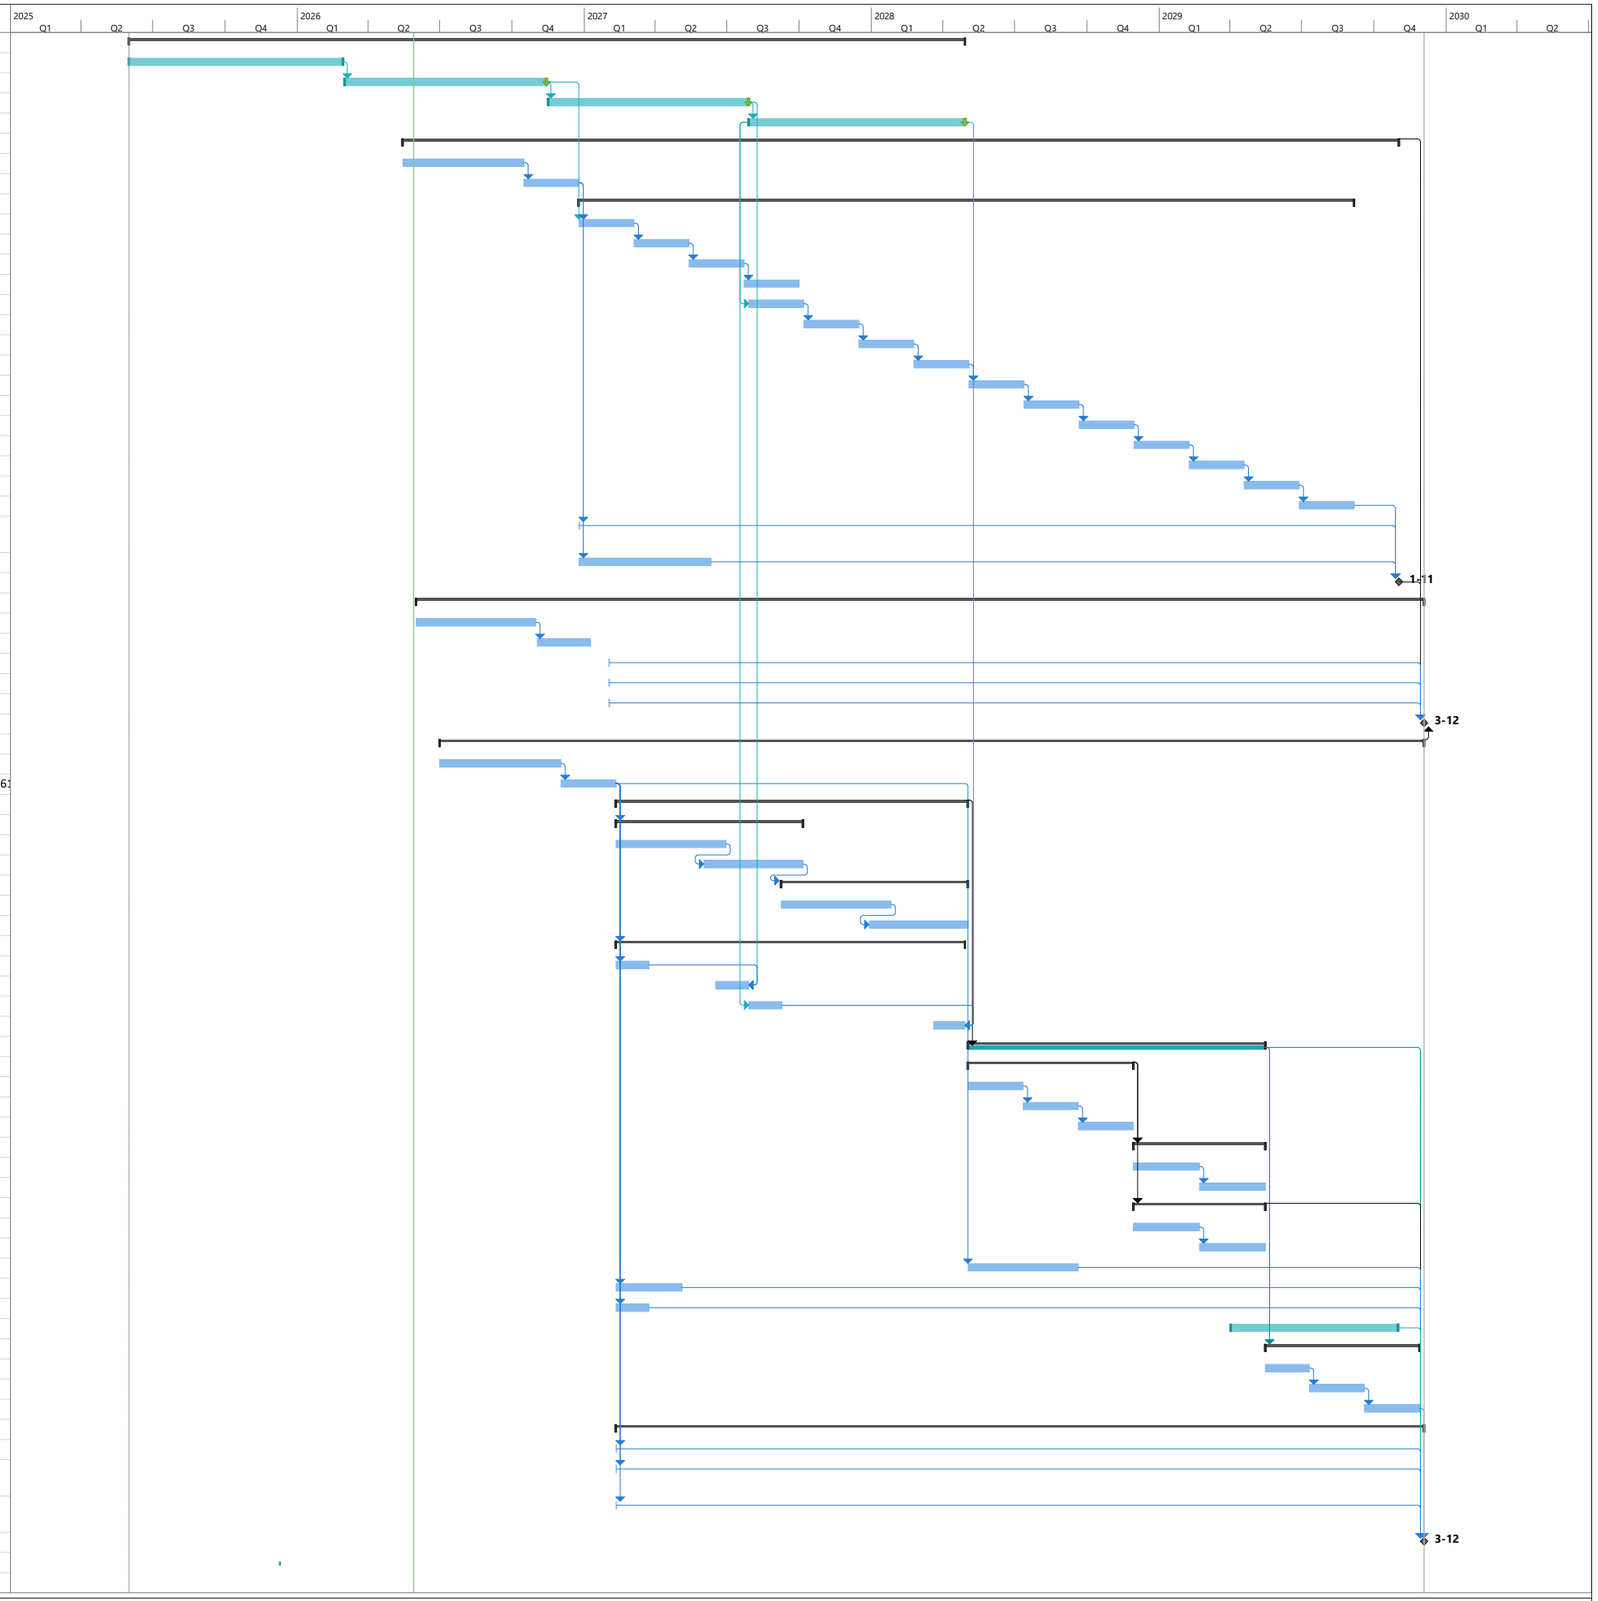

Project: Project planning_conce
Date: Fri 29-5-26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
