Botanische Kas UU

Uitvoeringsplanning

28/5/26

Versie: V1

	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resources Assigned
1	Uitvraag offertes...	**120,00**	**2/3/26**	**4/9/26**	
8	Opdrachtverstrekking	**60,00**	**29/6/26**	**12/10/26**	
9	opdrachtverstrekking sloop	0,00	29/6/26	29/6/26	
10	opdrachtverstrekking kas	0,00	12/10/26	12/10/26	
11	opdrachtverstrekking installaties	0,00	12/10/26	12/10/26	
12	opdrachtverstrekking kas inbouw	0,00	12/10/26	12/10/26	
13	Sloopwerkzaamheden	**55,00**	**29/6/26**	**2/10/26**	
14	termijn 1: opdracht	0,00	29/6/26	29/6/26	UU
15	voorbereiding sloop	20,00	29/6/26	24/7/26	
16	melden sloopvergunning	5,00	6/7/26	10/7/26	
17	asbest verwijderen	10,00	27/7/26	28/8/26	
18	termijn 2: start sloop	0,00	27/7/26	27/7/26	UU
19	sloop kas	10,00	31/8/26	11/9/26	
20	termin 3: kas verwijderd	0,00	11/9/26	11/9/26	UU
21	ondergrondse leidingen en fundatie	5,00	14/9/26	18/9/26	
22	bouwrijp maken	5,00	21/9/26	25/9/26	
23	oplevering sloop	0,00	25/9/26	25/9/26	
24	termijn 4: na oplevering	0,00	25/9/26	25/9/26	UU
25	verwijderen HWTL door UU	5,00	28/9/26	2/10/26	
26	Voorbereiding bouw kas	**60,00**	**12/10/26**	**15/1/27**	
27	termijn 1: opdracht 5%	0,00	12/10/26	12/10/26	UU
28	uitvoeringstekeningen UO	40,00	12/10/26	4/12/26	
29	melding start bouw	10,00	7/12/26	18/12/26	
30	controle tekenwerk UO	30,00	9/11/26	18/12/26	DLVge, UU
31	UO definitief	20,00	7/12/26	15/1/27	
32	Voorbereiding installaties	**81,00**	**12/10/26**	**15/2/27**	
33	termijn 1: opdracht 5%	0,00	12/10/26	12/10/26	UU
34	uitvoeringstekeningen UO	40,00	13/10/26	7/12/26	
35	controle tekenwerk UO	30,00	10/11/26	4/1/27	
36	UO definitief	20,00	8/12/26	18/1/27	
37	Commisioning plan	20,00	8/12/26	18/1/27	
38	Goedkeuring commisioning plan	20,00	19/1/27	15/2/27	DLVge, UU
39	termijn 2: goedgekeurd comssioning plan 5%	0,00	15/2/27	15/2/27	UU
40	Voorbereiding kas inbouw	**60,00**	**12/10/26**	**15/1/27**	
41	termijn 1: opdracht 5%	0,00	12/10/26	12/10/26	
42	uitvoeringstekeningen UO	40,00	12/10/26	4/12/26	
43	controle tekenwerk UO	30,00	9/11/26	18/12/26	
44	UO definitief	20,00	7/12/26	15/1/27	
45	Grondwerkzaamheden	**20,00**	**16/11/26**	**11/12/26**	
46	ophogen perceel en verharding	20,00	16/11/26	11/12/26	
47	termijn 2: start grondwerkzaamheden 5%	0,00	16/11/26	16/11/26	UU
48	Kas glas deel	**180,00**	**12/10/26**	**2/7/27**	
49	levertijd heipalen beton	50,00	12/10/26	18/12/26	
50	termijn 3: bestellen staal 5%	0,00	18/1/27	18/1/27	UU
51	levertijd staalconstuctie	60,00	18/1/27	9/4/27	
52	uitzetten nieuwe kas	5,00	14/12/26	18/12/26	
53	heiwerk 15 dagen 10 rond kerst	5,00	4/1/27	8/1/27	
54	fundatie	20,00	11/1/27	5/2/27	
55	termijn 4: fundatie gereed 5%	0,00	5/2/27	5/2/27	UU
56	voetfolie	5,00	8/2/27	12/2/27	
57	hemelwater afvoer hele kas	5,00	8/2/27	12/2/27	
58	staalconstructie	25,00	8/2/27	12/3/27	
59	termijn 5: aanvang staalconstructie 15%	0,00	8/2/27	8/2/27	UU
60	standbuis HWA	5,00	15/3/27	19/3/27	
61	beglazen	20,00	15/3/27	9/4/27	
62	termijn 7: dek dicht 11%	0,00	16/4/27	16/4/27	UU
63	buitengevel	15,00	29/3/27	16/4/27	
64	luchtmechaniek	15,00	12/4/27	30/4/27	
65	fundatie tussenkopgevels onderzoek	10,00	3/5/27	14/5/27	

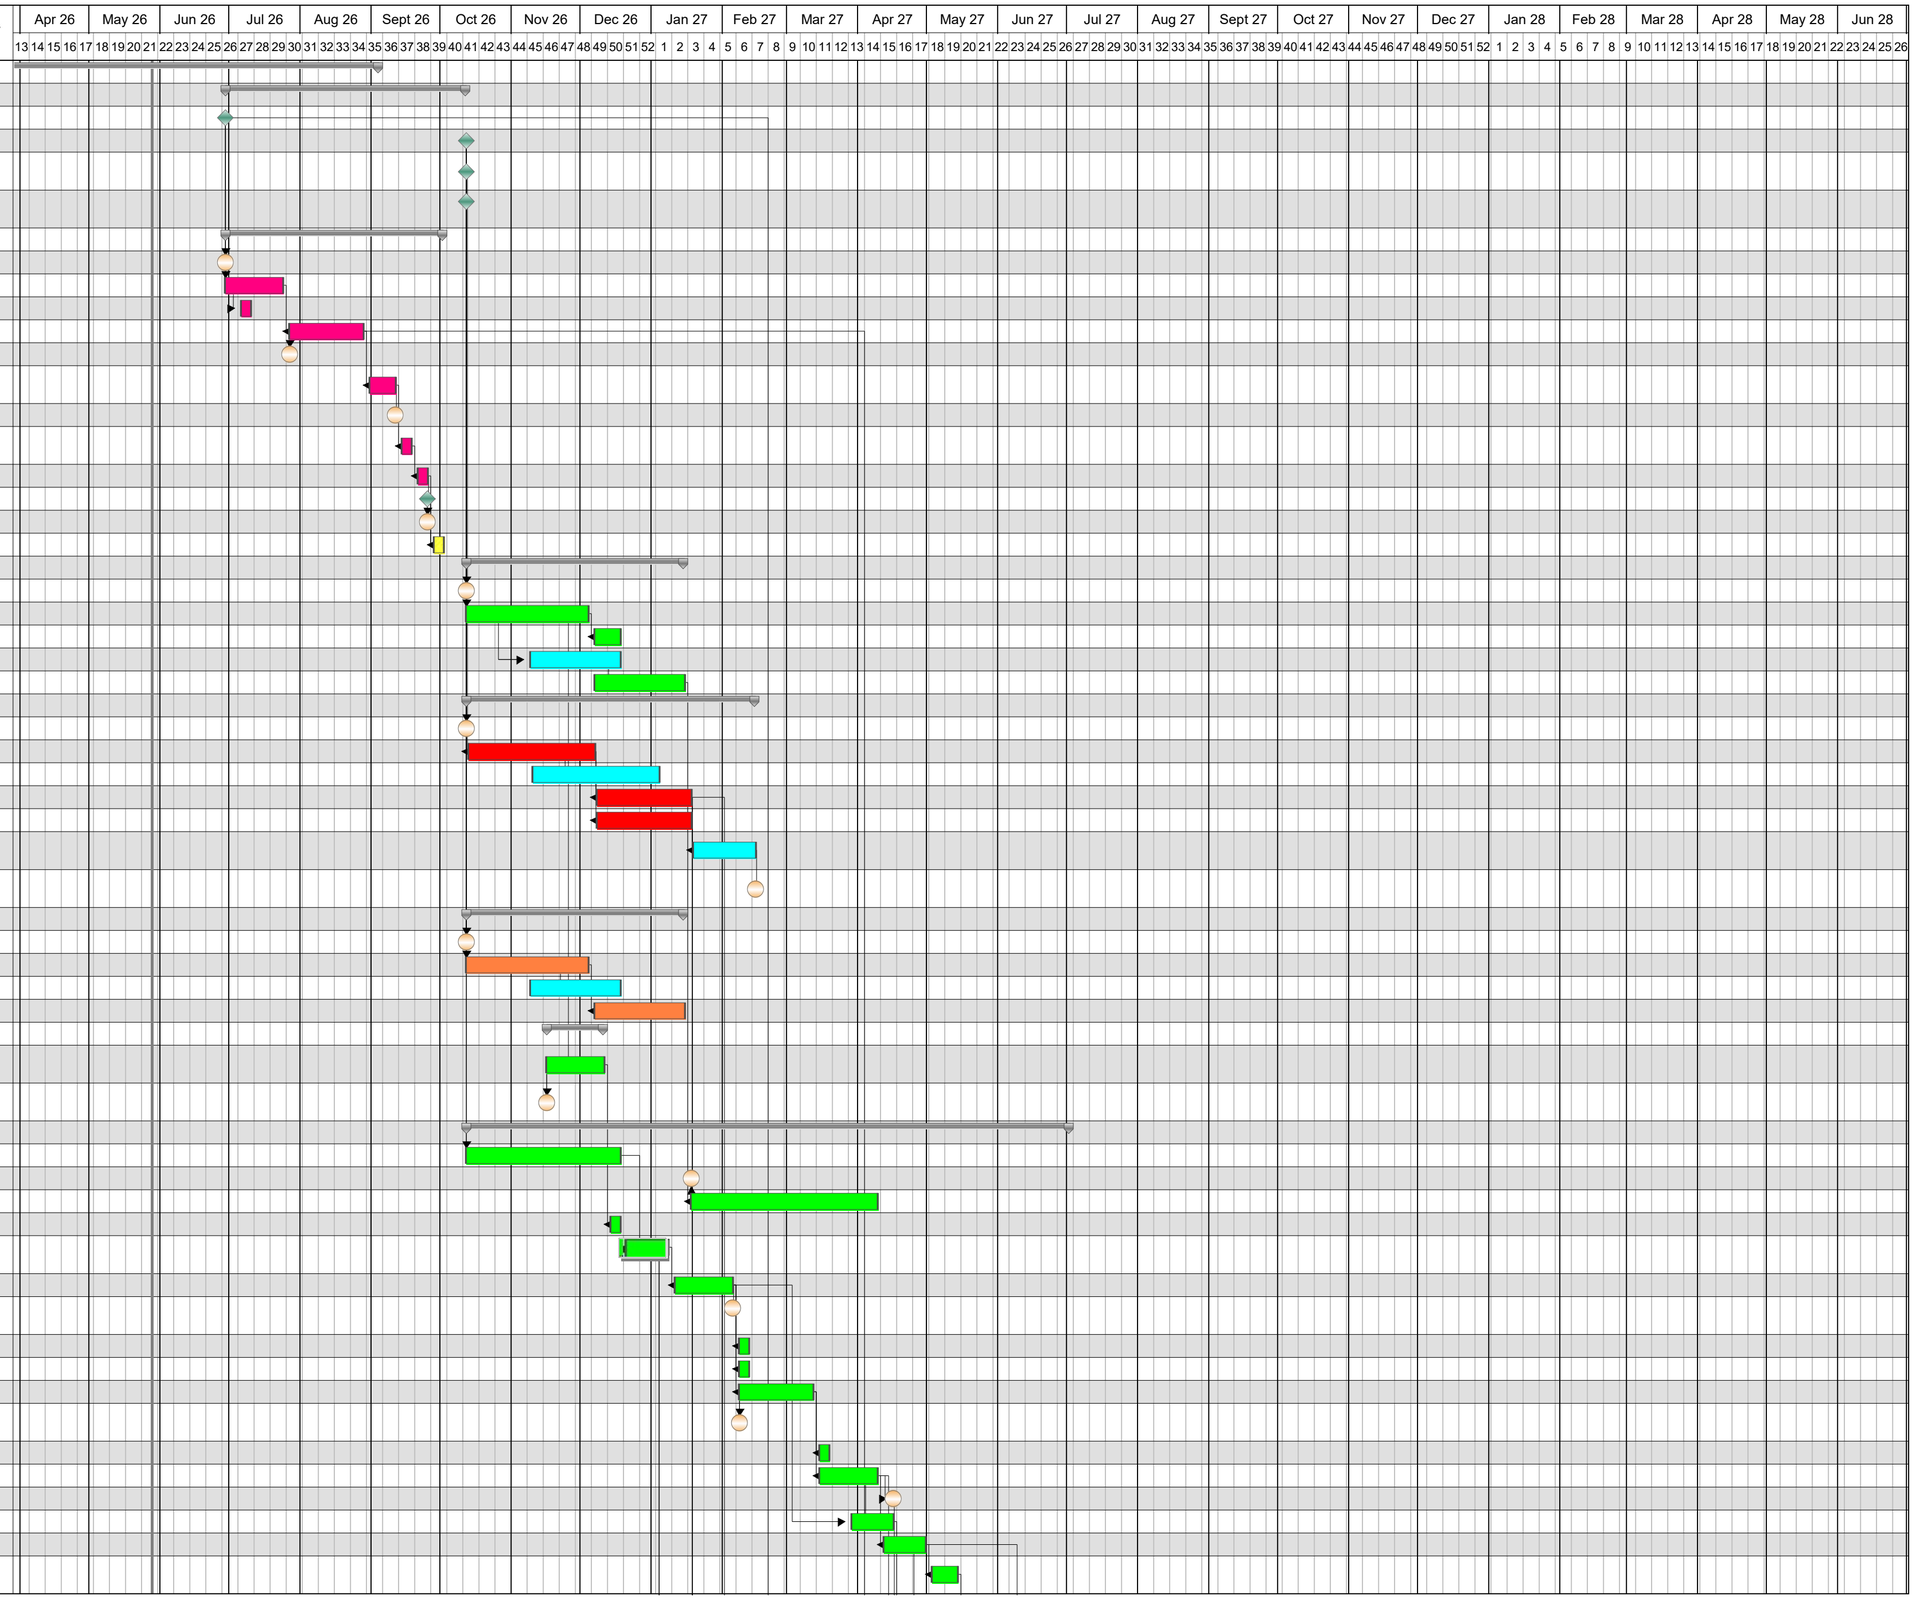

DLVge

Botanische Kas UU

Uitvoeringsplanning

28/5/26

Versie: V1

	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resources Assigned
66	binnengevel	15,00	19/4/27	7/5/27	
67	binnengevels ondezoekskassen	10,00	17/5/27	28/5/27	
68	deuren en afwerking	40,00	10/5/27	2/7/27	
69	termijn 9: na plaatsen deuren 10%	0,00	2/7/27	2/7/27	UU
70	Kas dicht dek	**120,00**	**4/1/27**	**18/6/27**	
71	heiwerk	15,00	4/1/27	22/1/27	
72	riolering, leidingwerk	10,00	25/1/27	5/2/27	
73	betonvloer	20,00	8/2/27	5/3/27	
74	termijn 6: vloer gereed 10%	0,00	5/3/27	5/3/27	UU
75	staalconstructie	15,00	8/3/27	26/3/27	
76	standbuis HWA	5,00	29/3/27	2/4/27	
77	sandwich dek	15,00	29/3/27	16/4/27	
78	termijn 8: sandwich dek dicht 4%	0,00	16/4/27	16/4/27	UU
79	buitengevels	5,00	12/4/27	16/4/27	
80	vliesgevel	5,00	19/4/27	23/4/27	
81	binnengevels	25,00	19/4/27	21/5/27	
82	deuren en afwerking	20,00	24/5/27	18/6/27	
83	Inbouw kas	**437,00**	**25/1/27**	**31/10/28**	
84	termijn 2: aanvangleidingwerk 8%	0,00	25/1/27	25/1/27	UU
85	riool, leidingwerk	10,00	25/1/27	5/2/27	
86	termijn 3: aanvang dekvloer 5%	0,00	19/4/27	19/4/27	UU
87	dekvloeren + VV slangen	15,00	19/4/27	7/5/27	
88	gemetselde binnenwanden	5,00	19/4/27	23/4/27	
89	verdiepingsvloer	10,00	26/4/27	7/5/27	
90	termijn 4: metselwerk en verdiepingsvloer gereed 10%	0,00	7/5/27	7/5/27	UU
91	buitengevel	5,00	10/5/27	14/5/27	
92	termijn 5: buitengevel gereed 8%	0,00	14/5/27	14/5/27	UU
93	trappen	5,00	10/5/27	14/5/27	
94	overige binnenwanden	10,00	10/5/27	21/5/27	
95	termijn 6: trappen en binnenwanden gereed 15%	0,00	21/5/27	21/5/27	UU
96	sanitaire installaties	10,00	7/6/27	18/6/27	
97	stukadoorswerk	5,00	21/6/27	25/6/27	
98	systeem plafond	10,00	21/6/27	2/7/27	
99	termijn 7: systeemplafond en tegelwerk gereed 12%	0,00	2/7/27	2/7/27	UU
100	tegelwerk	15,00	21/6/27	9/7/27	
101	keukenblok	5,00	5/7/27	9/7/27	
102	montage sanitair	10,00	12/7/27	23/7/27	
103	termin 8: sanitaire installaties gereed 10%	0,00	23/7/27	23/7/27	
104	afbouw (kozijnen, deuren)	35,00	12/7/27	17/9/27	
105	termijn 9: afbouw gereed 12%	0,00	17/9/27	17/9/27	UU
106	vloerafwerking	10,00	20/9/27	1/10/27	
107	schilderwerk en behang	10,00	4/10/27	15/10/27	
108	termijn 10: vloer en wandafwerking gereed 10%	0,00	15/10/27	15/10/27	UU
109	oplevering	0,00	15/10/27	15/10/27	
110	termijn 11: oplevering 5%	0,00	15/10/27	15/10/27	UU
111	revisie documenten	20,00	18/10/27	12/11/27	
112	check revisie documenten	20,00	15/11/27	10/12/27	
113	termijn 12: definitive revisie 2%	0,00	10/12/27	10/12/27	UU
114	afhandelen restpunten	20,00	18/10/27	12/11/27	
115	termijn 13: onderhoudstermijn 3%	0,00	31/10/28	31/10/28	UU
116	Scherminstallatie	**70,00**	**10/5/27**	**3/9/27**	
117	horizontaal installaties onderzoek	15,00	10/5/27	28/5/27	
118	termijn 11: aanvang scherm 5%	0,00	10/5/27	10/5/27	UU
119	horizontaal installaties opkweek, collectie, corridors	15,00	7/6/27	25/6/27	
120	intrekken doek	10,00	28/6/27	9/7/27	

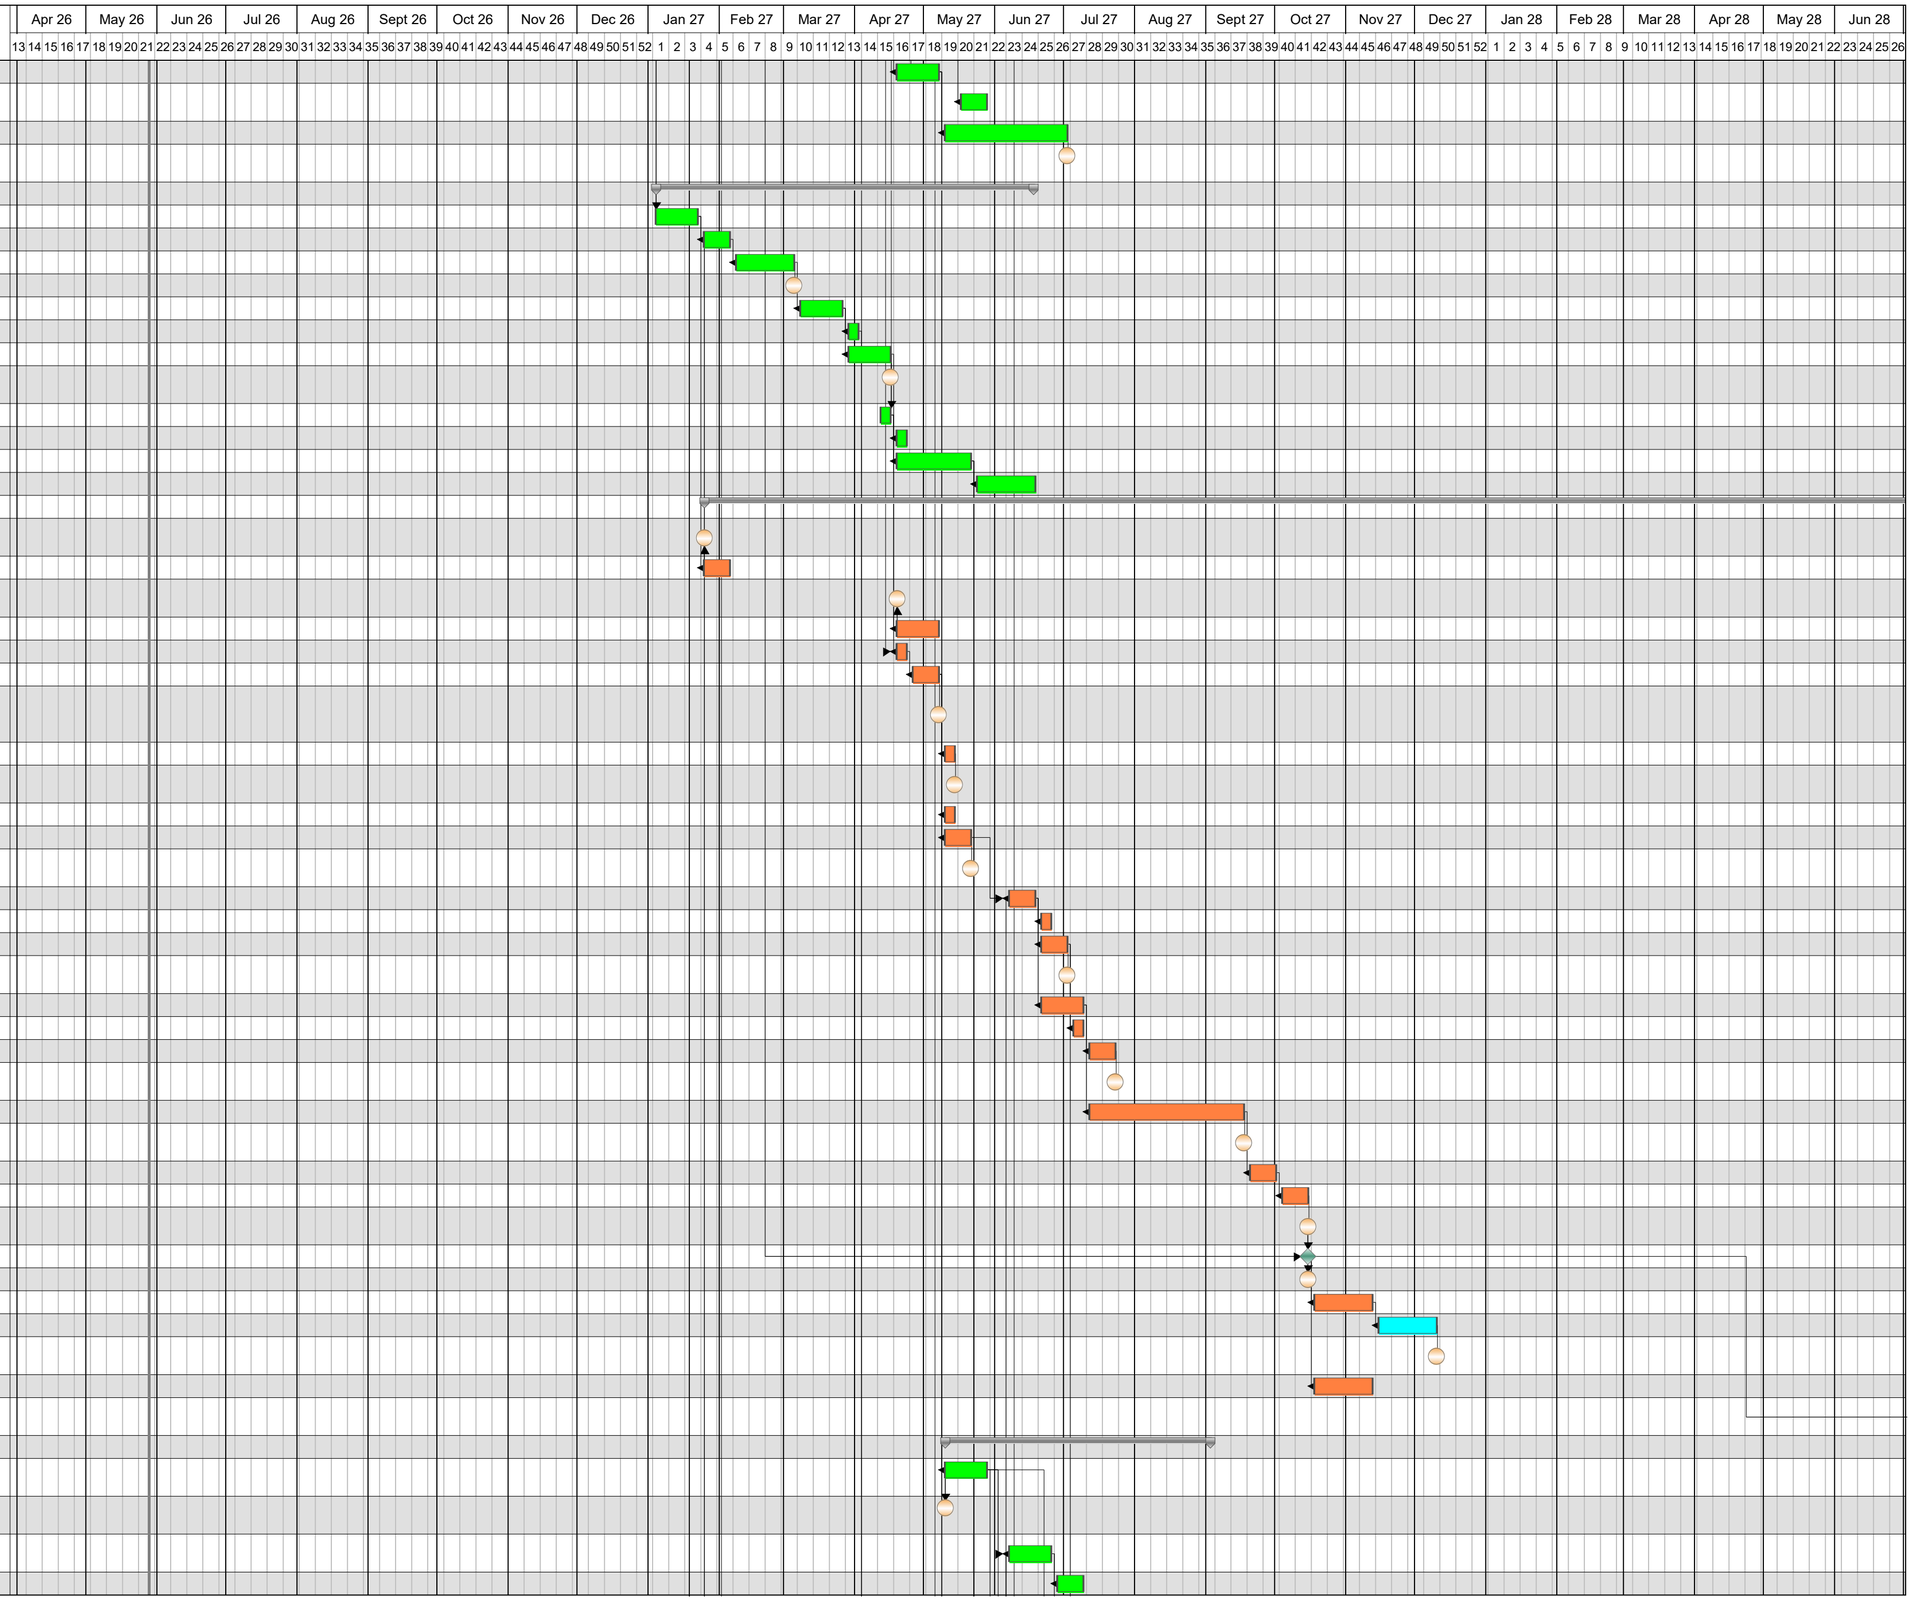

Botanische Kas UU

Uitvoeringsplanning

28/5/26

Versie: V1

	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resources Assigned
121	verticaal scherm	15,00	28/6/27	16/7/27	
122	insectengaas	15,00	19/7/27	27/8/27	
123	buitenscherm	5,00	30/8/27	3/9/27	
124	termijn 12: scherm installatie gereed 5%	0,00	3/9/27	3/9/27	UU
125	Betonwerk kas	**35,00**	**3/5/27**	**18/6/27**	
126	leidingwerk	10,00	3/5/27	14/5/27	
127	betonvloeren opkw, collectie, corridors met uitharden	20,00	10/5/27	4/6/27	
128	betonvloer onderzoek met uitharden	15,00	31/5/27	18/6/27	
129	termijn 10: na storten vloeren 10%	0,00	4/6/27	4/6/27	UU
130	Ventilatie systeem	**129,00**	**19/1/27**	**16/7/27**	
131	levertijd LBK	100,00	19/1/27	7/6/27	
132	termijn 3: bestelling LBK 5%	0,00	19/1/27	19/1/27	
133	plaatsen LBK en filterkasten	20,00	10/5/27	4/6/27	
134	kanaalwerk	40,00	24/5/27	16/7/27	
135	ventielen en kleppen	5,00	5/7/27	9/7/27	
136	druktest leidingwerk	5,00	12/7/27	16/7/27	
137	termijn 4: na druktest 5%	0,00	16/7/27	16/7/27	UU
138	Verwarming koeling	**140,00**	**24/5/27**	**7/1/28**	
139	termijn 5: aanvang CV werk 5%	0,00	24/5/27	24/5/27	UU
140	koelmachine en vaten	10,00	24/5/27	4/6/27	
141	verdeelstukken	10,00	7/6/27	18/6/27	
142	transportleidingen verwarming	15,00	21/6/27	9/7/27	
143	bovenverwarming buizen	60,00	12/7/27	22/10/27	
144	kasverwarming heaters	25,00	12/7/27	3/9/27	
145	termijn 6: transport + heaters gereed 5%	0,00	3/9/27	3/9/27	UU
146	transportleidingen koeling	10,00	6/9/27	17/9/27	
147	aansluiten LBK, fancoils	20,00	6/9/27	1/10/27	
148	termijn 7: transport koeling en aansluitig LBK gereed 5%	0,00	1/10/27	1/10/27	UU
149	wisselaars	5,00	4/10/27	8/10/27	
150	tafel verwarming	25,00	18/10/27	19/11/27	
151	buizen schilderen	10,00	1/11/27	12/11/27	
152	vullen installatie	5,00	22/11/27	26/11/27	
153	isoleren	20,00	29/11/27	7/1/28	
154	termijn 8: na vullen en isolatie 10%	0,00	7/1/28	7/1/28	UU
155	Water installatie	**160,00**	**25/1/27**	**24/9/27**	
156	leidingwerk ondergrond sandwich deel	10,00	25/1/27	5/2/27	
157	regenwater silo	5,00	5/4/27	9/4/27	
158	silo's en installatie wateruimte	10,00	24/5/27	4/6/27	
159	termijn 9: installatie TE0.01 gereed 5%	0,00	4/6/27	4/6/27	UU
160	leidingwerk ondergrond zonder betonvloer	15,00	10/5/27	28/5/27	
161	gietkranen kas	25,00	7/6/27	9/7/27	
162	gietkranen Ecotrons	10,00	12/7/27	23/7/27	
163	boven beregening	10,00	16/8/27	27/8/27	
164	nevelinstallatie	20,00	16/8/27	10/9/27	
165	druppelinstallatie tot tafel	10,00	30/8/27	10/9/27	
166	eb/vloed installatie tot tafel	10,00	30/8/27	10/9/27	
167	termijn 10: water en nevelinstallatie gereed 5%	0,00	10/9/27	10/9/27	UU
168	persluchtinstallatie	10,00	13/9/27	24/9/27	
169	Elektrische installatie	**224,00**	**19/1/27**	**17/12/27**	
170	levertijd hoofdverdeelinrichting	50,00	19/1/27	29/3/27	
171	plaatsen hoofdverdeelinrichting	5,00	24/5/27	28/5/27	
172	grondkabels	5,00	25/1/27	29/1/27	
173	aansluiten onderverdelers	5,00	21/6/27	25/6/27	
174	schakelpanelen assemblage bij installateur	50,00	16/2/27	26/4/27	
175	termijn 11: aanvang assemblage 5%	0,00	16/2/27	16/2/27	UU

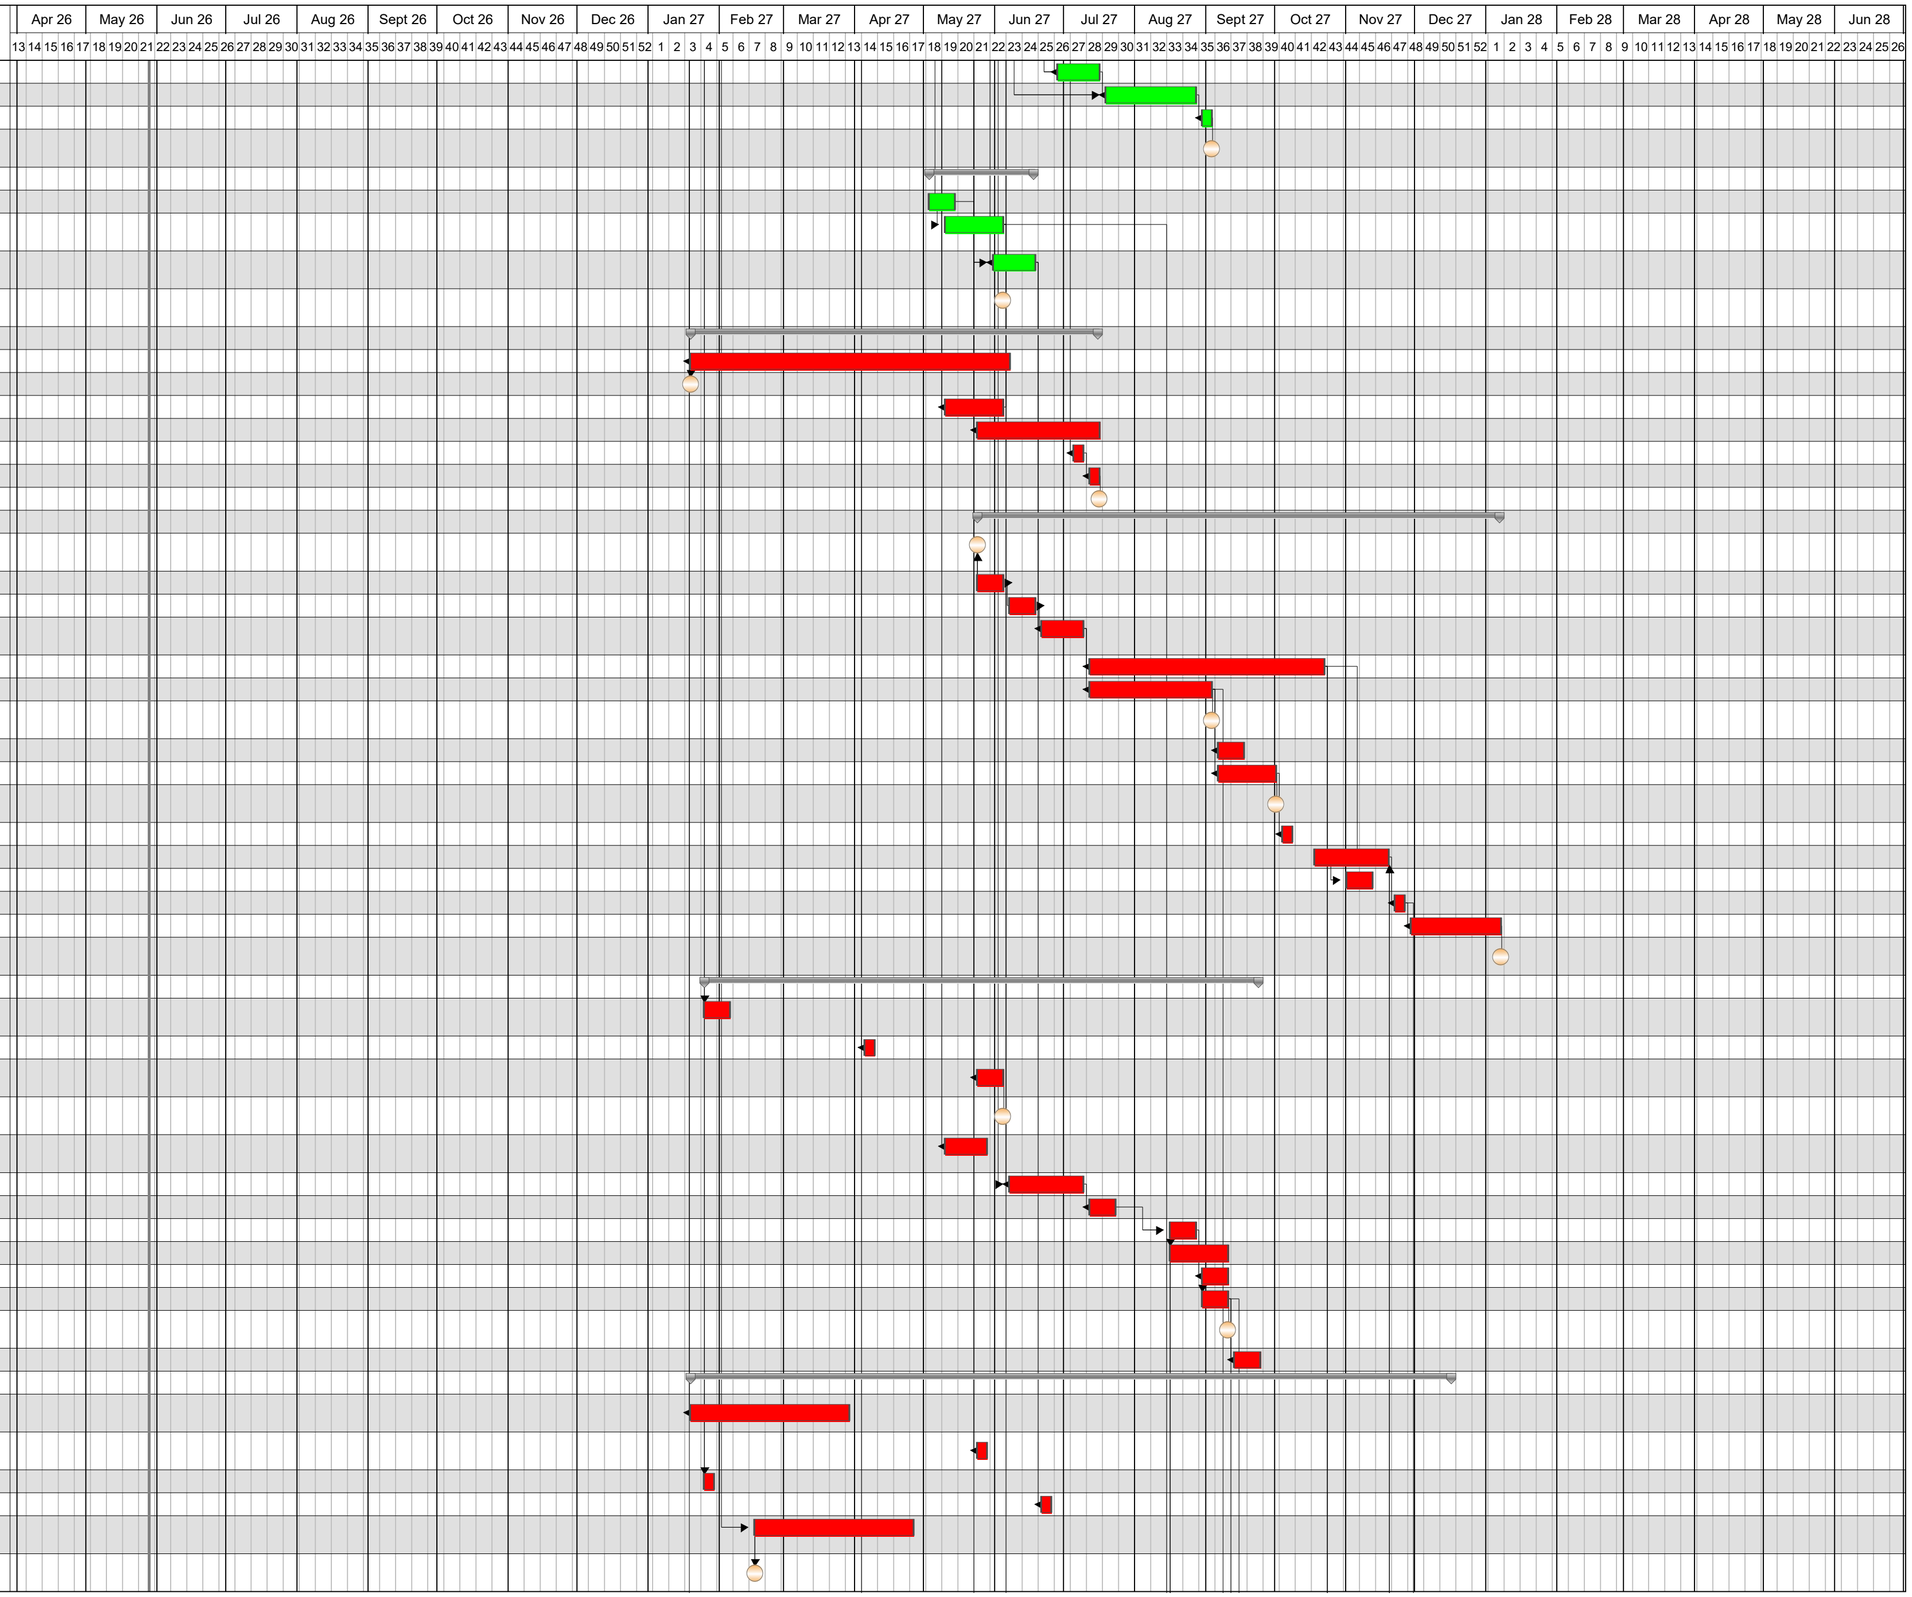

Botanische Kas UU

Uitvoeringsplanning

28/5/26

Versie: V1

	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resources Assigned
176	kabelgoten	20,00	7/6/27	2/7/27	
177	levertijd LED assimilatielampen	65,00	19/1/27	19/4/27	
178	assimilatiebelichting	20,00	5/7/27	20/8/27	
179	schakelpanelen bekabelen	60,00	21/6/27	1/10/27	
180	termijn 12: schakelpanelen op de tuin 10%	0,00	1/10/27	1/10/27	UU
181	scahekeplaneel aansluiting testen	10,00	27/9/27	8/10/27	
182	termijn 13: aansluiting panelen getest 10%	0,00	8/10/27	8/10/27	UU
183	WCD en verlichting	50,00	21/6/27	17/9/27	
184	data	20,00	5/7/27	20/8/27	
185	brandmeldinstallatie	10,00	23/8/27	3/9/27	
186	toegang en inbraaksinstallatie	10,00	23/8/27	3/9/27	
187	klimaat computer en GBS	25,00	27/9/27	29/10/27	
188	test tuinbouwcomputer	15,00	15/11/27	3/12/27	
189	test GBS	10,00	6/12/27	17/12/27	
190	termijn 14: GBS en tuinbouw- computer getest	0,00	17/12/27	17/12/27	UU
191	Sevicewagen	**20,00**	**16/8/27**	**10/9/27**	
192	rail	10,00	16/8/27	27/8/27	
193	termijn 1: aavang werkzaamheden 25%	0,00	16/8/27	16/8/27	UU
194	servicewagen, moederwagen	5,00	30/8/27	3/9/27	
195	testen installatie	5,00	6/9/27	10/9/27	
196	termijn 2: werkzaamheden gereed 75%	0,00	10/9/27	10/9/27	UU
197	Kweektafels	**20,00**	**25/10/27**	**19/11/27**	
198	onderstellen plaatsen	10,00	25/10/27	5/11/27	
199	installatie tafelbakken	10,00	8/11/27	19/11/27	
200	termijn 15: na plaatsen kweektafels 5%	0,00	19/11/27	19/11/27	UU
201	Onderbemaling en lavavloer	**15,00**	**13/9/27**	**1/10/27**	
202	ingraven drainage	5,00	13/9/27	17/9/27	
203	put en persleiding	5,00	20/9/27	24/9/27	
204	ruw egaliseren drainageveld	5,00	27/9/27	1/10/27	
205	uitgraven, folie, drainslang	5,00	20/9/27	24/9/27	
206	lava en bovendoek	5,00	27/9/27	1/10/27	
207	Canopywalk	**10,00**	**4/10/27**	**15/10/27**	
208	ophangcontructie	5,00	4/10/27	8/10/27	
209	termijn 1: start werkzaamheden 25%	0,00	4/10/27	4/10/27	UU
210	trappen en brug	5,00	11/10/27	15/10/27	
211	termijn 2: werkzaamheden gereed 75%	0,00	15/10/27	15/10/27	UU
212	Oplevering kas	**285,00**	**15/10/27**	**4/12/28**	
213	oplevering kas	0,00	15/10/27	15/10/27	
214	termijn 13: oplevering kas 5%	0,00	15/10/27	15/10/27	UU
215	revisie documenten	20,00	18/10/27	12/11/27	
216	check revisie documenten	20,00	15/11/27	10/12/27	
217	termijn 14: definiteive revisie 2%	0,00	10/12/27	10/12/27	UU
218	afhandelen restpunten	20,00	18/10/27	12/11/27	
219	termijn 15: onderhoudstermijn 3%	0,00	4/12/28	4/12/28	UU
220	Oplevering installaties	**245,00**	**17/12/27**	**8/12/28**	
221	overdracht eind rapportage commissioning	0,00	17/12/27	17/12/27	
222	termijn 16: overdracht commissioing deel bouw rapportage 5%	0,00	17/12/27	17/12/27	UU
223	oplevering installaties	0,00	17/12/27	17/12/27	
224	termijn 17: na oplevering 5%	0,00	17/12/27	17/12/27	UU
225	revisie documenten	20,00	3/1/28	28/1/28	
226	check revisie documenten	20,00	31/1/28	25/2/28	
227	termijn 18: definitieve revisie 2%	0,00	25/2/28	25/2/28	UU
228	afhandelen restpunten	20,00	3/1/28	28/1/28	
229	termijn 19: onderhoudstermijn 3%	0,00	8/12/28	8/12/28	UU

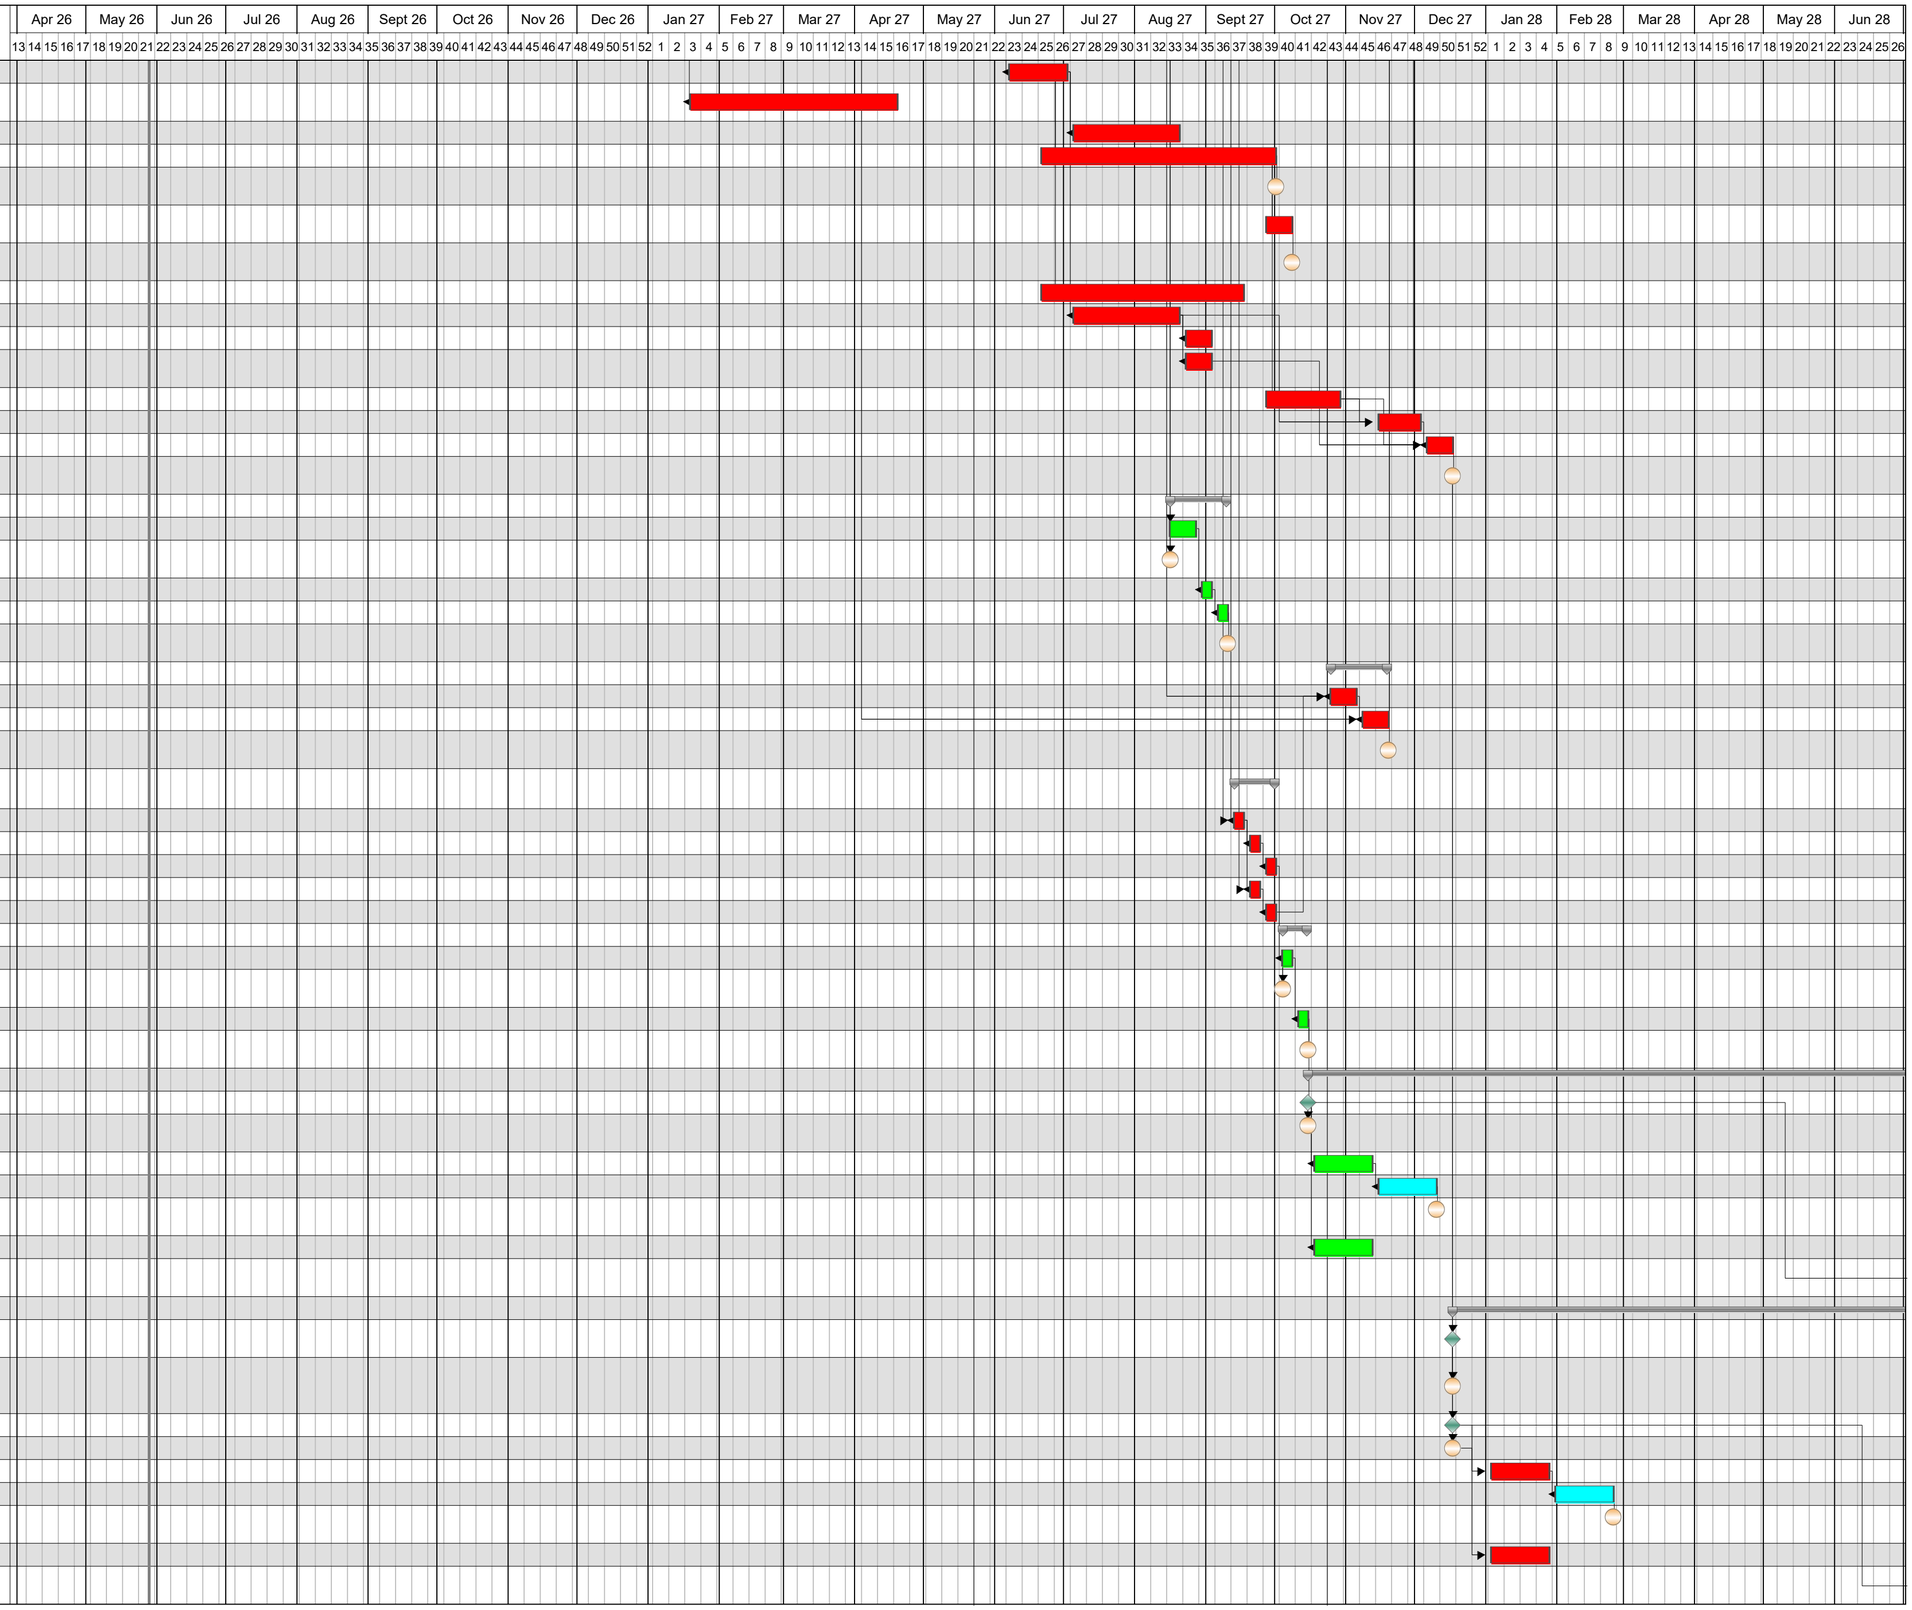

Botanische Kas UU

Uitvoeringsplanning

28/5/26

Versie: V1
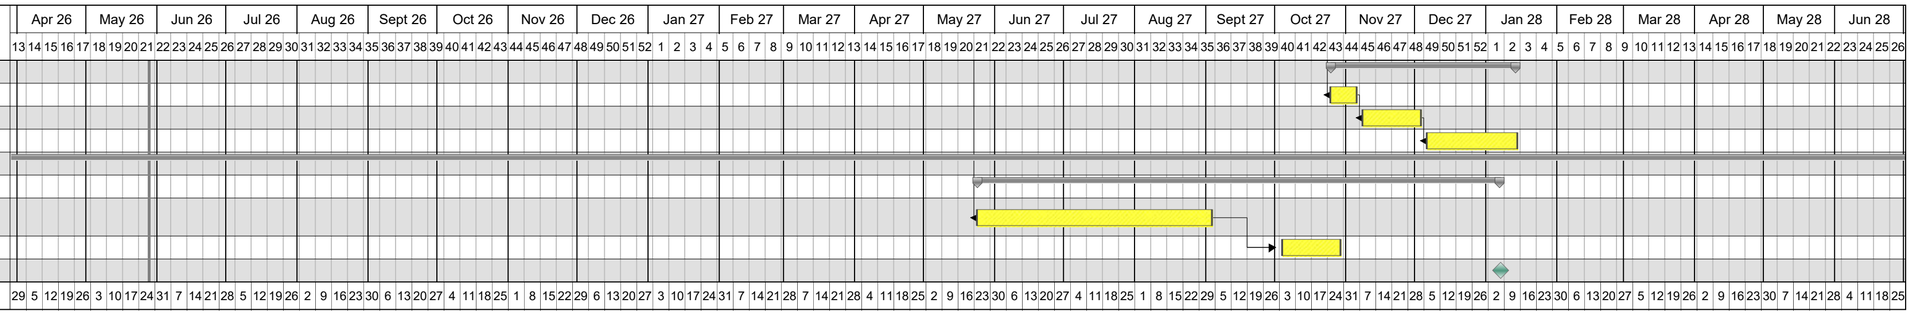
	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date	Resources Assigned
230	Verhuizen Ecotrons	**50,00**	**25/10/27**	**14/1/28**	
231	verhuizing lab 1	10,00	25/10/27	5/11/27	
232	verhuizing lab 2	20,00	8/11/27	3/12/27	
233	verhuizing lab 3	20,00	6/12/27	14/1/28	
234	Commisioning...	**620,00**	**2/3/26**	**22/9/28**	
342	WKO	**139,00**	**24/5/27**	**7/1/28**	
343	werkzaamheden in BEC ruimte	60,00	24/5/27	3/9/27	
344	inkoppelen	20,00	4/10/27	29/10/27	
345	oplevering WKO	0,00	7/1/28	7/1/28
