Unihorn Laboratorium
Ambachtsweg 9A
1671 GB Medemblik
Postbus 58
1633 ZH Avenhorn
Tel. 0229 - 547850
www.unihorn.nl

Analysecertificaat

Opdrachtgever	Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
T.a.v.	F. Broertjes
Straat	Aambeeld 1
Pc en plaats	1671 NT Medemblik

Uw kenmerk	Drie wegen Overijssel, N766
Unihorn project	240430-01
Rapportnummer	240430-01 BC-UL-RAP Versie 1

Medemblik, 8 januari 2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat op uw verzoek is uitgevoerd op het/de door u aangeboden monster(s). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het/de monster(s), zoals deze door u voor analyse ter beschikking werd(en) gesteld.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Unihorn laboratorium, gevestigd te Medemblik. De onderzoeksmethode(n) zijn vastgelegd in het geldende accreditatiecertificaat L523 en de onderzoeken zijn conform de vigerende Standaard RAW Bepalingen uitgevoerd.

Niet onder accreditatie valt:
- PAK-detectoronderzoek, dat is uitgevoerd op (deels) gedesintegreerd asfalt;
- Het opmeten en/of beschrijven van fundering en/of ondergrond;
- Het, voor zover mogelijk, benoemen van de (hoofd-)kleur van het asfalt/de steen.

Indien de totale laagdikte van een cilinder niet door het laboratorium kan worden bepaald, omdat deze (ernstige) schade vertoont wordt de, door u opgegeven, totale laagdikte aangehouden.
Unihorn is niet verantwoordelijk voor door u aangeleverde informatie, te weten: projectomschrijving, herkomst monsters, datum monstername, bedrijf dat de monstername heeft uitgevoerd en/of totale laagdikte. Deze informatie kan mogelijk van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten. In geval van versienummer “2” of hoger vervallen de voorgaande versies.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, naar aanleiding van dit rapport, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Unihorn Laboratorium.

Ik vertrouw er op dat uw opdracht naar tevredenheid en conform afspraak is uitgevoerd.

Hoogachtend,

D.Koopman
Laborant

G. van den Berg
Laborant

TESTEN RvA L 523


Op dit analysecertificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-01
Datum proef: 07-01-2025

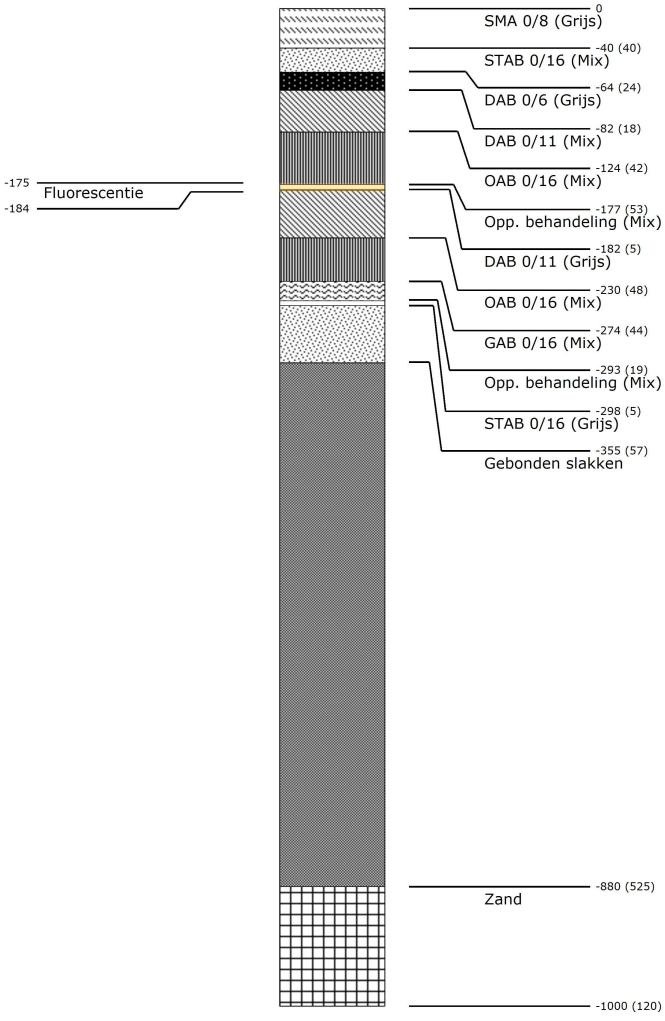

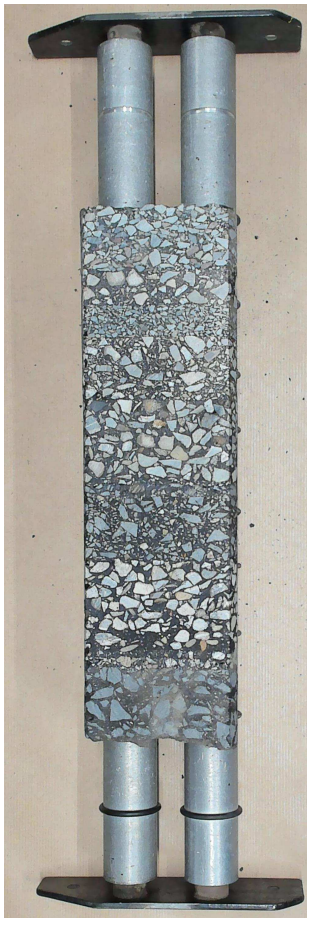

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-02
Datum proef: 07-01-2025

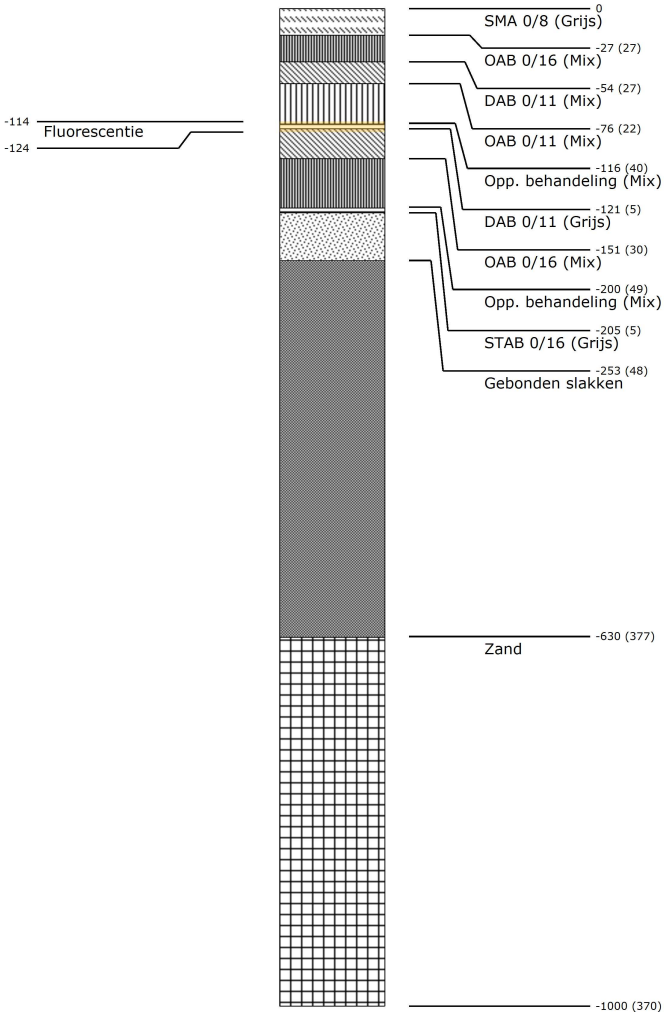

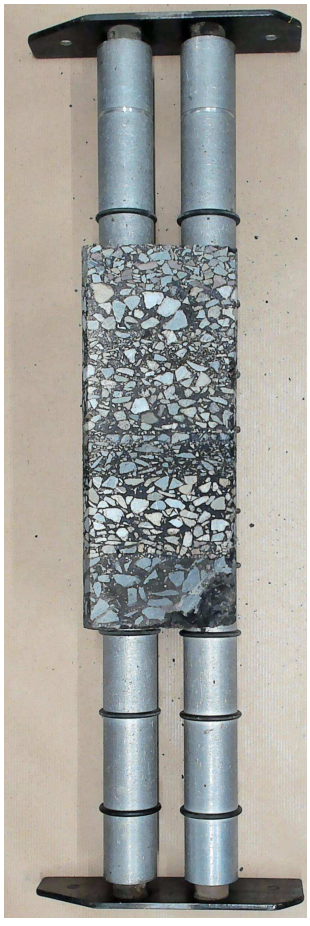

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-03
Datum proef: 07-01-2025

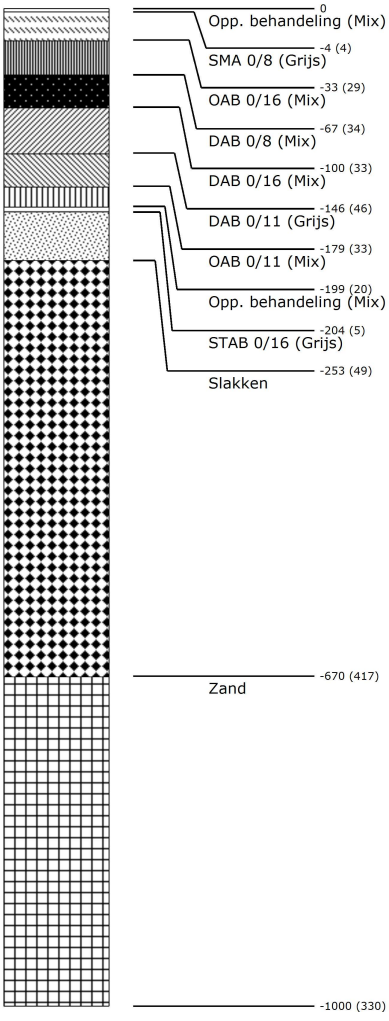



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-04
Datum proef: 07-01-2025

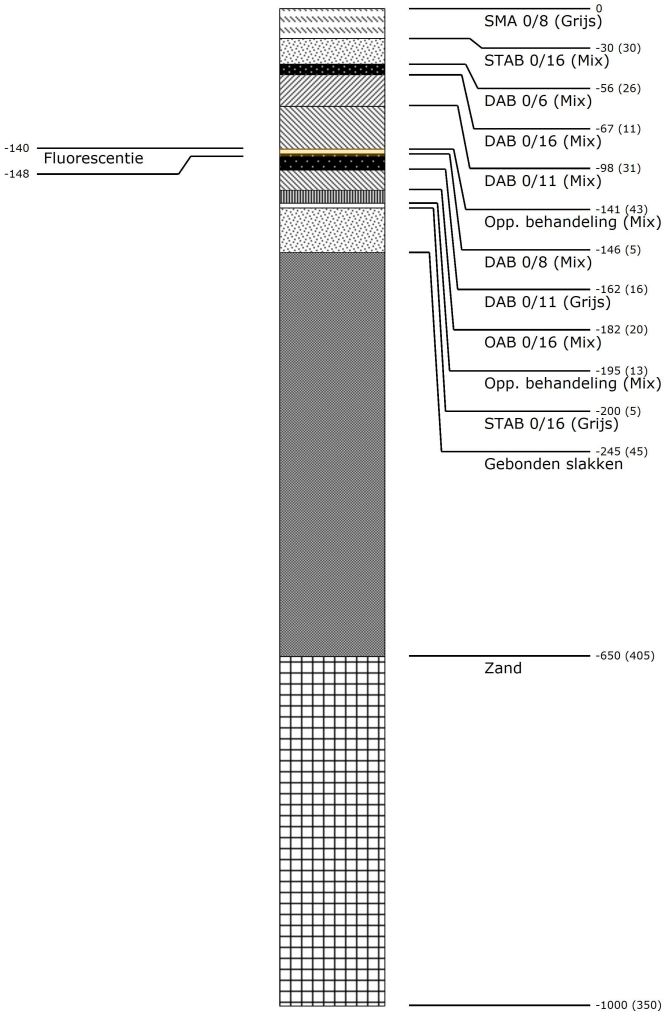



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-05
Datum proef: 07-01-2025

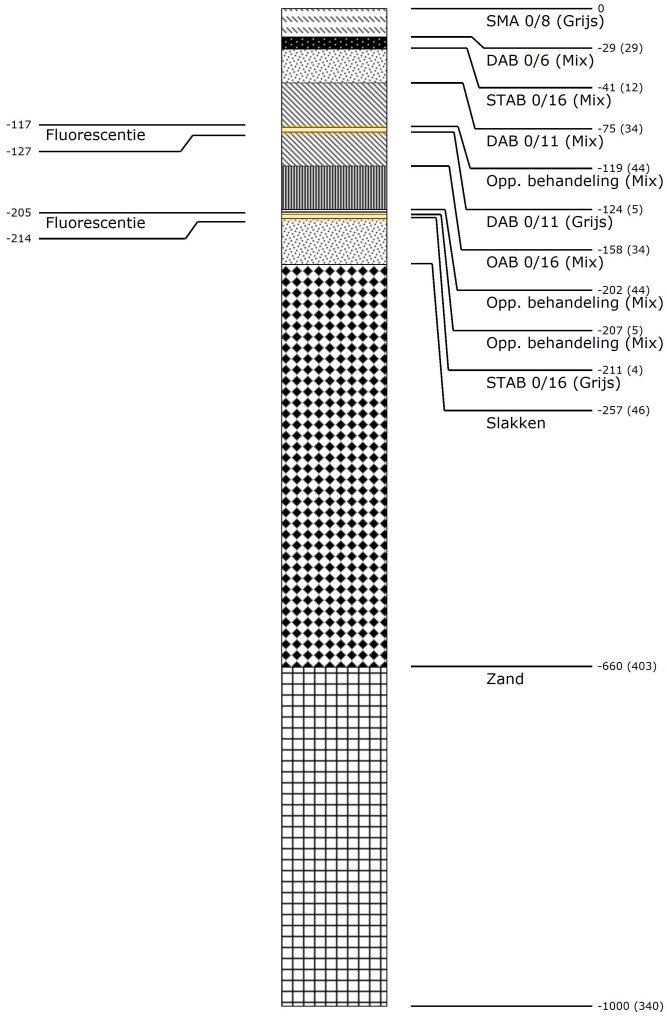

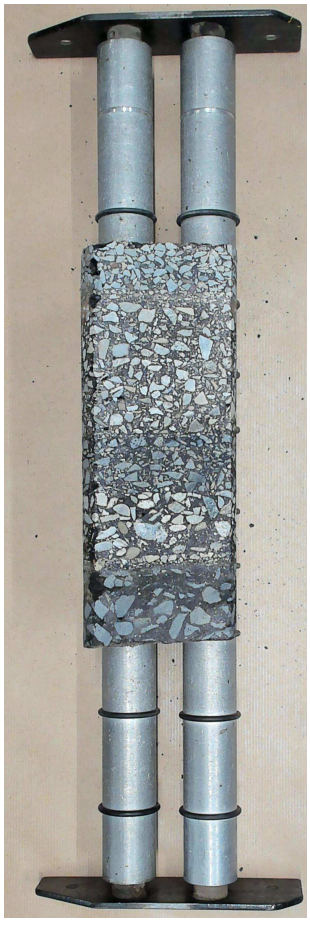

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-06
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 173 mm.

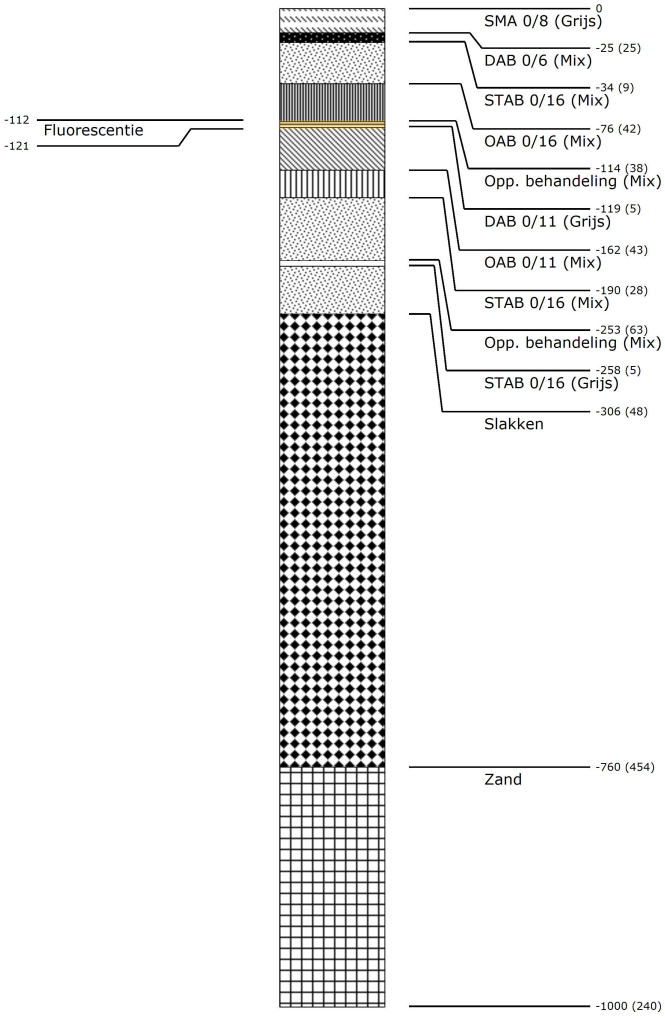

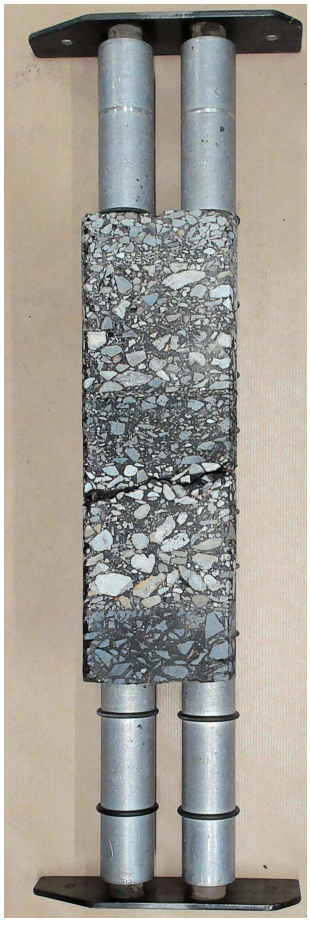

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-07
Datum proef: 07-01-2025

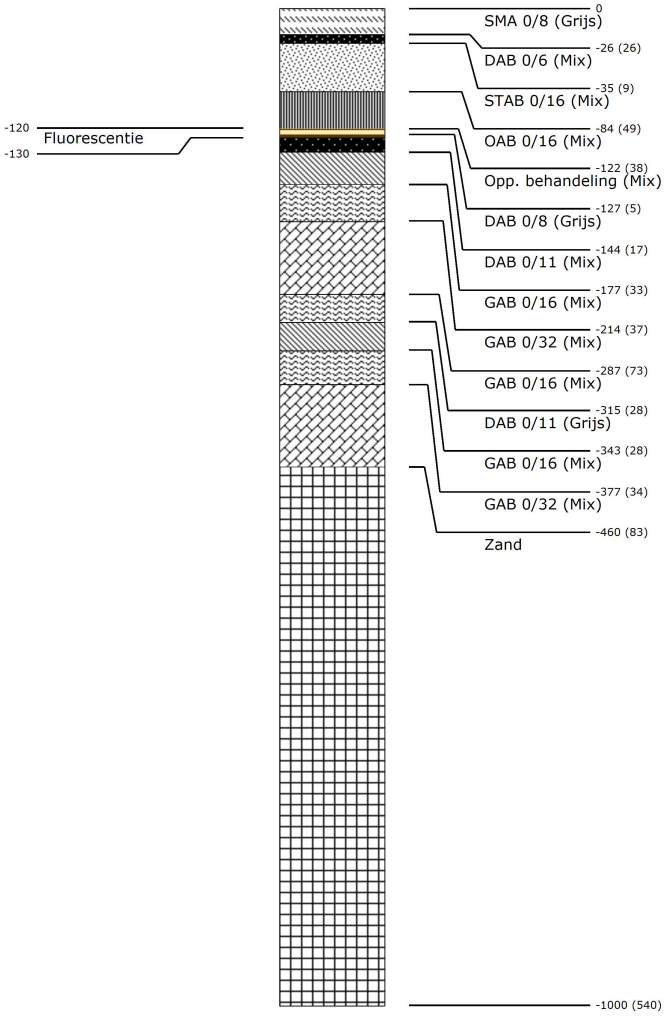



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-08
Datum proef: 07-01-2025

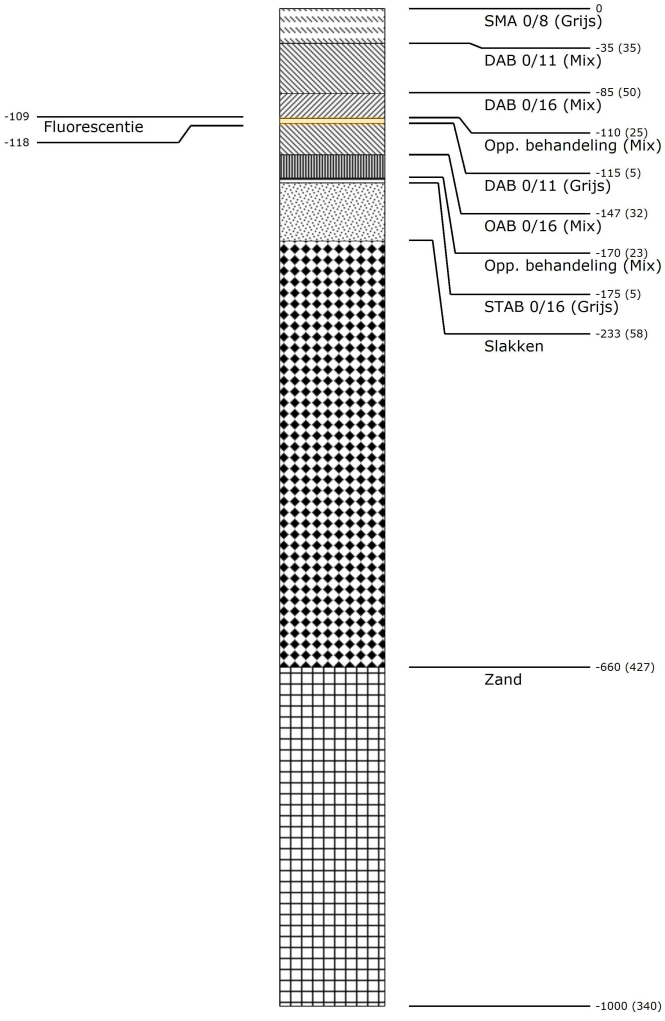

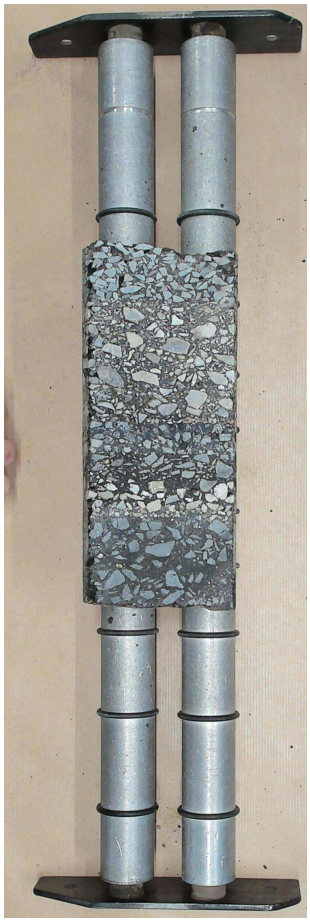

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-09
Datum proef: 07-01-2025

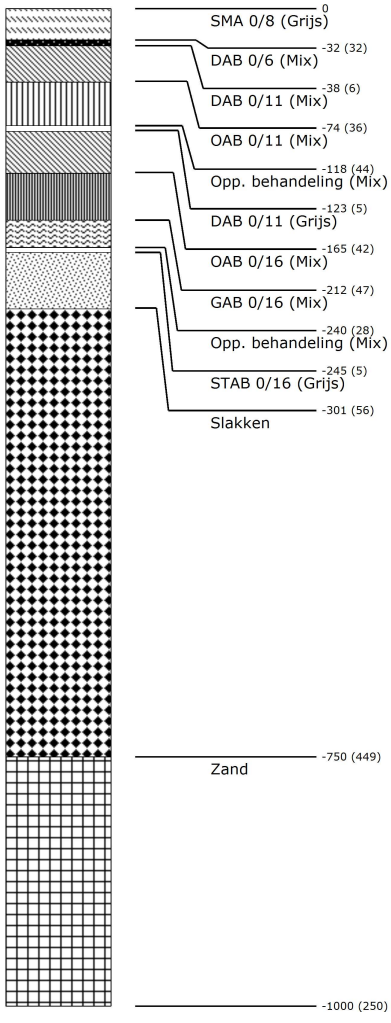



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-10
Datum proef: 07-01-2025

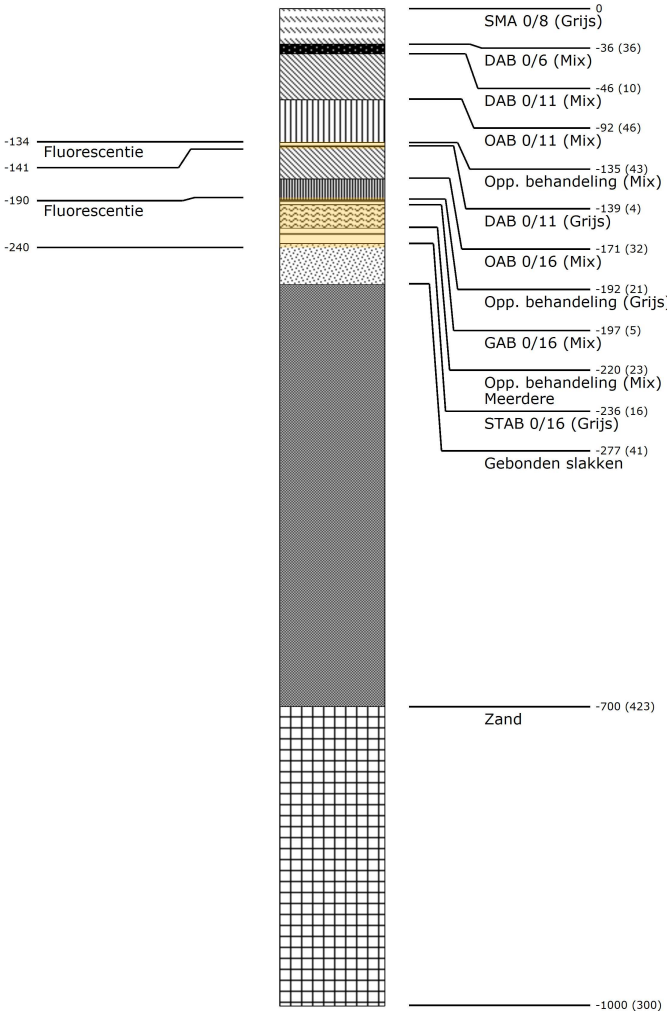



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-11
Datum proef: 07-01-2025

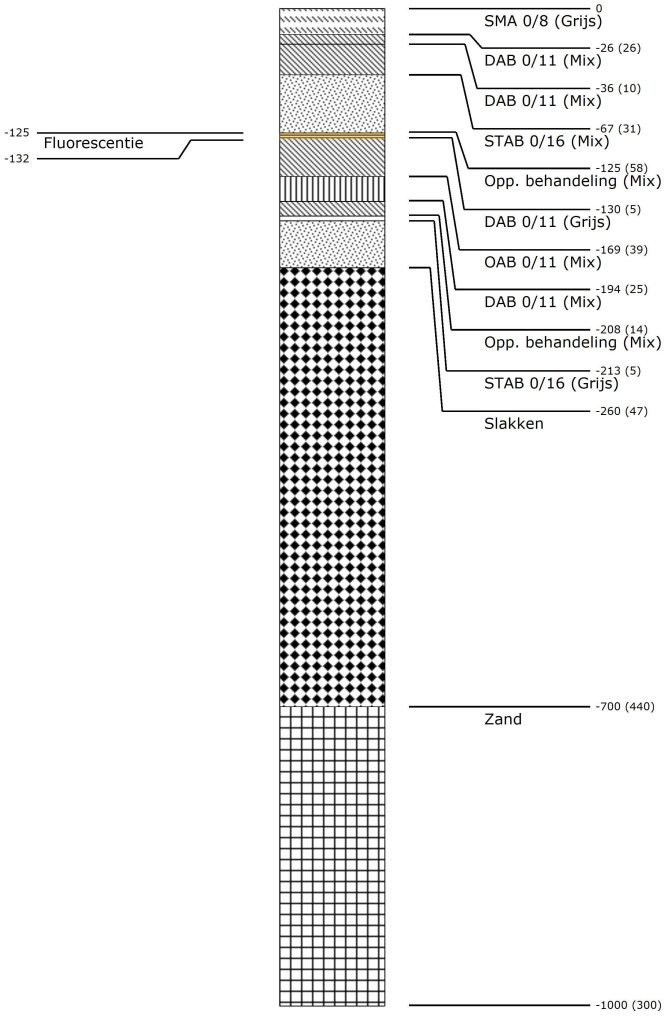



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-12
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 181 mm.

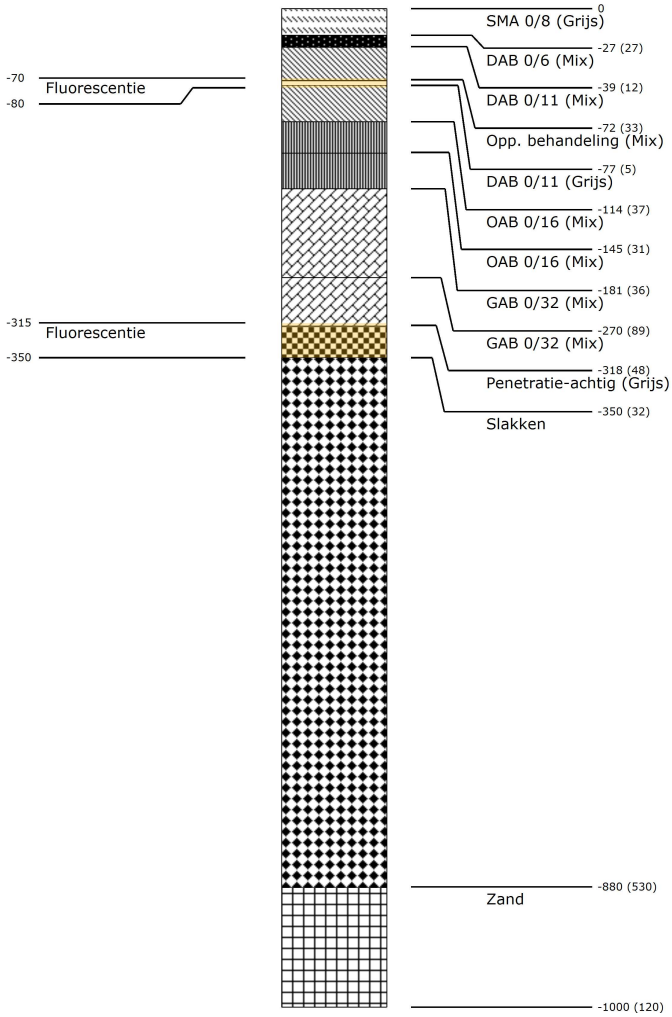



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-13
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 74 mm.

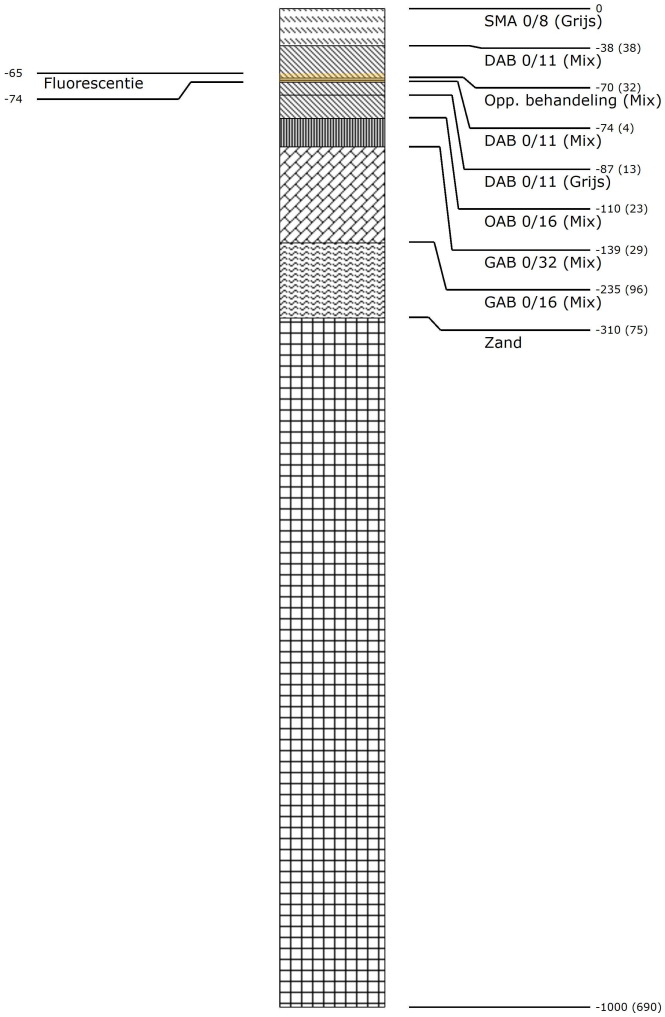



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: B-14
Datum proef: 07-01-2025

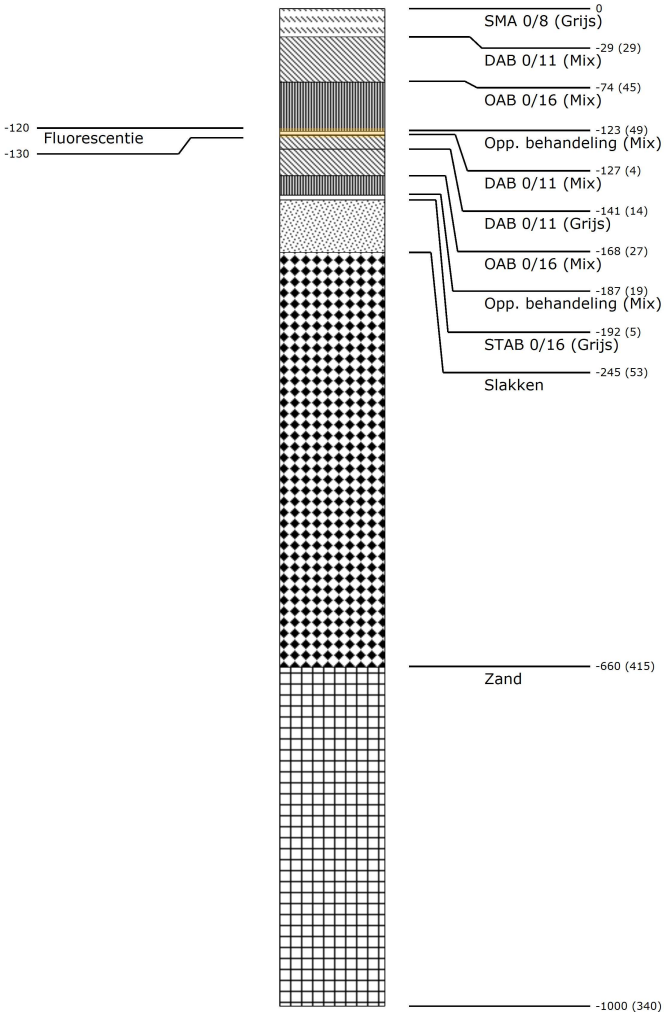



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: BS-01
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 70 en 182 mm.
Scheur van ca 182-235 mm.

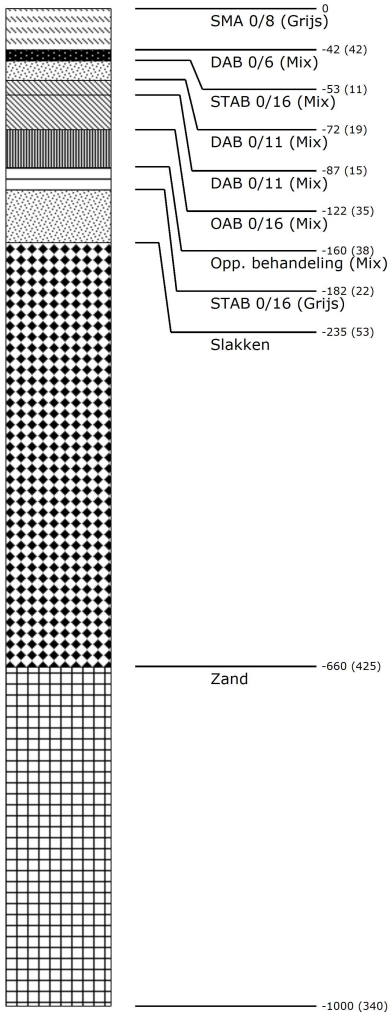

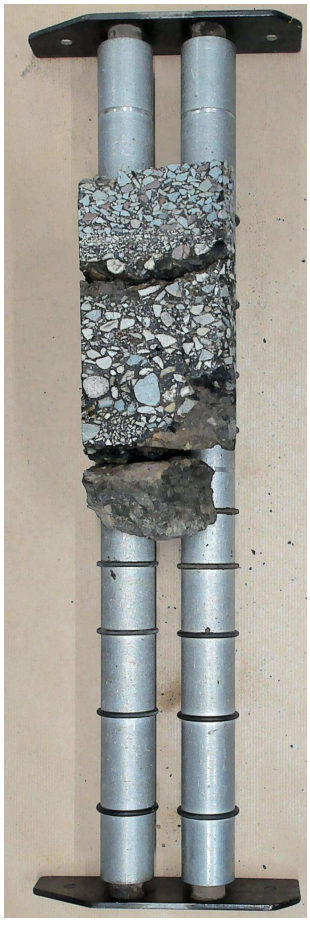

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: BS-02
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 114, 141 en 170 mm.
Scheur van ca 0-114 mm.

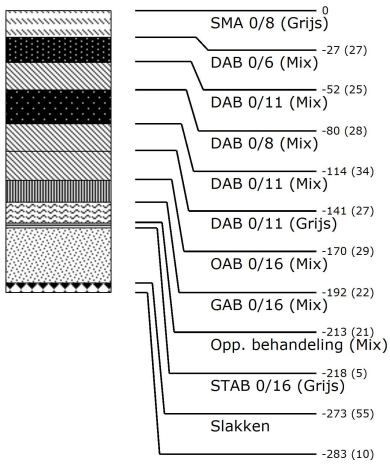



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: BS-03
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt vanaf ca 48 mm volledig gedesintegreerd. Totale laagdikte conform opgave boorman.

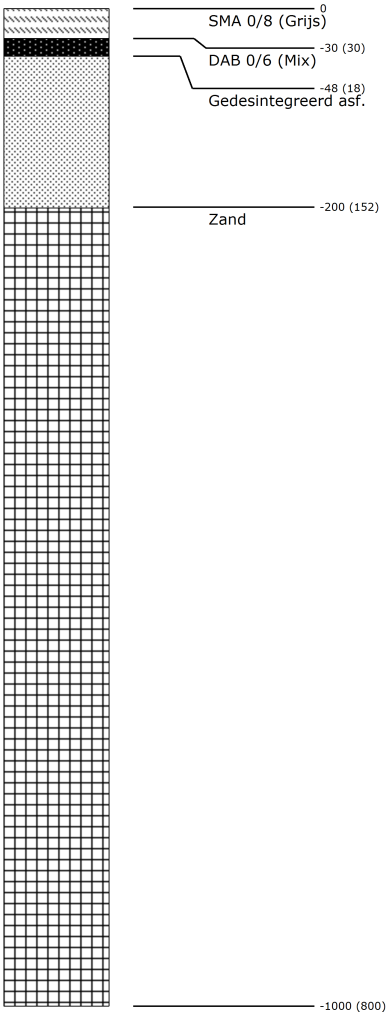



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)


Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: BS-04
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt los op ca. 66 mm.
Scheur van ca 0-66 mm en van 85-232 mm.

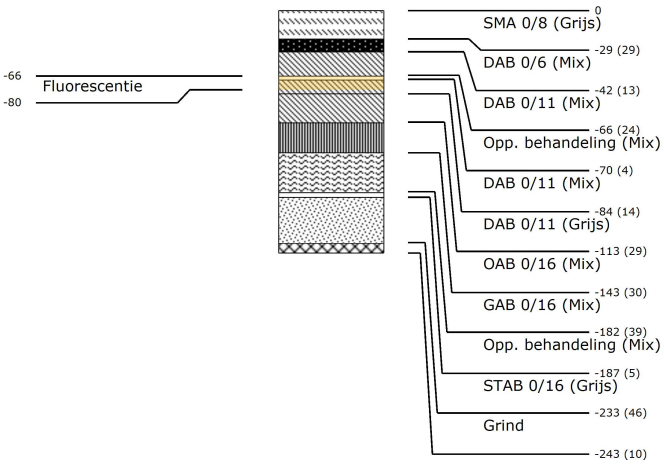

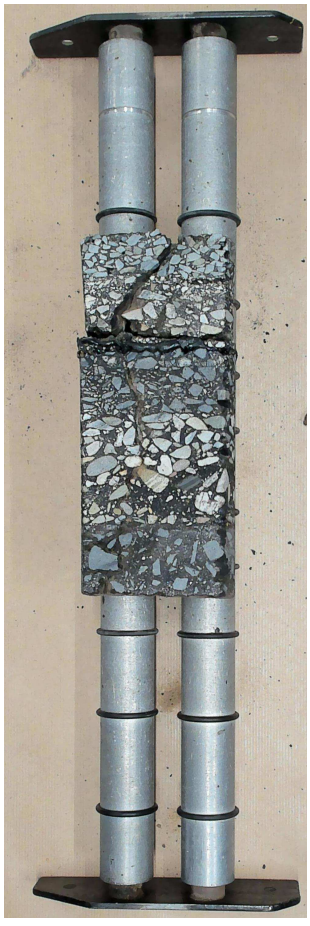

Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman


Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)

Unihorn Laboratorium
Postbus 58
1633 ZH AVENHORN

Unihorn Laboratorium is geaccrediteerd
voor de met Q gemerkte verrichtingen

Onderzoeksrapport Asfalt

Boring: BS-05
Datum proef: 07-01-2025
Opmerking: Asfalt vanaf ca 50 mm volledig gedesintegreerd. Totale laagdikte conform opgave boorman.
Fluorescentie-traject niet exact te bepalen van 50-250 mm.

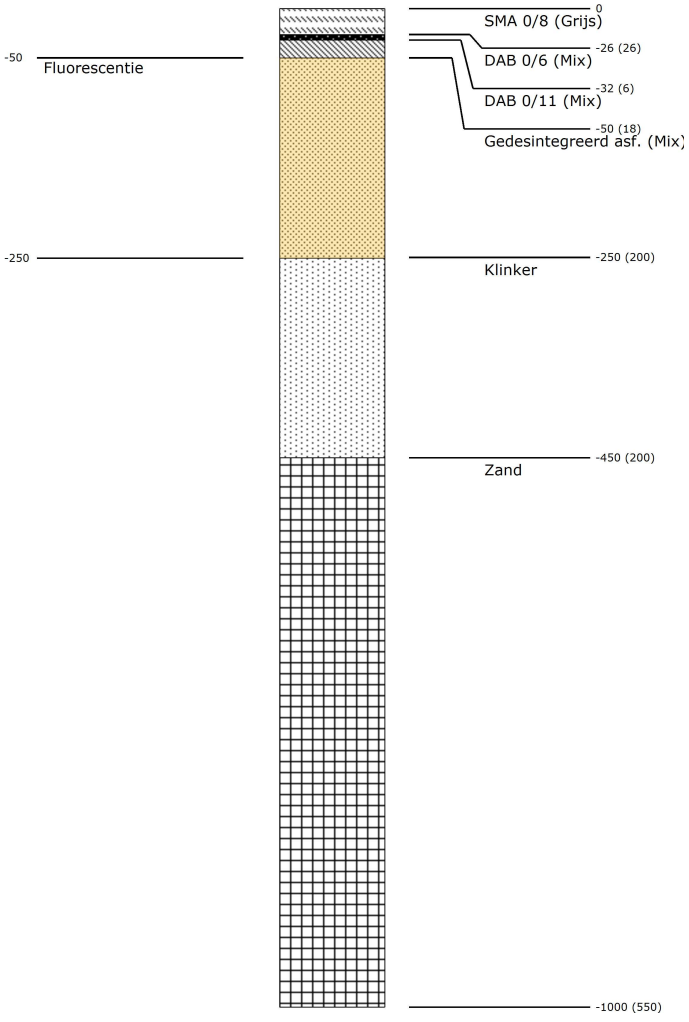



Deze rapportage mag niet in delen worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het Unihorn laboratorium.

Boorstaten in millimeters

Projectcode: 240430-01
Projectnaam: Drie wegen Overijssel, N766
Opdrachtgever: Unihorn bv i.o.v. Witteveen+Bos
Versie: 1

Monstername: Infra Advies Twente
Datum aanvoer: 10-1-2025
(xx) = individuele laagdikte

Laborant: Dennis Koopman

Indien Fluorescentie aangegeven: indicatief > 250 mg/kg PAK_{10}
Indien geen Fluorescentie aangegeven: indicatief ≤ 250 mg/kg PAK_{10}
Verrichting: Bepalen laagdikte en beschrijving van asfaltboorkernen, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
Bepalen aanwezigheid van PAK dmv. PAK detector, conform Standaard RAW Bepalingen (Q)
