Titelblad

Opdrachtgever:
Hijmans Sloopwerken, Asbest en Milieu B.V.

Onderzochte bouwwerk, constructie of object:
Zwembad De Plons
Houtduiflaan 3 te Beuningen

Opdrachtnemer:
VDM BV
SCA-Procescertificaat: 07-D070014

Rapportnummer:
M240727
Versie: 1

Uitgevoerd door:
Dhr. P. Peters
DIA 51E-151123-513064

Technisch verantwoordelijke:
Dhr. P. Peters
DIA 51E-151123-513064

Datum veldonderzoek:
27-1-2025

Autorisatiedatum:
28-1-2025

Rapportage verloopt op:
28-1-2028

Status rapportage:
Definitief



Asbestinventarisatie conform het certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Opdrachtgever:
Hijmans Sloopwerken, Asbest en Milieu B.V.
Contactpersoon: dhr. R. Hijmans
Postadres: Molenstraat 28
Postcode en plaats: 6645 BV Winssen
Telefoonnummer: 0487-521280

Projectgegevens:
Asbestinventarisatie conform het certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Onderzochte bouwwerk, constructie of object: zwembad De Plons
Adres: Houtduiflaan 3
Postcode en plaats: 6641 ZN Beuningen
DIA/rapporteur: dhr. P. Peters (DIA 51E-151123-513064)
Datum onderzoek: 27-1-2025
Projectnummer: M240727

Opdrachtnemer:
VDM BV
Eindstraat 42
5801 CR Venray
Telefoon:0478-649157
Faxnummer:0478-649158
info@asbestinbeeld.nl
www.asbestinbeeld.nl
SCA-Prosescertificaat: 07-D070014

Correspondentieadres:
VDM BV
Postbus 10
5825 ZG Overloon

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actuele situatie en de geldende regelgeving. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaatsvinden.
Gebruik van deze rapportage door anderen dan de geadresseerde, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, zonder toestemming van VDM BV, niet toegestaan.
Tevens is VDM BV niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud.

Voor akkoord:
Technisch verantwoordelijke
De heer P. Peters (DIA 51E-151123-513064)
Autorisatiedatum: 28-1-2025

Inhoud

1 Samenvatting 4
1.1 Specificatie reikwijdte onderzoeksgebied 4
1.2 Specificatie geschiktheid rapportage 4
1.3 Specificatie doel rapportage 4
1.4 Beperkingen rapportage 4
3 Methoden 6
4 Deskresearch 7
5 Aansprakelijkheid 7
6 Conclusies 8
Bijlage plattegrond: 10
Bijlage overzicht bemonsterde toepassingen: 13
Bijlage overzicht niet asbestverdachte toepassingen: 14
Bijlage Procescertificaat Asbestinventarisatie 16

Bijlage Analysecertificaat

Alle aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen vallen niet meer onder verantwoordingen van VDM BV, tenzij deze gegevens door VDM BV aantoonbaar zijn gevalideerd. Dit geldt ook voor via het internet werkende systemen van gegevensuitwisseling. Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende materialen etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.
In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te worden toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat de verwijdering kan plaats vinden.
Eigendommen van de klant zullen worden beschermd middels geheimhouding. Wij rapporteren alleen aan de opdrachtgever. Indien derden informatie willen wordt dit alleen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever verstrekt.

1 Samenvatting

In opdracht van Hijmans Sloopwerken, Asbest en Milieu B.V. te Winssen is door dhr. P. Peters (DIA 51E-151123-513064) op 27-1-2025, zwembad De Plons gelegen aan Houtduiflaan 3 te Beuningen conform het certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende materialen.

1.1 Specificatie reikwijdte onderzoeksgebied

☒ Het onderzoeksgebied betreft zwembad De Plons
☐ Betreft uitsluitend de binnenzijde van het aangegeven bouwwerk
☒ Onderzoeksgebied wordt op de plattegrond(en) in de bijlage duidelijk aangegeven.
(deel/delen van het) bouwwerk is/zijn onderzocht en indien van toepassing.

***Toelichting: Het onderzoeksgebied omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van een eventuele transitroute, zijnde de route tussen de* transitsluis en de decontaminatie-unit**

1.2 Specificatie geschiktheid rapportage

☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
☐ Geschikt voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
☒ Niet geschikt voor de bouwkundige integriteit aan te tasten en werkzaamheden uit te voeren aan de beperkingen opgenomen in deze rapportage.
☐ Geschikt voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden.
☒ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop (uitbreiding van 1995/96. Zie plattegrond)

1.3 Specificatie doel rapportage

Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van mogelijk asbesthoudende materialen.

1.4 Beperkingen rapportage

Plaatsen die niet onderzocht zijn:

Gezien het karakter van de opdracht, waarbij teneinde de gebruiksfunctie niet te compromitteren, destructief onderzoek niet mogelijk was en/of om veiligheidsreden niet heeft onderzoek naar asbesthoudende toepassingen op de volgende locaties niet plaatsgevonden: De spouwmuren (langs kozijnen), de kruipruimte, de ruimte boven asbestvrije vaste plafonds, pakkingen tussen flensen en dakbedekking t.b.v. het zwembad zijn niet onderzocht.

Vermoeden van niet direct waarneembaar asbest:

Tijdens het onderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven de vermoede, maar in het licht van de verstrekte onderzoeksopdracht niet (direct) waargenomen asbesthoudende materialen:

Ruimte	Plaats	Vermoede toepassing
zwembad (oudbouw)	schachten/schoorsteenkanaal/koven (binnenzijde)	asbesthoudende kanalen
zwembad (oudbouw)	spouwmuren (langs kozijnen)	asbesthoudende vochtkering
zwembad (oudbouw)	ruimte boven de vaste asbestvrije plafonds	asbesthoudend stelplaatjes
zwembad (oudbouw)	kruipruimte	asbesthoudende kanalen/pakkingen/bekisting
zwembad (oudbouw)	kelder tussen flensen (flensen te dicht op elkaar voor bemonstering)	asbesthoudende pakking
zwembad (oudbouw)	dakbedekking (onderste laag)	asbesthoudende bitumen

Aanvullend onderzoek naar de in bovenstaande tabel genoemde vermoede toepassingen is noodzakelijk indien de aanvankelijke aanleiding voor dit onderzoek wijzigt en bijvoorbeeld voorafgaand aan sloop of renovatie, waarbij de constructieve integriteit wordt aangetast.

1.5 Specificatie aangetroffen bronnen

De volgende materialen zijn bemonsterd tijdens de inventarisatie:

bron	toepassing	ruimten	locatie	hoeveelheid	monster	percentage	soort	risicoklasse
1	plaatmateriaal	accuzuur/bleekloog	plafond	ca 16m2	1	<0,1%	n.v.t.	bron asbestvrij

Zuivere maten in het werk te meten en te controleren.

2 Omschrijving van de opdracht

In opdracht van Hijmans Sloopwerken, Asbest en Milieu B.V. te Winssen is door dhr. P. Peters (DIA 51E-151123-513064) op 27-1-2025, zwembad De Plons gelegen aan Houtduiflaan 3 te Beuningen conform het certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende materialen. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van mogelijk asbesthoudende materialen.

Deze rapportage kan als basis dienen voor:

1. het indienen van een sloopmelding bij het omgevingsloket.
2. het aanvragen van een omgevingsvergunning bij het omgevingsloket.
3. www.omgevingswet.overheid.nl

Er zal binnen het kader van deze opdracht geen onderzoek worden gedaan naar de eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van het eventueel aan te treffen asbesthoudend materiaal.

Binnen het kader van deze opdracht wordt geen onderzoek verricht naar de eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem en valt buiten de reikwijdte van het vigerende certificatieschema voor het proces asbestinventarisatie. Voor asbest en/of asbesthoudend materiaal in bodem verwijzen wij u naar de NEN 5707 en BRL SIKB 2000 Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

Het onderzoek is uitgevoerd conform het vigerende certificatieschema voor het proces asbestinventarisatie. VDM BV is met certificaat 07-D 070014 door Normec Certification te Geldermalsen volgens deze richtlijn gecertificeerd.

3 Methoden

Materiaalmonsters

Van alle “asbestverdachte” toepassingen wordt per type toepassing minimaal 1 materiaalmonster genomen.
Bij het nemen van materiaalmonsters moet de concentratie asbeststof in de lucht zo laag mogelijk worden gehouden.
Hiervoor worden de volgende arbeids- en milieu hygiënische maatregelen genomen:

De bron goed impregneren/bevochtigen en/of intapen;
Het materiaal zo min mogelijk beschadigen, breken of verpulveren;
Het vrijkomende asbeststof afzuigen middels een hiervoor bestemde stofzuiger.

Nadat de locatie van het monster is geïmpregneerd, wordt met behulp van passend gereedschap een materiaalmonster genomen. Het materiaalmonster wordt vervolgens in een daarvoor bestemd plastic zakje dubbel verpakt en voorzien van een sticker met de tekst “asbestverdacht” en de exacte locatie wordt beschreven. Dit kenmerk is te herleiden in de uiteindelijke rapportage.

Na de monsternamen worden de gebruikte gereedschappen gereinigd met in acht name van de arbeids- en milieu hygiënische aspecten. De stofzuiger wordt vervolgens dubbel verpakt en voorzien van een “asbest” sticker.

Ingeval door de monsterneming de kwaliteit of de functionaliteit van het onderzoeksbouwwerk /de constructie wordt aangetast, zal monsterneming achterwege blijven.

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van:

- Mes
- Punttang
- Combinatietang
- Kurkboor
- Tape

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de conditie van het materiaal.
De keuze van de toegepaste persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hechtgebondenheid van de te bemonsteren materialen. De indeling is als volgt:

- PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen (1/2 gelaatsmasker, weggooioverall, handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte/omgeving.
- PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen (volgelaatsmasker met interne aandrijving, weggooioverall, handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte/omgeving.

4 Deskresearch

Er heeft allereerst overleg met dhr. R. Hijmans (Hijmans Sloopwerken, Asbest en Milieu B.V.) d.d. 19-12-2024 plaatsgevonden. De relevante informatie die uit het overleg naar voren is gekomen, is dat er In en op zwembad De Plons vermoedelijk asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Het is bij de opdrachtgever onbekend om welke materialen het gaat. Het zwembad is in de loop der jaren verbouwd en in 1995/96 uitgebreid met een zwembad, recreatieruimten, kantoren en technische ruimten. Op de aangeleverde tekening(en) zijn geen asbesthoudende toepassingen weergegeven. Het doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van mogelijk asbesthoudende materialen. Het bouwjaar van zwembad De Plons is 1977. Het vooronderzoek asbestinventarisatie is conform Artikel 16, beschreven in Staatscourant Nr. 12702 18-4-2024, uitgevoerd.

Aandachtpunt:		**Omschrijving**	**Asbestverdacht**
bouwjaar		1977	ja
gebouw in gebruik		ja	nee
verbouwing		ja	nee
eerdere sanering		nee	nee
verwoestingen		nee	nee
bouwtype	Vloer:	beton met vloerbedekking	nee
	Opgaand:	metselwerk	nee
	Plafond:	systeemplaten en schrootjes	nee
	Dak:	bitumen	ja
kruipruimte/kelder		kruipruimte/kelder	ja
verwarmingssysteem		HR cv ketel	nee
ventilatiesysteem		metaal	nee
riolering/afvoer		pvc	nee
leidingen		metaal	nee

Bouwtekening/bestek	**omschrijving**
sectie	Beuningen B 3543/3544
tekening/bestek nummer	ongenummerd
datum	n.v.t.
gemeente	Beuningen

5 Aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldige wijze van voorbereiding en uitvoering van deze inventarisatie kan niet worden gegarandeerd dat alle asbest en/of asbesthoudende materialen, mede gelet op het feit dat er meer dan 3500 toepassingen bekend zijn, zijn opgemerkt. Tijdens de renovatie of sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op asbestbronnen die niet in het uitgevoerde onderzoek zijn gedetecteerd. Hoewel de werkzaamheden door VDM BV naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan VDM BV derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. In voorkomend geval zal VDM BV, indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en hierbij benodigde rapportage verzorgen teneinde risico`s door onverhoopte emissie van asbestvezels te beperken.

6 Conclusies

Het asbestonderzoek wordt met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd waarbij al het asbestverdachte materiaal, dat met de gehanteerde onderzoeksmethode is aangetroffen in dit uiteindelijke rapport is vermeld.

Op en in het zwembad De Plons zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

De volgende materialen zijn bemonsterd tijdens de inventarisatie:

bron	toepassing	ruimten	locatie	hoeveelheid	monster	percentage	soort	risicoklasse
1	plaatmateriaal	accuzuur/bleekloog	plafond	ca 16m2	1	<0,1%	n.v.t.	bron asbestvrij

Zuivere maten in het werk te meten en te controleren.

Conclusie bron 1: Het plaatmateriaal is asbestvrij.
Opmerking bron 1: Niet van toepassing.

Plaatsen die niet onderzocht zijn:
Gezien het karakter van de opdracht, waarbij teneinde de gebruiksfunctie niet te compromitteren, destructief onderzoek niet mogelijk was en/of om veiligheidsreden niet heeft onderzoek naar asbesthoudende toepassingen op de volgende locaties niet plaatsgevonden: De spouwmuren (langs kozijnen), de kruipruimte, de ruimte boven asbestvrije vaste plafonds, pakkingen tussen flensen en dakbedekking t.b.v. het zwembad zijn niet onderzocht.

Vermoeden van niet direct waarneembaar asbest:
Tijdens het onderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven de vermoede, maar in het licht van de verstrekte onderzoeksopdracht niet (direct) waargenomen asbesthoudende materialen:

Ruimte	Plaats	Vermoede toepassing
zwembad (oudbouw)	schachten/schoorsteenkanaal/koven (binnenzijde)	asbesthoudende kanalen
zwembad (oudbouw)	spouwmuren (langs kozijnen)	asbesthoudende vochtkering
zwembad (oudbouw)	ruimte boven de vaste asbestvrije plafonds	asbesthoudend stelplaatjes
zwembad (oudbouw)	kruipruimte	asbesthoudende kanalen/pakkingen/bekisting
zwembad (oudbouw)	kelder tussen flensen (flensen te dicht op elkaar voor bemonstering)	asbesthoudende pakking
zwembad (oudbouw)	dakbedekking (onderste laag)	asbesthoudende bitumen

Aanvullend onderzoek naar de in bovenstaande tabel genoemde vermoede toepassingen is noodzakelijk indien de aanvankelijke aanleiding voor dit onderzoek wijzigt en bijvoorbeeld voorafgaand aan sloop of renovatie, waarbij de constructieve integriteit wordt aangetast.

Conclusie deskresearch:
In en op zwembad De Plons zijn vermoedelijk asbesthoudende materialen aanwezig. Het is bij de opdrachtgever onbekend om welke materialen het gaat. Het zwembad is in de loop der jaren verbouwd en in 1995/96 uitgebreid met een zwembad, recreatieruimten, kantoren en technische ruimten. Op de aangeleverde tekening(en) zijn geen asbesthoudende toepassingen weergegeven.

Aanvullende opmerkingen:

1. Conform opdracht is er **geen** destructief onderzoek uitgevoerd.
2. Alle technische installaties zoals 4 stuks Remeha gas 210 ECO PR 0.120 bj 1996 en de meszekeringen Holec P852-1 500v zijn asbestvrij.
3. Het onderzochte zwembad tijdens het onderzoek in gebruik. De aanwezige inboedel valt buiten de reikwijdte van het onderzoek.
4. De kruipruimte is in verband met veiligheidsoverwegingen (besloten ruimte) alleen vanaf het toegangsluik geïnspecteerd. Bij werkzaamheden in de kruipruimte dient deze aanvullend onderzocht te worden;

Revisie rapportage:

Revisie nr.:
Datum:
Reden revisie:
Asbesthoudend materiaal verwijderd volgens rapportage:
Asbesthoudend materiaal verwijderd door:
Asbesthoudend materiaal nog aanwezig:

Indien er onverhoopt tijdens de renovatie en/of sloopwerkzaamheden asbestverdachte materialen tevoorschijn komen dan vragen wij u de werkzaamheden te stoppen en direct melding te doen van deze niet gerapporteerde asbestverdachte materialen/toepassingen aan ons bureau zodat wij een aanvullend onderzoek kunnen verrichten. VDM BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, e.e.a. conform Algemene voorwaarden VDM BV.

Indien er destructieve handelingen worden uitgevoerd worden er steekproefsgewijs openingen gemaakt om een representatief beeld te krijgen van mogelijke aanwezige asbesthoudende materialen. Tijdens het destructief onderzoek kan mogelijk de gebruiksfunctie en het exterieur worden aangetast alsmede het aanzicht van het bouwwerk/object. Tijdens het destructief onderzoek wordt er geen onderzoek uitgevoerd aan de constructie van het bouwwerk en/of object vanwege de mogelijkheid dat er een onveilige situatie ontstaat.

De aangeven hoeveelheden zijn niet bedoeld als hoeveelheden voor bestek of aanbestedingen van de werkzaamheden. De aangegeven hoeveelheden dienen door de aannemer gecontroleerd te worden.

Uiteraard verdienen deze aspecten speciale aandacht tijdens het onderzoek. Het is daarom raadzaam om bij de sloop de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.

Bij twijfel over mogelijk asbestverdacht materiaal dat niet in dit rapport is beschreven verzoeken wij u contact op te nemen met ons bureau.


Bijlage plattegrond:

Onderzoeksgebied:
Betreft zwembad De Plons

Plaatsen die niet onderzocht zijn:
De spouwmuren (langs kozijnen), de kruipruimte, de ruimte boven asbestvrije vaste plafonds, pakkingen tussen flensen en dakbedekking t.b.v. het zwembad zijn niet onderzocht.

Bouwwerk/object niet onderzocht (deze vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek) gemarkeerd middels: ▭



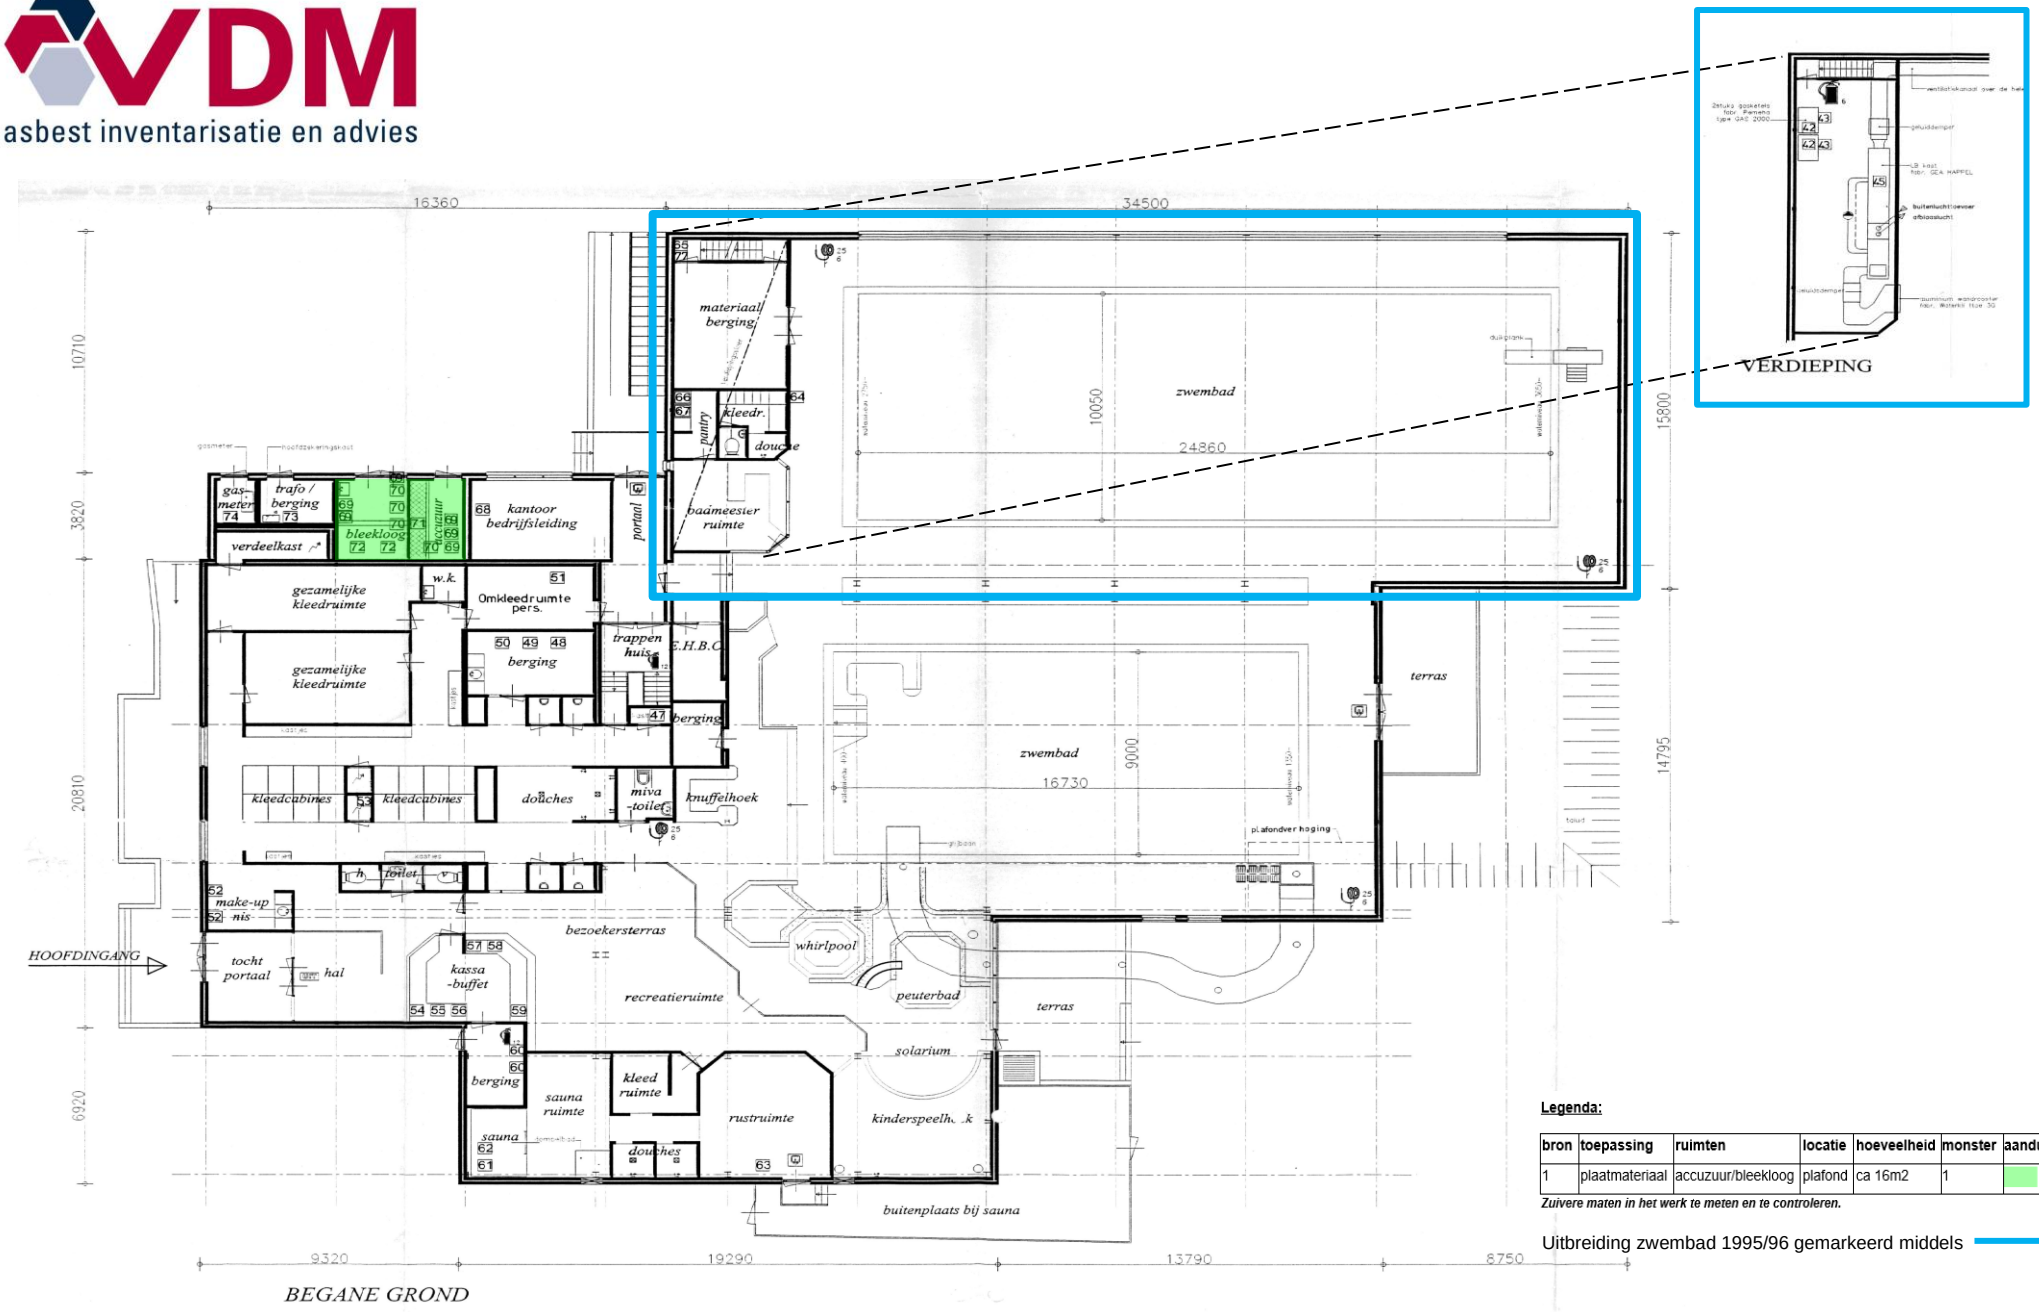


Legenda:

bron	toepassing	ruimten	locatie	hoeveelheid	monster	aanduiding
1	plaatmateriaal	accuzuur/bleekloog	plafond	ca 16m2	1	

Zuivere maten in het werk te meten en te controleren.

Uitbreiding zwembad 1995/96 gemarkeerd middels

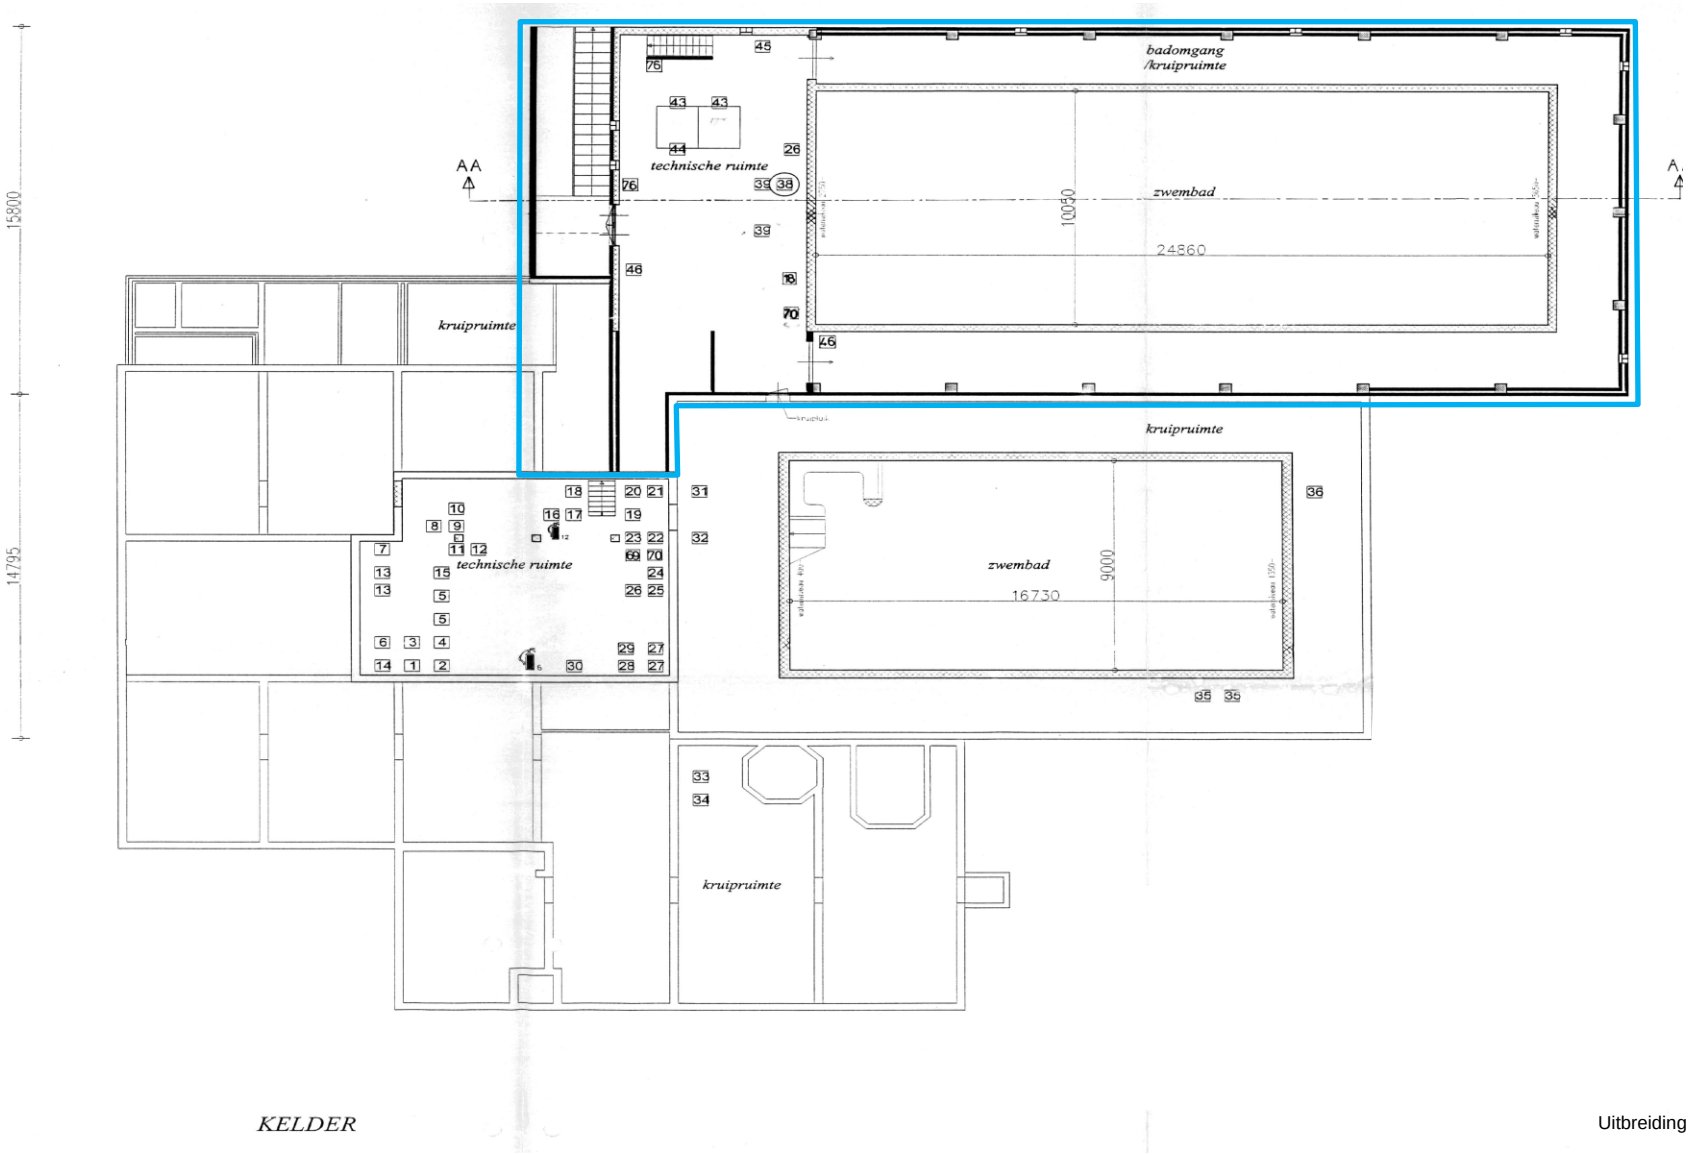

KELDER

Uitbreiding zwembad 1995/96 gemarkeerd middels

Bijlage overzicht bemonsterde toepassingen:





Aanzicht plaatmateriaal, monster 1 en plaatmateriaal, plafond accuzuur/bleekloog

Projectnummer:	**M240727**
Adres:	Houtduiflaan 3 te Beuningen

De toepassing:

Bron	1
Omschrijving toepassing	plaatmateriaal
Plaats in/op ruimte(s)	accuzuur/bleekloog
Locatie	plafond
Monster	1
Aard van materiaal	n.v.t.
Beschadigd	n.v.t.
Bereikbaarheid	n.v.t.
Verweerd	n.v.t.
Geschatte hoeveelheid	ca 16m2
Bevestigingsmethode	geschroefd
Geaccrediteerd laboratorium	SGI Compliance Environmental Control Zuid Accreditatieverklaring NEN-EN-ISO/IEC 17025 registratienummer: L140 uitgevoerd conform NEN 5896:2003
Analyse certificaat	A271986
Analyseresultaat	<0,1%

Opmerkingen:
Niet van toepassing.

Conclusie:
Het plaatmateriaal is asbestvrij.

Bijlage overzicht niet asbestverdachte toepassingen:






Aanzicht gevelbekleding, beglazingskit en raamdorpels




Aanzicht ventilatie/ontluchting







Aanzicht tegelwerken en dorpels gezet in specie



Aanzicht afvoeren, leidingisolatie en dekens

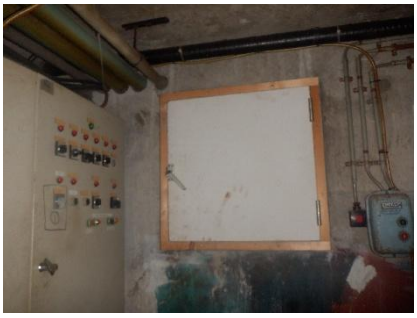

Aanzicht doorvoeren en inspectieluik oude kelder



Aanzicht brandwerend plaatmateriaal aanwezig op 1e verdieping. Bouwjaar 1995/96



Aanzicht flensafdichting ventilatiesysteem en ontluchting boven systeemplafond



Aanzicht Remeha ketel en Holec meszekering

Bijlage Procescertificaat Asbestinventarisatie

Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070014

VDM B.V.

Adres:	Eindstraat 42 5801 CR VENRAY	Datum uitgifte:	26-08-2024
		Vervaldatum:	25-10-2026
Telefoonnr:	+31 478 64 9157	Datum eerste uitgifte:	25-10-2006
Contactpersoon:	Mevr. G.T. Wilmsen	KvK-nummer:	17202215
		E-mail:	info@asbestinbeeld.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld door Stichting Ascert op 18 april 2024 in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in artikel 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling (“**Certificatieschema**”) en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
   a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
   b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
   c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
   d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.

W.L. Princen

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling: Aanwijzingsbeschikking:	Normec Certification B.V. ARBO/P&G/08/14505	Certificaatnummer: SCA-code:	07-D070014 07-D070014.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde. Nadruk verboden

Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 059 97 00
E: info@sgicompliance.nl
I: www.sgicompliance.nl

VDM B.V.
Eindstraat 42
5803 AN Venray
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00165006.1
Datum rapportage	28-01-2025
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	mnYMmq9y
Uw referentie	M240727
Ons projectnummer	A271986
Omschrijving opdrachtgever	Beuningen Houtduiflaan 3
Ontvangst monsters	28-01-2025
Monsterneming door	Opdrachtgever
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	28-01-2025
Analyse locatie	Kamperweg 1 6361 GZ Nuth

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: M240727. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

SGI Compliance Environmental Control is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door SGI Compliance Environmental Control uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het Hoofd Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@sgicompliance.nl onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend, i.o.



Mevr. E. Abdulovic
Eerste Analist

Analyserapport

Rapportnummer: A00165006.1

Ons projectnummer: A271986

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype *1 *3	Soort asbest	Massa (%)	Binding *2
A271986-001	M1 plaatmateriaal plafond accuzuur/bleekloog	Plaat	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.

**: <0.1% (niet aantoonbaar)*

*1 Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld.
*2 Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van SGI Compliance Environmental Control is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld.
*3 Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.
