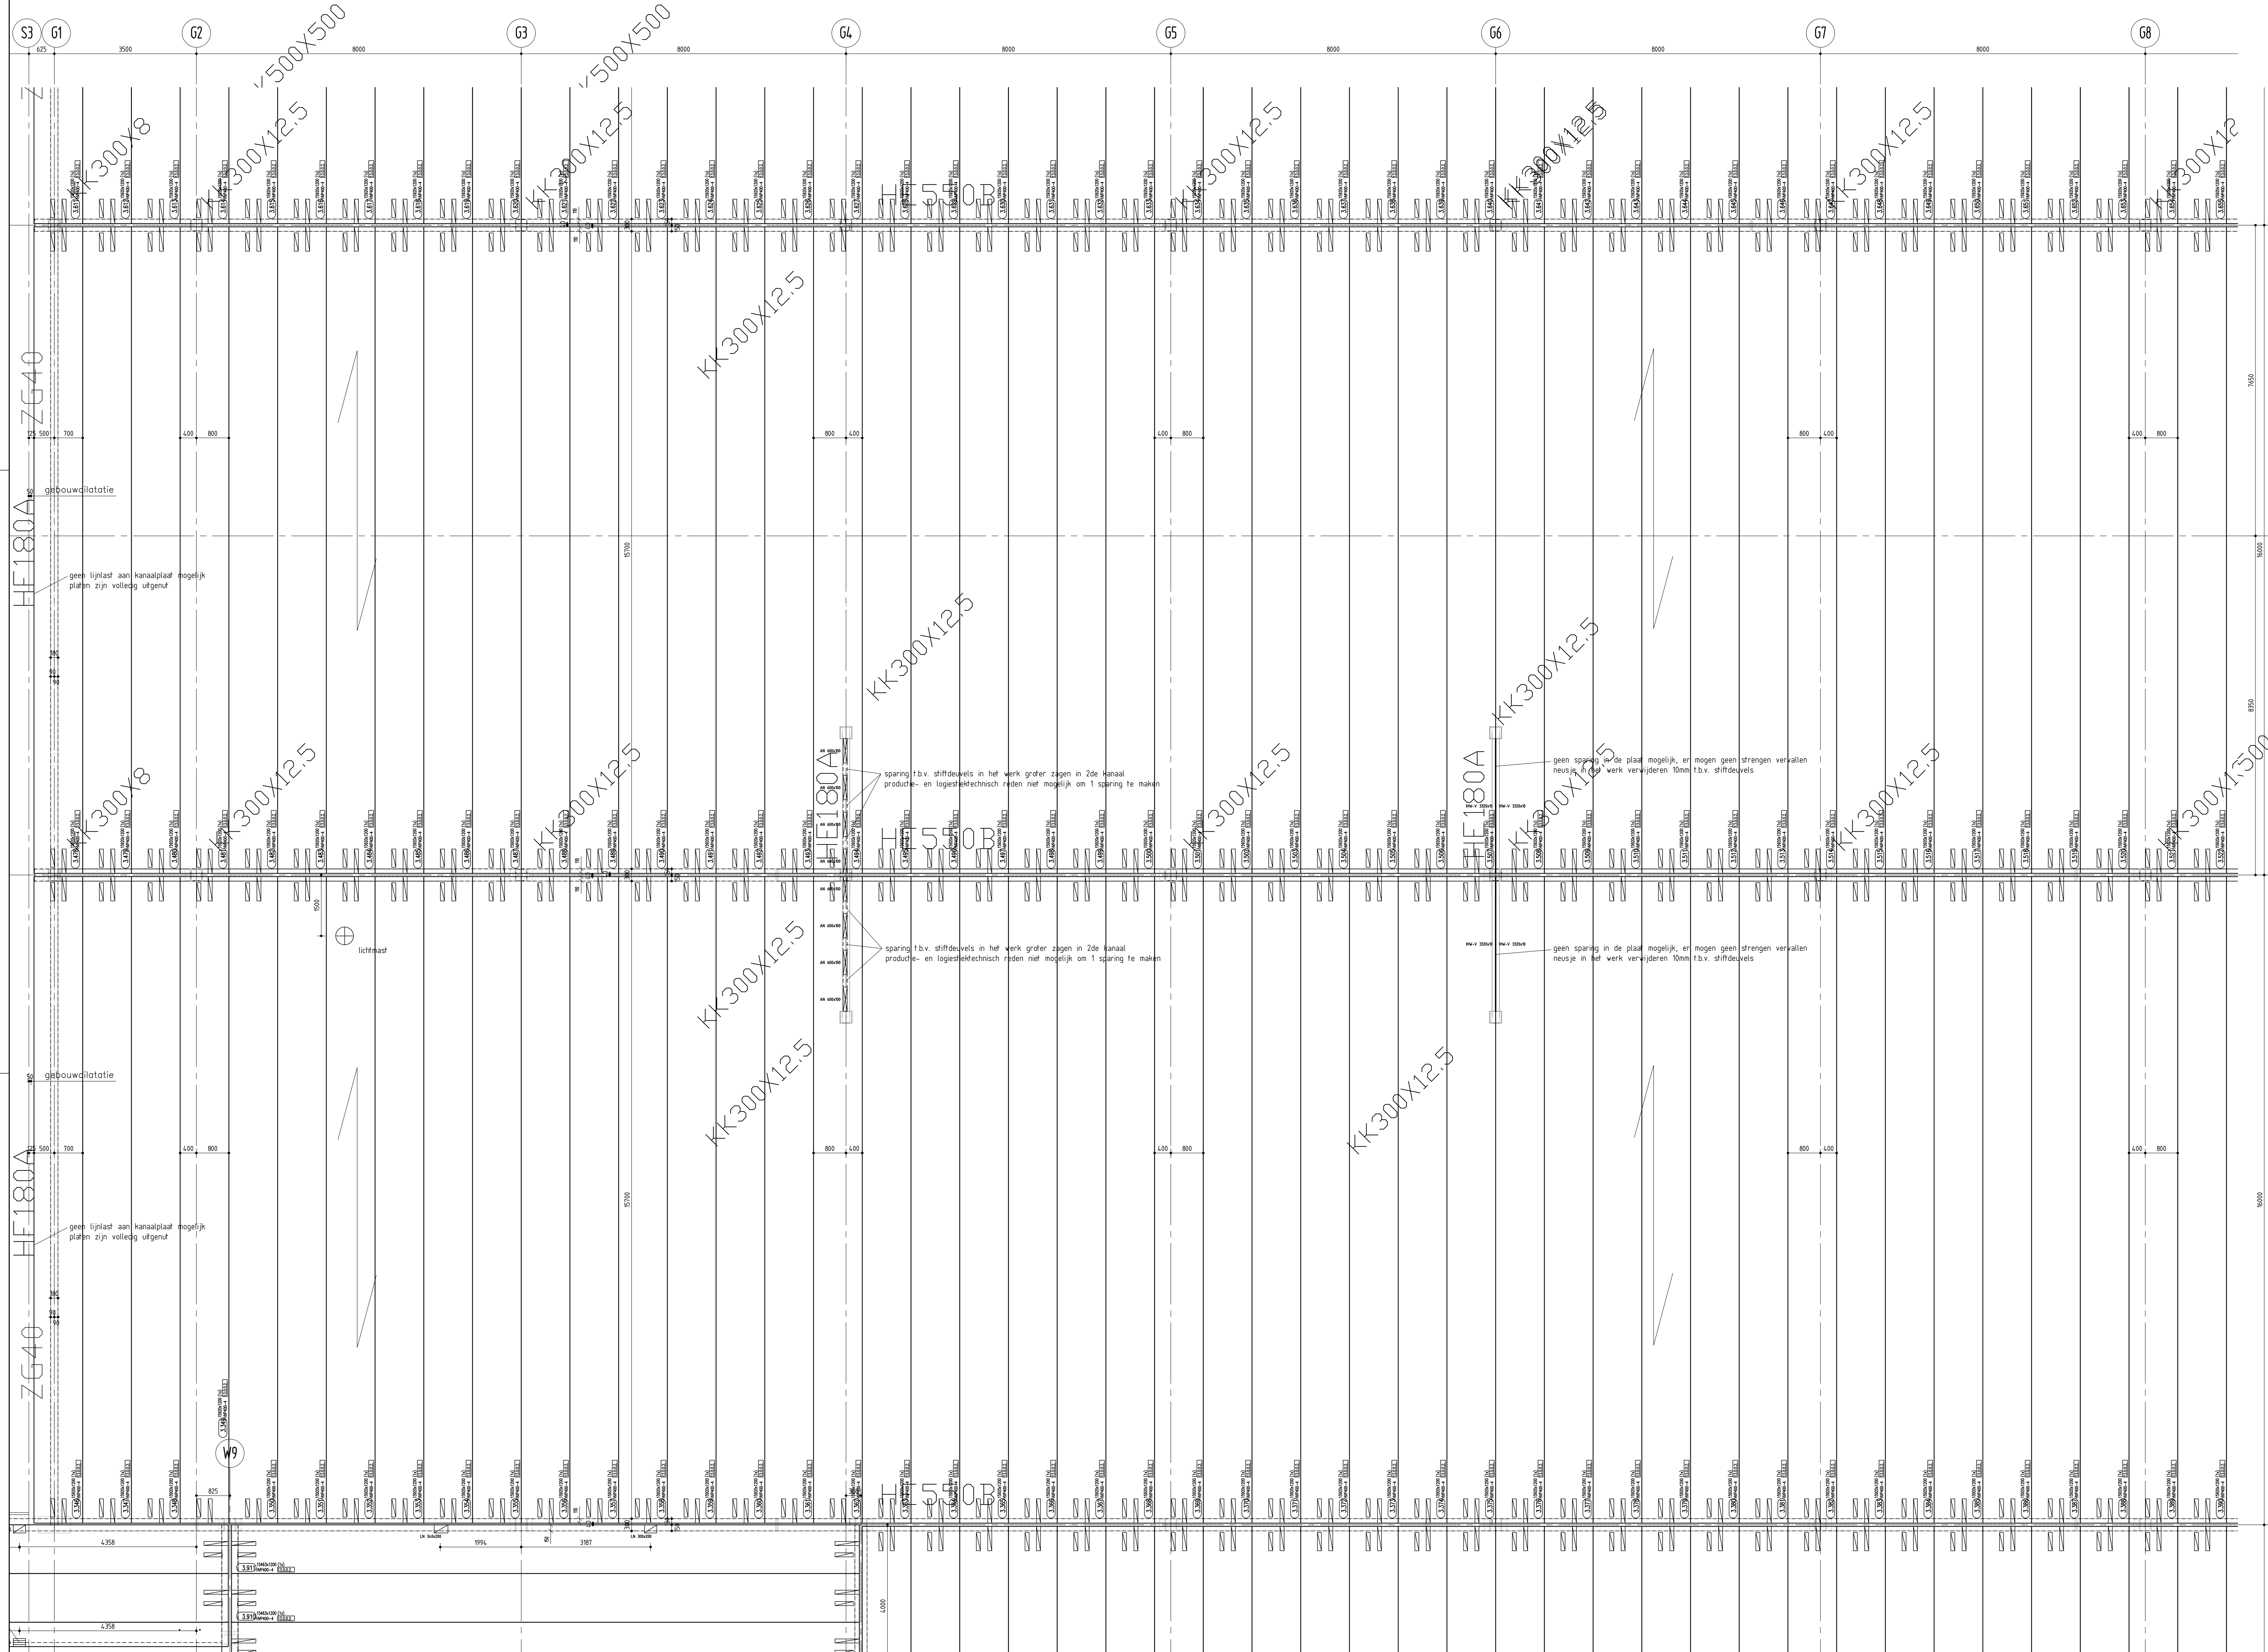


Uitgangspunten:

veiligheidsklasse : 3
milieuklasse : XC3
sterkteklasse : HVP C50/60, druklaag C28/35
eis m.b.t. brandwerendheid : geen eis

Belasting op vloerveld:

e.g. HVP400 : 4.67 kN/m²
druklaag 120 mm : 2.88 kN/m²
extra ballast / afwerking : 1.15 kN/m²
veranderlijke belasting : 5.00 kN/m² (ψ = 0.25)

Algemeen:

In de uitgangspunten van de opdracht van de levering van de HVP 400 voor niveau V1 is het volgende uitgangspunt gehanteerd.
Bij de theoretische benadering voldoet de toepassing van de HVP-400 in combinatie met een veranderlijke belasting van 5.00 kN/m² niet aan de trillingseis van 5 Hrtz. Door u uitgevoerde praktijkproeven laten echter een gunstiger resultaat zien. Het is aan u om te beoordelen of het resultaat van de praktijkproeven binnen de grens van de beoogde trillingsfrequentie blijft.

Lijn- en/of puntlasten:

Bouwfase:

n.v.t. (geen belasting t.g.v. onderstempelingsfase bovenliggende vloer gerekend).

ondersteuning aan kolom benodigd

Druklaagwapening ihw te storten delen vlgs opgave hoofdconstructeur

In het werk te boren sparingen door en voor rekening aannemer.

sparingen maximaal 2 ø 200 en alleen in hart kanaal.
grotere sparingen of die op een streng komen uitsluitend na overleg overleg met constructeur BetonSon.

HVP400-4


HVP-400-4

STANDAARD PASPLATEN HVP320-4Z/400-4Z:

WAPENING ALGEMEEN:

DIAMETER:		
= draad	ø 5,0	FeP 1770
= streng	ø 9,3	FeP 1860
= streng	ø 12,5	FeP 1860


EIS BRANDWERENDHEID: 30 minuten

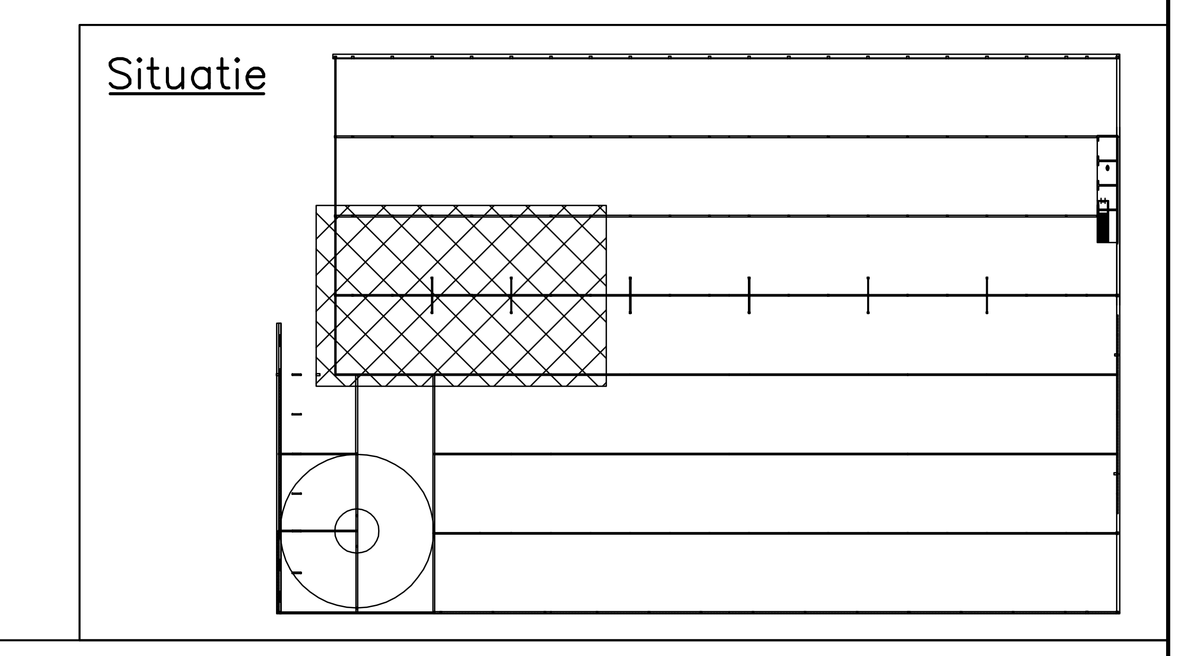

Situatie

HIJSVOORZIENING

Ten behoeve van het veilig hijsen brengt Betonson in de 150 / 200 dikke vloeren in alle platen hijsogen aan en in de 260 / 320 / 400 dikke vloeren in de pasplaten en platen met grote hoeksparingen hijssleutelsparingen aan.

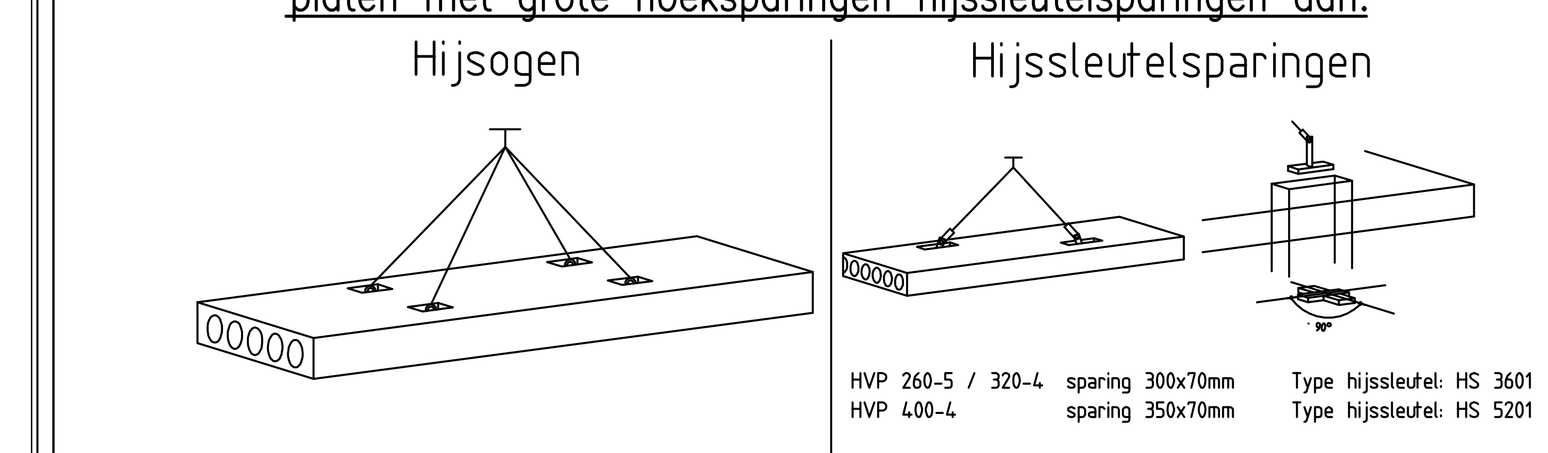

Hijsen met standaard viersprong

Levering hijssleutels door en voor rekening aannemer

MONTAGE VOORSCHRIFT: (Zie tevens de verwerkingsvoorschriften)

STANDAARD PLAAT = merkkaart
Doorsneden aanzicht

PASPLAAT
Ruwe zijde (geen vellingkant)
Doorsneden aanzicht
Standaard vellingkant

MONTEREN AAN DE HAND VAN MERKKAART
HIJSEN: MAXIMALE OVERSTEK 1250mm.

ONTWATERING

Om water- en/of vorstschade, ten gevolge van in het kanaal verzameld water, te voorkomen dient u ontwateringsgaatjes op hun werking te controleren en deze zonodig open te maken.
Ter plaatse van kanaaldelen welke als gevolg van in het werk aangestorte sparingen afgesloten worden dient u in het werk een ontwateringsgaatje aan te brengen. (b.v. tussen aangestorte hamerkop-, hijsvoorziening-, sleufsparingen etc)
Alle ontwateringsgaatjes openhouden tot het tijdstip waarop er geen water meer in de kanalen kan komen.

PLAATMERK:

1.20 5100x1200 (1x) HVP150-11L 0.4.0.0.
Afmeting plaat (lengte x breedte)
(Aantal maal uitvoeren)
Wapeningspatroon
Plaattype

Ref. punt waar maatvoering naar verwijst
Afstand tot Ref. punt
Type aanduiding sparing
Referentie punt

SPARINGEN:

Sparingen:
ø 50 (R2)
ø 80 (R3)
ø 100 (R4)
ø 150 (R5)
hijsoog (HO)
doorgaande sparing (AN, TR)
loze sparing (LN, SL)
in het werk te maken sparing (IHW-V)
in het werk te maken sparing (IHW-R)
Elektradozen:
Rond 8xø16/19 bovenaansluitingen (E10)


RENVOOI:

	In het werk te storten door aannemer (wapening vlgs. tek/berek. hoofdconstr.)
	Metselwerk, lijnlast op vloer > 3kN/m1
	Lichte scheidingswanden geen lijnlast op vloer.
	Langsnokken 300 x 90 mm

Toleranties in mm (NEN 2889)

Platen			Sparingen		
Lengte	+28	-28	Afmeting (rond)	+15	-15
Breedte (standaard)	+12	-12	Plaats (rond)	+30	-30
Breedte (pasplaat)	+20	-20	Afmeting (rechthoekig)	+40	-40
Dikte	+12	-12	Plaats (rechthoekig)	+30	-30

DOORSNEDE TOEGEPASTE VLOERTYPE(S)

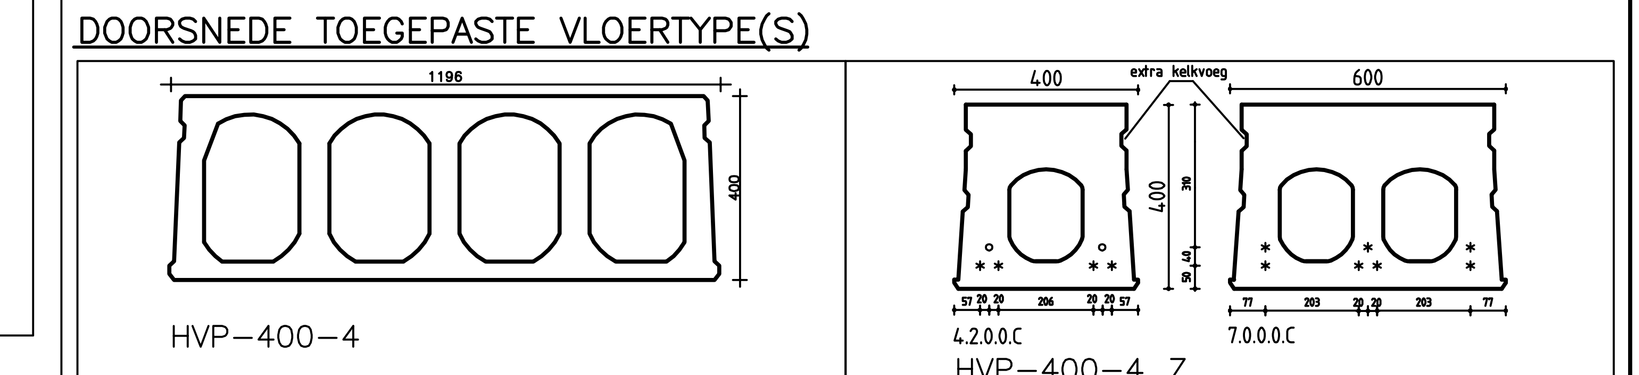

Ontwateringsgaatjes : Nee
Opruwen : Ja, i.v.m. gewapende druklaag
Milieuklasse : XC1
Sterkteklasse : C53/65
Sterktekl. druklaag min.: C20/25
Isolatie : , mm

Engineering werkzaamheden conform categorie 4, criteria 73
Opmerkingen:

RAVEELCONSTRUCTIES (VERZINKT)			
TYPE	AANTAL	TYPE	AANTAL

Ophangelementen:

Totaal vloeropp.	:	17974.28 m²
HVP-400-4	:	17908.75 m²
HVP-400-4_Z	:	65.53 m²
	:	m²
	:	m²
	:	m²

Project: IKEA UTRECHT
Onderdeel: Veld V1 (5700+P)(fase 3, as G1 t/m G8 - GD t/m GF)

Status: **DEFINITIEF**

Project nr: 23140 — Tekening nr: H03J

Getekend:	Datum:	Schaal: 1: 50
A T.Jansen	3-7-12	Legplan
B T.Jansen	28-8-12	Legplan+sparingen
C M.Teeuwen	17-9-12	Definitief

Tekenaar: T.Jansen, Tel: 0499-486393
Constructeur: J.Reitsma, Tel: 0499-486363
Gezien:

Opdrachtgever Betonson: ASK Romein Bouw B.V., Postbus 1732, 4700 BS ROOSENDAAL, 0165 - 750300
Hoofdconstructeur: CAE Nederland BV, Postbus 9358, 3007 AJ Rotterdam, 010 - 4471744

betonson systeemvloeren
