
Gelatinebrug - Schieoevers

9-9-2026

Id	Sc	% voltooid	Projecten	Start	Gereed	Duur	Voorafgaande taken	Opvolgende taken
1	0	21%	**1 I10015-100 - Gelatinebrug - Schieoevers**	1-2-2024	2-11-2033	492 wkn		
2	0	100%	**1.1 Initiatieffase (Gemeente)**	1-2-2024	6-2-2026	103,4 wkn		
3	0	100%	**1.1.1 Project start up / voorbereiden aanbesteding**	1-2-2024	6-2-2026	103,4 wkn		
4	0	100%	1.1.1.1 Opstart nieuw projectteam P&P	1-2-2024	1-2-2024	0 wkn		5
5	0	100%	1.1.1.2 Maatwerk afspraken met MRDH voorbereiden	20-6-2024	29-1-2025	32 wkn	4	8;6
6	0	100%	1.1.1.3 Intern projectteam vorming realisatie: SO + PvE	16-12-2024	6-2-2026	58 wkn	5	15
7	0	100%	**1.1.1.4 B&W traject - Maatwerk afspraak met MRDH**	29-1-2025	27-5-2025	16,63 wkn		
8	0	100%	1.1.1.4.1 Aanleveren stukken WHO / woe.	29-1-2025	29-1-2025	1 uur	5	9
9	0	100%	1.1.1.4.2 WHO - waarna stukken in procedure kunnen t.b.v. digitale paraaf ma.	3-2-2025	24-2-2025	25 uur	8	10
10	0	100%	1.1.1.4.3 Eventueel aanpassen stuk dinsdag voor 17.00 in route	24-2-2025	1-4-2025	5,25 wkn	9	11
11	0	100%	1.1.1.4.4 Laatste paraaf op woensdag voor 17.00 -> BPO	2-4-2025	23-4-2025	25 uur	10	12
12	0	100%	1.1.1.4.5 Behandeling in B&W op dinsdag - Maatwerkafspraak MRDH	6-5-2025	27-5-2025	25 uur	11	15
13	0	66%	**1.2 Definitiefase (Gemeente)**	9-2-2026	26-2-2027	53 wkn		
14	0	96%	**1.2.1 Programma van Eisen - Klanteisspecificatie (KES)**	9-2-2026	1-10-2026	33,7 wkn		
15	0	100%	1.2.1.1 Voorbereiden Klanteisspecificatie (KES)	9-2-2026	6-3-2026	4 wkn	6;12	16;50
16	0	100%	1.2.1.2 KES c0.1	6-3-2026	6-3-2026	0 wkn	15	18;19
17	0	100%	**1.2.1.3 Delen/input ophalen KES c0.1**	9-3-2026	15-4-2026	5,5 wkn		
18	0	100%	1.2.1.3.1 Input ophalen PZH (Technisch + Omgeving)	9-3-2026	3-4-2026	1 mnd	16	20
19	0	100%	1.2.1.3.2 Input ophalen TU-Delft (Technisch + Omgeving)	9-3-2026	3-4-2026	1 mnd	16	20
20	0	100%	1.2.1.3.3 Verwerken input PZH en TU-Delft	6-4-2026	15-4-2026	1,5 wkn	18;19	21
21	0	100%	1.2.1.3.4 KES c1.0	15-4-2026	15-4-2026	0 wkn	20	57BE+1 wk;24
22	0	100%	**1.2.1.4 KOR toets KES c1.0**	11-5-2026	17-6-2026	5,5 wkn		
23	0	100%	1.2.1.4.1 Indienen KES c1.0 bij KOR	11-5-2026	11-5-2026	1 uur	24BE-1,5 wkn	
24	0	100%	1.2.1.4.2 KOR Informatiesessie	20-5-2026	20-5-2026	1 dag	21	25;23BE-1,5 wkn
25	0	100%	1.2.1.4.3 Review KOR op KES c1.0	21-5-2026	3-6-2026	2 wkn	24	26
26	0	100%	1.2.1.4.4 Reacties verwerken KOR & Advies en beleid	4-6-2026	17-6-2026	2 wkn	25	42BE+4 dagen;28
27	0	100%	**1.2.1.5 Ruimtelijk Programma van Eisen (RPVE)**	2-6-2026	30-7-2026	8,5 wkn		
28	0	100%	1.2.1.5.1 Afspraak met JAM	2-6-2026	2-6-2026	4 uur	26	29BE+2 wkn;35BE+6 dagen
29	0	100%	1.2.1.5.2 RPVE (concept definitief)	16-6-2026	16-6-2026	0 wkn	28BE+2 wkn	30BE+4 wkn
30	0	100%	1.2.1.5.3 Qteam	15-7-2026	15-7-2026	2 uur	29BE+4 wkn	31BE+1 dag
31	0	100%	1.2.1.5.4 AOK	16-7-2026	16-7-2026	2 uur	30BE+1 dag	32
32	0	100%	1.2.1.5.5 Verwerken review	16-7-2026	30-7-2026	2 wkn	31	33
33	0	100%	1.2.1.5.6 RPVE definitief	30-7-2026	30-7-2026	0 wkn	32	63
34	0	86%	**1.2.1.6 Omgevingsdocument**	10-6-2026	18-9-2026	14,4 wkn		
35	0	100%	1.2.1.6.1 Insiders	10-6-2026	10-6-2026	0 wkn	28BE+6 dagen	36BE+2 wkn
36	0	100%	1.2.1.6.2 Outsiders	24-6-2026	24-6-2026	0 wkn	35BE+2 wkn	37BE+17 dagen
37	0	100%	1.2.1.6.3 Omgevingsdocument (Definitief concept)	17-7-2026	17-7-2026	0 wkn	36BE+17 dagen	38
38	0	100%	1.2.1.6.4 Reactie op definitief concept	17-7-2026	4-9-2026	7 wkn	37	39
39	0	35%	1.2.1.6.5 Verwerken review	4-9-2026	18-9-2026	2 wkn	38	40
40	0	0%	1.2.1.6.6 Omgevingsdocument definitief	18-9-2026	18-9-2026	0 wkn	39	63;48BE+9 dagen
41	0	100%	**1.2.1.7 Honorering sessie**	24-6-2026	23-7-2026	4,22 wkn		
42	0	100%	1.2.1.7.1 Honorering sessie	24-6-2026	24-6-2026	1 dag	26BE+4 dagen	43
43	0	100%	1.2.1.7.2 Reacties verwerken KES c2.0	25-6-2026	22-7-2026	4 wkn	42	44
44	0	100%	1.2.1.7.3 KES d1.0	22-7-2026	22-7-2026	0 wkn	43	45
45	0	100%	1.2.1.7.4 KES d1.0 delen met stakeholders (intern en extern)	23-7-2026	23-7-2026	1 uur	44	46
46	0	100%	1.2.1.7.5 Programma van Eisen gereed (KES d1.0)	23-7-2026	23-7-2026	0 wkn	45	93;63;221
47	0	0%	**1.2.1.8 Technische sessie Gemeenteraad**	1-10-2026	1-10-2026	0 wkn		
48	0	0%	1.2.1.8.1 Raadsinformatiesessie RPVE + Omgevingsdocument	1-10-2026	1-10-2026	0 wkn	40BE+9 dagen	63
49	0	93%	**1.2.2 Contractdocumenten - Ontwerpende partij**	9-3-2026	23-9-2026	28,6 wkn		
50	0	100%	1.2.2.1 Aanbestedingsstrategie opstellen	9-3-2026	3-4-2026	4 wkn	15	51
51	0	100%	1.2.2.2 Contractdocumenten opstellen	6-4-2026	28-8-2026	21 wkn	50	52
52	0	80%	1.2.2.3 Reviewperiode contractdocumenten	31-8-2026	11-9-2026	2 wkn	51	53
53	0	0%	1.2.2.4 Verwerken review contractdocumenten	14-9-2026	23-9-2026	8 dagen	52	54
54	0	0%	1.2.2.5 Contractdocumenten gereed	23-9-2026	23-9-2026	0 wkn	53	63
55	0	4%	**1.2.3 Openbare procedure (europees) - Ontwerpende partij**	20-5-2026	26-2-2027	38,48 wkn		
56	0	100%	**1.2.3.1 B&W traject - Start Europese aanbesteding**	20-5-2026	9-6-2026	2,7 wkn		
57	0	100%	1.2.3.1.1 Aanleveren stukken PHO / woe.	20-5-2026	20-5-2026	1 uur	21BE+1 wk	58
58	0	100%	1.2.3.1.2 PHO - waarna stukken in procedure kunnen t.b.v. digitale paraaf ma.	25-5-2026	25-5-2026	1 uur	57	59
59	0	100%	1.2.3.1.3 Eventueel aanpassen stuk dinsdag voor 17.00 in route	25-5-2026	1-6-2026	1 wk	58	60
60	0	100%	1.2.3.1.4 Laatste paraaf op woensdag voor 17.00 -> BPO	3-6-2026	3-6-2026	1 uur	59	61
61	0	100%	1.2.3.1.5 Behandeling in B&W op dinsdag - Start EA ontwerpende partij	9-6-2026	9-6-2026	1 uur	60	63
62	0	0%	**1.2.3.2 Gunningfase**	1-10-2026	26-2-2027	19,3 wkn		
63	0	0%	1.2.3.2.1 Publicatie (via het aanbestedingsplatform Mercell)	1-10-2026	1-10-2026	0 dagen	46;61;54;33;40;48	64BE+9 dagen
64	0	0%	1.2.3.2.2 Uiterste datum aanmelden presentatie	14-10-2026	15-10-2026	1 dag	63BE+9 dagen	65
65	0	0%	1.2.3.2.3 Inlichtingenbijeenkomst op locatie	15-10-2026	16-10-2026	1 dag	64	66BE+4 dagen
66	0	0%	1.2.3.2.4 Deadline aanvragen individuele inlichtingenronde	22-10-2026	22-10-2026	0 wkn	65BE+4 dagen	67BE+8 dagen
67	0	0%	1.2.3.2.5 Individuele inlichtingenronde	3-11-2026	6-11-2026	3 dagen	66BE+8 dagen	68BE+7 dagen
68	0	0%	1.2.3.2.6 Uiterste datum inleveren vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen	17-11-2026	17-11-2026	0 dagen	67BE+7 dagen	69BE+4 dagen
69	0	0%	1.2.3.2.7 Publicatie Nota van Inlichtingen	23-11-2026	23-11-2026	0 vdagen	68BE+4 dagen	70BE+7 dagen
70	0	0%	1.2.3.2.8 Uiterste datum ontvangst Inschrijvingen	2-12-2026	2-12-2026	0 dagen	69BE+7 dagen	79BE+50 dagen;71
71	0	0%	1.2.3.2.9 Beoordelingsperiode	2-12-2026	23-12-2026	3 vwkn	70	72
72	0	0%	1.2.3.2.10 Verificatiegesprek na consensus overleg	23-12-2026	13-1-2027	5 dagen	71	73BE+11 dagen
73	0	0%	1.2.3.2.11 Streefdatum verzenden gunningsvoornemen en afwijzingsbrieven	28-1-2027	29-1-2027	1 dag	72BE+11 dagen	74
74	0	0%	1.2.3.2.12 Standstill-termijn (20 kalenderdagen)	29-1-2027	20-2-2027	22 vdagen	73	75

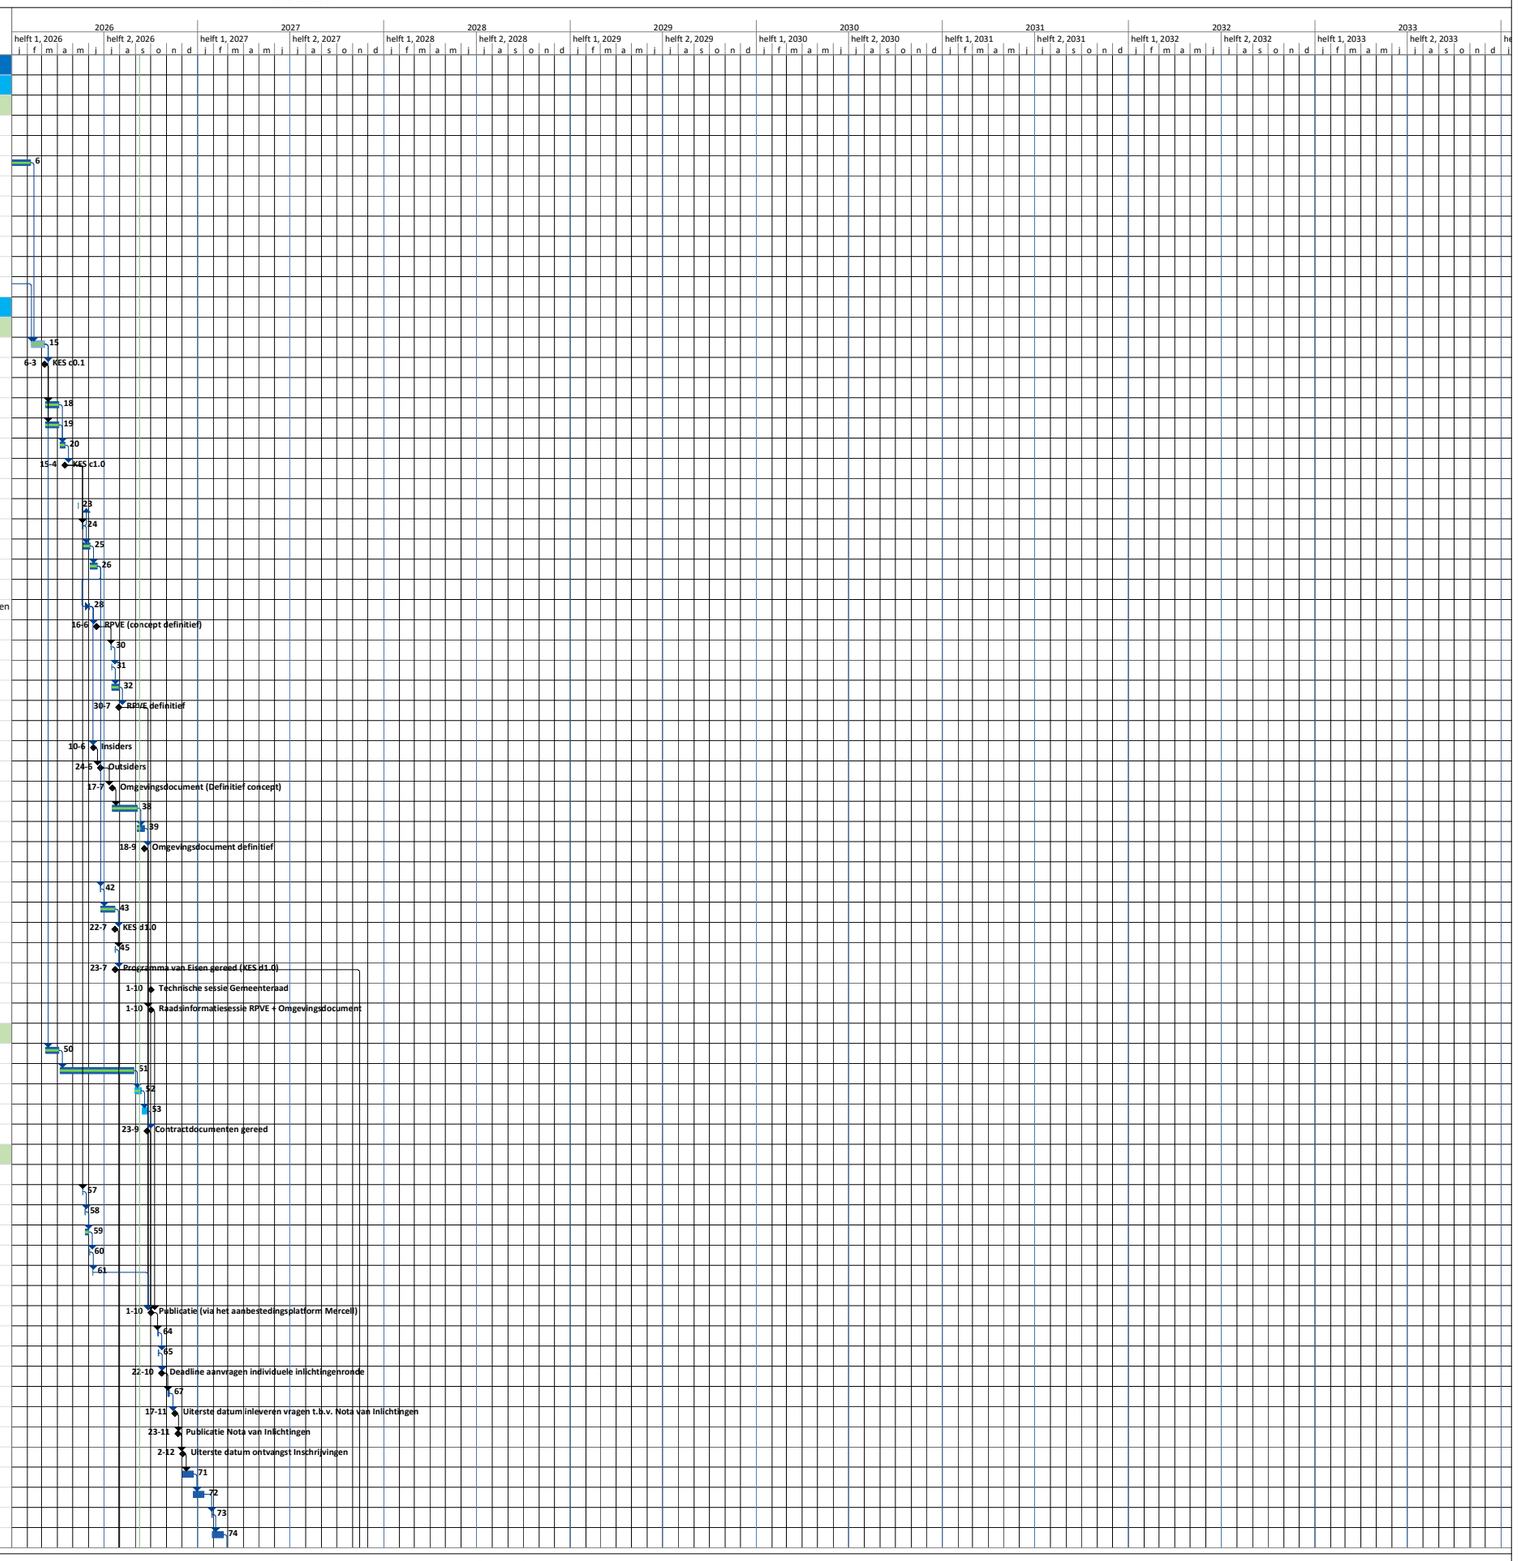


Project: Sjabloon projectplanning
Date: 9-9-2026

Split
Rolled Up Inactief
Inactief
Rolled Up Initiatief
Initiatief
Rolled up definitie
definitie
Rolled Up Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase
Rolled Up Ontwerp
Ontwerp
Rolled Up Vergunning
Vergunning
Rolled Up Aanbesteding
Aanbesteding
Rolled Up Realisatiefase
Realisatiefase
Ingebruikname
Rolled up Risicobuffer
Risicobuffer
Rolled Up Nazorgfase
Nazorgfase
Rolled Up Progress
Progress
Mijlpaal
Deadline

Gelatinebrug - Schieoevers

9-9-2026

Id	Sch	% voltooid	Projecten	Start	Gereed	Duur	Voorafgaande taken	Opvolgende taken
75	0	0%	1.2.3.2.13 Verzenden definitieve gunning	20-2-2027	20-2-2027	0 dagen	74	76BE+5 dagen
76	0	0%	1.2.3.2.14 Streefdatum ondertekening Overeenkomst	26-2-2027	26-2-2027	0 vdagen	75BE+5 dagen	77
77	0	0%	1.2.3.2.15 Datum geschatte eerste Opdracht/ingangsdatum	26-2-2027	26-2-2027	0 dagen	76	80BE+48 dagen;78
78	0	0%	1.2.3.2.16 Gunningsfase gereed	26-2-2027	26-2-2027	0 dagen	77	93;83BE+1 wk
81	0	0%	**1.3 Ontwerp en voorbereidingsfase (Gemeente + IB)**	8-3-2027	3-4-2030	154,6 wkn		
82	0	0%	**1.3.1 Schetsontwerp**	8-3-2027	5-11-2027	35 wkn		
83	0	0%	1.3.1.1 PSU	8-3-2027	12-3-2027	1 wk	78BE+1 wk	84
84	0	0%	1.3.1.2 Toetsing op tegenstrijdigheden en integraliteit KES d1.0 door IB	15-3-2027	7-5-2027	8 wkn	83	85
85	0	0%	1.3.1.3 Honeringssessie KES d1.1	10-5-2027	21-5-2027	2 wkn	84	86
86	0	0%	1.3.1.4 Opstellen schetsontwerp + System Reqiurement Specification (SRS - 40%)	24-5-2027	10-9-2027	16 wkn	85	87GE;88
87	0	0%	1.3.1.5 Raming schetsontwerp	16-8-2027	10-9-2027	4 wkn	86GE	88
88	0	0%	1.3.1.6 Reviewperiode Schetsontwerp (KES d2.0)	13-9-2027	8-10-2027	4 wkn	86;87	89;222
89	0	0%	1.3.1.7 Verwerken review Schetsontwerp	11-10-2027	5-11-2027	4 wkn	88	90
90	0	0%	1.3.1.8 Schetsontwerp gereed	5-11-2027	5-11-2027	0 wkn	89	92
91	0	0%	**1.3.2 Voorlopig ontwerp**	8-11-2027	27-6-2028	31,2 wkn		
92	0	0%	1.3.2.1 PFU	8-11-2027	12-11-2027	1 wk	90	93
93	0	0%	1.3.2.2 Opstellen voorlopig ontwerp + System Reqiurement Specification (SRS - 70%)	15-11-2027	3-4-2028	18 wkn	46;78;92	94GE;95;101;102;103;104;1
94	0	0%	1.3.2.3 Raming voorlopig ontwerp	7-3-2028	3-4-2028	4 wkn	93GE	95;113
95	0	0%	1.3.2.4 Reviewperiode Voorlopig Ontwerp	4-4-2028	1-5-2028	4 wkn	93;94	96;125
96	0	0%	1.3.2.5 Verwerken review Voorlopig Ontwerp	2-5-2028	29-5-2028	4 wkn	95	97
97	0	0%	1.3.2.6 Voorlopig ontwerp gereed	26-6-2028	26-6-2028	0 wkn	96;105;101;102;103;104	223;98
98	0	0%	1.3.2.7 Subsidieaanvraag MRDH op basis van maatwerkafspraken	27-6-2028	27-6-2028	1 dag	97	113
99	0	0%	**1.3.3 Conditionering**	4-4-2028	3-4-2030	100,6 wkn		172
100	0	0%	**1.3.3.1 Uitvoeren onderzoeken VO**	4-4-2028	26-6-2028	12 wkn		
101	0	0%	1.3.3.1.1 Terrein Inmeting 3D	4-4-2028	29-5-2028	2 mndn	93	97
102	0	0%	1.3.3.1.2 Bodem en milieu incl. booronderzoek (zeefkromme)	4-4-2028	26-6-2028	3 mndn	93	97
103	0	0%	1.3.3.1.3 Quickscan Flora en Fauna	4-4-2028	1-5-2028	1 mnd	93	97
104	0	0%	1.3.3.1.4 Boom effecten analyse (SO)	4-4-2028	29-5-2028	2 mndn	93	97
105	0	0%	1.3.3.1.5 Verkeers- en parkeer telling	4-4-2028	29-5-2028	2 mndn	93	97
106	0	0%	**1.3.3.2 Uitvoeren onderzoeken DO**	1-6-2029	3-4-2030	42 wkn		
107	0	0%	1.3.3.2.1 Proefsleuvenonderzoek	1-6-2029	23-8-2029	3 mndn	166	170
108	0	0%	1.3.3.2.2 Verhardingsadvies	1-6-2029	26-7-2029	2 mndn	166	170
109	0	0%	1.3.3.2.3 Trillingsonderzoek (optioneel)	1-6-2029	28-6-2029	1 mnd	166	170
110	0	0%	1.3.3.2.4 Boom effecten analyse (DO)	7-3-2030	3-4-2030	1 mnd	170;187	173
111	0	0%	**1.3.4 Besluitvormingstraject - Investeringsbesluit**	28-6-2028	12-10-2028	15,43 wkn		
112	0	0%	**1.3.4.1 B&W traject - Investeringsbesluit**	28-6-2028	22-8-2028	7,83 wkn		
113	0	0%	1.3.4.1.1 Aanleveren stukken PHO / woe.	28-6-2028	28-6-2028	1 uur	94;98	114;131GB
114	0	0%	1.3.4.1.2 PHO - waarna stukken in procedure kunnen t.b.v. digitale paraaf ma.	3-7-2028	3-7-2028	1 uur	113	115
115	0	0%	1.3.4.1.3 Eventueel aanpassen stuk dinsdag voor 17.00 in route	3-7-2028	10-7-2028	1 wk	114	116
116	0	0%	1.3.4.1.4 Laatste paraaf op woensdag voor 17.00 -> BPO	12-7-2028	12-7-2028	1 uur	115	117
117	0	0%	1.3.4.1.5 Behandeling in B&W op dinsdag - Investeringsbesluit	22-8-2028	22-8-2028	1 uur	116	119BE+3 dagen
118	0	0%	**1.3.4.2 Raadstraject - Investeringsbesluit**	25-8-2028	12-10-2028	7 wkn		
119	0	0%	1.3.4.2.1 Aanlevering bij de griffie	25-8-2028	25-8-2028	0 uur	117BE+3 dagen	120BE+2 wkn
120	0	0%	1.3.4.2.2 Datum procedurevergadering	8-9-2028	8-9-2028	0 wkn	119BE+2 wkn	121BE+3 wkn
121	0	0%	1.3.4.2.3 Datum commissie vergadering	29-9-2028	29-9-2028	0 uur	120BE+3 wkn	122BE+2 wkn
122	0	0%	1.3.4.2.4 Gemeenteraad behandeling - Investeringsbesluit	12-10-2028	12-10-2028	0 wkn	121BE+2 wkn	123;149
123	0	0%	1.3.4.2.5 GO/NO GO moment	12-10-2028	12-10-2028	0 wkn	122	149
124	0	0%	**1.3.5 UAV-GC Bouwteamcontract opstellen**	2-5-2028	28-8-2028	17 wkn		
125	0	0%	1.3.5.1 Contractdocumenten opstellen	2-5-2028	24-7-2028	12 wkn	95	126
126	0	0%	1.3.5.2 Reviewperiode contractdocumenten	25-7-2028	7-8-2028	2 wkn	125	127
127	0	0%	1.3.5.3 Verwerken review contractdocumenten	8-8-2028	28-8-2028	3 wkn	126	128
128	0	0%	1.3.5.4 Contractdocumenten gereed	28-8-2028	28-8-2028	0 wkn	127	149
129	0	0%	**1.3.6 Openbare procedure (europees) - twee-fasen-contract**	28-6-2028	22-2-2029	32,4 wkn		
130	0	0%	**1.3.6.1 B&W traject - Start EA Gelantinebrug**	28-6-2028	22-8-2028	7,83 wkn		
131	0	0%	1.3.6.1.1 Aanleveren stukken PHO / woe.	28-6-2028	28-6-2028	1 uur	113GB	132
132	0	0%	1.3.6.1.2 PHO - waarna stukken in procedure kunnen t.b.v. digitale paraaf ma.	3-7-2028	3-7-2028	1 uur	131	133
133	0	0%	1.3.6.1.3 Eventueel aanpassen stuk dinsdag voor 17.00 in route	3-7-2028	10-7-2028	1 wk	132	134
134	0	0%	1.3.6.1.4 Laatste paraaf op woensdag voor 17.00 -> BPO	12-7-2028	12-7-2028	1 uur	133	135
135	0	0%	1.3.6.1.5 Behandeling in B&W op dinsdag - Start EA Gelantinebrug	22-8-2028	22-8-2028	1 uur	134	137;149BE+1 wk
148	0	0%	**1.3.6.3 Gunningfase**	12-10-2028	22-2-2029	16,98 wkn		
149	0	0%	1.3.6.3.1 Uitnodiging tot inschrijving	12-10-2028	13-10-2028	1 dag	147;135BE+1 wk;128;122;1	150
150	0	0%	1.3.6.3.2 Uiterste datum voor indienen vragen	13-10-2028	17-11-2028	5 wkn	149	151
151	0	0%	1.3.6.3.3 Beantwoorden vragen	17-11-2028	17-11-2028	0 dagen	150	152
152	0	0%	1.3.6.3.4 Termijn indienen inschrijving	17-11-2028	27-12-2028	40 vdagen	151	153
153	0	0%	1.3.6.3.5 Inschrijvingen binnen	27-12-2028	27-12-2028	0 dagen	152	154
154	0	0%	1.3.6.3.6 Inschrijvingen beoordelen	8-1-2029	12-1-2029	1 wk	153	155GE
155	0	0%	1.3.6.3.7 Consensusoverleg	12-1-2029	12-1-2029	1 dag	154GE	156
156	0	0%	1.3.6.3.8 Klick gesprek	15-1-2029	19-1-2029	1 wk	155	157
157	0	0%	1.3.6.3.9 Opstellen gunningsadvies	22-1-2029	26-1-2029	1 wk	156	158
158	0	0%	1.3.6.3.10 Besluitvorming gunning	29-1-2029	1-2-2029	4 dagen	157	159
159	0	0%	1.3.6.3.11 Bekendmaking besluit voorlopige gunning	2-2-2029	2-2-2029	1 dag	158	160
160	0	0%	1.3.6.3.12 Bezwaartermijn	2-2-2029	22-2-2029	20 vdagen	159	161
161	0	0%	1.3.6.3.13 Definitieve gunning / contracteren	22-2-2029	22-2-2029	0 dagen	160	162
162	0	0%	1.3.6.3.14 Gunningsfase gereed	22-2-2029	22-2-2029	0 dagen	161	165

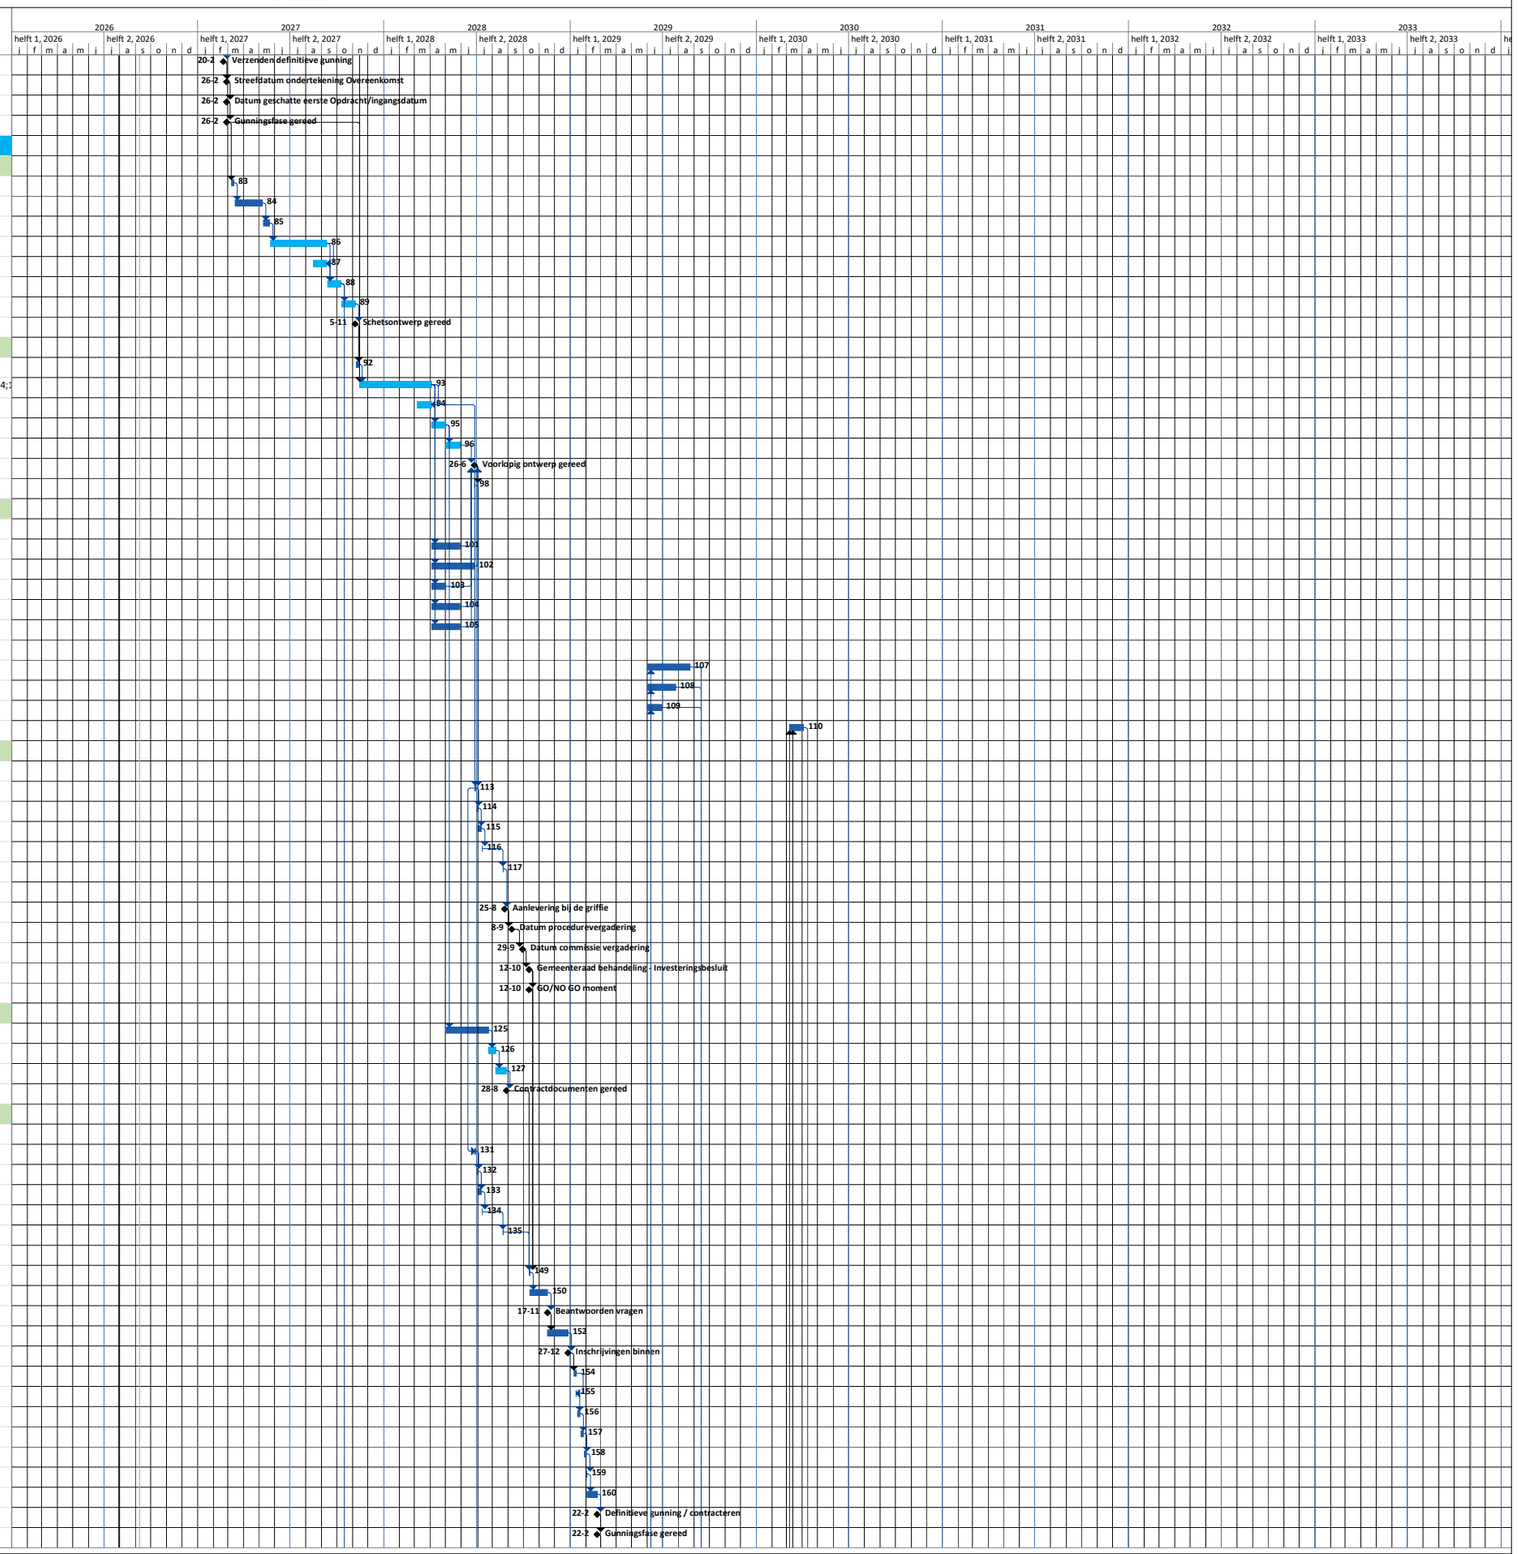


Project: Sjabloon projectplanning
Date: 9-9-2026

Split	Rolled Up Initiatief	definitie	Rolled Up Ontwerp	Vergunning	Rolled Up Realisatiefase	Rolled up Risicobuffer	Nazorgfase	Mijlpaal
Rolled Up Inactief	Initiatief	Rolled Up Voorbereidingsfase	Ontwerp	Rolled Up Aanbesteding	Realisatiefase	Risicobuffer	Rolled Up Progress	Deadline
Inactief	Rolled up definitie	Voorbereidingsfase	Rolled Up Vergunning	Aanbesteding	Ingebruikname	Rolled Up Nazorgfase	Progress	

Gelatinebrug - Schieoevers

9-9-2026

Id	Sch	% voltooid	Projecten	Start	Gereed	Duur	Voorafgaande taken	Opvolgende taken
163	0	0%	**1.4 Bouwteamfase (Gemeente + IB + Aannemer)**	23-2-2029	4-9-2030	78 wkn		
164	0	0%	**1.4.1 Definitief ontwerp**	23-2-2029	20-9-2029	30 wkn		
165	0	0%	1.4.1.1 PFU	23-2-2029	8-3-2029	2 wkn	162	166
166	0	0%	1.4.1.2 Opstellen definitief ontwerp + Sub-System Reqiurement Specification (SSRS - 100%)	9-3-2029	31-5-2029	12 wkn	165	167;107;108;109
167	0	0%	1.4.1.3 Raming definitief ontwerp	1-6-2029	26-7-2029	8 wkn	166	168
168	0	0%	1.4.1.4 Reviewperiode Definitief Ontwerp	27-7-2029	6-9-2029	6 wkn	167	169
169	0	0%	1.4.1.5 Verwerken review Definitief ontwerp	7-9-2029	20-9-2029	2 wkn	168	170
170	0	0%	1.4.1.6 Definitief ontwerp gereed	20-9-2029	20-9-2029	0 wkn	169;107;108;109	110;189;172;183
171	0	0%	**1.4.2 Omgevingsvergunning**	4-4-2030	4-9-2030	22 wkn		
172	0	0%	1.4.2.1 Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning	4-4-2030	17-4-2030	2 wkn	99;170	173
173	0	0%	1.4.2.2 Indienen aanvraag omgevingsvergunning	17-4-2030	17-4-2030	0 dagen	172;110	174
174	0	0%	1.4.2.3 Proceduretijd omgevingsvergunning	17-4-2030	12-6-2030	8 vwkn	173	175
175	0	0%	1.4.2.4 Verlenging behandeling	12-6-2030	24-7-2030	6 vwkn	174	176
176	0	0%	1.4.2.5 Bekendmaking vergunning	24-7-2030	24-7-2030	0 wkn	175	177
177	0	0%	1.4.2.6 Bezwarentermijn	24-7-2030	4-9-2030	6 vwkn	176	178
179	0	0%	1.4.2.8 Bruikbare vergunning beschikbaar	4-9-2030	4-9-2030	0 dagen	178	205
182	0	0%	**1.4.3 Technisch ontwerp (technische uitwerking van DO)**	21-9-2029	6-3-2030	22 wkn		
183	0	0%	1.4.3.1 PFU	21-9-2029	4-10-2029	2 wkn	170	184
184	0	0%	1.4.3.2 Opstellen Technisch ontwerp	5-10-2029	9-1-2030	12 wkn	183	185
185	0	0%	1.4.3.3 Reviewperiode Technisch Ontwerp	10-1-2030	20-2-2030	6 wkn	184	186
186	0	0%	1.4.3.4 Verwerken review Technisch ontwerp	21-2-2030	6-3-2030	2 wkn	185	187
187	0	0%	1.4.3.5 Technisch ontwerp gereed	6-3-2030	6-3-2030	0 wkn	186	110;189
188	0	0%	**1.4.4 GO/NO GO**	7-3-2030	3-4-2030	4 wkn		
189	0	0%	1.4.4.1 GO/NO GO moment (realisatie aannemer)	7-3-2030	20-3-2030	2 wkn	170;187	190
190	0	0%	1.4.4.2 Opstellen aannemersovereenkomst	21-3-2030	3-4-2030	2 wkn	189	191
191	0	0%	1.4.4.3 Bouwteamfase afgerond	3-4-2030	3-4-2030	0 wkn	190	194
192	0	0%	**1.5 Uitvoeringsfase (Aannemer)**	4-4-2030	19-1-2033	139 wkn		
193	0	0%	**1.5.1 Voorbereiding aannemer**	4-4-2030	26-6-2030	12 wkn		
194	0	0%	1.5.1.1 Opstellen projectbeheersplan, Kwaliteitsplan & Keuringsplan / Testplan	4-4-2030	26-6-2030	3 mndn	191	196
195	0	0%	**1.5.2 Uitvoeringsontwerp (uitgewerkte blauwdruk is waarmee de aannemer direct kan bouwen)**	27-6-2030	19-2-2031	32 wkn		
196	0	0%	1.5.2.1 PFU	27-6-2030	10-7-2030	2 wkn	194	197
197	0	0%	1.5.2.2 Opstellen Uitvoeringsontwerp	11-7-2030	27-11-2030	20 wkn	196	198GE;199
198	0	0%	1.5.2.3 Raming Uitvoeringsontwerp	31-10-2030	27-11-2030	4 wkn	197GE	
199	0	0%	1.5.2.4 Reviewperiode Uitvoeringsontwerp	28-11-2030	22-1-2031	6 wkn	197	200
200	0	0%	1.5.2.5 Verwerken review Uitvoeringsontwerp	23-1-2031	19-2-2031	4 wkn	199	201
201	0	0%	1.5.2.6 Uitvoeringsontwerp gereed	19-2-2031	19-2-2031	0 wkn	200	203;224
202	0	0%	**1.5.3 Voorbereiding start uitvoering**	20-2-2031	4-6-2031	15 wkn		
203	0	0%	1.5.3.1 Voorbereiding uitvoering gelatinebrug	20-2-2031	4-6-2031	15 wkn	201	205
204	0	0%	**1.5.4 Realisatie Gelatinebrug**	4-6-2031	19-1-2033	80 wkn		
205	0	0%	1.5.4.1 Start uitvoering gelatinebrug	4-6-2031	4-6-2031	0 wkn	203;179	206
206	0	0%	1.5.4.2 Vaste gedeelte incl. landhoofd en hellingbanen Schiewegzijde	5-6-2031	24-3-2032	40 wkn	205	210;207
207	0	0%	1.5.4.3 Beweegbare gedeelte incl. Landhoofd L&C	25-3-2032	19-1-2033	40 wkn	206	210;208GE
208	0	0%	1.5.4.4 Aanlanding Schieweg & Rotterdamseweg	23-9-2032	19-1-2033	14 wkn	207GE	210
209	0	0%	**1.5.5 Ingebruikname**	19-1-2033	19-1-2033	0 wkn		
210	0	0%	1.5.5.1 Ingebruikname Gelatinebrug	19-1-2033	19-1-2033	0 wkn	207;206;208	212;213;216
211	0	0%	**1.6 Nazorgfase**	20-1-2033	2-11-2033	41 wkn		
212	0	0%	1.6.1 Restpunten	20-1-2033	13-4-2033	12 wkn	210	214
213	0	0%	1.6.2 Aanleveren revisiegegevens	20-1-2033	13-4-2033	12 wkn	210	214
214	0	0%	1.6.3 Opleverdocument	14-4-2033	6-7-2033	12 wkn	212;213	215
215	0	0%	1.6.4 Overdrachtsdocumenten	7-7-2033	28-9-2033	12 wkn	214	217;225
216	0	0%	1.6.5 Evaluatie	20-1-2033	16-3-2033	8 wkn	210	217
217	0	0%	1.6.6 Decharge opstellen	29-9-2033	2-11-2033	5 wkn	216;215	218
218	0	0%	1.6.7 Project gedechargeerd	2-11-2033	2-11-2033	0 wkn	217	
220	0	0%	**2 System Engineering**	23-7-2026	28-9-2033	359,98 wkn		
221	0	100%	2.1 Baseline 1: KES d1.0	23-7-2026	23-7-2026	0 wkn	46	
222	0	0%	2.2 Baseline 2: KES d2.0	8-10-2027	8-10-2027	0 wkn	88	
223	0	0%	2.3 Baseline 3: SES/SRS en geaccepteerd Voorlopig Ontwerp (VO) + Vraagspecificatie	26-6-2028	26-6-2028	0 wkn	97	
224	0	0%	2.4 Baseline 4: SSES/SSRS en geaccepteerd DO/UO inclusief Werkbeschrijving	19-2-2031	19-2-2031	0 wkn	201	
225	0	0%	2.5 Baseline 5: As-Built dossier	28-9-2033	28-9-2033	0 wkn	215	
226	0	21%	**3 Verbreding Delftse Schie (EVW011202, PZH)**	1-8-2025	28-11-2030	268 wkn		
227	0	32%	**3.1 Raad van State**	1-8-2025	9-2-2029	176 wkn		
228	0	32%	3.1.1 Raad van State procedure	1-8-2025	9-2-2029	44 mndn		229
229	0	0%	3.1.2 BP onherroepelijk	9-2-2029	9-2-2029	0 wkn	228	231
230	0	0%	**3.2 Realisatie**	12-2-2029	31-10-2030	88 wkn		
231	0	0%	3.2.1 Voorbereiding realisatie	12-2-2029	29-6-2029	5 mndn	229	232
232	0	0%	3.2.2 Realisatie Verbreding Delftse Schie	2-7-2029	31-10-2030	17 mndn	231	233
233	0	0%	3.2.3 Loswal en ligplaatsen verplaatst	31-10-2030	31-10-2030	0 dagen	232	235
234	0	0%	**3.3 Verplaatsen zandhandel**	1-11-2030	28-11-2030	4 wkn		
235	0	0%	3.3.1 Zandhandel verhuizen	1-11-2030	28-11-2030	4 wkn	233	236
236	0	0%	3.3.2 Zandhandel verhuist	28-11-2030	28-11-2030	0 wkn	235	
237	0	0%	**4 Subsidie complexe schakel MRDH**	1-10-2028	31-12-2025	62 wkn		
238	0	0%	4.1 Deadline - Subsidie voor Deelproject 2 en Deelproject 3 bij MRDH op basis van maatwerkafspr	1-10-2028	1-10-2028	0 wkn		
239	0	0%	4.2 Deadline - Subsidie voor Deelproject 2 en Deelproject 3 bij MRDH op basis van subsidieverordr	31-12-2025	31-12-2025	0 wkn		

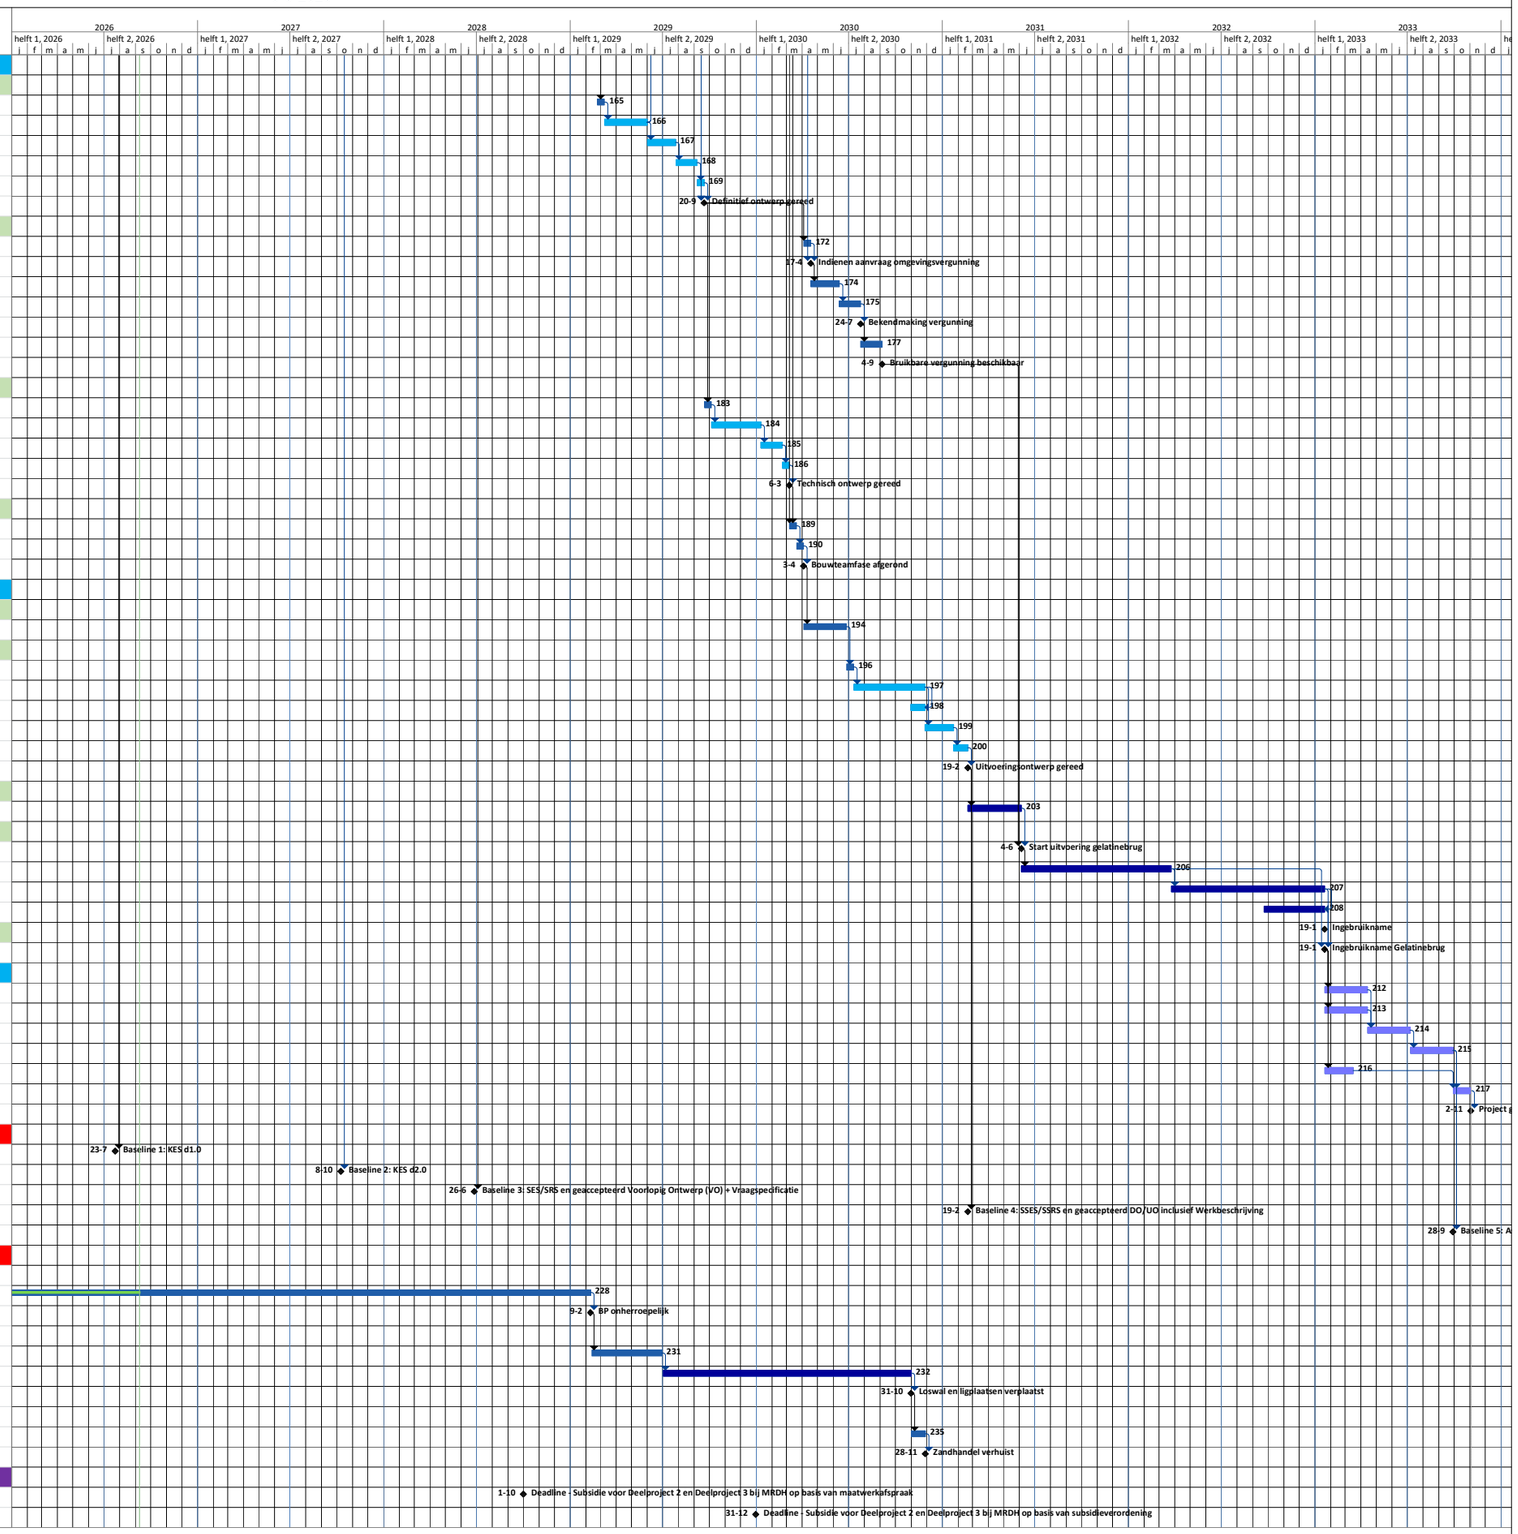

Project: Sjabloon projectplanning
Date: 9-9-2026

Split
Rolled Up Inactief
Inactief
Rolled Up Initiatief
Initiatief
Rolled up definitie
definitie
Rolled Up Voorbereidingsfase
Voorbereidingsfase
Rolled Up Ontwerp
Ontwerp
Rolled Up Vergunning
Vergunning
Rolled Up Aanbesteding
Aanbesteding
Rolled Up Realisatiefase
Realisatiefase
Ingebruikname
Rolled up Risicobuffer
Risicobuffer
Rolled Up Nazorgfase
Nazorgfase
Rolled Up Progress
Progress
Mijlpaal
Deadline
