Installatiecode SCIOS	BQH-AAA-34
Inspectiekenmerk	6512BT-6-JL-26-BQH-AAA-34-B-PI_G
Naam	ROC Campusbaan
Adres	Campusbaan 6
Postcode	6512 BT
Plaats	Nijmegen
Periodieke inspectie	17 augustus 2026



Periodieke inspectie
Goedgekeurd

Unica Building Services is een gecertificeerd inspectiebedrijf

Gegevens Algemeen / Inspectie / Uitvoerende / Opdrachtgever / Drijver / Eindconclusie 3
Eindconclusie 4
Verbeterpunten 5
Opmerkingen 6
Werkwijze PI 7
ROC Campusbaan
Checklist 8
Sectie componenten- locatie / functie / merk / type 9
Dichtheidscontrole 11
Sectie metingen 12
Toestellen 13
Bijlage foto's 14
Gebruikte afkortingen / meetapparatuur 16

Gegevens algemeen	
SCIOS identificatiecode	BQH-AAA-34
EBI rapport kenmerk	KRO186512BT6-7A-EBI
Opgesteld door	Konings Service & Inspecties - G.W.A.Koninks
Datum inspectie	2 mei 2018
Scope installatie volgens certificatieregeling	7a Brandstofleiding
Brandstof	G25 Laag calorisch gas
Gasmeter	Rotormeter G100 - 180m3/h - 1890kW bw (Bij 100mbar druk)
Inhoud gasmeter	1.11 liter
Gasleveringsdruk netbeheerder	8000 mbar
Druk na gasaansluitpunt DR	100 mbar

Gegevens van de inspectie/drijver	
Inspectie referentie	6512BT-6-JL-26-BQH-AAA-34-B-PI_G versie:2
Periodieke inspectie brandstofleiding	4 jaar
Naam	ROC Campusbaan
Adres	Campusbaan 6
Postcode / Plaats	6512 BT / Nijmegen
Inspectie datum	17 augustus 2026

Gegevens inspectiebedrijf	
Bedrijfsnaam	Unica Building Services
Adres	Mr. B.M. Teldersstraat 5
Postcode / Plaats	6842 CT / Arnhem
Telefoon	088 – 864 22 22
Contactpersoon	Scios Arnhem
Email	sciosarnhem@unica.nl

Gegevens opdrachtgever	
In opdracht van	ROC Nijmegen
Contactpersoon	Mevr. J.Arts
Adres	Campusbaan 6
Postcode / Plaats	6512BT / Nijmegen
E-mail	jolanda.arts@roc-nijmegen.nl

De brandstoftoevoerleiding voldoet aan de eisen betreffende veilig functioneren. Het systeem voor de toevoer van brandstof voldoet NIET aan de van toepassing zijnde Nederlandse normen en richtlijnen. De opmerkingen die betrekking hebben op de Nederlandse normen en richtlijnen zijn in het inspectierapport opgenomen op de pagina waar de verbeterpunten worden beschreven. De installatie mag in gebruik blijven het afgeven van de verklaring van keuring/inspectie is hiermee gerechtvaardigd. In het SCIOS portaal is de stookinstallatie afgemeld.

Inspectie Interval

De inspectie-/keuring termijn is wettelijk vastgesteld op ten minste eenmaal per vier jaar, en dient uitgevoerd te worden voor:
17 augustus 2030. De periodieke inspectie dient uitgevoerd te worden door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf.

Er zijn verbeterpunten over het voldoen aan normen en richtlijnen van de toevoer van de brandstof. Deze verbeterpunten zijn in het inspectierapport opgenomen.

De inspecteur, bevoegd tot het uitvoeren van periodieke inspectie, scope 7a.



J. Lampen

d.d. 17 augustus 2026

Verbeterpunten

De hier benoemde tekortkomingen staan het afgeven van de verklaring van inspectie niet in de weg. Echter adviseren wij de eigenaar van de brandstofleiding deze tekortkomingen te herstellen om te voldoen aan de eisen die staan beschreven in de NEN normen betreffende aanleg en in gebruik hebben van gasleidingen. Bevoegd gezag kan hier controles op uitvoeren.

ROC Campusbaan

De hendel van de (5) afsluiter (Remeha gas 310 eco) is zwaar om te bedienen!maar sluit wel af.(Advies om deze te vervangen.)

De gastoevoerleiding (ruimte 0.97)is voorzien van een laag menie. De menie beschermt op langer termijn de gasleiding onvoldoende tegen roesten. De gastoevoerleiding dient te worden voorzien van een afwerklaag in de kleur (oker)geel. Zie de NEN 1078 art. 5.8.4.



De afsluiter is aan de verkeerde zijde (afgaande zijde) van de filters gemonteerd.het filter dient te worden verplaatst.



Er ontbreken op meerdere plaatsen in de leiding meetpunten voor de drukregelaars,veiligheidafsluiters en gasgebrekkleppen.om deze appendages op goede werking te kunnen controleren dienen deze aangebracht te worden.(zie foto’s)

Opmerkingen

De verwijzing op de verklaring van keuring/inspectie van SCIOS naar de 'Opmerkingen die hersteld moeten worden' vindt u in deze rapportage onder 'Verbeterpunten'

Dit rapport mag slechts in zijn geheel zonder enige toevoegingen of weglatingen gepubliceerd worden.
Voor afwijkingen van deze voorwaarden of voor publicatie in vertaling is schriftelijk toestemming vereist van Unica Building Services.
Onafhankelijk van de inhoud van dit rapport aanvaardt voornoemd bedrijf geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de installatie.

De aansluitleiding vanuit de grond met eventuele isolatiekoppeling die is aangesloten op de gasdrukregel beveiligingsapparatuur en de gasmeter valt onder de verantwoording van de netbeheerder.

De gasmeterruimte is geen direct onderdeel van de inspectie doordat deze onder medeverantwoording van het netwerkbedrijf valt. Eventuele geconstateerde gebreken zijn vermeld bij de opmerkingen. Het is raadzaam indien er opmerkingen zijn aangaande de ruimte en of gasleveringsinstallatie deze aan het netbeheerder door te geven.

U dient conform de NEN-EN 1775 een verantwoordelijk persoon aan te wijzen, bij deze persoon dienen alle werkzaamheden aan de gasleiding te worden gemeld, tevens dient deze zorg te dragen dat het benodigde onderhoud en de verplichte keuringen worden uitgevoerd.

De aangesloten toestellen op de gasleiding zijn niet geinspecteerd in deze inspectie, hiervoor is een separate inspectie van de toestellen en of het cascade systeem noodzakelijk. Indien deze niet is uitgevoerd wijzen wij u er bij deze op dat dit wettelijk verplichte keuring(en) betreft.

Inhoud is overgenomen uit de EBI.

De brandstofleiding is overeenkomstig de huidige wet en regelgeving geïnspecteerd. Dit houdt in dat alleen dat gedeelte van de gasleiding, dat dient voor gastoevoer naar toestellen met een (nominaal) vermogen > 100 kW, is beoordeeld.De leidingdelen in de kooklokalen en nastec lokalen zijn niet beoordeeld.(Deze zijn ook niet opgenomen in het basisverslag)

ROC Campusbaan

De in- en uitlaatdruk van de gasgebrekbeveiliging zijn door het ontbreken van meetpunten niet te bepalen. Hierdoor is de openingsdruk ook niet te bepalen. De werking is gecontroleerd zonder drukmeting.

Of de brandstofleiding is aangelegd volgens tekening is niet beoordeeld. Er is geen tekening beschikbaar. In het basisrapport is vastgelegd welke materialen zijn gebruikt en welke verbindingstechniek zijn toegepast. Tevens is een inhoudsberekening en een schuine projectietekening gemaakt. Let op! De schuine projectietekening is niet op schaal getekend.

Het drukverlies is beoordeeld aan de waarden in het basisverslag.En in orde bevonden.

In de gasmeterruimte is de metalen gasleiding geaard door middel van een vereffeningsleiding. De mate van potentiaalvereffening en het al dan niet verbonden zijn met de hoofdaardrail valt onder de beoordeling van de erkende elektrotechnisch installateur die de vereffeningsleiding heeft gemonteerd.

Er is geen persrapport aanwezig. Of er in het verleden een persrapport is opgesteld, is niet te achterhalen.

De brandwerende en gasbelemmerende uitvoering van de leidingdoorvoeringen maken geen deel uit van deze inspectie conform de SCIOS-regeling. Deze verantwoording ligt bij de gebruiker/eigenaar. De uitvoering hiervan dient te voldoen aan de omgevingswet.

De kwaliteit van de lasverbindingen, waarmee de stalen leiding is verbonden, zijn niet aangetoond omdat de vakbekwaamheid van de lasser niet te achterhalen is: Het is onbekend wie de lasverbindingen heeft vervaardigd. Mochten er in de toekomst twijfels ontstaan omtrent de kwaliteit van de lasverbindingen, dan is het niet uitgesloten dat er een niet-destructief onderzoek zal plaatsvinden.

De checklist vragen die niet van toepassing zijn op de installatie worden niet afgedrukt in het rapport.
Op de website van Rapport Online zijn deze checklist vragen beoordeeld en doelbewust op n.v.t. gezet.

Aan het eind van iedere locatie in deze rapportage zijn foto's toegevoegd.

Werkwijze PI

ROC Campusbaan

Bij een leiding/sectiedeel met inhoud van >50 dm3 en werkdruk ≤500 mbar wordt deze als gasdicht beschouwd als het geconstateerde lek ≤1 l/h.
De benodigde meettijd t(s) ≥: 3.6 x drukdaling(mbar) x leidinginhoud (dm3).
Bij een geconstateerd lek >1l/h en ≤5l/h moet door lekzoeken worden vastgesteld: of er sprake is van gasophoping / waar de lekkage zich bevindt en of dit risico's veroorzaakt.
Bij een geconstateerd lek groter dan 5l/h is er sprake van Afkeur.

Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen	
Tekeningen: aanwezig, leesbaar en in overeenstemming met situatie	**Zie opmerkingen**
Voldoet de transportcapaciteit en het maximaal drukverlies	**Zie opmerkingen**
Leidingsysteem: Beschadiging/corrosie	**Zie verbeterpunten**
Leidingsysteem: Vereffening; volgens norm, locatie, zichtbaar aanwezig	**Zie opmerkingen**
Leidingsysteem: Herkenbaarheid	Akkoord
Appendages: Filter(s): afsluitbaar	**Zie verbeterpunten**
Leidingsysteem: Resultaat sterktebeproeving	**Zie opmerkingen**
Leidingsysteem: Geschikt voor het gas en minimale en maximale gasdruk	Akkoord
Componenten, zijn er voldoende meetnippels aangebracht in de installatie	**Zie verbeterpunten**
Zijn de afsluiters en de overige componenten zoals drukregelaars goed bereikbaar	Akkoord
Mantelbuis toegepast bij doorvoeringen van wanden en vloeren	Akkoord
Bovengrondse doorvoeringen door scheidingen van een brandcompartiment voldoende brandwerend	**Zie opmerkingen**
Zijn de doorvoeringen in de stookruimte en gasmeterruimte gasbelemmerend	Akkoord
Bevestiging en ondersteuning; staat, deugdelijk, volgens norm	**Zie opmerkingen**
Las verbindingen stalen leiding akkoord	**Zie opmerkingen**
Zijn er geen schroefdraadverbinding toegepast groter dan 2"	Akkoord
Is de PE leiding zo kort mogelijk het gebouw ingevoerd en voldoende beschermd tegen mechanische beschadiging en hitte	Akkoord
Leidingsysteem in grond: Grondconditie (nog steeds) acceptabel	Akkoord
Leidingsysteem in grond: staat, gas- en waterdicht	Akkoord

Gehanteerde voorschriften	Het EBI-rapport en de voorschriften fabrikant

Sectie #1

Sectie #1 bedoeld voor	Stookruimtes
Gasaansluitpunt DR locatie	In de gasmeterkast
Drukregelaar fabrikant/type	Elster / 243-8-1-SRL
Calamiteiten afsluiter #1.1 locatie	Gaskast Liander
Calamiteiten afsluiter #1.1 fabrikant/type	Wouter Witzel / Vlinderklep
Calamiteiten afsluiter #1.1 maat	Flens
Afsluiter #1.1 locatie	Gasinvoerkast buiten (B0.97)
Afsluiter #1.1 functie	Sectie afsluiter
Afsluiter #1.1 fabrikant/type	Econ / Kogel
Afsluiter #1.1 maat	Flens
Afsluiter #1.2 locatie	Stookruimte B4 T1
Afsluiter #1.2 functie	Sectie afsluiter
Afsluiter #1.2 fabrikant/type	RIW / Kogel
Afsluiter #1.2 maat	DN20 - ¾"
Afsluiter #1.3 locatie	Stookruimte B4 T1
Afsluiter #1.3 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel C
Afsluiter #1.3 fabrikant/type	VSH / Kogel
Afsluiter #1.3 maat	Knel 22 mm
Afsluiter #1.4 locatie	Stookruimte B4 T1
Afsluiter #1.4 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel B
Afsluiter #1.4 fabrikant/type	RIW / Kogel
Afsluiter #1.4 maat	DN15 - ½"
Afsluiter #1.5 locatie	Stookruimte B4 T1
Afsluiter #1.5 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel A
Afsluiter #1.5 fabrikant/type	Econ / Kogel
Afsluiter #1.5 maat	Flens
Afsluiter #1.6 locatie	Schoonmaakkast b.g
Afsluiter #1.6 functie	Sectie afsluiter t.b.v kooklokaal
Afsluiter #1.6 fabrikant/type	RIW / Kogel
Afsluiter #1.6 maat	DN40 - 1½"
Afsluiter #1.7 locatie	Schoonmaakkast b.g
Afsluiter #1.7 functie	Sectie afsluiter t.b.v kooklokaal
Afsluiter #1.7 fabrikant/type	RIW / Kogel
Afsluiter #1.7 maat	DN40 - 1½"
Afsluiter #1.8 locatie	Stookruimte K4 T2
Afsluiter #1.8 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel D
Afsluiter #1.8 fabrikant/type	Brandoni / Kogel
Afsluiter #1.8 maat	DN50 - 2"
Afsluiter #1.9 locatie	Stookruimte K4 T2
Afsluiter #1.9 functie	Sectie afsluiter
Afsluiter #1.9 fabrikant/type	RIW / Kogel
Afsluiter #1.9 maat	DN20 - ¾"
Afsluiter #1.10 locatie	Stookruimte K4 T2
Afsluiter #1.10 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel E
Afsluiter #1.10 fabrikant/type	VSH / Kogel

Afsluiter #1.10 maat	Knel 22 mm
Afsluiter #1.11 locatie	Stookruimte K4 T2
Afsluiter #1.11 functie	Toestelafsluiter t.b.v. toestel F
Afsluiter #1.11 fabrikant/type	HSF / Kogel
Afsluiter #1.11 maat	DN25 - 1"
Veiligheidsafsluiter #1.1 locatie	Schoonmaakkast b.g
Veiligheidsafsluiter #1.1 functie	T.b.v. de afzuiging boven de kooktoestellen
Veiligheidsafsluiter #1.1 fabrikant	Elektrogas
Veiligheidsafsluiter #1.1 maat	DN40 - 1½"
Veiligheidsafsluiter #1.2 locatie	Schoonmaakkast b.g
Veiligheidsafsluiter #1.2 functie	T.b.v. de afzuiging boven de kooktoestellen
Veiligheidsafsluiter #1.2 fabrikant	Elektrogas
Veiligheidsafsluiter #1.2 maat	DN40 - 1½"
Filter #1.1 locatie	Stookruimte K4 T2
Filter #1.1 fabrikant/maat	CIM / DN25 - 1"
Drukregelaar #1.1 locatie	Stookruimte B4 T1
Drukregelaar #1.1 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.1 fabrikant/type	Sperryn / G1020C1HB2270
Drukregelaar #1.2 locatie	Stookruimte B4 T1
Drukregelaar #1.2 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.2 fabrikant/type	Elster / J48
Drukregelaar #1.3 locatie	Schoonmaakkast b.g
Drukregelaar #1.3 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.3 fabrikant/type	Sperryn / G1020S1NB200001
Drukregelaar #1.4 locatie	Schoonmaakkast b.g
Drukregelaar #1.4 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.4 fabrikant/type	Sperryn / G1020S1NB200001
Drukregelaar #1.5 locatie	Stookruimte K4 T2
Drukregelaar #1.5 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.5 fabrikant/type	Elster / J48
Drukregelaar #1.6 locatie	Stookruimte K4 T2
Drukregelaar #1.6 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.6 fabrikant/type	Elster / J78
Drukregelaar #1.7 locatie	Stookruimte K4 T2
Drukregelaar #1.7 functie	Het terugregelen van 100 naar 30 mbar.
Drukregelaar #1.7 fabrikant/type	Sperryn / G1020C1KB2270
Gasgebrekbeveiliging #1.1 locatie	Schoonmaakkast b.g
Gasgebrekbeveiliging #1.1 functie	Beveiligt tegen ongewenst uitstromen van gas na dat de gastoevoer onderbroken is geweest
Gasgebrekbeveiliging #1.1 fabrikant/type	Sperryn / L1040S1TB
Gasgebrekbeveiliging #1.2 locatie	Schoonmaakkast b.g
Gasgebrekbeveiliging #1.2 functie	Beveiligt tegen ongewenst uitstromen van gas na dat de gastoevoer onderbroken is geweest
Gasgebrekbeveiliging #1.2 fabrikant/type	Sperryn / L1040S1TB

Drukdalingsproef groep A		
Inhoud Sectie 1 (incl gasmeter)	1950	liter
Inhoud Drukdalingsproef groep A	1950	liter
Begindruk, gemeten	99.7	mbar
Einddruk, gemeten	98.8	mbar
Drukdaling na verstreken tijd, gemeten	0.9	mbar
Minimale testduur volgens NEN8078	117	min
Testduur, verstreken	120	min
Lekverlies, gemeten	0.88	l/uur

Lekverlies	Meting	
Drukdalingsproef groep A	0.88	l/uur
Totaal lekverlies	0.88	l/uur

Sectie #1 VA's & aardbeving gaskleppe	Gangbaarheid	Afsluitbaarheid
Veiligheidsafsluiter #1-1	Akkoord	Akkoord
Veiligheidsafsluiter #1-2	Akkoord	Akkoord

Sectie #1 afsluiters	Gangbaarheid	Afsluitbaarheid
Afsluiter #1-1	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-2	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-3	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-4	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-5	**Zie verbeterpunten**	Akkoord
Afsluiter #1-6	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-7	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-8	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-9	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-10	Akkoord	Akkoord
Afsluiter #1-11	Akkoord	Akkoord

Sectie #1 calamiteiten afsluiters	Gangbaarheid	Afsluitbaarheid
Afsluiter #1-1	Akkoord	Akkoord

Sectie #1 Gasgebrekbeveiliging	
Gasgebrekbeveiliging #1 functioneel	**Akkoord - niet gemeten**
Gasgebrekbeveiliging #2 functioneel	**Akkoord - niet gemeten**

Gasleverancier sluitdruk	Meting	
Bij de gasmeter, sluitdruk	105	mbar

Sectie #1 metingen

Toestel Drukregelaars	Meting	
Toestel drukregelaar 1, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 1 sluitdruk	32.3	mbar
Toestel drukregelaar 1 uitlaatdruk vollast	27	mbar
Toestel drukregelaar 2, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 2 sluitdruk	33.6	mbar
Toestel drukregelaar 2 uitlaatdruk vollast	23.8	mbar
Toestel drukregelaar 3, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 3 sluitdruk	32.4	mbar
Toestel drukregelaar 3 uitlaatdruk vollast	nvt	mbar
Toestel drukregelaar 4, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 4 sluitdruk	32	mbar
Toestel drukregelaar 4 uitlaatdruk vollast	nvt	mbar
Toestel drukregelaar 5, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 5 sluitdruk	32.8	mbar
Toestel drukregelaar 5 uitlaatdruk vollast	25.8	mbar
Toestel drukregelaar 6, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 6 sluitdruk	31.2	mbar
Toestel drukregelaar 6 uitlaatdruk vollast	22.4	mbar
Toestel drukregelaar 7, inlaatdruk	100	mbar
Toestel drukregelaar 7 sluitdruk	31.4	mbar
Toestel drukregelaar 7 uitlaatdruk vollast	24.3	mbar

Bouwjaar +/- 2007

Toestellen waarvoor geinspecteerde leiding dient

	Merk/Type	Serienummer	Bel. Hs
1A	Remeha Gas 310 Eco 9 Leden	0627901869320	598.9 kW
1B	Remeha Quinta Pro 45	1420609638680	45.8 kW
1C	A.O. Smith BFC 100 N	170606112204001	105.6 kW
1D	Remeha Gas 310 Eco 9 Leden	0700402322130	598.9 kW
1E	Remeha Quinta Pro 65	1618814091350	68.8 kW
1F	Remeha Quinta ACE 115	1928122329900	118.9 kW
1G	Pelgrim HG7BAE1D (2 stuks)	91030024	25.1 kW
1H	Pelgrim HG7BAE1D (8 stuks)	Nvt.	100.4 kW
1I	Mareno PCGD-61L (21 stuks)	MA020015404	308 kW

	Ruimte	Toestel omschrijving
1A	Stookruimte B4.T1	Centrale verwarming
1B	Stookruimte B4.T1	Warmwater
1C	Stookruimte B4.T1	Warmwater
1D	Stookruimte K4.T2	Centrale verwarming
1E	Stookruimte K4.T2	Centrale verwarming en warmwater
1F	Stookruimte K4.T2	Warmwater
1G	Opstellingsruimte Kooklokaal 0.08	Fornuis
1H	Opstellingsruimte Kooklokaal 0.10	Fornuis
1I	Opstellingsruimte Kooklokaal 0.10	Fornuis

Foto 1



Ontbreken van Meetnippels om de in en uitgaande drukken te kunnen meten.

Foto 2




Gasmeterkast Liander

Foto 3



Geen meetvoorzieningen aanwezig! (Stookruimte K4)

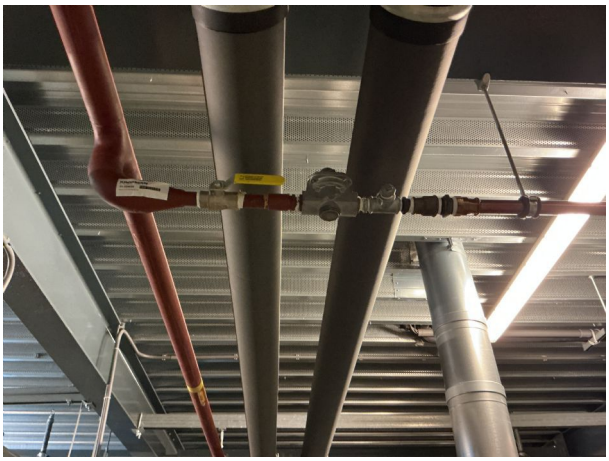

Ontbreken van meetpunten (Stookruimte B4)

Foto 5



Ontbreken van meetpunten bij gas 310 toestel.(Stookruimte B4)

Gebruikte afkortingen

A	Afsluiter
AV	Afblaas veiligheid
B	B klep
bw	Boven waarde
C	Compensator
CA	Calamiteiten Afsluiter
DA	Drukafslag
DR	Gasdrukregelaar
EVHI	Elektronisch Volume Herleidings Instrument
F	Filter
G	Gasmeter
GA	Grond afsluiter
gl	Grond leiding
grens	grenswaarde
HD	Hoge gasdrukbewaking
I	Isolatie Koppeling/Flens/Kraan
iz	In zicht, zonder gereedschap bereikbaar
kW	Kilo Watt
mbar	Millibar
nb	Niet bepaald
niz	Niet in zicht, niet bereikbaar zonder gereedschap
VA	Veiligheidsafsluiter
ZS	Zakstuk

Meetapparatuur

Soort	Merk / Type	Identificatienummer
Drukmeter	Euro Index S4601-ST	036601145
Drukmeter	Euro Index S4601-ST	036601839
Drukmeter	Euro index S2601	036007448
Gaslekzoeker	Sewerin Snooper	022 01 034303
Digitale Multimeter	Fluke 83	10
Drukmeter	Euro index S4610-ST	036604424

Gecertificeerd Inspectiebedrijf
Unica Installatietechniek B.V.
De Wel 15
3871 MT Hoevelaken
0332478080
scios@unica.nl
http://www.unica.nl

VERKLARING

Verklaring van keuring/inspectie brandstofleiding

Ondergetekende verklaart hierbij dat in het kader van de Omgevingswet de brandstoftoevoerleiding

met installatiecode	***BQH-AAA-34***
Scope	**7A. Brandstoftoevoer gasvormige brandstoffen ≤ 0,5 bar**

Opgesteld bij

Bedrijf / organisatie	**Stichting R.O.C. Nijmegen e.o.**
Adres	**Campusbaan 6**
Plaats	**6512 BT Nijmegen**

een periodieke inspectie heeft plaatsgevonden aan de hand van basisrapportnummer: KRO186512BT6-7A-EBI en dat, mede in samenhang met het milieu waarin deze is gelegen, de leiding voldoet aan de eisen betreffende:

- veilig functioneren

en derhalve in gebruik mag blijven.

Inspectierapportnummer **6512BT-6-JL-26-BQH-AAA-34-B-PI_G**

Er zijn naar aanleiding van de inspectie opmerkingen over het voldoen aan normen en richtlijnen van de toevoer van brandstof. Deze opmerkingen zijn in het inspectierapport opgenomen.

Keuring / Inspectie

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de inspectie van de brandstoftoevoerleidingen, niet op de emissiemeting of de inspectie van het stooktoestel.

De eerstvolgende periodieke keuring/inspectie moet voor **17-08-2030** worden uitgevoerd

Datum	**17-08-2026**
Naam gecertificeerd inspectiebedrijf	**Unica Installatietechniek B.V.**
Naam uitvoerende	**J. (Johan) Lampen**
Datum/tijd afmelding	17-08-2026 19:33

Copyright Stichting SCIOS
Aanpassing van de verklaring is niet toegestaan en maakt deze ongeldig.
