
Id	Taakmodu	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
1		**Baggeren Regulier 2027**			**0%**	**277,2 wkn**	**maa 21-9-26**	**maa 12-1-32**
2		**Baggeren Regulier 2027 DG0**			**8%**	**34,2 wkn**	**maa 21-9-26**	**maa 17-5-27**
3		**10_Initiatieffase**			**38%**	**6,4 wkn**	**maa 21-9-26**	**din 3-11-26**
29		**Gate 2 (Projectbrief)**			**0%**	**4 wkn**	**woe 4-11-26**	**din 1-12-26**
32		**30_Definitiefase**			**0%**	**27,8 wkn**	**woe 4-11-26**	**maa 17-5-27**
33		**Aanbesteding (Uitvraag IB)**			**0%**	**13,8 wkn**	**woe 4-11-26**	**maa 8-2-27**
34		Versturen uitnodigingen / publicatie	CM	OG	0%	0,4 wkn	woe 4-11-26	don 5-11-26
35		Inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	42 vdagen	don 5-11-26	don 17-12-26
36		Versturen (laatste) nota van inlichtingen	CM	OG	0%	1,4 wkn	woe 25-11-26	don 3-12-26
37		Einde inschrijvingstermijn	CM	OG	0%	0 wkn	don 17-12-26	don 17-12-26
38		*KERSTVAKANTIE*			*0%*	*2,2 wkn*	*vri 18-12-26*	*vri 1-1-27*
39		Beoordeling aanbiedingen door projectteam	CM	OG	0%	2 wkn	maa 4-1-27	vri 15-1-27
40		Opstellen en vaststellen voorlopig gunningsadvies	CM	OG	0%	0,2 wkn	maa 18-1-27	maa 18-1-27
41		Stand-still periode	CM	OG	0%	21 vdagen	maa 18-1-27	maa 8-2-27
42		Definitieve gunning	CM	OG	0%	0 wkn	maa 8-2-27	maa 8-2-27
43		**PSU**			**0%**	**3 wkn**	**woe 30-12-26**	**din 19-1-27**
44		Voorbereiden PSU	MPB	OG	0%	2 wkn	woe 30-12-26	din 12-1-27
45		PSU	MPB	OG	0%	1 wk	woe 13-1-27	din 19-1-27
46		**Voorbereiden Ontwerpfase IB**			**0%**	**9 wkn**	**din 9-2-27**	**maa 12-4-27**
47		Concept PMP (Project Management Plan) opstellen P.1	MPB	ON	0%	2 wkn	din 9-2-27	maa 22-2-27
48		Review concept PMP P.1	MPB	OG	0%	2 wkn	din 23-2-27	maa 8-3-27
49		Organiseren Projectstartup (PSU)	CM	ON	0%	1 wk	din 23-2-27	maa 1-3-27
50		PMP definitief maken en opleveren P.1	MPB	ON	0%	1 wk	din 9-3-27	maa 15-3-27
51		PMP definitieve versie beoordelen P.1	MPB	OG	0%	1 wk	din 16-3-27	maa 22-3-27
52		Organiseren Risicosessie (door IB)	MPB	ON	0%	1 wk	din 2-3-27	maa 8-3-27
53		Concept Risicodossier opstellen P.2	MPB	ON	0%	2 wkn	din 9-3-27	maa 22-3-27
54		Organiseren Validatie & Verificatiesessie (door IB)	MPB	ON	0%	1 wk	din 23-3-27	maa 29-3-27
55		Review Concept Risicodossier P.2	MPB	OG	0%	2 wkn	din 23-3-27	maa 5-4-27
56		Risicodossier definitief opleveren P.2	MPB	ON	0%	1 wk	din 6-4-27	maa 12-4-27
57		Voorbereiden Ontwerpfase IB gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 12-4-27	maa 12-4-27
58		**Communicatie Omgeving Brief 1: Inpeilen en Bemonsteren**			**0%**	**6 wkn**	**din 23-3-27**	**maa 3-5-27**
59		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	2 wkn	din 23-3-27	maa 5-4-27
60		Overheden informeren start inpeilen	OM	OG	0%	4 wkn	din 6-4-27	maa 3-5-27
61		Opstellen en versturen Brief 1: Ingeilen en en Bemonsteren	OM	OG	0%	4 wkn	din 6-4-27	maa 3-5-27
62		Communicatie Omgeving Brief 1 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 3-5-27	maa 3-5-27
63		**V&G Plan**			**0%**	**5 wkn**	**din 13-4-27**	**maa 17-5-27**
64		Aanleveren V&G plan door IB P.4	TM	ON	0%	2 wkn	din 13-4-27	maa 26-4-27
65		Review V&G plan P.6	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-4-27	maa 10-5-27
66		V&G plan definitief maken P.4	TM	ON	0%	1 wk	din 11-5-27	maa 17-5-27
67		V&G plan gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 17-5-27	maa 17-5-27
68		**Meetplan**			**0%**	**5 wkn**	**din 13-4-27**	**maa 17-5-27**
69		Concept meetplan inpeilen opleveren P.5	TM	ON	0%	2 wkn	din 13-4-27	maa 26-4-27
70		Review meetplan P.5	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-4-27	maa 10-5-27
71		Definitief maken meetplan P.5	TM	ON	0%	1 wk	din 11-5-27	maa 17-5-27
72		Meetplan gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 17-5-27	maa 17-5-27
73		**Risicoreservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**maa 17-5-27**	**maa 17-5-27**
78		**Baggeren Regulier 2027 DG2 - Kopsloten**			**0%**	**211,8 wkn**	**din 18-5-27**	**vri 6-6-31**
79		**30_Definitiefase**			**0%**	**40,8 wkn**	**din 18-5-27**	**vri 25-2-28**
80		**Veldinventarisatie**			**0%**	**13 wkn**	**din 18-5-27**	**maa 16-8-27**
81		Uitvoeren veldinventarisatie	OM	ON	0%	8 wkn	din 18-5-27	maa 12-7-27
82		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie, issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	2 wkn	din 13-7-27	maa 26-7-27
83		Beoordelen concept issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	OG	0%	2 wkn	din 27-7-27	maa 9-8-27
84		Definitief opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	1 wk	din 10-8-27	maa 16-8-27
85		Veldinventarisatie gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 16-8-27	maa 16-8-27
86		**Inpeilen**			**0%**	**22 wkn**	**din 18-5-27**	**maa 18-10-27**
87		Inpeilen	TM	ON	0%	8 wkn	din 18-5-27	maa 12-7-27
88		Vullen Goewebviewer	TM	ON	0%	9 wkn	din 18-5-27	maa 19-7-27
89		Aanleveren peilverschillen P.6	TM	ON	0%	9 wkn	din 18-5-27	maa 19-7-27
90		Review peilverschillen P.6	TM	OG	0%	9 wkn	din 25-5-27	maa 26-7-27
91		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	8 wkn	din 1-6-27	maa 26-7-27
92		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	OG	0%	9 wkn	din 1-6-27	maa 2-8-27
93		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	9 wkn	din 8-6-27	maa 9-8-27
94		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.11	TM	ON	0%	2 wkn	din 10-8-27	maa 23-8-27
95		Review baggernoodzaak kaart P.11	TM	OG	0%	2 wkn	din 24-8-27	maa 6-9-27
96		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 7-9-27	maa 20-9-27
97		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	2 wkn	din 21-9-27	maa 4-10-27
98		VTW scopewijziging na inpeilingen	MPB	OG	0%	2 wkn	din 5-10-27	maa 18-10-27
99		Inpeilen gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 18-10-27	maa 18-10-27
100		**Omgevingsmanagement Kwantiteit**			**0%**	**4 wkn**	**din 19-10-27**	**maa 15-11-27**
101		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4 wkn	din 19-10-27	maa 15-11-27
102		**Verdeling Deelgebieden regulier 2026 t/m 2030 (door aannemers)**			**0%**	**8,2 wkn**	**din 19-10-27**	**din 14-12-27**
103		Aanleveren kwantiteit aan aannemers	CM	OG	0%	1 dag	din 19-10-27	din 19-10-27
104		Verdeling deelgebieden door aannemers	CM	OG	0%	6 wkn	woe 20-10-27	din 30-11-27
105		Toetsen verdeling deelgebieden	CM	OG	0%	2 wkn	woe 1-12-27	din 14-12-27
106		Verdeling Deelgebieden gereed	CM	OG	0%	0 wkn	din 14-12-27	din 14-12-27
107		**Kaarten Overheid**			**0%**	**18 wkn**	**din 19-10-27**	**maa 21-2-28**
108		Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 19-10-27	maa 1-11-27
109		Review kaarten (sem)overheden kwantiteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 2-11-27	maa 8-11-27
110		Kaarten (sem)overheden kwantiteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 9-11-27	maa 15-11-27
111		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	14 wkn	din 16-11-27	maa 21-2-28
112		Kaarten Overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 21-2-28	maa 21-2-28
113		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**18,8 wkn**	**din 19-10-27**	**vri 25-2-28**
114		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	din 19-10-27	maa 25-10-27
115		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 26-10-27	maa 22-11-27
116		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	3,8 wkn	din 23-11-27	vri 17-12-27
117		*KERSTVAKANTIE*			*0%*	*2 wkn*	*maa 20-12-27*	*vri 31-12-27*
118		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 3-1-28	vri 14-1-28
119		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2 wkn	maa 17-1-28	vri 28-1-28
120		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 31-1-28	vri 11-2-28
121		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 14-2-28	vri 25-2-28
122		Opdracht naar Aquon en vooronderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 25-2-28	vri 25-2-28
123		**SSK-Raming**			**0%**	**10 wkn**	**din 16-11-27**	**maa 24-1-28**
124		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 16-11-27	maa 29-11-27
125		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 30-11-27	maa 13-12-27
126		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	4 wkn	din 14-12-27	maa 10-1-28
127		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 11-1-28	maa 24-1-28
128		SSK-raming gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 24-1-28	maa 24-1-28
129		**Risico-reservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**vri 25-2-28**	**vri 25-2-28**
134		**Gate 3 (Projectcontract)**			**0%**	**4 wkn**	**maa 28-2-28**	**vri 24-3-28**
135		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 28-2-28	vri 24-3-28
136		Mijlpaal: Gate 3 (Projectcontract) afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 24-3-28	vri 24-3-28
137		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**78 wkn**	**maa 28-2-28**	**vri 24-8-29**
138		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**10 wkn**	**maa 28-2-28**	**vri 5-5-28**
139		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	maa 28-2-28	vri 24-3-28
140		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 27-3-28	vri 7-4-28
141		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 10-4-28	vri 21-4-28
142		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 10-4-28	vri 21-4-28
143		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 24-4-28	vri 5-5-28
144		Bemonsteren & Analyseren gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 5-5-28	vri 5-5-28
145		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**maa 24-4-28**	**vri 16-6-28**
146		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	maa 24-4-28	vri 5-5-28
147		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	maa 8-5-28	vri 19-5-28
148		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 22-5-28	vri 2-6-28
149		Bemonsteren, analyseren, toetsen, afperkend waterbodemonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 5-6-28	vri 16-6-28
150		Afperkend onderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 16-6-28	vri 16-6-28
151		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**10 wkn**	**maa 8-5-28**	**vri 14-7-28**
152		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	maa 8-5-28	vri 19-5-28
153		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	maa 22-5-28	vri 2-6-28
154		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 5-6-28	vri 16-6-28
155		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	maa 19-6-28	vri 14-7-28
156		Verkennend Asbestonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 14-7-28	vri 14-7-28
157		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**18 wkn**	**maa 8-5-28**	**vri 8-9-28**
158		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**8 wkn**	**maa 8-5-28**	**vri 30-6-28**
159		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	6 wkn	maa 8-5-28	vri 16-6-28
160		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 19-6-28	vri 30-6-28
161		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**maa 19-6-28**	**vri 14-7-28**
162		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 19-6-28	vri 30-6-28
163		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 3-7-28	vri 14-7-28
164		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**maa 17-7-28**	**vri 11-8-28**
165		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 17-7-28	vri 28-7-28
166		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 31-7-28	vri 11-8-28
167		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4 wkn**	**maa 14-8-28**	**vri 8-9-28**
168		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 14-8-28	vri 25-8-28
169		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 28-8-28	vri 8-9-28
170		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 8-9-28	vri 8-9-28
171		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**6 wkn**	**maa 11-9-28**	**vri 20-10-28**
172		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	2 wkn	maa 11-9-28	vri 22-9-28
173		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	OG	0%	1 wk	maa 25-9-28	vri 29-9-28
174		Aanleveren definitieve geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	1 wk	maa 2-10-28	vri 6-10-28
175		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 9-10-28	vri 20-10-28
176		Uitvoeringsscope gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 20-10-28	vri 20-10-28
177		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**maa 23-10-28**	**vri 1-12-28**
178		Opstellen kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	maa 23-10-28	vri 3-11-28
179		Review kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	maa 6-11-28	vri 10-11-28
180		Kaarten (sem)overheden kwantiteit en kwaliteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	maa 13-11-28	vri 17-11-28
181		Toesturen UOK op basis van Kwantiteit en Kwaliteit overheden	OM	OG	0%	2 wkn	maa 20-11-28	vri 1-12-28
182		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 1-12-28	vri 1-12-28
183		**Communicatie Omgeving Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**8 wkn**	**maa 23-10-28**	**vri 15-12-28**
184		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	maa 23-10-28	vri 17-11-28
185		Opstellen en versturen Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	4 wkn	maa 20-11-28	vri 15-12-28
186		Communicatie Omgeving Brief 2 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 15-12-28	vri 15-12-28

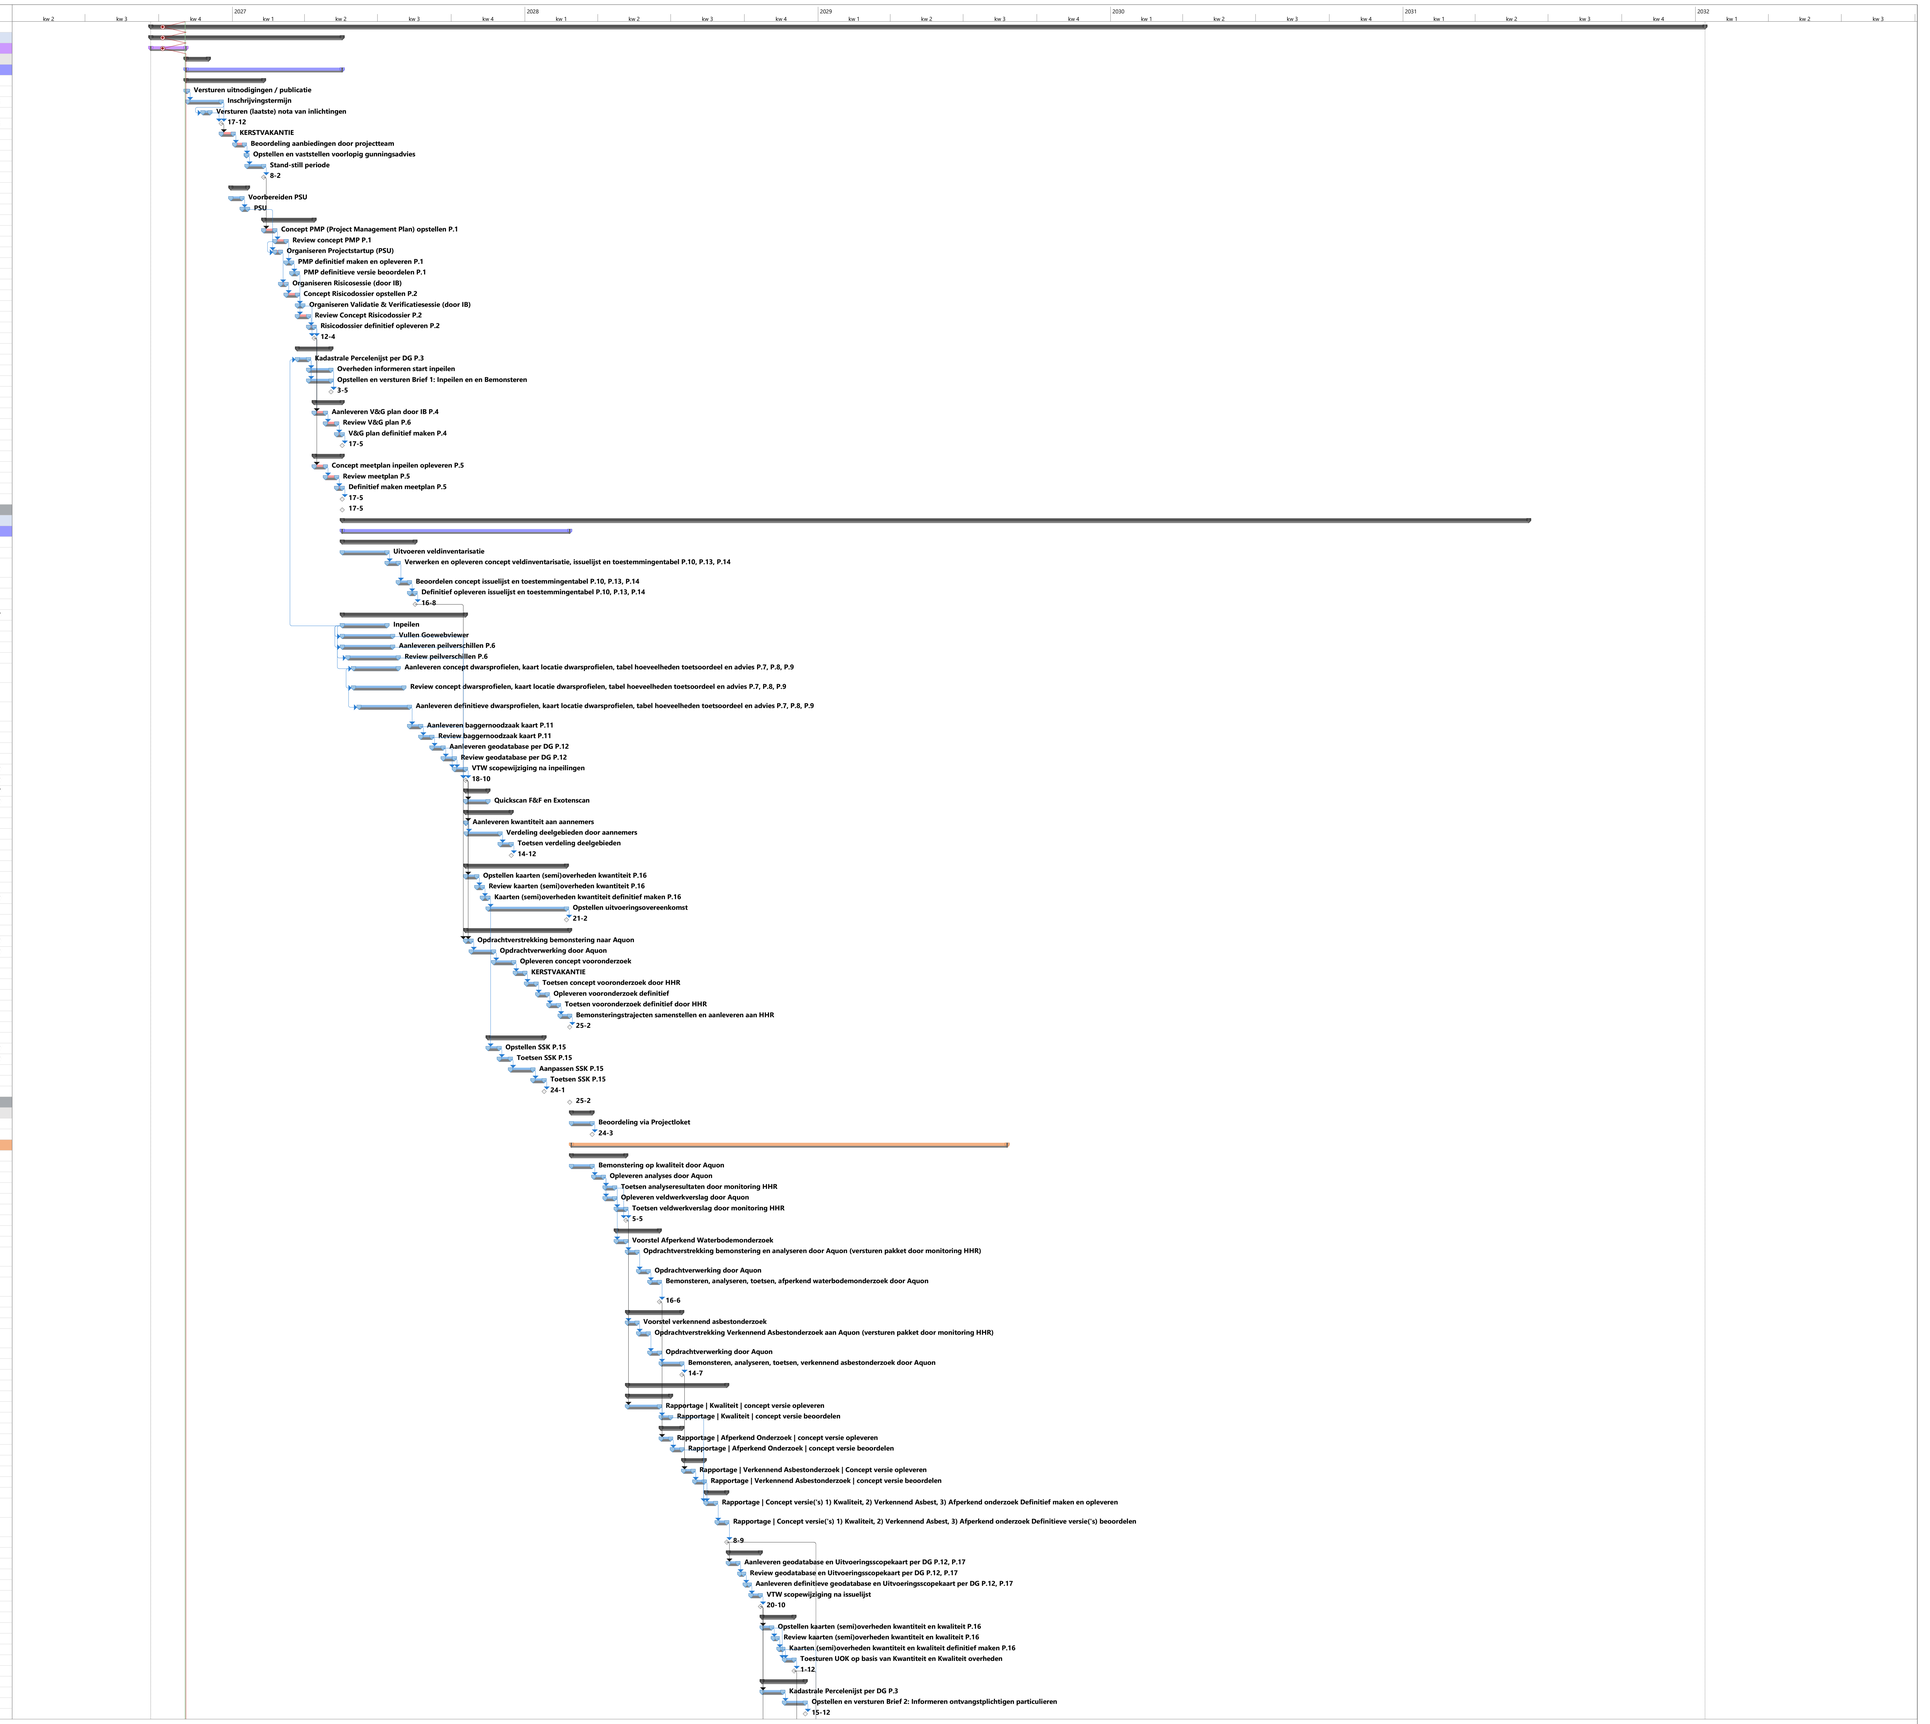


Project: Sjabloon Baggeren - in
Datum: din 3-11-26


Taak · Splitsing · Samenvatting · Inactieve taken · Inactieve samenvatting · Alleen duur · Handmatige samenvatting · Alleen einddatum · Externe mijlpaal · Basislijn · Samenvattingstaak van basislijn · Voortgang, handmatig

Kritiek · Mijlpaal · Projectsamenvatting · Inactieve mijlpaal · Handmatig taak · Handmatige samenvatting · Alleen begindatum · Externe taken · Deadline · Mijlpaal van basislijn · Voortgang

Id	Taakmodu	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
187		**SSK-Raming**			**0%**	**16 wkn**	**maa 23-10-28**	**vri 9-2-29**
188		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 23-10-28	vri 3-11-28
189		Opstellen rapport risicosessie P.2	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 6-11-28	vri 17-11-28
190		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	4 wkn	maa 4-12-28	vri 29-12-28
191		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 1-1-29	vri 12-1-29
192		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 15-1-29	vri 26-1-29
193		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 29-1-29	vri 9-2-29
194		SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed	MPB	OG	0%	0 dagen	vri 9-2-29	vri 9-2-29
195		**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**14 wkn**	**maa 1-1-29**	**vri 6-4-29**
196		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	ON	0%	2 wkn	maa 1-1-29	vri 12-1-29
197		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	OG	0%	2 wkn	maa 15-1-29	vri 26-1-29
198		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.18	CM	ON	0%	2 wkn	maa 29-1-29	vri 9-2-29
199		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	vri 9-2-29	vri 9-2-29
200		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	maa 12-2-29	vri 23-2-29
201		Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	1 wk	maa 19-2-29	vri 23-2-29
202		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	maa 26-2-29	vri 9-3-29
203		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	maa 2-4-29	vri 6-4-29
204		Prijsvorming Voorbereiding gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 6-4-29	vri 6-4-29
205		**Kredietaanvraag**			**0%**	**9 wkn**	**maa 29-1-29**	**vri 30-3-29**
206		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 29-1-29	vri 9-2-29
207		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	maa 12-2-29	vri 16-2-29
208		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 19-2-29	vri 2-3-29
209		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 5-3-29	vri 30-3-29
210		Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 30-3-29	vri 30-3-29
211		**Communicatie Omgeving Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**8 wkn**	**maa 29-1-29**	**vri 23-3-29**
212		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	maa 29-1-29	vri 23-2-29
213		Opstellen en versturen Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	4 wkn	maa 26-2-29	vri 23-3-29
214		Communicatie Omgeving Brief 3 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 23-3-29	vri 23-3-29
215		**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20 wkn**	**maa 9-4-29**	**vri 24-8-29**
216		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20 wkn	maa 9-4-29	vri 24-8-29
217		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	12 wkn	maa 9-4-29	vri 29-6-29
218		Bespreken werkzaamheden inschrijfstaat B (vanuit werkplannen)	CM	OG	0%	1 wk	maa 2-7-29	vri 6-7-29
219		Beoordelen werkplannen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 2-7-29	vri 13-7-29
220		Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 16-7-29	vri 27-7-29
221		Voorbereiding gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 24-8-29	vri 24-8-29
222		**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**4 wkn**	**vri 27-7-29**	**vri 24-8-29**
223		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	vri 27-7-29	vri 27-7-29
224		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2 wkn	maa 30-7-29	vri 10-8-29
225		Bespreken Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	1 wk	maa 13-8-29	vri 17-8-29
226		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	maa 13-8-29	vri 24-8-29
227		Prijsvorming Uitvoering gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 24-8-29	vri 24-8-29
228		**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**0 wkn**	**vri 24-8-29**	**vri 24-8-29**
233		**Gate 3.1**			**0%**	**4 wkn**	**maa 30-7-29**	**vri 24-8-29**
234		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 30-7-29	vri 24-8-29
235		Mijlpaal: Gate 3.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 24-8-29	vri 24-8-29
236		**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**1 wk**	**maa 27-8-29**	**vri 31-8-29**
237		**Nadere aanneemingsovereenkomst**			**0%**	**1 wk**	**maa 27-8-29**	**vri 31-8-29**
238		Sluiten nadere aanneemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	maa 27-8-29	vri 31-8-29
239		Nadere aanneemingsovereenkomt gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 31-8-29	vri 31-8-29
240		**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**0 wkn**	**vri 31-8-29**	**vri 31-8-29**
245		**Gate 3.2**			**0%**	**4 wkn**	**maa 3-9-29**	**vri 28-9-29**
246		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 3-9-29	vri 28-9-29
247		Mijlpaal: Gate 3.2 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 28-9-29	vri 28-9-29
248		**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**88 wkn**	**maa 3-9-29**	**vri 9-5-31**
249		**Realisatie**			**0%**	**59 wkn**	**maa 3-9-29**	**vri 18-10-30**
250		Realisatie	CM	OG	0%	52 wkn	maa 3-9-29	vri 30-8-30
251		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.8	CM	ON	0%	52 wkn	maa 17-9-29	vri 13-9-30
252		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	maa 16-9-30	vri 27-9-30
253		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	maa 30-9-30	vri 11-10-30
254		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	1 wk	maa 14-10-30	vri 18-10-30
255		Realisatie gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 18-10-30	vri 18-10-30
256		**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26 wkn**	**maa 2-9-30**	**vri 28-2-31**
257		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26 wkn	maa 2-9-30	vri 28-2-31
258		Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6 wkn	maa 2-9-30	vri 11-10-30
259		Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4 wkn	maa 14-10-30	vri 8-11-30
260		Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 28-2-31	vri 28-2-31
261		**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2 wkn**	**maa 30-9-30**	**vri 11-10-30**
262		Financiele afronding met gemeenten	OM	OG	0%	2 wkn	maa 30-9-30	vri 11-10-30
263		Afronden Contracten overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 11-10-30	vri 11-10-30
264		**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**12 wkn**	**maa 17-2-31**	**vri 9-5-31**
265		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	maa 17-2-31	vri 28-2-31
266		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	maa 17-2-31	vri 28-2-31
267		*KERSTVAKANTIE*			0%	2 wkn	*maa 3-3-31*	*vri 24-3-31*
268		Opstellen overdrachtsdossier P.20	TM	ON	0%	4 wkn	maa 17-3-31	vri 11-4-31
269		Opstellen nacalculatie door HHR	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 17-3-31	vri 11-4-31
270		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	maa 14-4-31	vri 9-5-31
271		Afronden contractuele verplichtingen IB gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 9-5-31	vri 9-5-31
272		Evaluatie met aannemer, IB, HHR	MBP	OG	0%	2 wkn	maa 17-3-31	vri 28-3-31
273		**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0 wkn**	**vri 9-5-31**	**vri 9-5-31**
278		**Gate 4.0**			**0%**	**4 wkn**	**maa 12-5-31**	**vri 6-6-31**
279		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 12-5-31	vri 6-6-31
280		Mijlpaal: Gate 4.0 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 6-6-31	vri 6-6-31
281		**Baggeren Regulier 2027 DG2**			**0%**	**211 wkn**	**din 29-6-27**	**maa 14-7-31**
282		**30_Definitiefase**			**0%**	**40 wkn**	**din 29-6-27**	**maa 3-4-28**
283		**Veldinventarisatie**			**0%**	**12 wkn**	**din 29-6-27**	**maa 20-9-27**
284		Uitvoeren veldinventarisatie	OM	ON	0%	7 wkn	din 29-6-27	maa 16-8-27
285		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie, issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	2 wkn	din 17-8-27	maa 30-8-27
286		Beoordelen concept issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	OG	0%	2 wkn	din 31-8-27	maa 13-9-27
287		Definitief opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	1 wk	din 14-9-27	maa 20-9-27
288		Veldinventarisatie gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 20-9-27	maa 20-9-27
289		**Inpeilen**			**0%**	**21 wkn**	**din 29-6-27**	**maa 22-11-27**
290		Inpeilen	TM	ON	0%	7 wkn	din 29-6-27	maa 16-8-27
291		Vullen Goewebviewer	TM	ON	0%	8 wkn	din 29-6-27	maa 23-8-27
292		Aanleveren peilverschillen P.6	TM	ON	0%	8 wkn	din 29-6-27	maa 23-8-27
293		Review peilverschillen P.6	TM	OG	0%	8 wkn	din 6-7-27	maa 30-8-27
294		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	7 wkn	din 13-7-27	maa 30-8-27
295		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	OG	0%	8 wkn	din 13-7-27	maa 6-9-27
296		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	8 wkn	din 20-7-27	maa 13-9-27
297		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.11	TM	ON	0%	2 wkn	din 14-9-27	maa 27-9-27
298		Review baggernoodzaak kaart P.11	TM	OG	0%	2 wkn	din 28-9-27	maa 11-10-27
299		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 12-10-27	maa 25-10-27
300		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	2 wkn	din 26-10-27	maa 8-11-27
301		VTW scopewijziging na inpeilingen	MPB	OG	0%	2 wkn	din 9-11-27	maa 22-11-27
302		Inpeilen gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 22-11-27	maa 22-11-27
303		**Omgevingsmanagement Kwantiteit**			**0%**	**4 wkn**	**din 23-11-27**	**maa 20-12-27**
304		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4 wkn	din 23-11-27	maa 20-12-27
305		**Kaarten Overheid**			**0%**	**18 wkn**	**din 23-11-27**	**maa 27-3-28**
306		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 23-11-27	maa 6-12-27
307		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 7-12-27	maa 13-12-27
308		Kaarten (semi)overheden kwantiteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 14-12-27	maa 20-12-27
309		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	14 wkn	din 21-12-27	maa 27-3-28
310		Kaarten Overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 27-3-28	maa 27-3-28
311		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**19 wkn**	**din 23-11-27**	**maa 3-4-28**
312		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	din 23-11-27	maa 29-11-27
313		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	6 wkn	din 30-11-27	maa 10-1-28
314		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4 wkn	din 11-1-28	maa 7-2-28
315		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-2-28	maa 21-2-28
316		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-2-28	maa 6-3-28
317		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 7-3-28	maa 20-3-28
318		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 21-3-28	maa 3-4-28
319		Opdracht naar Aquon en vooronderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 3-4-28	maa 3-4-28
320		**SSK-Raming**			**0%**	**10 wkn**	**maa 21-12-27**	**maa 28-2-28**
321		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	4 wkn	din 21-12-27	maa 17-1-28
322		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 18-1-28	maa 31-1-28
323		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 1-2-28	maa 14-2-28
324		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 15-2-28	maa 28-2-28
325		SSK-raming gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 28-2-28	maa 28-2-28
326		**Risico-reservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**maa 3-4-28**	**maa 3-4-28**
331		**Gate 3 (Projectcontract)**			**0%**	**4 wkn**	**din 4-4-28**	**maa 1-5-28**
332		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 4-4-28	maa 1-5-28
333		Mijlpaal: Gate 3 (Projectcontract) afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 1-5-28	maa 1-5-28
334		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**80 wkn**	**din 4-4-28**	**maa 15-10-29**
335		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**12 wkn**	**din 4-4-28**	**maa 26-6-28**
336		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	6 wkn	din 4-4-28	maa 15-5-28
337		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 16-5-28	maa 29-5-28
338		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 30-5-28	maa 12-6-28
339		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 30-5-28	maa 12-6-28
340		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 13-6-28	maa 26-6-28
341		Bemonsteren & Analyseren gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 26-6-28	maa 26-6-28
342		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**din 13-6-28**	**maa 7-8-28**
343		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 13-6-28	maa 26-6-28
344		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-6-28	maa 10-7-28
345		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-7-28	maa 24-7-28
346		Bemonsteren, analyseren, toetsen, afperkend waterbodemonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-7-28	maa 7-8-28
347		Afperkend onderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 7-8-28	maa 7-8-28
348		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**10 wkn**	**din 27-6-28**	**maa 4-9-28**
349		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-6-28	maa 10-7-28
350		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-7-28	maa 24-7-28
351		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-7-28	maa 7-8-28
352		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 8-8-28	maa 4-9-28
353		Verkennend Asbestonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 4-9-28	maa 4-9-28
354		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**18 wkn**	**din 27-6-28**	**maa 30-10-28**
355		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**8 wkn**	**din 27-6-28**	**maa 21-8-28**

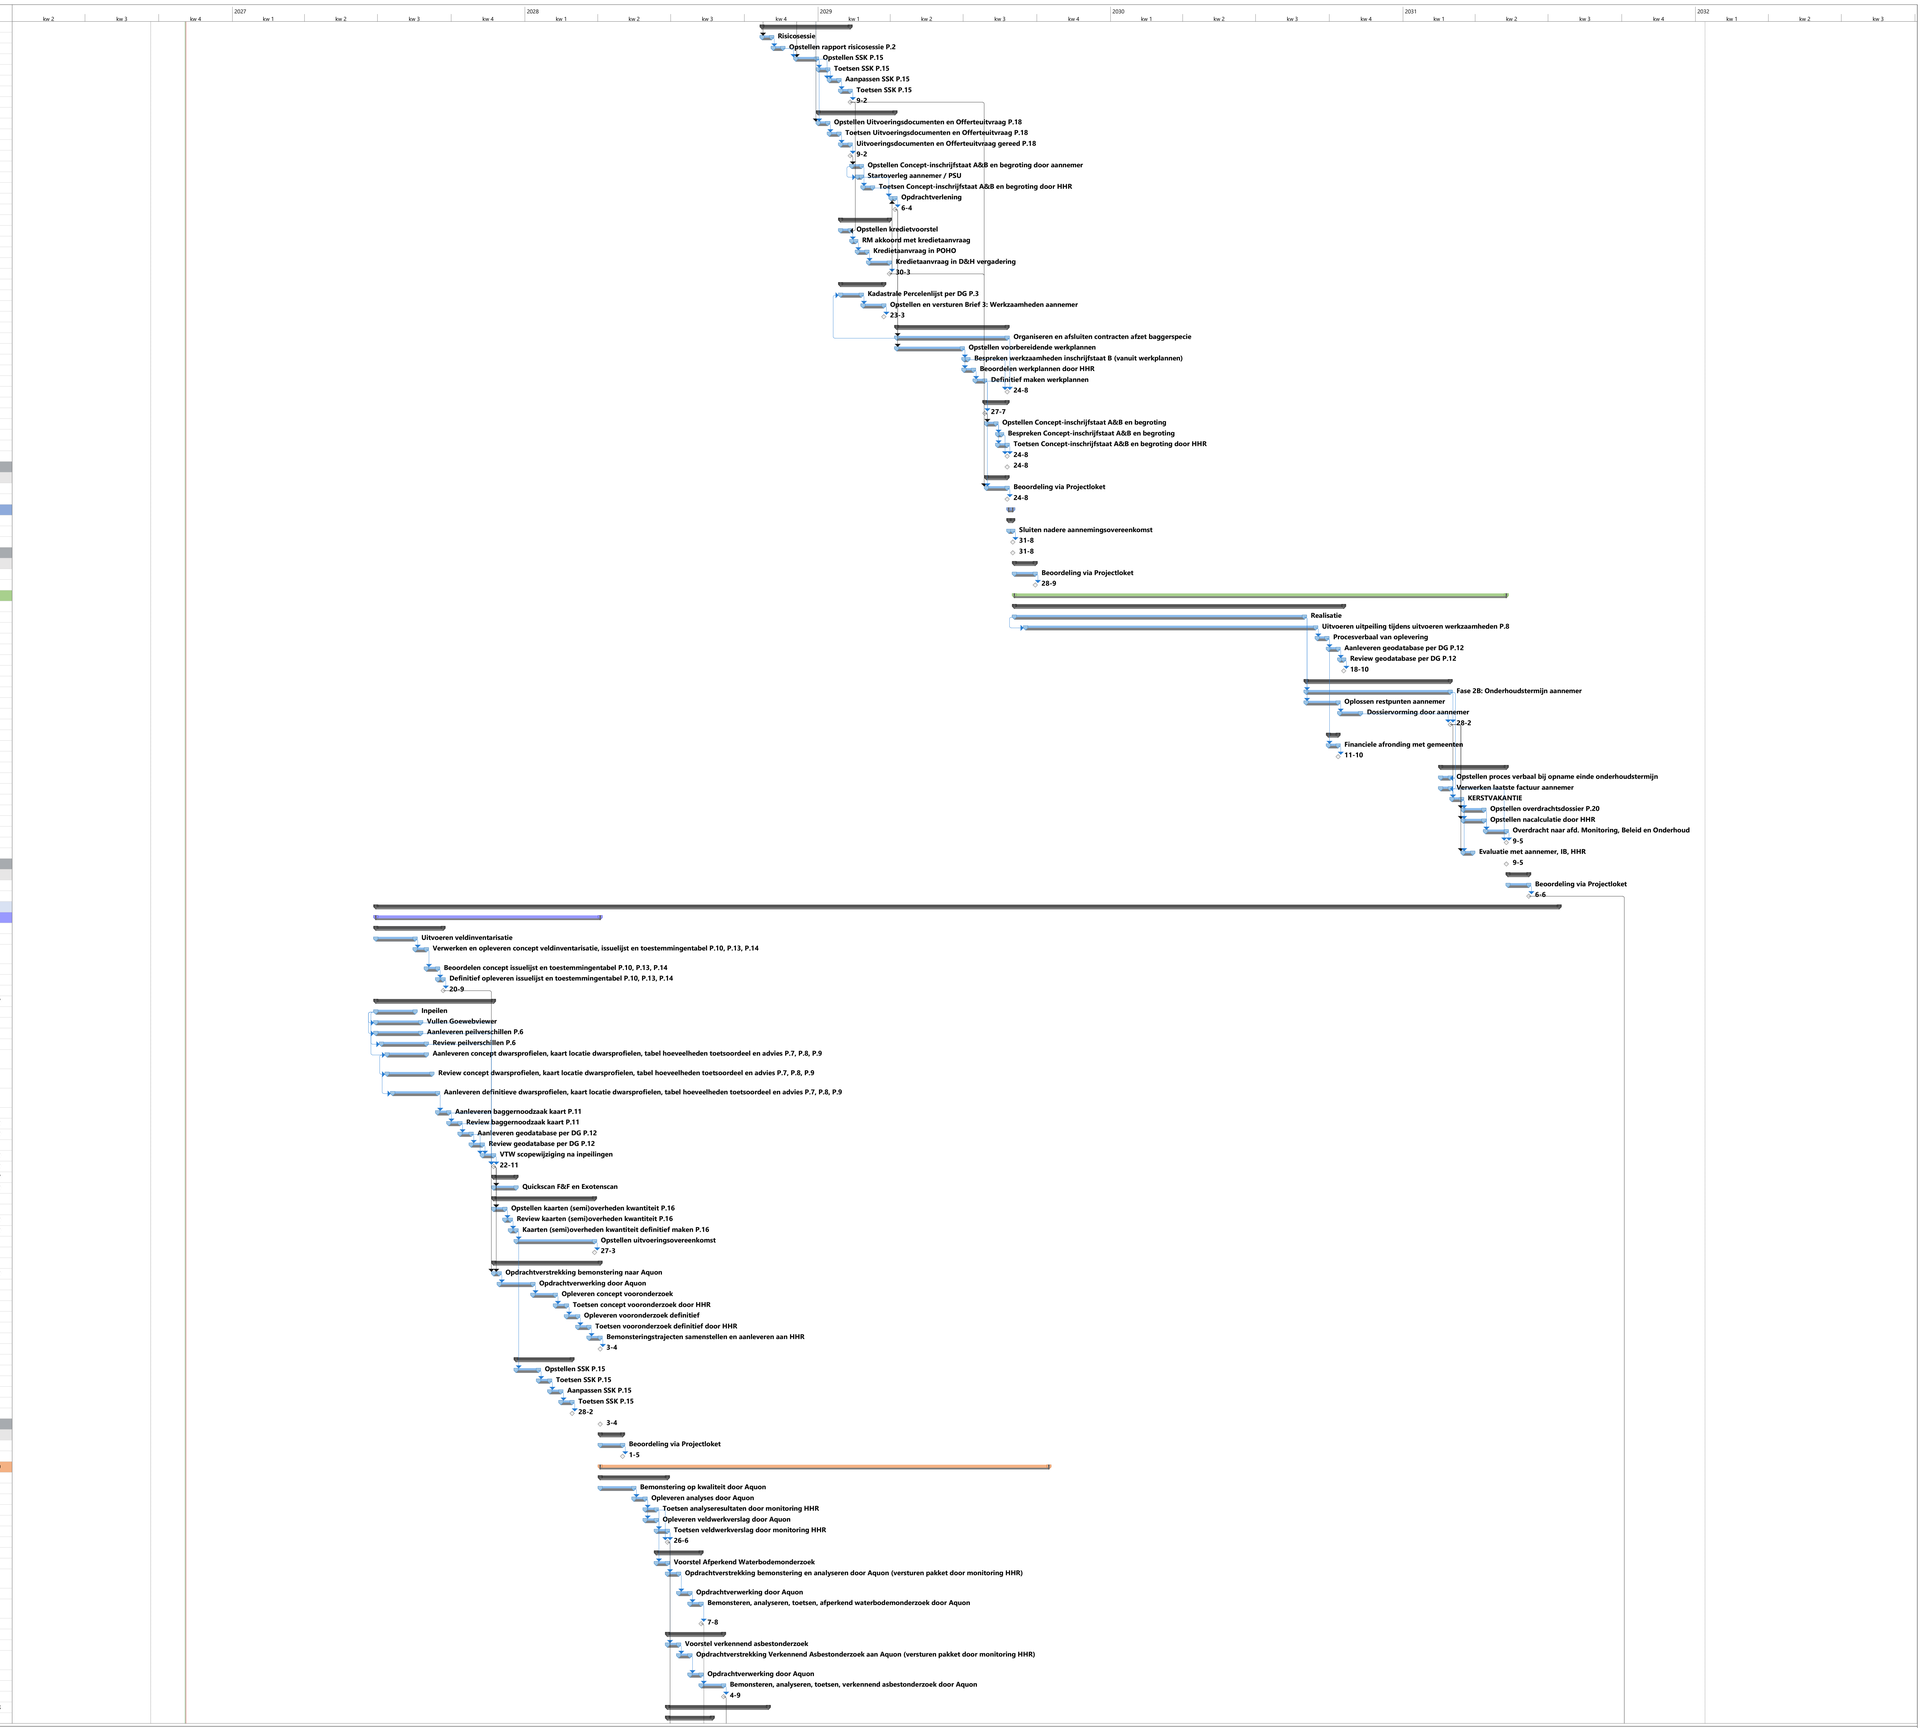


Id	Taakmodu	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
356		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	6 wkn	din 27-6-28	maa 7-8-28
357		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
358		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 8-8-28**	**maa 4-9-28**
359		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
360		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
361		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 5-9-28**	**maa 2-10-28**
362		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 5-9-28	maa 18-9-28
363		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 19-9-28	maa 2-10-28
364		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4 wkn**	**din 3-10-28**	**maa 30-10-28**
365		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 3-10-28	maa 16-10-28
366		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 17-10-28	maa 30-10-28
367		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 30-10-28	maa 30-10-28
368		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**6 wkn**	**din 31-10-28**	**maa 11-12-28**
369		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	2 wkn	din 31-10-28	maa 13-11-28
370		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	OG	0%	1 wk	din 14-11-28	maa 20-11-28
371		Aanleveren definitieve geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	1 wk	din 21-11-28	maa 27-11-28
372		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	din 28-11-28	maa 11-12-28
373		Uitvoeringsscope gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 11-12-28	maa 11-12-28
374		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**8 wkn**	**din 12-12-28**	**maa 5-2-29**
375		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 12-12-28	maa 25-12-28
376		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	OG	0%	3 wkn	din 26-12-28	maa 15-1-29
377		Kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 16-1-29	maa 22-1-29
378		Toesturen UOK op basis van Kwantiteit en Kwaliteit overheden	OM	OG	0%	2 wkn	din 23-1-29	maa 5-2-29
379		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 5-2-29	maa 5-2-29
380		**Communicatie Omgeving Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**10 wkn**	**din 12-12-28**	**maa 19-2-29**
381		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	6 wkn	din 12-12-28	maa 22-1-29
382		Opstellen en versturen Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	4 wkn	din 23-1-29	maa 19-2-29
383		Communicatie Omgeving Brief 2 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 19-2-29	maa 19-2-29
384		**SSK-Raming**			**0%**	**16 wkn**	**din 12-12-28**	**maa 2-4-29**
385		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	din 12-12-28	maa 25-12-28
386		Opstellen rapport risicosessie P.2	MPB	ON	0%	4 wkn	din 26-12-28	maa 22-1-29
387		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 6-2-29	maa 19-2-29
388		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 20-2-29	maa 5-3-29
389		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 6-3-29	maa 19-3-29
390		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
391		SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed	MPB	OG	0%	0 dagen	maa 2-4-29	maa 2-4-29
392		**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**14 wkn**	**din 20-2-29**	**maa 28-5-29**
393		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 20-2-29	maa 5-3-29
394		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	OG	0%	2 wkn	din 6-3-29	maa 19-3-29
395		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
396		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 2-4-29	maa 2-4-29
397		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 3-4-29	maa 16-4-29
398		Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	1 wk	din 10-4-29	maa 16-4-29
399		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 17-4-29	maa 30-4-29
400		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	din 22-5-29	maa 28-5-29
401		Prijsvorming Voorbereiding gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 28-5-29	maa 28-5-29
402		**Kredietaanvraag**			**0%**	**9 wkn**	**din 20-3-29**	**maa 21-5-29**
403		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
404		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	din 3-4-29	maa 9-4-29
405		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	din 10-4-29	maa 23-4-29
406		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	din 24-4-29	maa 21-5-29
407		Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 21-5-29	maa 21-5-29
408		**Communicatie Omgeving Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**8 wkn**	**din 20-3-29**	**maa 14-5-29**
409		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	din 20-3-29	maa 16-4-29
410		Opstellen en versturen Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	4 wkn	din 17-4-29	maa 14-5-29
411		Communicatie Omgeving Brief 3 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 14-5-29	maa 14-5-29
412		**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20 wkn**	**maa 15-10-29**	**maa 15-10-29**
413		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20 wkn	din 29-5-29	maa 15-10-29
414		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	12 wkn	din 29-5-29	maa 20-8-29
415		Bespreken werkzaamheden inschrijfstaat B (vanuit werkplannen)	CM	OG	0%	1 wk	din 21-8-29	maa 27-8-29
416		Beoordelen werkplannen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 21-8-29	maa 3-9-29
417		Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2 wkn	din 4-9-29	maa 17-9-29
418		Voorbereiding gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 15-10-29	maa 15-10-29
419		**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**4 wkn**	**maa 17-9-29**	**maa 15-10-29**
420		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 17-9-29	maa 17-9-29
421		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2 wkn	din 18-9-29	maa 1-10-29
422		Bespreken Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	1 wk	din 2-10-29	maa 8-10-29
423		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 2-10-29	maa 15-10-29
424		Prijsvorming Uitvoering gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 15-10-29	maa 15-10-29
425		**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**0 wkn**	**maa 15-10-29**	**maa 15-10-29**
430		**Gate 3.1**			**0%**	**4 wkn**	**din 18-9-29**	**maa 15-10-29**
431		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 18-9-29	maa 15-10-29
432		Mijlpaal: Gate 3.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 15-10-29	maa 15-10-29
433		**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**1 wk**	**din 16-10-29**	**maa 22-10-29**
434		**Nadere aannemingsovereenkomst**			**0%**	**1 wk**	**din 16-10-29**	**maa 22-10-29**
435		Sluiten nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	din 16-10-29	maa 22-10-29
436		Nadere aannemingsovereenkomt gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 22-10-29	maa 22-10-29
437		**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**0 wkn**	**maa 22-10-29**	**maa 22-10-29**
442		**Gate 3.2**			**0%**	**4 wkn**	**din 23-10-29**	**maa 19-11-29**
443		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 23-10-29	maa 19-11-29
444		Mijlpaal: Gate 3.2 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 19-11-29	maa 19-11-29
445		**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86 wkn**	**din 23-10-29**	**maa 16-6-31**
446		**Realisatie**			**0%**	**59 wkn**	**din 23-10-29**	**maa 9-12-30**
447		Realisatie	CM	OG	0%	52 wkn	din 23-10-29	maa 21-10-30
448		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.8	CM	ON	0%	52 wkn	din 6-11-29	maa 4-11-30
449		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	din 5-11-30	maa 18-11-30
450		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 19-11-30	maa 2-12-30
451		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	1 wk	din 3-12-30	maa 9-12-30
452		Realisatie gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 9-12-30	maa 9-12-30
453		**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26 wkn**	**din 22-10-30**	**maa 21-4-31**
454		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26 wkn	din 22-10-30	maa 21-4-31
455		Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6 wkn	din 22-10-30	maa 2-12-30
456		Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4 wkn	din 3-12-30	maa 30-12-30
457		Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 21-4-31	maa 21-4-31
458		**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2 wkn**	**din 19-11-30**	**maa 2-12-30**
459		Financiele afronding met gemeenten	OM	OG	0%	2 wkn	din 19-11-30	maa 2-12-30
460		Afronden Contracten overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 2-12-30	maa 2-12-30
461		**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**10 wkn**	**din 8-4-31**	**maa 16-6-31**
462		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	din 8-4-31	maa 21-4-31
463		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 8-4-31	maa 21-4-31
464		Opstellen overdrachtsdossier P.20	TM	ON	0%	4 wkn	din 22-4-31	maa 19-5-31
465		Opstellen nacalculatie door HHR	MPB	OG	0%	4 wkn	din 22-4-31	maa 19-5-31
466		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	din 20-5-31	maa 16-6-31
467		Afronden contractuele verplichtingen IB gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 16-6-31	maa 16-6-31
468		Evaluatie met aannemer, IB, HHR	MBP	OG	0%	2 wkn	din 22-4-31	maa 5-5-31
469		**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0 wkn**	**maa 16-6-31**	**maa 16-6-31**
474		**Gate 4.0**			**0%**	**4 wkn**	**din 17-6-31**	**maa 14-7-31**
475		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 17-6-31	maa 14-7-31
476		Mijlpaal: Gate 4.0 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 14-7-31	maa 14-7-31
477		**Baggeren Regulier 2027 DG4**			**0%**	**209 wkn**	**din 10-8-27**	**maa 11-8-31**
478		**30_Definitiefase**			**0%**	**39 wkn**	**din 10-8-27**	**maa 8-5-28**
479		**Veldinventarisatie**			**0%**	**11 wkn**	**din 10-8-27**	**maa 25-10-27**
480		Uitvoeren veldinventarisatie	OM	ON	0%	6 wkn	din 10-8-27	maa 20-9-27
481		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie, issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	2 wkn	din 21-9-27	maa 4-10-27
482		Beoordelen concept issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	OG	0%	2 wkn	din 5-10-27	maa 18-10-27
483		Definitief opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	1 wk	din 19-10-27	maa 25-10-27
484		Veldinventarisatie gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 25-10-27	maa 25-10-27
485		**Inpeilen**			**0%**	**22 wkn**	**din 10-8-27**	**maa 10-1-28**
486		Inpeilen	TM	ON	0%	6 wkn	din 10-8-27	maa 20-9-27
487		Vullen Goewebviewer	TM	ON	0%	7 wkn	din 10-8-27	maa 27-9-27
488		Aanleveren peilverschillen P.6	TM	ON	0%	7 wkn	din 10-8-27	maa 27-9-27
489		Review peilverschillen P.6	TM	OG	0%	7 wkn	din 17-8-27	maa 4-10-27
490		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	6 wkn	din 24-8-27	maa 4-10-27
491		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	OG	0%	7 wkn	din 24-8-27	maa 11-10-27
492		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	7 wkn	din 31-8-27	maa 18-10-27
493		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.11	TM	ON	0%	2 wkn	din 19-10-27	maa 1-11-27
494		Review baggernoodzaak kaart P.11	TM	OG	0%	2 wkn	din 2-11-27	maa 15-11-27
495		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 16-11-27	maa 29-11-27
496		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	2 wkn	din 30-11-27	maa 13-12-27
497		VTW scopewijziging na inpeilingen	MPB	OG	0%	4 wkn	din 14-12-27	maa 10-1-28
498		Inpeilen gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 10-1-28	maa 10-1-28
499		**Omgevingsmanagement Kwantiteit**			**0%**	**4 wkn**	**din 11-1-28**	**maa 7-2-28**
500		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4 wkn	din 11-1-28	maa 7-2-28
501		**Kaarten Overheid**			**0%**	**16 wkn**	**din 11-1-28**	**maa 1-5-28**
502		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 11-1-28	maa 24-1-28
503		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 25-1-28	maa 31-1-28
504		Kaarten (semi)overheden kwantiteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 1-2-28	maa 7-2-28
505		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	12 wkn	din 8-2-28	maa 1-5-28
506		Kaarten Overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 1-5-28	maa 1-5-28
507		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**17 wkn**	**din 11-1-28**	**maa 8-5-28**
508		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	din 11-1-28	maa 17-1-28
509		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 18-1-28	maa 14-2-28
510		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4 wkn	din 15-2-28	maa 13-3-28
511		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 14-3-28	maa 27-3-28
512		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2 wkn	din 28-3-28	maa 10-4-28
513		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-4-28	maa 24-4-28
514		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-4-28	maa 8-5-28
515		Opdracht naar Aquon en vooronderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 8-5-28	maa 8-5-28
516		**SSK-Raming**			**0%**	**8 wkn**	**din 8-2-28**	**maa 3-4-28**
517		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 8-2-28	maa 21-2-28
518		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 22-2-28	maa 6-3-28
519		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 7-3-28	maa 20-3-28
520		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 21-3-28	maa 3-4-28
521		SSK-raming gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 3-4-28	maa 3-4-28

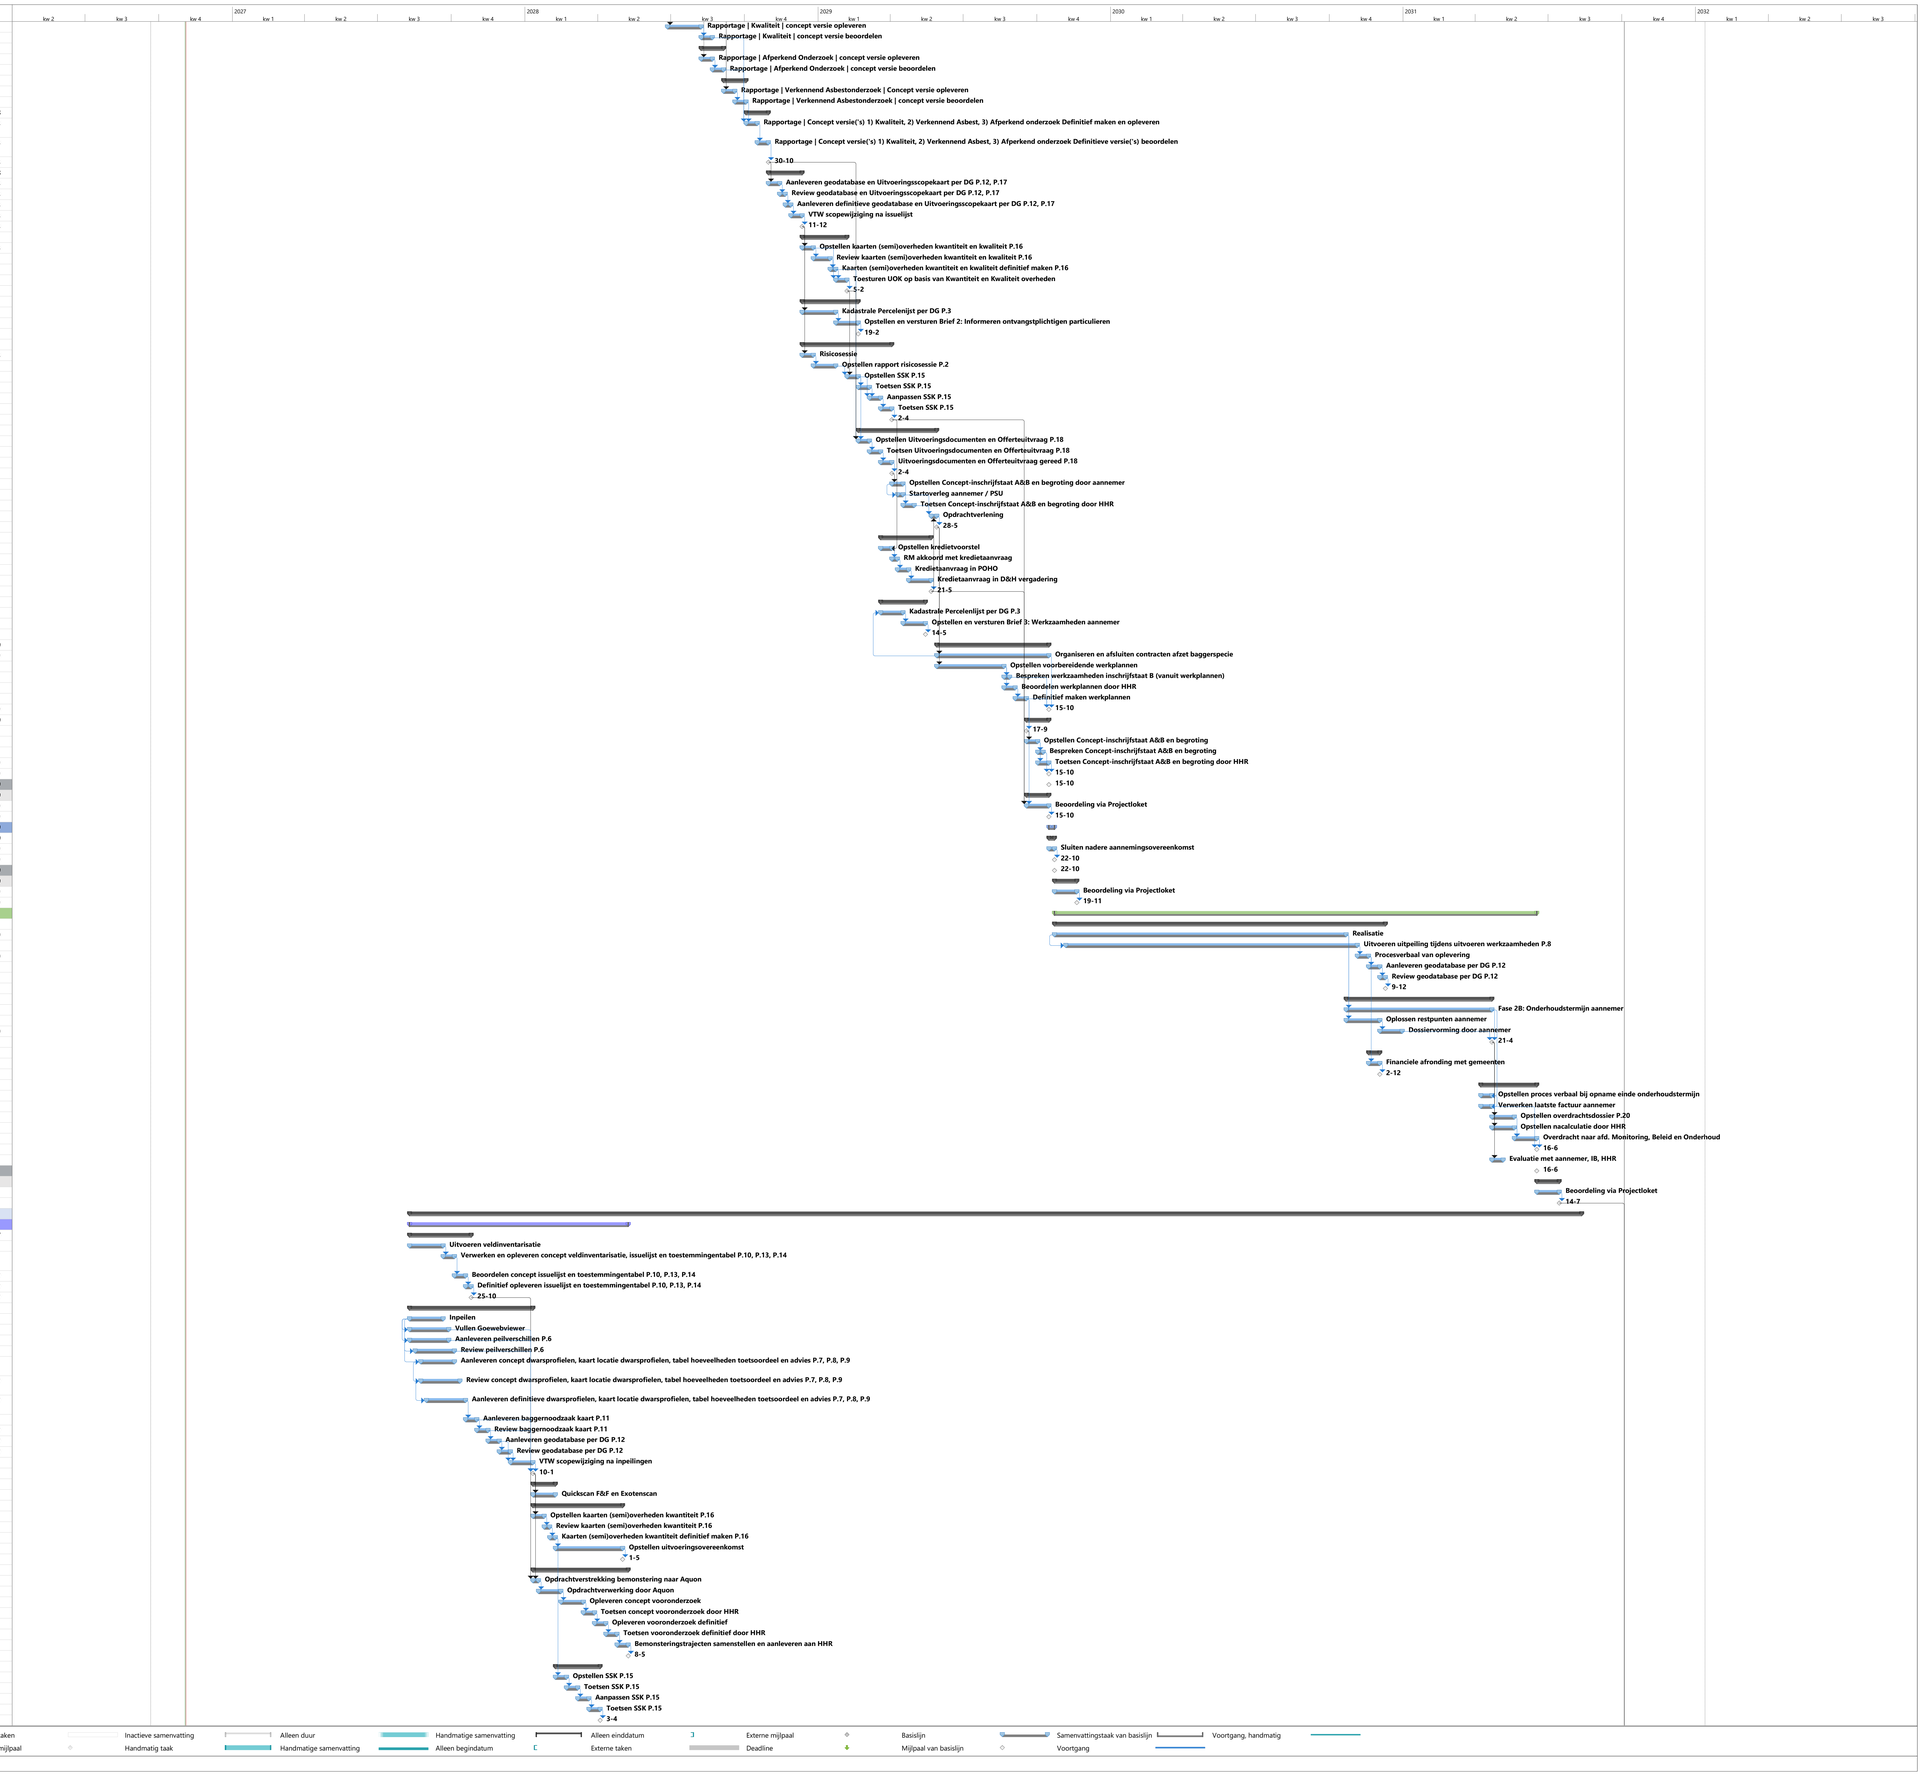

Id	Taakmodi	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
522		**Risico-reservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**maa 8-5-28**	**maa 8-5-28**
527		**Gate 3 (Projectcontract)**			**0%**	**4 wkn**	**din 9-5-28**	**maa 5-6-28**
528		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 9-5-28	maa 5-6-28
529		Miljpaal: Gate 3 (Projectcontract) afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 5-6-28	maa 5-6-28
530		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**79 wkn**	**din 9-5-28**	**maa 12-11-29**
531		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**11 wkn**	**din 9-5-28**	**maa 24-7-28**
532		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	5 wkn	din 9-5-28	maa 12-6-28
533		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 13-6-28	maa 26-6-28
534		Toetsen analysesresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-6-28	maa 10-7-28
535		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 27-6-28	maa 10-7-28
536		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-7-28	maa 24-7-28
537		Bemonsteren & Analyseren gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 24-7-28	maa 24-7-28
538		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**din 11-7-28**	**maa 4-9-28**
539		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-7-28	maa 24-7-28
540		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-7-28	maa 7-8-28
541		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
542		Bemonsteren, analyseren, toetsen, afperkend waterbodemonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
543		Afperkend onderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 4-9-28	maa 4-9-28
544		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**10 wkn**	**din 25-7-28**	**maa 2-10-28**
545		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-7-28	maa 7-8-28
546		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
547		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
548		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 5-9-28	maa 2-10-28
549		Verkennend Asbestonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 2-10-28	maa 2-10-28
550		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**18 wkn**	**din 25-7-28**	**maa 27-11-28**
551		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**din 25-7-28**	**maa 4-9-28**
552		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	4 wkn	din 25-7-28	maa 21-8-28
553		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
554		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 5-9-28**	**maa 2-10-28**
555		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 5-9-28	maa 18-9-28
556		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 19-9-28	maa 2-10-28
557		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 3-10-28**	**maa 30-10-28**
558		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 3-10-28	maa 16-10-28
559		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 17-10-28	maa 30-10-28
560		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4 wkn**	**din 31-10-28**	**maa 27-11-28**
561		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 31-10-28	maa 13-11-28
562		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 14-11-28	maa 27-11-28
563		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 27-11-28	maa 27-11-28
564		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**8 wkn**	**din 28-11-28**	**maa 22-1-29**
565		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	2 wkn	din 28-11-28	maa 11-12-28
566		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	OG	0%	1 wk	din 12-12-28	maa 18-12-28
567		Aanleveren definitieve geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	3 wkn	din 19-12-28	maa 8-1-29
568		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	din 9-1-29	maa 22-1-29
569		Uitvoeringsscope gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 22-1-29	maa 22-1-29
570		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**din 23-1-29**	**maa 5-3-29**
571		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 23-1-29	maa 5-2-29
572		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 6-2-29	maa 12-2-29
573		Kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 13-2-29	maa 19-2-29
574		Toesturen UOK op basis van Kwantiteit en Kwaliteit overheden	OM	OG	0%	2 wkn	din 20-2-29	maa 5-3-29
575		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 5-3-29	maa 5-3-29
576		**Communicatie Omgeving Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**8 wkn**	**din 23-1-29**	**maa 19-3-29**
577		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	din 23-1-29	maa 19-2-29
578		Opstellen en versturen Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	4 wkn	din 20-2-29	maa 19-3-29
579		Communicatie Omgeving Brief 2 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 19-3-29	maa 19-3-29
580		**SSK-Raming**			**0%**	**14 wkn**	**din 23-1-29**	**maa 30-4-29**
581		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	din 23-1-29	maa 5-2-29
582		Opstellen rapport risicosessie P.2	MPB	ON	0%	2 wkn	din 6-2-29	maa 19-2-29
583		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 6-3-29	maa 19-3-29
584		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
585		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 3-4-29	maa 16-4-29
586		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 17-4-29	maa 30-4-29
587		SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed	MPB	OG	0%	0 dagen	maa 30-4-29	maa 30-4-29
588		**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**14 wkn**	**din 20-3-29**	**maa 25-6-29**
589		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
590		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	OG	0%	2 wkn	din 3-4-29	maa 16-4-29
591		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 17-4-29	maa 30-4-29
592		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 30-4-29	maa 30-4-29
593		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 1-5-29	maa 14-5-29
594		Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	1 wk	din 8-5-29	maa 14-5-29
595		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 15-5-29	maa 28-5-29
596		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	din 19-6-29	maa 25-6-29
597		Prijsvorming Voorbereiding gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 25-6-29	maa 25-6-29
598		**Kredietaanvraag**			**0%**	**9 wkn**	**din 17-4-29**	**maa 18-6-29**
599		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	din 17-4-29	maa 30-4-29
600		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	din 1-5-29	maa 7-5-29
601		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	din 8-5-29	maa 21-5-29
602		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	din 22-5-29	maa 18-6-29
603		Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 18-6-29	maa 18-6-29
604		**Communicatie Omgeving Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**8 wkn**	**din 17-4-29**	**maa 11-6-29**
605		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	din 17-4-29	maa 14-5-29
606		Opstellen en versturen Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	4 wkn	din 15-5-29	maa 11-6-29
607		Communicatie Omgeving Brief 3 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 11-6-29	maa 11-6-29
608		**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20 wkn**	**din 26-6-29**	**maa 12-11-29**
609		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20 wkn	din 26-6-29	maa 12-11-29
610		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	12 wkn	din 26-6-29	maa 17-9-29
611		Bespreken werkzaamheden inschrijfstaat B (vanuit werkplannen)	CM	OG	0%	1 wk	din 18-9-29	maa 24-9-29
612		Beoordelen werkplannen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 18-9-29	maa 1-10-29
613		Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2 wkn	din 2-10-29	maa 15-10-29
614		Voorbereiding gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 12-11-29	maa 12-11-29
615		**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**4 wkn**	**maa 15-10-29**	**maa 12-11-29**
616		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 15-10-29	maa 15-10-29
617		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2 wkn	din 16-10-29	maa 29-10-29
618		Bespreken Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	1 wk	din 30-10-29	maa 5-11-29
619		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 30-10-29	maa 12-11-29
620		Prijsvorming Uitvoering gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 12-11-29	maa 12-11-29
621		**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**0 wkn**	**maa 12-11-29**	**maa 12-11-29**
626		**Gate 3.1**			**0%**	**4 wkn**	**din 16-10-29**	**maa 12-11-29**
627		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 16-10-29	maa 12-11-29
628		Miljpaal: Gate 3.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 12-11-29	maa 12-11-29
629		**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**1 wk**	**din 13-11-29**	**maa 19-11-29**
630		**Nadere aanmeldingsovereenkomst**			**0%**	**1 wk**	**din 13-11-29**	**maa 19-11-29**
631		Sluiten nadere aanmeldingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	din 13-11-29	maa 19-11-29
632		Nadere aanmeldingsovereenkomst gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 19-11-29	maa 19-11-29
633		**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**0 wkn**	**maa 19-11-29**	**maa 19-11-29**
638		**Gate 3.2**			**0%**	**4 wkn**	**din 20-11-29**	**maa 17-12-29**
639		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 20-11-29	maa 17-12-29
640		Miljpaal: Gate 3.2 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 17-12-29	maa 17-12-29
641		**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86 wkn**	**din 20-11-29**	**maa 14-7-31**
642		**Realisatie**			**0%**	**61 wkn**	**din 20-11-29**	**maa 20-1-31**
643		DG1 Realisatie	CM	OG	0%	52 wkn	din 20-11-29	maa 18-11-30
644		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.8	CM	ON	0%	52 wkn	din 4-12-29	maa 2-12-30
645		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	din 3-12-30	maa 16-12-30
646		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	4 wkn	din 17-12-30	maa 13-1-31
647		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	1 wk	din 14-1-31	maa 20-1-31
648		Realisatie gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 20-1-31	maa 20-1-31
649		**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26 wkn**	**din 19-11-30**	**maa 19-5-31**
650		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26 wkn	din 19-11-30	maa 19-5-31
651		Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	8 wkn	din 19-11-30	maa 13-1-31
652		Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4 wkn	din 14-1-31	maa 10-2-31
653		Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 19-5-31	maa 19-5-31
654		**Afronden contracten overheid**			**0%**	**4 wkn**	**din 17-12-30**	**maa 13-1-31**
655		Financiele afronding met gemeenten	OM	OG	0%	4 wkn	din 17-12-30	maa 13-1-31
656		Afronden Contracten overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 13-1-31	maa 13-1-31
657		**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**10 wkn**	**din 6-5-31**	**maa 14-7-31**
658		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	din 6-5-31	maa 19-5-31
659		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 6-5-31	maa 19-5-31
660		Opstellen overdrachtsdossier P.20	TM	ON	0%	4 wkn	din 20-5-31	maa 16-6-31
661		Opstellen nacalculatie door HHR	MPB	OG	0%	4 wkn	din 20-5-31	maa 16-6-31
662		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	din 17-6-31	maa 14-7-31
663		Afronden contractuele verplichtingen IB gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 14-7-31	maa 14-7-31
664		Evaluatie met aannemer, IB, HHR	MBP	OG	0%	2 wkn	din 20-5-31	maa 2-6-31
665		**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0 wkn**	**maa 14-7-31**	**maa 14-7-31**
670		**Gate 4.0**			**0%**	**4 wkn**	**din 15-7-31**	**maa 11-8-31**
671		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 15-7-31	maa 11-8-31
672		Miljpaal: Gate 4.0 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 11-8-31	maa 11-8-31
673		**Baggeren Regulier 2027 DG1**			**0%**	**211 wkn**	**din 21-9-27**	**maa 6-10-31**
674		**30_Definitiefase**			**0%**	**39 wkn**	**din 21-9-27**	**maa 19-6-28**
675		**Veldinventarisatie**			**0%**	**11 wkn**	**din 21-9-27**	**maa 6-12-27**
676		Uitvoeren veldinventarisatie	OM	ON	0%	6 wkn	din 21-9-27	maa 1-11-27
677		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie, issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	2 wkn	din 2-11-27	maa 15-11-27
678		Beoordelen concept issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	OG	0%	2 wkn	din 16-11-27	maa 29-11-27
679		Definitief opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	1 wk	din 30-11-27	maa 6-12-27
680		Veldinventarisatie gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 6-12-27	maa 6-12-27
681		**Inpeilen**			**0%**	**22 wkn**	**din 21-9-27**	**maa 21-2-28**
682		Inpeilen	TM	ON	0%	6 wkn	din 21-9-27	maa 1-11-27
683		Vullen Goewebviewer	TM	ON	0%	7 wkn	din 21-9-27	maa 8-11-27
684		Aanleveren peilverschillen P.6	TM	ON	0%	7 wkn	din 21-9-27	maa 8-11-27
685		Review peilverschillen P.6	TM	OG	0%	7 wkn	din 28-9-27	maa 15-11-27
686		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	6 wkn	din 5-10-27	maa 15-11-27
687		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	OG	0%	7 wkn	din 5-10-27	maa 22-11-27
688		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	7 wkn	din 12-10-27	maa 29-11-27


Id	Taakmodu	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
689		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.11	TM	ON	0%	2 wkn	din 30-11-27	maa 13-12-27
690		Review baggernoodzaak kaart P.11	TM	OG	0%	4 wkn	din 14-12-27	maa 10-1-28
691		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 11-1-28	maa 24-1-28
692		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-1-28	maa 7-2-28
693		VTW scopewijziging na inpeilingen	MPB	OG	0%	2 wkn	din 8-2-28	maa 21-2-28
694		Inpeilen gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 21-2-28	maa 21-2-28
695		**Omgevingsmanagement Kwantiteit**			**0%**	**4 wkn**	**din 22-2-28**	**maa 20-3-28**
696		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4 wkn	din 22-2-28	maa 20-3-28
697		**Kaarten Overheid**			**0%**	**16 wkn**	**din 22-2-28**	**maa 12-6-28**
698		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 22-2-28	maa 6-3-28
699		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 7-3-28	maa 13-3-28
700		Kaarten (semi)overheden kwantiteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 14-3-28	maa 20-3-28
701		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	12 wkn	din 21-3-28	maa 12-6-28
702		Kaarten Overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 12-6-28	maa 12-6-28
703		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**17 wkn**	**din 22-2-28**	**maa 19-6-28**
704		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	din 22-2-28	maa 28-2-28
705		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 29-2-28	maa 27-3-28
706		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	4 wkn	din 28-3-28	maa 24-4-28
707		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-4-28	maa 8-5-28
708		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2 wkn	din 9-5-28	maa 22-5-28
709		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 23-5-28	maa 5-6-28
710		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 6-6-28	maa 19-6-28
711		Opdracht naar Aquon en vooronderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 19-6-28	maa 19-6-28
712		**SSK-Raming**			**0%**	**8 wkn**	**din 21-3-28**	**maa 15-5-28**
713		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 21-3-28	maa 3-4-28
714		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 4-4-28	maa 17-4-28
715		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 18-4-28	maa 1-5-28
716		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 2-5-28	maa 15-5-28
717		SSK-raming gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 15-5-28	maa 15-5-28
718		**Risico-reservering 30_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**maa 19-6-28**	**maa 19-6-28**
723		**Gate 3 (Projectcontract)**			**0%**	**4 wkn**	**din 20-6-28**	**maa 17-7-28**
724		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 20-6-28	maa 17-7-28
725		Mijlpaal: Gate 3 (Projectcontract) afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 17-7-28	maa 17-7-28
726		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**79 wkn**	**din 20-6-28**	**maa 24-12-29**
727		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**11 wkn**	**din 20-6-28**	**maa 4-9-28**
728		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	5 wkn	din 20-6-28	maa 24-7-28
729		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-7-28	maa 7-8-28
730		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
731		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-8-28	maa 21-8-28
732		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
733		Bemonsteren & Analyseren gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 4-9-28	maa 4-9-28
734		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**din 22-8-28**	**maa 16-10-28**
735		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 22-8-28	maa 4-9-28
736		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 5-9-28	maa 18-9-28
737		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 19-9-28	maa 2-10-28
738		Bemonsteren, analyseren, toetsen, afperkend waterbodemonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 3-10-28	maa 16-10-28
739		Afperkend onderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 16-10-28	maa 16-10-28
740		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**10 wkn**	**din 5-9-28**	**maa 13-11-28**
741		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 5-9-28	maa 18-9-28
742		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	din 19-9-28	maa 2-10-28
743		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	din 3-10-28	maa 16-10-28
744		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 17-10-28	maa 13-11-28
745		Verkennend Asbestonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 13-11-28	maa 13-11-28
746		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**20 wkn**	**din 5-9-28**	**maa 22-1-29**
747		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**din 5-9-28**	**maa 16-10-28**
748		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	4 wkn	din 5-9-28	maa 2-10-28
749		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 3-10-28	maa 16-10-28
750		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 17-10-28**	**maa 13-11-28**
751		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 17-10-28	maa 30-10-28
752		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 31-10-28	maa 13-11-28
753		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**din 14-11-28**	**maa 11-12-28**
754		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 14-11-28	maa 27-11-28
755		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	din 28-11-28	maa 11-12-28
756		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**6 wkn**	**din 12-12-28**	**maa 22-1-29**
757		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	din 12-12-28	maa 25-12-28
758		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	4 wkn	din 26-12-28	maa 22-1-29
759		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 22-1-29	maa 22-1-29
760		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**6 wkn**	**din 23-1-29**	**maa 5-3-29**
761		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	2 wkn	din 23-1-29	maa 5-2-29
762		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	OG	0%	1 wk	din 6-2-29	maa 12-2-29
763		Aanleveren definitieve geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	1 wk	din 13-2-29	maa 19-2-29
764		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	din 20-2-29	maa 5-3-29
765		Uitvoeringsscope gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 5-3-29	maa 5-3-29
766		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**din 6-3-29**	**maa 16-4-29**
767		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 6-3-29	maa 19-3-29
768		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 20-3-29	maa 26-3-29
769		Kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 27-3-29	maa 2-4-29
770		Toesturen UOK op basis van Kwantiteit en Kwaliteit overheden	OM	OG	0%	2 wkn	din 3-4-29	maa 16-4-29
771		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 16-4-29	maa 16-4-29
772		**Communicatie Omgeving Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**8 wkn**	**din 6-3-29**	**maa 30-4-29**
773		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	din 6-3-29	maa 2-4-29
774		Opstellen en versturen Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	4 wkn	din 3-4-29	maa 30-4-29
775		Communicatie Omgeving Brief 2 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 30-4-29	maa 30-4-29
776		**SSK-Raming**			**0%**	**14 wkn**	**din 6-3-29**	**maa 11-6-29**
777		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	din 6-3-29	maa 19-3-29
778		Opstellen rapport risicosessie P.2	MPB	ON	0%	2 wkn	din 20-3-29	maa 2-4-29
779		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 17-4-29	maa 30-4-29
780		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 1-5-29	maa 14-5-29
781		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 15-5-29	maa 28-5-29
782		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 29-5-29	maa 11-6-29
783		SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed	MPB	OG	0%	0 dagen	maa 11-6-29	maa 11-6-29
784		**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**14 wkn**	**din 1-5-29**	**maa 6-8-29**
785		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 1-5-29	maa 14-5-29
786		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	OG	0%	2 wkn	din 15-5-29	maa 28-5-29
787		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.18	CM	ON	0%	2 wkn	din 29-5-29	maa 11-6-29
788		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 11-6-29	maa 11-6-29
789		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 12-6-29	maa 25-6-29
790		Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	1 wk	din 19-6-29	maa 25-6-29
791		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 26-6-29	maa 9-7-29
792		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	din 31-7-29	maa 6-8-29
793		Prijsvorming Voorbereiding gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 6-8-29	maa 6-8-29
794		**Kredietaanvraag**			**0%**	**9 wkn**	**din 29-5-29**	**maa 30-7-29**
795		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	din 29-5-29	maa 11-6-29
796		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	din 12-6-29	maa 18-6-29
797		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	din 19-6-29	maa 2-7-29
798		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	din 3-7-29	maa 30-7-29
799		Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 30-7-29	maa 30-7-29
800		**Communicatie Omgeving Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**8 wkn**	**din 29-5-29**	**maa 23-7-29**
801		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	din 29-5-29	maa 25-6-29
802		Opstellen en versturen Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	4 wkn	din 26-6-29	maa 23-7-29
803		Communicatie Omgeving Brief 3 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 23-7-29	maa 23-7-29
804		**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20 wkn**	**din 7-8-29**	**maa 24-12-29**
805		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20 wkn	din 7-8-29	maa 24-12-29
806		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	12 wkn	din 7-8-29	maa 29-10-29
807		Bespreken werkzaamheden inschrijfstaat B (vanuit werkplannen)	CM	OG	0%	1 wk	din 30-10-29	maa 5-11-29
808		Beoordelen werkplannen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 30-10-29	maa 12-11-29
809		Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2 wkn	din 13-11-29	maa 26-11-29
810		Voorbereiding gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 24-12-29	maa 24-12-29
811		**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**4 wkn**	**maa 26-11-29**	**maa 24-12-29**
812		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	maa 26-11-29	maa 26-11-29
813		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2 wkn	din 27-11-29	maa 10-12-29
814		Bespreken Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	1 wk	din 11-12-29	maa 17-12-29
815		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	din 11-12-29	maa 24-12-29
816		Prijsvorming Uitvoering gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 24-12-29	maa 24-12-29
817		**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**0 wkn**	**maa 24-12-29**	**maa 24-12-29**
822		**Gate 3.1**			**0%**	**4 wkn**	**din 27-11-29**	**maa 24-12-29**
823		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 27-11-29	maa 24-12-29
824		Mijlpaal: Gate 3.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 24-12-29	maa 24-12-29
825		**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**3 wkn**	**din 25-12-29**	**maa 14-1-30**
826		**Nadere aannemingsovereenkomst**			**0%**	**3 wkn**	**din 25-12-29**	**maa 14-1-30**
827		Sluiten nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	3 wkn	din 25-12-29	maa 14-1-30
828		Nadere aannemingsovereenkomt gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 14-1-30	maa 14-1-30
829		**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**0 wkn**	**maa 14-1-30**	**maa 14-1-30**
834		**Gate 3.2**			**0%**	**4 wkn**	**din 15-1-30**	**maa 11-2-30**
835		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 15-1-30	maa 11-2-30
836		Mijlpaal: Gate 3.2 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 11-2-30	maa 11-2-30
837		**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86 wkn**	**din 15-1-30**	**maa 8-9-31**
838		**Realisatie**			**0%**	**59 wkn**	**din 15-1-30**	**maa 3-3-31**
839		Realisatie	CM	OG	0%	52 wkn	din 15-1-30	maa 13-1-31
840		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.8	CM	ON	0%	52 wkn	din 29-1-30	maa 27-1-31
841		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	2 wkn	din 28-1-31	maa 10-2-31
842		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 11-2-31	maa 24-2-31
843		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	1 wk	din 25-2-31	maa 3-3-31
844		Realisatie gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 3-3-31	maa 3-3-31
845		**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26 wkn**	**din 14-1-31**	**maa 14-7-31**
846		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26 wkn	din 14-1-31	maa 14-7-31
847		Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	6 wkn	din 14-1-31	maa 24-2-31
848		Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4 wkn	din 25-2-31	maa 24-3-31
849		Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 14-7-31	maa 14-7-31
850		**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2 wkn**	**din 11-2-31**	**maa 24-2-31**
851		Financiele afronding met gemeenten	OM	OG	0%	2 wkn	din 11-2-31	maa 24-2-31
852		Afronden Contracten overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 24-2-31	maa 24-2-31
853		**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**10 wkn**	**din 1-7-31**	**maa 8-9-31**
854		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	din 1-7-31	maa 14-7-31

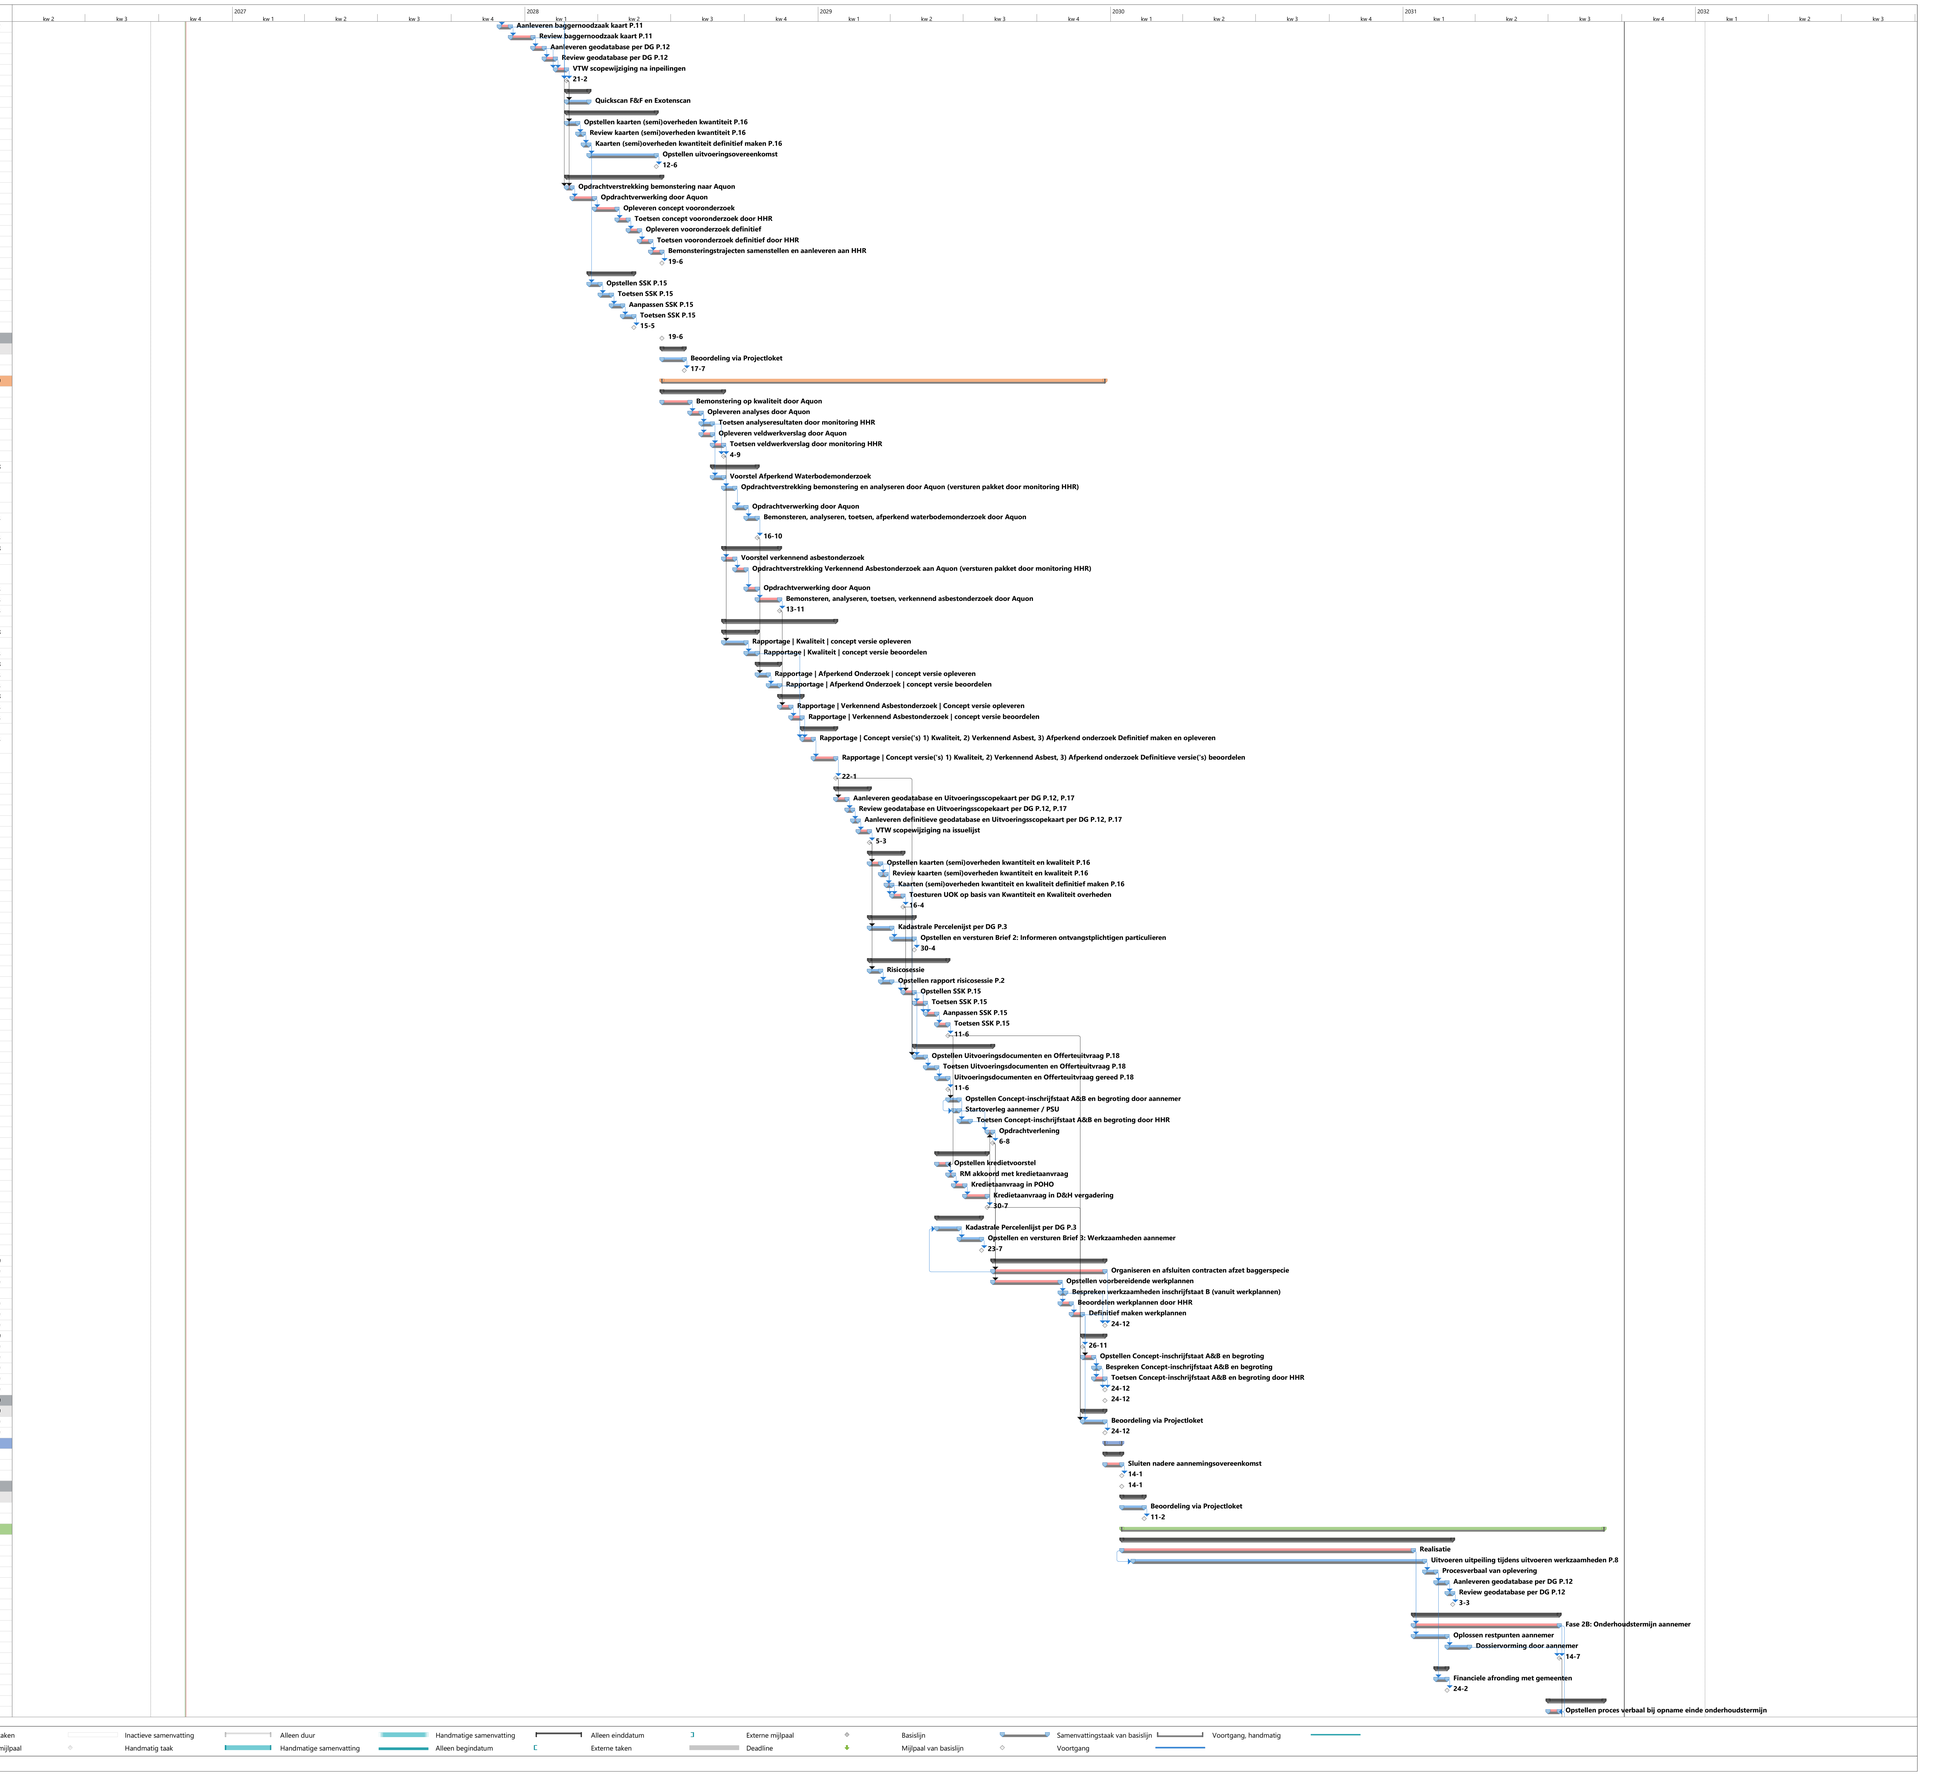


Project: Sjabloon Baggeren - in
Datum: din 3-11-26

Taak, Kritiek, Splitsing, Mijlpaal, Samenvatting, Projectsamenvatting, Inactieve taken, Inactieve mijlpaal, Inactieve samenvatting, Handmatig taak, Alleen duur, Handmatige samenvatting, Handmatige samenvatting, Alleen begindatum, Alleen einddatum, Externe taken, Externe mijlpaal, Deadline, Basislijn, Mijlpaal van basislijn, Samenvattingstaak van basislijn, Voortgang, Voortgang, handmatig

Id	Taakmodu	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
855		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	din 1-7-31	maa 14-7-31
856		Opstellen overdrachtsdossier P.20	TM	ON	0%	4 wkn	din 15-7-31	maa 11-8-31
857		Opstellen nacalculatie door HHR	MPB	OG	0%	4 wkn	din 15-7-31	maa 11-8-31
858		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	din 12-8-31	maa 8-9-31
859		Afronden contractuele verplichtingen IB gereed	CM	OG	0%	0 wkn	maa 8-9-31	maa 8-9-31
860		Evaluatie met aannemer, IB, HHR	MBP	OG	0%	2 wkn	din 15-7-31	maa 28-7-31
861		**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0 wkn**	**maa 8-9-31**	**maa 8-9-31**
866		**Gate 4.0**			**0%**	**4 wkn**	**din 9-9-31**	**maa 6-10-31**
867		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 9-9-31	maa 6-10-31
868		Mijlpaal: Gate 4.0 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 6-10-31	maa 6-10-31
869		**Baggeren Regulier 2027 DG3**			**0%**	**219 wkn**	**din 2-11-27**	**maa 12-1-32**
870		**30_Definitiefase**			**0%**	**34,8 wkn**	**din 2-11-27**	**vri 30-6-28**
871		**Veldinventarisatie**			**0%**	**7 wkn**	**din 2-11-27**	**maa 20-12-27**
872		Uitvoeren veldinventarisatie	OM	ON	0%	2 wkn	din 2-11-27	maa 15-11-27
873		Verwerken en opleveren concept veldinventarisatie, issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	2 wkn	din 16-11-27	maa 29-11-27
874		Beoordelen concept issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	OG	0%	2 wkn	din 30-11-27	maa 13-12-27
875		Definitief opleveren issuelijst en toestemmingentabel P.10, P.13, P.14	OM	ON	0%	1 wk	din 14-12-27	maa 20-12-27
876		Veldinventarisatie gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 20-12-27	maa 20-12-27
877		**Inpeilen**			**0%**	**18 wkn**	**din 2-11-27**	**maa 6-3-28**
878		Inpeilen	TM	ON	0%	2 wkn	din 2-11-27	maa 15-11-27
879		Vullen Goewebviewer	TM	ON	0%	3 wkn	din 2-11-27	maa 22-11-27
880		Aanleveren peilverschillen P.6	TM	ON	0%	3 wkn	din 2-11-27	maa 22-11-27
881		Review peilverschillen P.6	TM	OG	0%	3 wkn	din 9-11-27	maa 29-11-27
882		Aanleveren concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	2 wkn	din 16-11-27	maa 29-11-27
883		Review concept dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	OG	0%	3 wkn	din 16-11-27	maa 6-12-27
884		Aanleveren definitieve dwarsprofielen, kaart locatie dwarsprofielen, tabel hoeveelheden toetsoordeel en advies P.7, P.8, P.9	TM	ON	0%	3 wkn	din 23-11-27	maa 13-12-27
885		Aanleveren baggernoodzaak kaart P.11	TM	ON	0%	4 wkn	din 14-12-27	maa 10-1-28
886		Review baggernoodzaak kaart P.11	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-1-28	maa 24-1-28
887		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	din 25-1-28	maa 7-2-28
888		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	2 wkn	din 8-2-28	maa 21-2-28
889		VTW scopewijziging na inpeilingen	MPB	OG	0%	2 wkn	din 22-2-28	maa 6-3-28
890		Inpeilen gereed	TM	OG	0%	0 wkn	maa 6-3-28	maa 6-3-28
891		**Omgevingsmanagement Kwantiteit**			**0%**	**4 wkn**	**din 7-3-28**	**maa 3-4-28**
892		Quickscan F&F en Exotenscan	OM	OG	0%	4 wkn	din 7-3-28	maa 3-4-28
893		**Kaarten Overheid**			**0%**	**16 wkn**	**din 7-3-28**	**maa 26-6-28**
894		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	din 7-3-28	maa 20-3-28
895		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	din 21-3-28	maa 27-3-28
896		Kaarten (semi)overheden kwantiteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	din 28-3-28	maa 3-4-28
897		Opstellen uitvoeringsovereenkomst	OM	OG	0%	12 wkn	din 4-4-28	maa 26-6-28
898		Kaarten Overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	maa 26-6-28	maa 26-6-28
899		**Opdracht naar Aquon en Vooronderzoek**			**0%**	**16,8 wkn**	**din 7-3-28**	**vri 30-6-28**
900		Opdrachtverstrekking bemonstering naar Aquon	TM	OG	0%	1 wk	din 7-3-28	maa 13-3-28
901		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	4 wkn	din 14-3-28	maa 10-4-28
902		Opleveren concept vooronderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	din 11-4-28	maa 24-4-28
903		Toetsen concept vooronderzoek door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	din 25-4-28	maa 8-5-28
904		Opleveren vooronderzoek definitief	TM	OG	0%	2 wkn	din 9-5-28	maa 22-5-28
905		*KERSTVAKANTIE*			*0%*	*1,8 wkn*	*din 23-5-28*	*vri 2-6-28*
906		Toetsen vooronderzoek definitief door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 5-6-28	vri 16-6-28
907		Bemonsteringstrajecten samenstellen en aanleveren aan HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 19-6-28	vri 30-6-28
908		Opdracht naar Aquon en vooronderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 30-6-28	vri 30-6-28
909		**SSK-Raming**			**0%**	**8 wkn**	**din 4-4-28**	**maa 29-5-28**
910		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 4-4-28	maa 17-4-28
911		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 18-4-28	maa 1-5-28
912		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	din 2-5-28	maa 15-5-28
913		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	din 16-5-28	maa 29-5-28
914		SSK-raming gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 29-5-28	maa 29-5-28
915		**Risico-reservering 90_Definitiefase**			**0%**	**0 wkn**	**vri 30-6-28**	**vri 30-6-28**
920		**Gate 3 (Projectcontract)**			**0%**	**4 wkn**	**maa 3-7-28**	**vri 28-7-28**
921		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 3-7-28	vri 28-7-28
922		Mijlpaal: Gate 3 (Projectcontract) afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 28-7-28	vri 28-7-28
923		**40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**74 wkn**	**maa 3-7-28**	**vri 30-11-29**
924		**Bemonsteren & Analyseren**			**0%**	**8 wkn**	**maa 3-7-28**	**vri 25-8-28**
925		Bemonstering op kwaliteit door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 3-7-28	vri 14-7-28
926		Opleveren analyses door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 17-7-28	vri 28-7-28
927		Toetsen analyseresultaten door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 31-7-28	vri 11-8-28
928		Opleveren veldwerkverslag door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 31-7-28	vri 11-8-28
929		Toetsen veldwerkverslag door monitoring HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 14-8-28	vri 25-8-28
930		Bemonsteren & Analyseren gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 25-8-28	vri 25-8-28
931		**Afperkend Waterbodemonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**maa 14-8-28**	**vri 6-10-28**
932		Voorstel Afperkend Waterbodemonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	maa 14-8-28	vri 25-8-28
933		Opdrachtverstrekking bemonstering en analyseren door Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	maa 28-8-28	vri 8-9-28
934		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 11-9-28	vri 22-9-28
935		Bemonsteren, analyseren, toetsen, afperkend waterbodemonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 25-9-28	vri 6-10-28
936		Afperkend onderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 6-10-28	vri 6-10-28
937		**Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**8 wkn**	**maa 28-8-28**	**vri 20-10-28**
938		Voorstel verkennend asbestonderzoek	TM	OG	0%	2 wkn	maa 28-8-28	vri 8-9-28
939		Opdrachtverstrekking Verkennend Asbestonderzoek aan Aquon (versturen pakket door monitoring HHR)	TM	OG	0%	2 wkn	maa 11-9-28	vri 22-9-28
940		Opdrachtverwerking door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 25-9-28	vri 6-10-28
941		Bemonsteren, analyseren, toetsen, verkennend asbestonderzoek door Aquon	TM	OG	0%	2 wkn	maa 9-10-28	vri 20-10-28
942		Verkennend Asbestonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 20-10-28	vri 20-10-28
943		**Rapportage Waterbodemonderzoek**			**0%**	**16 wkn**	**maa 28-8-28**	**vri 15-12-28**
944		**Rapportage | Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**maa 28-8-28**	**vri 6-10-28**
945		Rapportage | Kwaliteit | concept versie opleveren	TM	OG	0%	4 wkn	maa 28-8-28	vri 22-9-28
946		Rapportage | Kwaliteit | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 25-9-28	vri 6-10-28
947		**Rapportage Afperkend onderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**maa 9-10-28**	**vri 3-11-28**
948		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 9-10-28	vri 20-10-28
949		Rapportage | Afperkend Onderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 23-10-28	vri 3-11-28
950		**Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek**			**0%**	**4 wkn**	**maa 23-10-28**	**vri 17-11-28**
951		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | Concept versie opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 23-10-28	vri 3-11-28
952		Rapportage | Verkennend Asbestonderzoek | concept versie beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 6-11-28	vri 17-11-28
953		**Rapportage Concept versie('s) Definitief maken**			**0%**	**4 wkn**	**maa 20-11-28**	**vri 15-12-28**
954		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitief maken en opleveren	TM	OG	0%	2 wkn	maa 20-11-28	vri 1-12-28
955		Rapportage | Concept versie('s) 1) Kwaliteit, 2) Verkennend Asbest, 3) Afperkend onderzoek Definitieve versie('s) beoordelen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 4-12-28	vri 15-12-28
956		Rapportage Waterbodemonderzoek gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 15-12-28	vri 15-12-28
957		**Uitvoeringsscope**			**0%**	**8 wkn**	**maa 18-12-28**	**vri 9-2-29**
958		Aanleveren geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	4 wkn	maa 18-12-28	vri 12-1-29
959		Review geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	OG	0%	1 wk	maa 15-1-29	vri 19-1-29
960		Aanleveren definitieve geodatabase en Uitvoeringsscopekaart per DG P.12, P.17	TM	ON	0%	1 wk	maa 22-1-29	vri 26-1-29
961		VTW scopewijziging na issuelijst	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 29-1-29	vri 9-2-29
962		Uitvoeringsscope gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 9-2-29	vri 9-2-29
963		**Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit**			**0%**	**6 wkn**	**maa 12-2-29**	**vri 23-3-29**
964		Opstellen kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	ON	0%	2 wkn	maa 12-2-29	vri 23-2-29
965		Review kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit P.16	OM	OG	0%	1 wk	maa 26-2-29	vri 2-3-29
966		Kaarten (semi)overheden kwantiteit en kwaliteit definitief maken P.16	OM	ON	0%	1 wk	maa 5-3-29	vri 9-3-29
967		Toesturen UOK op basis van Kwantiteit en Kwaliteit overheden	OM	OG	0%	2 wkn	maa 12-3-29	vri 23-3-29
968		Omgevingsmanagement Kwantiteit en Kwaliteit gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 23-3-29	vri 23-3-29
969		**Communicatie Omgeving Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren**			**0%**	**8 wkn**	**maa 12-2-29**	**vri 6-4-29**
970		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	maa 12-2-29	vri 9-3-29
971		Opstellen en versturen Brief 2: Informeren ontvangstplichtigen particulieren	OM	OG	0%	4 wkn	maa 12-3-29	vri 6-4-29
972		Communicatie Omgeving Brief 2 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 6-4-29	vri 6-4-29
973		**SSK-Raming**			**0%**	**14 wkn**	**maa 12-2-29**	**vri 18-5-29**
974		Risicosessie	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 12-2-29	vri 23-2-29
975		Opstellen rapport risicosessie P.2	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 26-2-29	vri 9-3-29
976		Opstellen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 26-3-29	vri 6-4-29
977		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 9-4-29	vri 20-4-29
978		Aanpassen SSK P.15	MPB	ON	0%	2 wkn	maa 23-4-29	vri 4-5-29
979		Toetsen SSK P.15	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 7-5-29	vri 18-5-29
980		SSK Kwantiteit en Kwaliteit + Risicosessie gereed	MPB	OG	0%	0 dagen	vri 18-5-29	vri 18-5-29
981		**Aannemer Fase 1A: Prijsvorming Voorbereiding**			**0%**	**14 wkn**	**maa 9-4-29**	**vri 13-7-29**
982		Opstellen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	ON	0%	2 wkn	maa 9-4-29	vri 20-4-29
983		Toetsen Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag P.18	CM	OG	0%	2 wkn	maa 23-4-29	vri 4-5-29
984		Uitvoeringsdocumenten en Offerteuitvraag gereed P.18	CM	ON	0%	2 wkn	maa 7-5-29	vri 18-5-29
985		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	vri 18-5-29	vri 18-5-29
986		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	maa 21-5-29	vri 1-6-29
987		Startoverleg aannemer / PSU	CM	OG	0%	1 wk	maa 28-5-29	vri 1-6-29
988		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	maa 4-6-29	vri 15-6-29
989		Opdrachtverlening	CM	OG	0%	1 wk	maa 9-7-29	vri 13-7-29
990		Prijsvorming Voorbereiding gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 13-7-29	vri 13-7-29
991		**Kredietaanvraag**			**0%**	**9 wkn**	**maa 7-5-29**	**vri 6-7-29**
992		Opstellen kredietvoorstel	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 7-5-29	vri 18-5-29
993		RM akkoord met kredietaanvraag	MPB	OG	0%	1 wk	maa 21-5-29	vri 25-5-29
994		Kredietaanvraag in POHO	MPB	OG	0%	2 wkn	maa 28-5-29	vri 8-6-29
995		Kredietaanvraag in D&H vergadering	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 11-6-29	vri 6-7-29
996		Uitvoeringskrediet verleend	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 6-7-29	vri 6-7-29
997		**Communicatie Omgeving Brief 3: Werkzaamheden Aannemer**			**0%**	**8 wkn**	**maa 7-5-29**	**vri 29-6-29**
998		Kadastrale Percelenlijst per DG P.3	OM	ON	0%	4 wkn	maa 7-5-29	vri 1-6-29
999		Opstellen en versturen Brief 3: Werkzaamheden aannemer	OM	OG	0%	4 wkn	maa 4-6-29	vri 29-6-29
1000		Communicatie Omgeving Brief 3 gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 29-6-29	vri 29-6-29
1001		**Aannemer Fase 1B: Voorbereiding**			**0%**	**20 wkn**	**maa 16-7-29**	**vri 30-11-29**
1002		Organiseren en afsluiten contracten afzet baggerspecie	OM	OG	0%	20 wkn	maa 16-7-29	vri 30-11-29
1003		Opstellen voorbereidende werkplannen	TM	OG	0%	12 wkn	maa 16-7-29	vri 5-10-29
1004		Bespreken werkzaamheden inschrijfstaat B (vanuit werkplannen)	CM	OG	0%	1 wk	maa 8-10-29	vri 12-10-29
1005		Beoordelen werkplannen door HHR	TM	OG	0%	2 wkn	maa 8-10-29	vri 19-10-29
1006		Definitief maken werkplannen	TM	OG	0%	2 wkn	maa 22-10-29	vri 2-11-29
1007		Voorbereiding gereed	TM	OG	0%	0 wkn	vri 30-11-29	vri 30-11-29
1008		**Fase 2A: Prijsvorming Uitvoering**			**0%**	**4 wkn**	**vri 2-11-29**	**vri 30-11-29**
1009		Offerteuitvraag	CM	OG	0%	0 wkn	vri 2-11-29	vri 2-11-29
1010		Opstellen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	2 wkn	maa 5-11-29	vri 16-11-29
1011		Bespreken Concept-inschrijfstaat A&B en begroting	CM	OG	0%	1 wk	maa 19-11-29	vri 23-11-29
1012		Toetsen Concept-inschrijfstaat A&B en begroting door HHR	CM	OG	0%	2 wkn	maa 19-11-29	vri 30-11-29
1013		Prijsvorming Uitvoering gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 30-11-29	vri 30-11-29

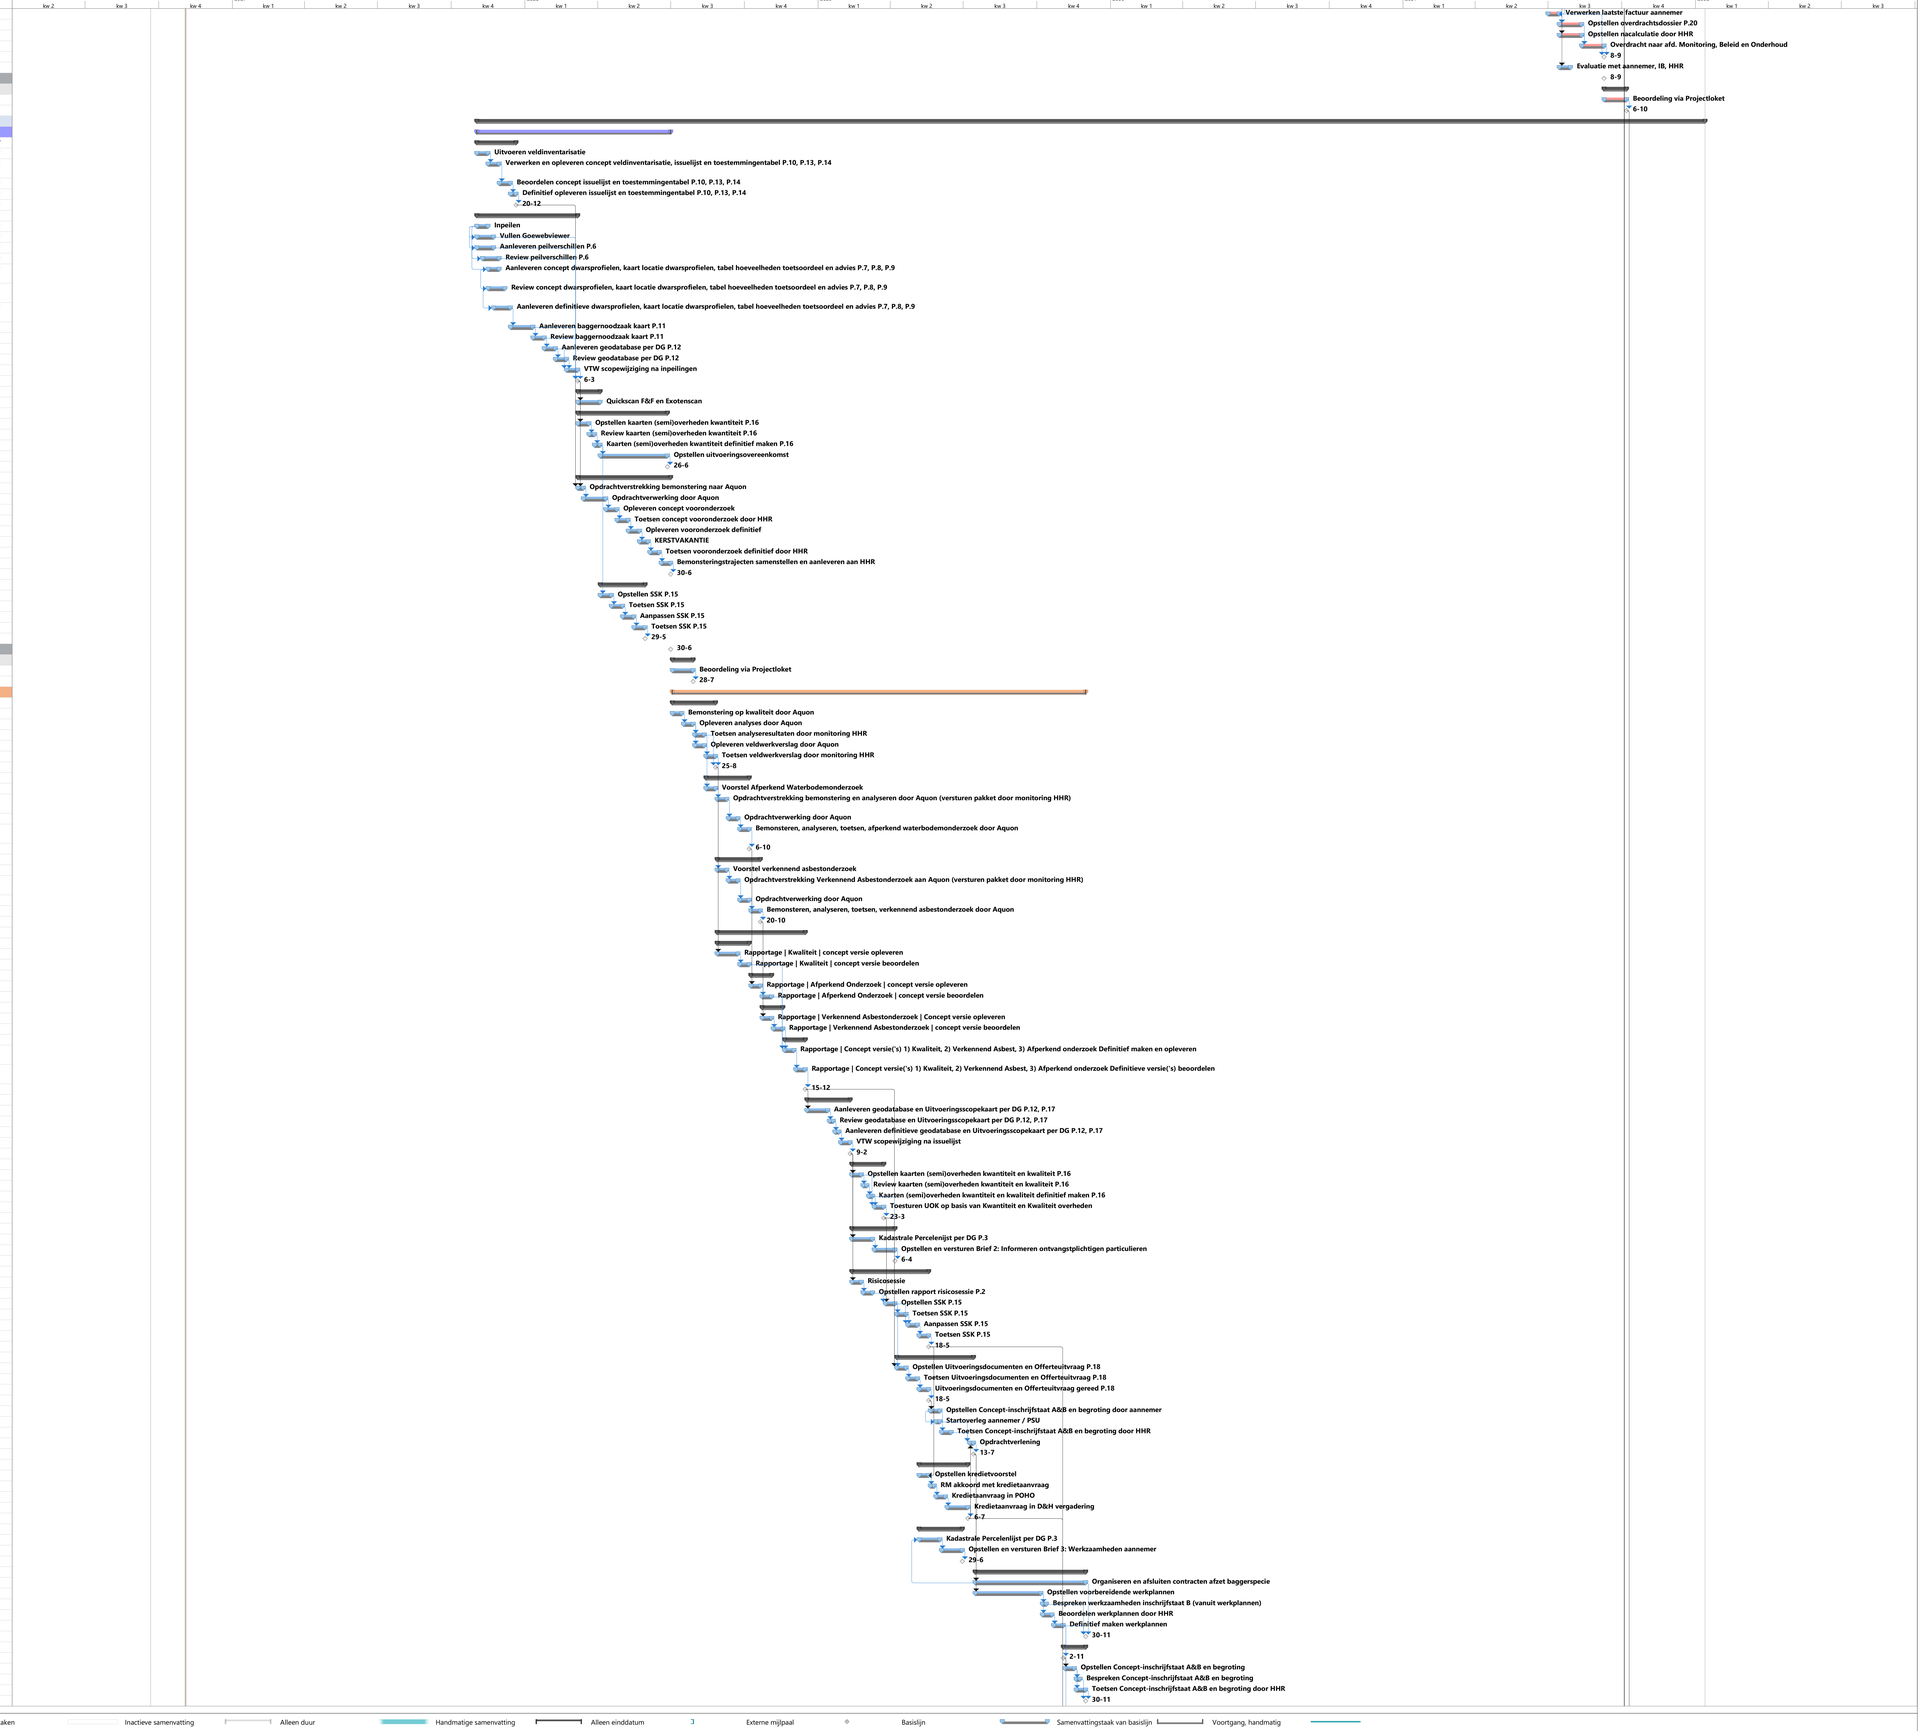

Id	Taakmodi	Taaknaam	Tekst1	Tekst2	% voltooid	Duur	Begindatum	Einddatum
1014		**Risico-reservering 40_Uitvoeringsfase, Ontwerp**			**0%**	**0 wkn**	**vri 30-11-29**	**vri 30-11-29**
1019		**Gate 3.1**			**0%**	**4 wkn**	**maa 5-11-29**	**vri 30-11-29**
1020		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 5-11-29	vri 30-11-29
1021		Mijlpaal: Gate 3.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 30-11-29	vri 30-11-29
1022		**50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**1 wk**	**maa 3-12-29**	**vri 7-12-29**
1023		**Nadere aannemingsovereenkomst**			**0%**	**1 wk**	**maa 3-12-29**	**vri 7-12-29**
1024		Sluiten nadere aannemingsovereenkomst	CM	OG	0%	1 wk	maa 3-12-29	vri 7-12-29
1025		Nadere aannemingsovereenkomt gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 7-12-29	vri 7-12-29
1026		**Risico-reservering 50_Uitvoeringsfase, Voorbereiding**			**0%**	**0 wkn**	**vri 7-12-29**	**vri 7-12-29**
1031		**Gate 3.2**			**0%**	**4 wkn**	**maa 10-12-29**	**vri 4-1-30**
1032		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 10-12-29	vri 4-1-30
1033		Mijlpaal: Gate 3.2 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 4-1-30	vri 4-1-30
1034		**60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**86 wkn**	**maa 10-12-29**	**vri 1-8-31**
1035		**Realisatie**			**0%**	**61 wkn**	**maa 10-12-29**	**vri 7-2-31**
1036		Realisatie	CM	OG	0%	52 wkn	maa 10-12-29	vri 6-12-30
1037		Uitvoeren uitpeiling tijdens uitvoeren werkzaamheden P.8	CM	ON	0%	52 wkn	maa 24-12-29	vri 20-12-30
1038		Procesverbaal van oplevering	CM	OG	0%	4 wkn	maa 23-12-30	vri 17-1-31
1039		Aanleveren geodatabase per DG P.12	TM	ON	0%	2 wkn	maa 20-1-31	vri 31-1-31
1040		Review geodatabase per DG P.12	TM	OG	0%	1 wk	maa 3-2-31	vri 7-2-31
1041		Realisatie gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 7-2-31	vri 7-2-31
1042		**Afronden contractuele verplichtingen aannemer**			**0%**	**26 wkn**	**maa 9-12-30**	**vri 6-6-31**
1043		Fase 2B: Onderhoudstermijn aannemer	CM	OG	0%	26 wkn	maa 9-12-30	vri 6-6-31
1044		Oplossen restpunten aannemer	CM	OG	0%	8 wkn	maa 9-12-30	vri 31-1-31
1045		Dossiervorming door aannemer	CM	OG	0%	4 wkn	maa 3-2-31	vri 28-2-31
1046		Afronden contractuele verplichtingen aannemer gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 6-6-31	vri 6-6-31
1047		**Afronden contracten overheid**			**0%**	**2 wkn**	**maa 20-1-31**	**vri 31-1-31**
1048		Financiele afronding met gemeenten	OM	OG	0%	2 wkn	maa 20-1-31	vri 31-1-31
1049		Afronden Contracten overheid gereed	OM	OG	0%	0 wkn	vri 31-1-31	vri 31-1-31
1050		**Afronden contractuele verplichtingen IB**			**0%**	**10 wkn**	**maa 26-5-31**	**vri 1-8-31**
1051		Opstellen proces verbaal bij opname einde onderhoudstermijn	CM	OG	0%	2 wkn	maa 26-5-31	vri 6-6-31
1052		Verwerken laatste factuur aannemer	CM	OG	0%	2 wkn	maa 26-5-31	vri 6-6-31
1053		Opstellen overdrachtsdossier P.20	TM	ON	0%	4 wkn	maa 9-6-31	vri 4-7-31
1054		Opstellen nacalculatie door HHR	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 9-6-31	vri 4-7-31
1055		Overdracht naar afd. Monitoring, Beleid en Onderhoud	TM	OG	0%	4 wkn	maa 7-7-31	vri 1-8-31
1056		Afronden contractuele verplichtingen IB gereed	CM	OG	0%	0 wkn	vri 1-8-31	vri 1-8-31
1057		Evaluatie met aannemer, IB, HHR	MBP	OG	0%	2 wkn	maa 9-6-31	vri 20-6-31
1058		**Risicoreservering 60_Uitvoeringsfase, Realisatie**			**0%**	**0 wkn**	**vri 1-8-31**	**vri 1-8-31**
1063		**Gate 4.0**			**0%**	**4 wkn**	**maa 4-8-31**	**vri 29-8-31**
1064		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	maa 4-8-31	vri 29-8-31
1065		Mijlpaal: Gate 4.0 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	vri 29-8-31	vri 29-8-31
1066		**65_Afrondingsfase, Nazorg**			**0%**	**4 wkn**	**din 7-10-31**	**maa 3-11-31**
1067		**Interne afronding**			**0%**	**4 wkn**	**din 7-10-31**	**maa 3-11-31**
1068		Evaluatie van het projectresultaat	PM	OG	0%	2 wkn	din 7-10-31	maa 20-10-31
1069		Definitief maken nacalculatie	MPB	OG	0%	2 wkn	din 21-10-31	maa 3-11-31
1070		Interne afronding gereed	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 3-11-31	maa 3-11-31
1071		**Risicoreservering 65_Afrondingsfase, Nazorg**			**0%**	**0 wkn**	**maa 3-11-31**	**maa 3-11-31**
1076		**Gate 4.1**			**0%**	**4 wkn**	**din 4-11-31**	**maa 1-12-31**
1077		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	4 wkn	din 4-11-31	maa 1-12-31
1078		Mijlpaal: Gate 4.1 afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 1-12-31	maa 1-12-31
1079		**Afrondingsfase, TAF [Technisch, Financieel, Administratief]**			**0%**	**0 wkn**	**maa 1-12-31**	**maa 1-12-31**
1080		**TAF**			**0%**	**0 wkn**	**maa 1-12-31**	**maa 1-12-31**
1081		Voorbereiden TAF	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 1-12-31	maa 1-12-31
1082		Uitvoeren TAF	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 1-12-31	maa 1-12-31
1083		Mijlpaal: TAF afgerond	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 1-12-31	maa 1-12-31
1084		**Risicoreservering [Afrondingsfase, TAF]**			**0%**	**0 wkn**	**maa 1-12-31**	**maa 1-12-31**
1089		**Gate 5 (Decharge)**			**0%**	**6 wkn**	**din 2-12-31**	**maa 12-1-32**
1090		Beoordeling via Projectloket	MPB	OG	0%	6 wkn	din 2-12-31	maa 12-1-32
1091		Mijlpaal: Gate 5 (Decharge)	MPB	OG	0%	0 wkn	maa 12-1-32	maa 12-1-32

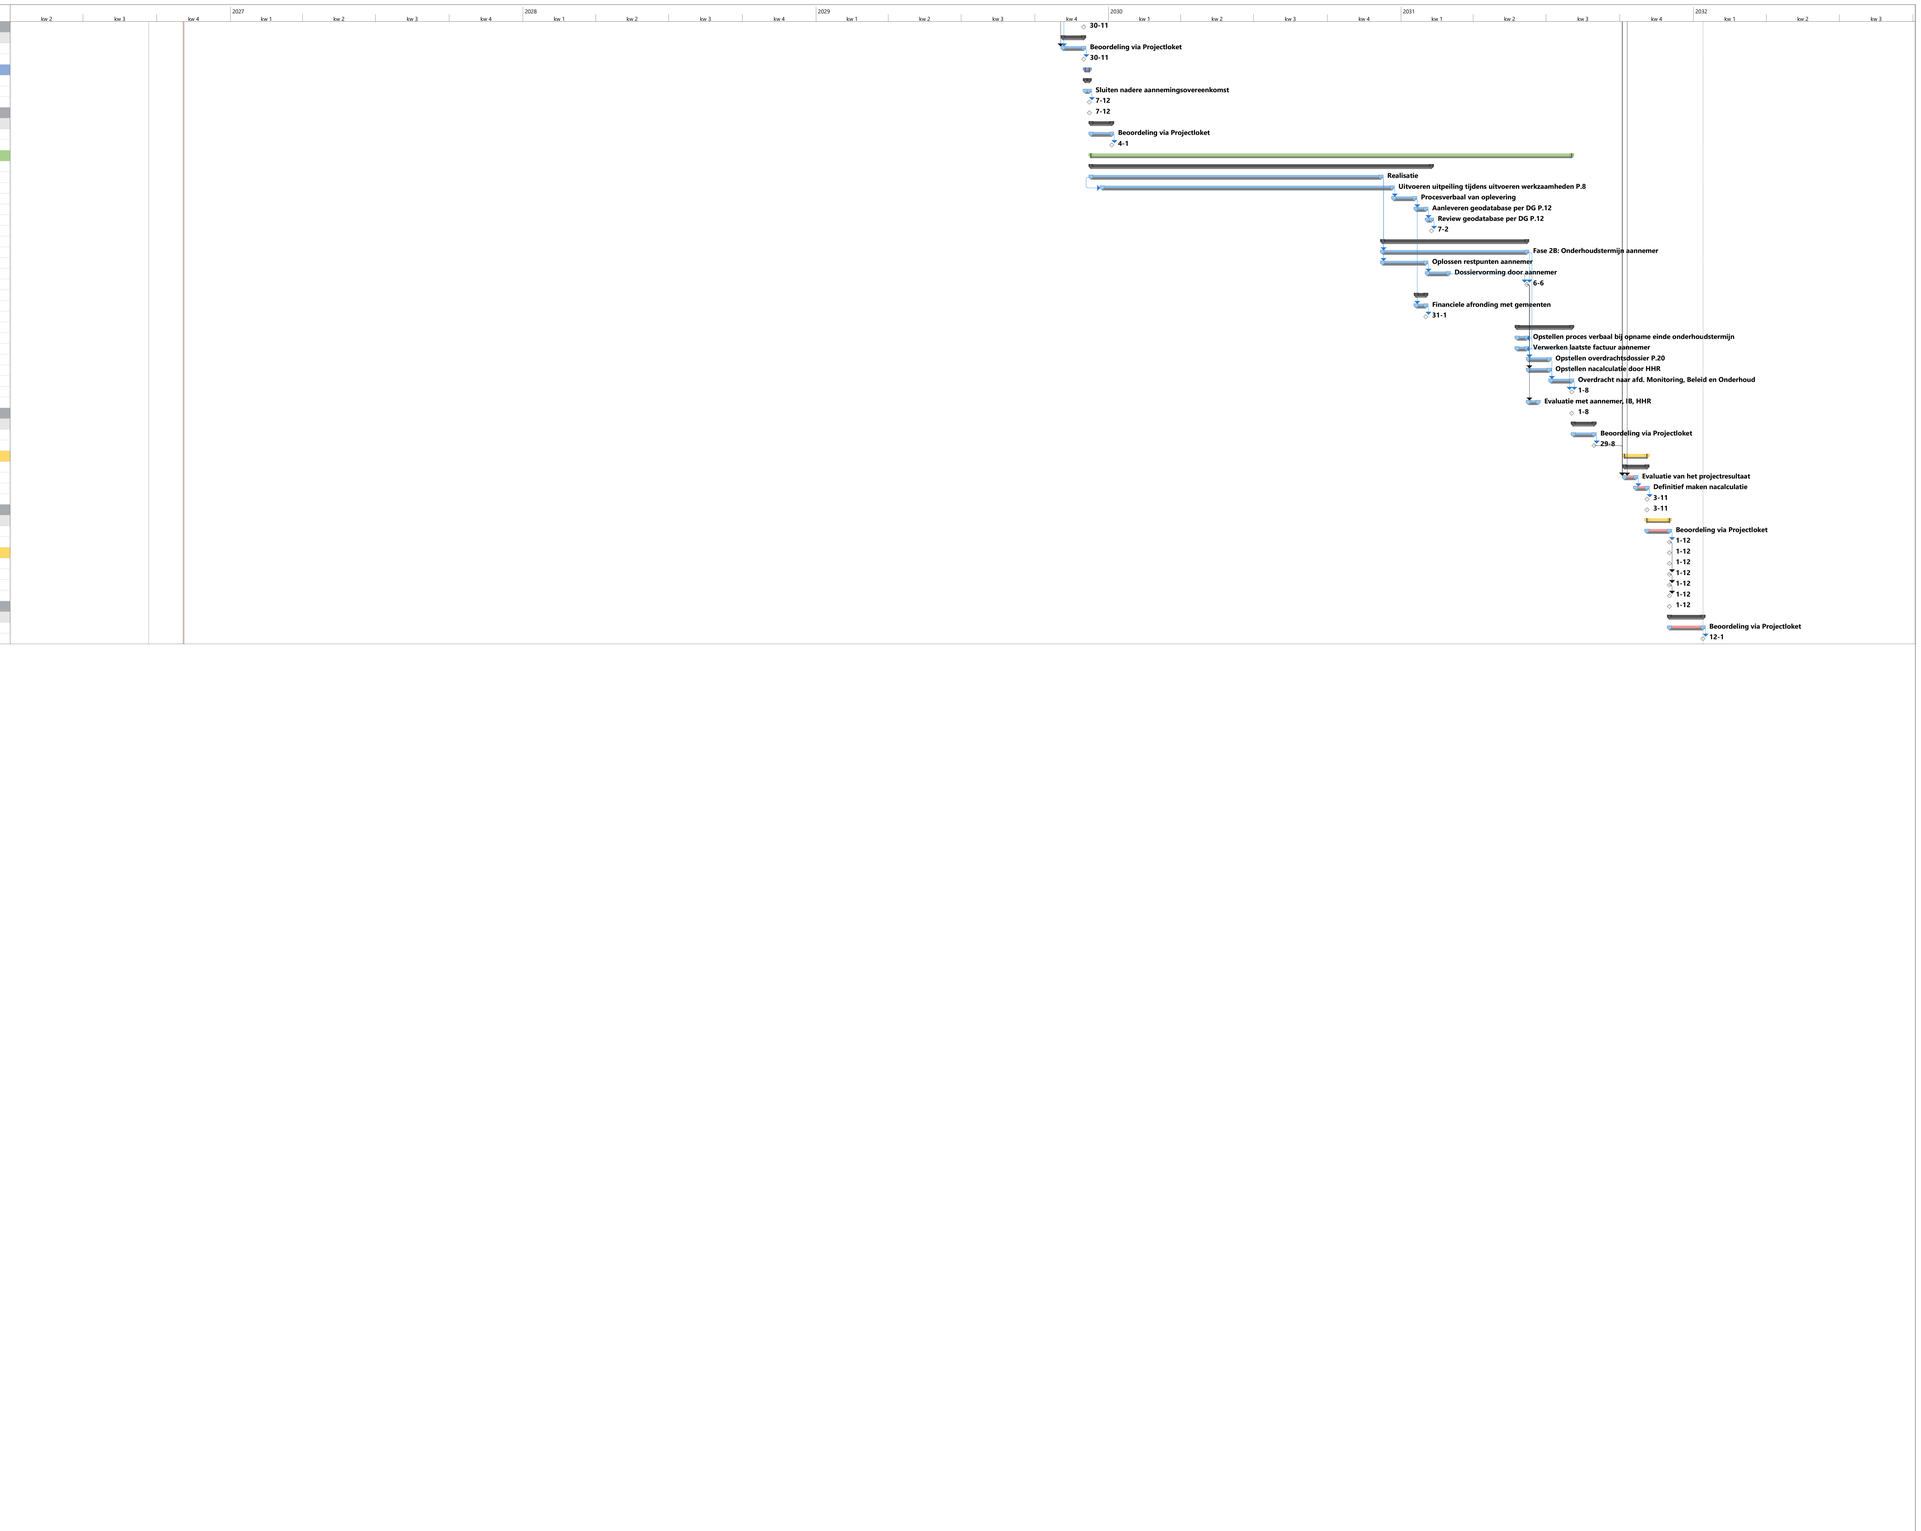

Project: Sjabloon Baggeren - in
Datum: din 3-11-26

Taak	Splitsing	Samenvatting	Inactieve taken	Inactieve samenvatting	Alleen duur	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Externe mijlpaal	Basislijn	Samenvattingstaak van basislijn	Voortgang, handmatig
Kritiek	Mijlpaal	Projectsamenvatting	Inactieve mijlpaal	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Alleen begindatum	Externe taken	Deadline	Mijlpaal van basislijn	Voortgang	
