
Activity Name	Activity ID	Start	Finish
Overall uitvoeringsplanning Arkervaart		07-Sep-26	31-Oct-30
Uitwerken DO en acceptatie		07-Sep-26	02-Apr-27
Contractvoorbereiding Brug Arkervaart		19-Oct-26	11-Aug-28
Vergunningen aanvragen		05-Apr-27	18-Feb-28
Verleggingen K&L		08-Mar-27	29-Sep-28
Inkoop liggers		11-Jan-27	10-May-30
Uitvoering		14-Aug-28	31-Oct-30
Doorgrondings/opstartfase	A1220	14-Aug-28	06-Oct-28
Verifiëren en compleet maken DO	A1230	09-Oct-28	29-Dec-28
Vergunningen (ON)	A1240	01-Jan-29	13-Jul-29
Ontwerp UO (incl. acceptatie)	A1250	01-Jan-29	28-Dec-29
Fase 0 - Voorbereidende werkzaamheden		04-Jan-30	10-Jun-30
Instellen verkeersmaatregelen (90 km/u)	A1270	04-Jan-30	07-Jan-30
Inrichten werkterrein	A1260	08-Jan-30	28-Jan-30
Kap bomen, begroeiing verwijderen	A1280	29-Jan-30	11-Feb-30
Demonteren geleiderails	A1290	12-Feb-30	18-Feb-30
Bovengrondshalen/verleggen K&L	A1300	19-Feb-30	18-Mar-30
Gereed voor frezen leeflaag berm en talud	A1470	19-Mar-30	19-Mar-30
Frezen leeflaag berm en talud	A1310	20-Mar-30	26-Mar-30
Afronden verleggen K&L	A1480	20-Mar-30	02-Apr-30
Aanbrengen grondwerk verbreding aardebaan	A1320	27-Mar-30	23-Apr-30
Aanbrengen damwanden (zuidoostzijde)	A1330	03-Apr-30	07-May-30
Bouwen fundering tussensteunpunten nieuwe bruggen	A1340	26-Feb-30	10-Jun-30
Fase 1 - Werkzaamheden in SLOT (afsluiting A28)		28-Jun-30	31-Jul-30
Instellen verkeersmaatregelen (afsluiten rijskweg)	A1350	28-Jun-30	28-Jun-30
Sloop bestaande constructie	A1360	01-Jul-30	03-Jul-30
Aanpassingen vaarweg	A1380	05-Jul-30	22-Jul-30
Realisatie nieuwe bruggen (excl. fundering tussenst.)	A1370	04-Jul-30	26-Jul-30
Aanpassingen rijksweg A28	A1390	05-Jul-30	29-Jul-30
Buffer & opheffen verkeersmaatregelen	A1400	30-Jul-30	31-Jul-30
Einde fase 1 (slot)	A1410	31-Jul-30	31-Jul-30
Fase 2 - Afwerking		22-Aug-30	31-Oct-30
Aanpassen onderliggend wegennet	A1420	22-Aug-30	18-Sep-30
Onderliggend wegennet gereed voor afwerking taluds	A1490	19-Sep-30	19-Sep-30
Afronden aanpassen onderliggend wegennet	A1500	19-Sep-30	25-Sep-30
Afwerking taluds	A1430	20-Sep-30	10-Oct-30
Aanbrengen beplanting	A1510	11-Oct-30	17-Oct-30
Terrein opruimen	A1440	11-Oct-30	24-Oct-30
Oplevering	A1450	31-Oct-30	31-Oct-30

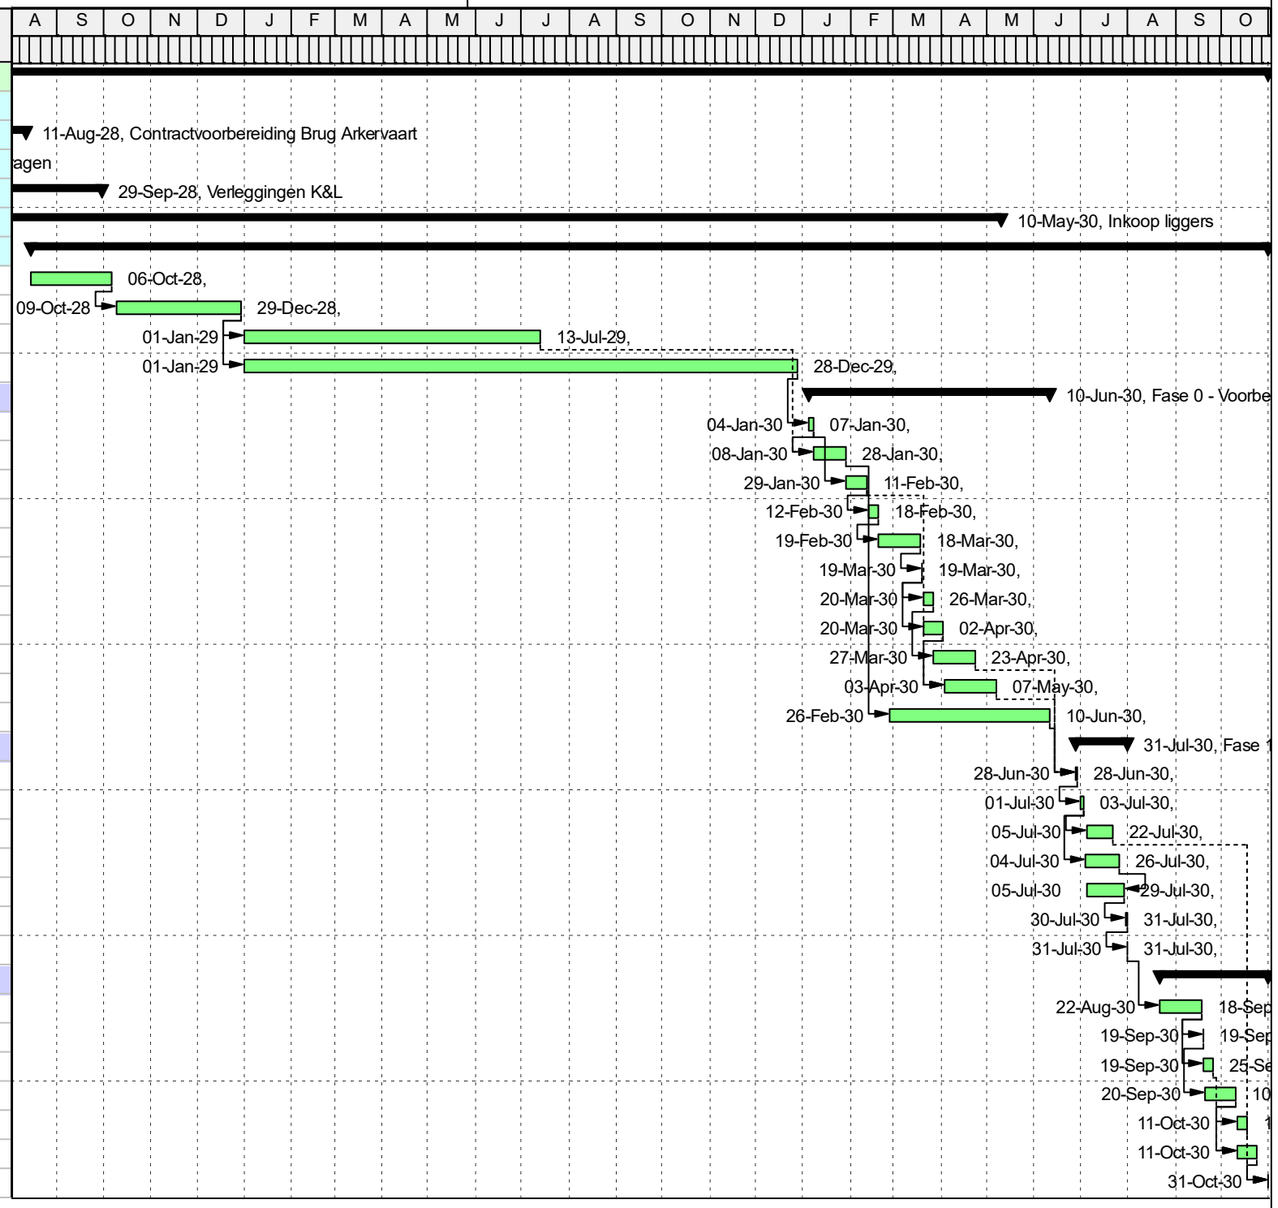

Remaining Level of Effort | Actual Work | Critical Remaining ...
Actual Level of Effort | Remaining Work | Milestone

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
