
A: Detailplanning (weergave DO tot en met Goedgekeurd PB)

Planning planuitwerking Mastenbroek - IJssel

Drents Overijsselse Delta — uw waterschap

TAUW anteagroup landpro


ID	Taaknaam	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**Planuitwerking Mastenbroek - Ijssel**	**797 days**	**Thu 4-6-26**	**Mon 3-12-29**	
2	**Mijlpalen**	**215 days**	**Fri 22-12-28**	**Mon 3-12-29**	
3	**- Indienen vaststellingsverzoek planuitwerkingsfase**	0 days	Mon 3-12-29	Mon 3-12-29	4;187;158
4	**- Indienen subsidie aanvraag**	0 days	Thu 18-10-29	Thu 18-10-29	5;359
5	**- vaststellen Projectbesluit door GS**	0 days	Thu 18-10-29	Thu 18-10-29	122;7;192;195;6
6	**- Vaststellen Projectbesluit in DB**	0 days	Thu 28-6-29	Thu 28-6-29	121;360
7	**- vaststellen ontwerp Projectbesluit door DB**	0 days	Fri 22-12-28	Fri 22-12-28	105
12	**Integraal Ontwerp Overleg**	**453 days**	**Wed 10-6-26**	**Fri 2-6-28**	
43	**Voorlopig ontwerp proces**	**317 days**	**Thu 4-6-26**	**Fri 5-11-27**	
80	**DO-fase**	**312 days**	**Thu 2-9-27**	**Fri 22-12-28**	**179;182;354**
81	**Definitief ontwerpproces**	**147 days**	**Thu 2-9-27**	**Fri 7-4-28**	
82	Opstarten samenwerking met aannemer	60 days	Thu 2-9-27	Wed 24-11-27	76;198;235;318;3
83	Voorbereidingen DO	60 days	Thu 2-9-27	Wed 24-11-27	76;355
84	Opstellen uitvoeringsplan	87 days	Thu 25-11-27	Fri 7-4-28	67;70;77;78;82;8
85	Optimaliseren VO tot DO overige delen	87 days	Thu 25-11-27	Fri 7-4-28	67;70;78;82;276;
86	Effectbeoordeling	60 days	Mon 13-3-28	Fri 2-6-28	84FS-20 days;85F
87	**Ontwerpprojectbesluit**	**152 days**	**Mon 10-4-28**	**Tue 5-12-28**	
88	Opstellen dummy concept ontwerp projectbesluit	40 days	Mon 10-4-28	Fri 2-6-28	84;85
89	Opstellen concept ontwerp projectbesluit	60 days	Mon 5-6-28	Fri 22-9-28	88
90	Indienen concept ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 22-9-28	Fri 22-9-28	89;42
91	Beoordelingsperiode WDOD	5 days	Mon 25-9-28	Fri 29-9-28	90
92	Aanpassen essentiele opmerkingen	5 days	Mon 2-10-28	Fri 6-10-28	91
93	ABG warme overdracht	0 days	Fri 6-10-28	Fri 6-10-28	92
94	Beoordelingsperiode ABG en AOG	15 days	Mon 9-10-28	Fri 27-10-28	93
95	Juridische toets	15 days	Mon 9-10-28	Fri 27-10-28	93
96	Verwerken opmerkingen	20 days	Mon 30-10-2	Fri 24-11-28	95;94
97	Vrijgave ontwerpprojectbesluit	1 day	Mon 27-11-2	Mon 27-11-28	96
98	Indienen EINDCONCEPT ontwerpproejctbesluit ter acceptatie door IPM en ABG	0 days	Mon 27-11-28	Mon 27-11-28	97;149;302;244;3
99	ABG advies vrijgave ontwerpprojectbesluitaan BBG	0 days	Fri 1-12-28	Fri 1-12-28	98FS+4 days
100	Vaststelling ontwerpprojectbesluit in IPM	2 days	Mon 4-12-28	Tue 5-12-28	99
101	Ontwerpprojectbesluit	0 days	Tue 5-12-28	Tue 5-12-28	100;194
102	**Bestuurlijke besluitvorming**	**6 days**	**Thu 14-12-28**	**Fri 22-12-28**	
103	BBG advies vrijgave ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 15-12-28	Fri 15-12-28	99FS+10 days;183
104	PFO: ontwerpprojectbesluit	0 days	Thu 14-12-28	Thu 14-12-28	101FS+7 days
105	DB: ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 22-12-28	Fri 22-12-28	104FS+5 days;103
106	**Procedure en voorbereiding realisatie**	**184 days**	**Mon 8-1-29**	**Thu 18-10-29**	
107	**Reactieperiode**	**70 days**	**Mon 8-1-29**	**Fri 13-4-29**	
108	Ter inzage legging	6 wks	Mon 8-1-29	Fri 16-2-29	105
109	Commissie mer	9 wks	Mon 8-1-29	Fri 9-3-29	105
110	Opstellen reactienota	8 wks	Mon 19-2-29	Fri 13-4-29	108;186;180
111	**Projectbesluit**	**42 days**	**Mon 16-4-29**	**Tue 12-6-29**	
112	Opstellen projectbesluit	4 wks	Mon 16-4-29	Fri 11-5-29	110;109;163;178
113	Indienen projectbesluit	0 days	Fri 11-5-29	Fri 11-5-29	112
114	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 14-5-29	Fri 25-5-29	113
115	Projectbesluit afronden ter vaststelling in AB	10 days	Mon 28-5-29	Fri 8-6-29	114;205
116	ABG advies aan BBG	0 days	Fri 8-6-29	Fri 8-6-29	115
117	Vaststelling in IPM	2 days	Mon 11-6-29	Tue 12-6-29	116
118	**Bestuurlijke besluitvorming Projectbesluit**	**65 days**	**Thu 21-6-29**	**Thu 18-10-29**	
119	BBG advies vrijgave projectbesluit	0 days	Fri 22-6-29	Fri 22-6-29	116FS+10 days
120	PFO: projectbesluit	0 days	Thu 21-6-29	Thu 21-6-29	117FS+7 days
121	DB: vaststelling projectbesluit	0 days	Thu 28-6-29	Thu 28-6-29	120FS+5 days;119
122	**Goedkeuring in GS**	3 mons	Fri 29-6-29	Thu 18-10-29	121
124	**Werkpakketten**	**820 days**	**Thu 23-4-26**	**Mon 3-12-29**	
125	**Omgevingsmanagement**	**820 days**	**Thu 23-4-26**	**Mon 3-12-29**	
196	**Techniek**	**695 days**	**Thu 23-4-26**	**Fri 11-5-29**	
328	**Contractmanagement**	**722 days**	**Thu 23-4-26**	**Tue 19-6-29**	
331	**4.03 Aanbesteding**	**293 days**	**Thu 23-4-26**	**Wed 1-9-27**	
356	**4.06 Uitwerking tbv prijsvorming en opstellen overeenkomst**	**248 days**	**Fri 26-5-28**	**Tue 19-6-29**	
357	Detaileren DO tbv overeenkomst fase 2	79 days	Fri 26-5-28	Wed 11-10-28	84;85;239
358	Grootste (rest)riscio's elimineren tbv overeenkomst fase 2	80 days	Thu 20-7-28	Wed 6-12-28	357FS-40 days
359	Prijsvorming en opstellen overeenkomst fase 2	129 days	Thu 7-12-28	Tue 19-6-29	358
360	Realisatieovereenkomst gereed	0 days	Tue 19-6-29	Tue 19-6-29	359

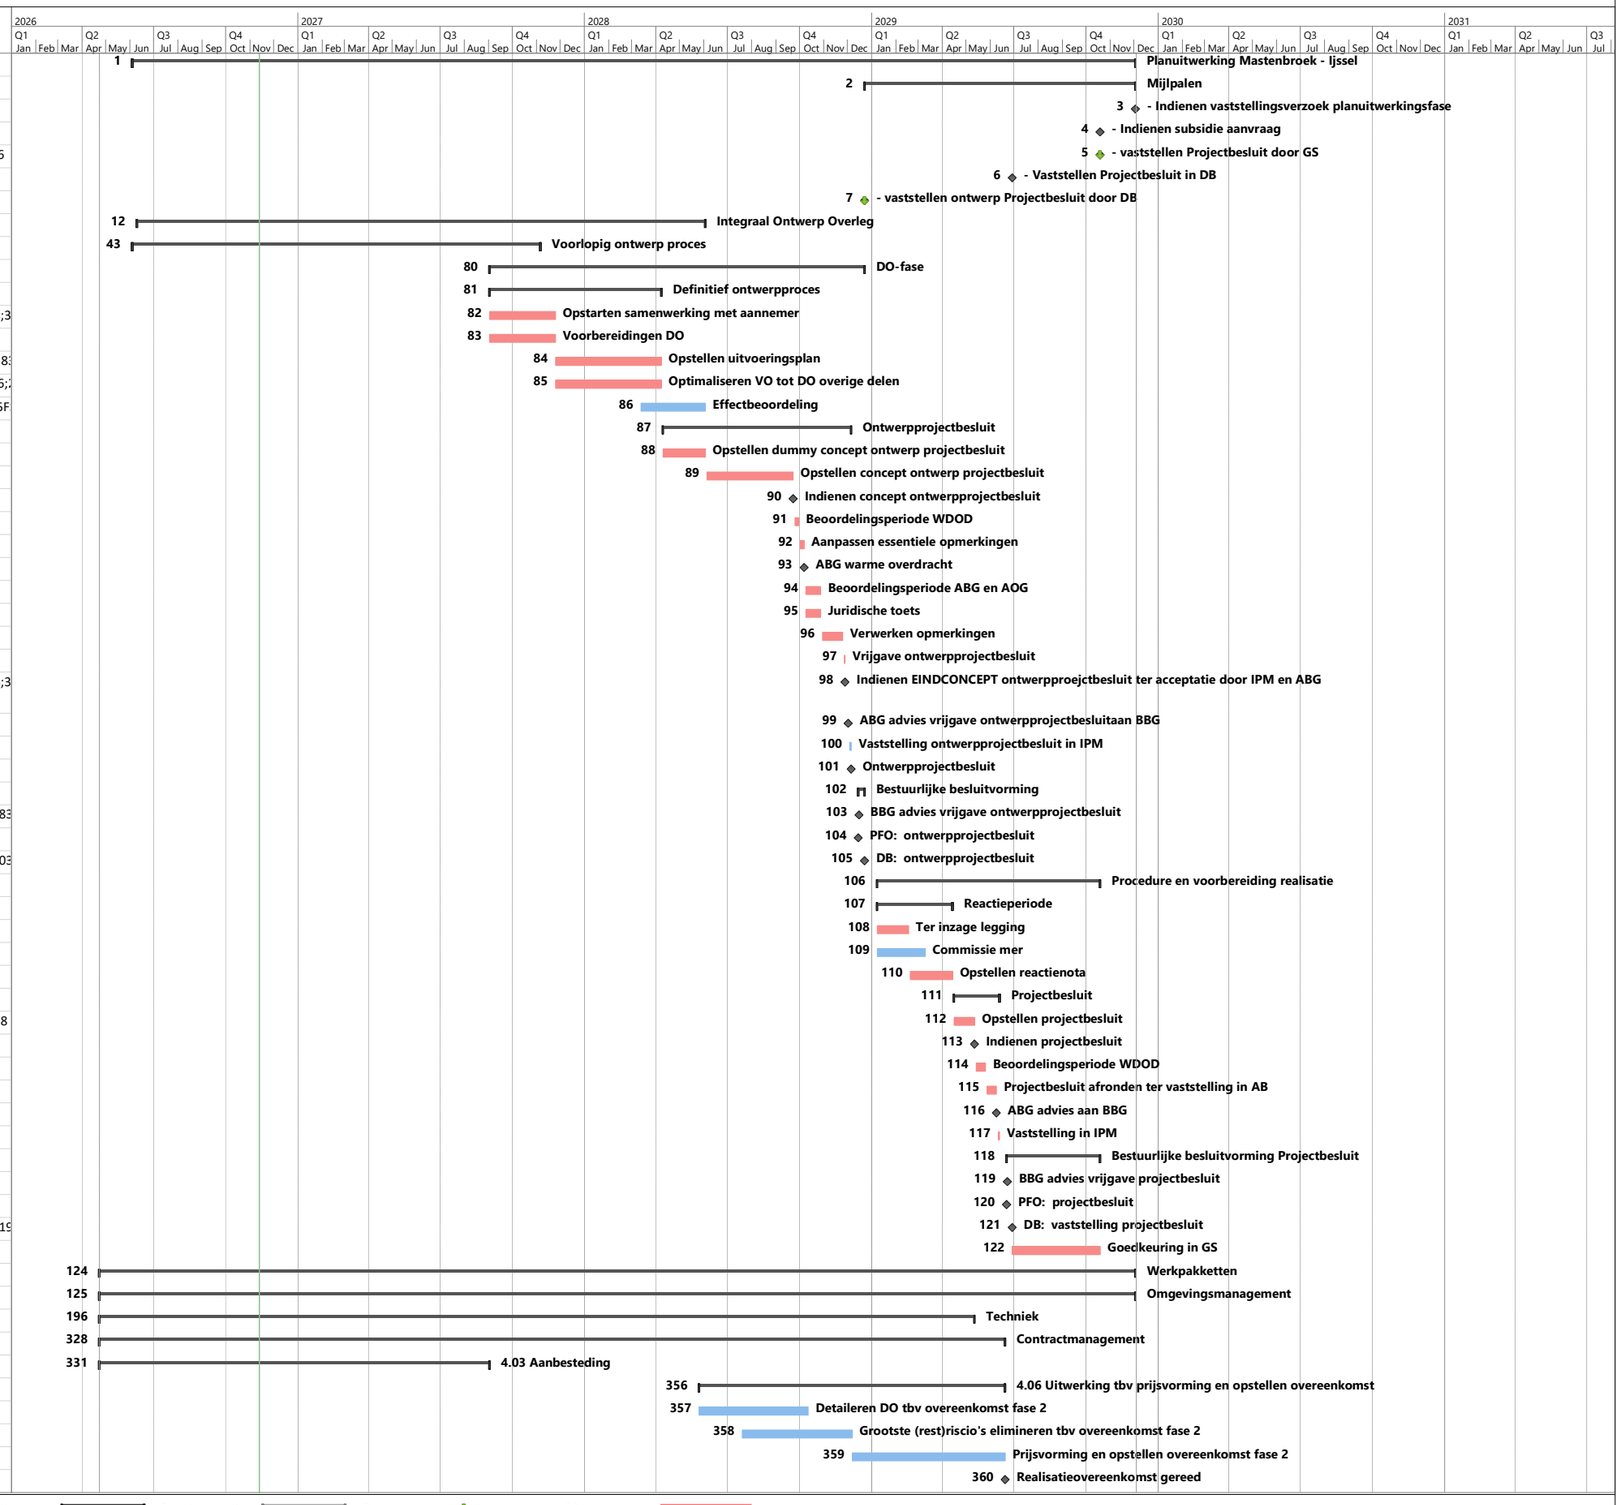

B: Detailplanning (volledige weergave PU fase)

Planning planuitwerking Mastenbroek - IJssel


ID	Taaknaam	Duration	Start	Finish	Successors
1	**Planuitwerking Mastenbroek - Ijssel**	**797 days**	**Thu 4-6-26**	**Mon 3-12-29**	
2	**Mijlpalen**	**215 days**	**Fri 22-12-28**	**Mon 3-12-29**	
3	**- Indienen vaststellingsverzoek planuitwerkingsfase**	0 days	Mon 3-12-29	Mon 3-12-29	134
4	**- Indienen subsidie aanvraag**	0 days	Thu 18-10-29	Thu 18-10-29	3
5	**- vaststellen Projectbesluit door GS**	0 days	Thu 18-10-29	Thu 18-10-29	4
6	**- Vaststellen Projectbesluit in DB**	0 days	Thu 28-6-29	Thu 28-6-29	**5**
7	**- vaststellen ontwerp Projectbesluit door DB**	0 days	Fri 22-12-28	Fri 22-12-28	5
8	**Bestuurlijke besluitmomenten**	**15 days**	**Tue 17-11-26**	**Tue 8-12-26**	
9	MT HWBP besluit beschikking PU-fase M-IJ	0 days	Tue 17-11-26	Tue 17-11-26	
10	Vastellen kedriet PU in DB	0 days	Tue 17-11-26	Tue 17-11-26	
11	Vastellen krediet PU AB	0 days	Tue 8-12-26	Tue 8-12-26	
12	**Integraal Ontwerp Overleg**	**453 days**	**Wed 10-6-26**	**Fri 2-6-28**	
13	**VO-fase**	**250 days**	**Wed 10-6-26**	**Tue 13-7-27**	
14	IOO 33 Stationsgebied	0 days	Wed 10-6-26	Wed 10-6-26	45
15	IOO 34 Opstarten ontwerptraject	0 days	Wed 24-6-26	Wed 24-6-26	
16	IOO 35 Maatwerklocaties varianten bedenken / stationsgebied	0 days	Wed 15-7-26	Wed 15-7-26	307FS+30 days;308;309;160;161
17	IOO 36 Terugblik zomer Staza ontwerp en strategie 6.3	0 days	Wed 26-8-26	Wed 26-8-26	50
18	IOO 37 Ontwerphoogte deeltrajecten + Variantvoorstel 2, 4 en 6.2 en opzet BKP	0 days	Wed 9-9-26	Wed 9-9-26	51
19	IOO 38 Aandachtspunten landschappelijke inpassing	0 days	Wed 23-9-26	Wed 23-9-26	56
20	IOO 39 Variantvoorstel deeltraject 3.2, dorpsweg 1, nieuwstad en Uiterwijkseweg	0 days	Thu 8-10-26	Thu 8-10-26	57
21	IOO 40 Variantvoorstel Molenbrug, Pieterhoeve bespreken	0 days	Wed 21-10-26	Wed 21-10-26	62
22	IOO 41 Opzet afwegingsnotitie en bijpraten ontwerp (batch 1) en omgeving	0 days	Wed 4-11-26	Wed 4-11-26	52
23	IOO 42 Afweging varianten DT 2, 4 en 6.2 en doorkijk maatwerklocaties	0 days	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26	57
24	IOO 43 Afweging varianten Dorpsweg, Uiterwijkseweg en Nieuwstad	0 days	Wed 2-12-26	Wed 2-12-26	25
25	IOO 44 Afweging Molenbrug en Pieterhoeve en doorkijk 2027	0 days	Wed 16-12-26	Wed 16-12-26	26FS+10 days
26	IOO 45 Terugblik vakantie doorkijk nieuwe jaar/ Uitloop afweging	0 days	Wed 13-1-27	Wed 13-1-27	27
27	IOO 46 totale afweging en Keuze VO	0 days	Wed 20-1-27	Wed 20-1-27	67;28FS+20 days
28	IOO 47 uitwerking VO DT 3.1, 3.2, 5, 6.1, 6.4	0 days	Tue 16-2-27	Tue 16-2-27	29FS+15 days
29	IOO 48 Uitwerking VO Stationsgebied	0 days	Tue 9-3-27	Tue 9-3-27	30FS+10 days
30	IOO 49 Uitwerking VO maatwerklocaties	0 days	Tue 23-3-27	Tue 23-3-27	31FS+20 days
31	IOO 50 Uitwerking VO DT 2, 4 en 6.2	0 days	Tue 20-4-27	Tue 20-4-27	32FS+20 days
32	IOO 51 staza overall ontwerp VO	0 days	Tue 25-5-27	Tue 25-5-27	33FS+20 days
33	IOO 52 Concept VO rapport	0 days	Tue 22-6-27	Tue 22-6-27	34FS+15 days
34	IOO 53	0 days	Tue 13-7-27	Tue 13-7-27	
35	**DO-fase**	**127 days**	**Wed 24-11-27**	**Fri 2-6-28**	
43	**Voorlopig ontwerp proces**	**317 days**	**Thu 4-6-26**	**Fri 5-11-27**	
44	**Stap1**	**70 days**	**Thu 4-6-26**	**Wed 7-10-26**	
45	Technische uitgangspunten vaststellen, input veldonderzoeken verwerken	40 days	Thu 4-6-26	Wed 26-8-26	S;258SS;261SS;189FS-10 days;127SS
46	Ontwikkelen van varianten en eerste berekeningen (verkenning van de opties)	40 days	Thu 4-6-26	Wed 26-8-26	47;16SS+20 days;50
47	Eerste gesprekken omgeving (gesprek 1)	30 days	Thu 27-8-26	Wed 7-10-26	S+10 days;272SS+15 days;151SS;166
48	**Ontwerp varianten (7 maatwerklocaties + Dt 2, 4 en 6.2)**	**205 days**	**Thu 27-8-26**	**Wed 30-6-27**	
49	**Batch 1: Dt 2, 4 en 6.2**	**70 days**	**Thu 27-8-26**	**Wed 2-12-26**	
50	Stap 2: Ontwikkelen van varianten (batch 1)	10 days	Thu 27-8-26	Wed 9-9-26	54;18;51;246SF
51	Stap 2: Ontwerpen van varianten (batch 1)	40 days	Thu 10-9-26	Wed 4-11-26	52;229;22;308
52	Stap 3: Beoordeling in MER light (batch 1)	20 days	Thu 5-11-26	Wed 2-12-26	63;24;73;200FF;273SS-10 days
53	**Batch 2: Maatwerk Dorpsweg, Nieuwstad en Uiterwijkseweg**	**70 days**	**Thu 10-9-26**	**Wed 16-12-26**	
54	Stap 2: Ontwikkelen van varianten (batch 2)	10 days	Thu 10-9-26	Wed 23-9-26	59;19;56;55
55	Stap 2: Gesprek omgeving	50 days	Thu 24-9-26	Wed 2-12-26	63
56	Stap 2: Ontwerpen van varianten (batch 2)	40 days	Thu 24-9-26	Wed 18-11-26	57;23;308
57	Stap 3: Beoordeling in MER light (batch 2)	20 days	Thu 19-11-26	Wed 16-12-26	63;25;73FS-20 days;268
58	**Batch 3: Maatwerk: Molenbrug en Pieter Hoeve**	**50 days**	**Thu 8-10-26**	**Wed 16-12-26**	
59	Stap 2: Ontwikkelen van varianten (batch 3: Maatwerk)	10 days	Thu 8-10-26	Wed 21-10-26	61;60;20SS;21
60	Stap 2: Gesprekken met omgeving (gesprek 2, batch 3: Maatwerk)	30 days	Thu 22-10-26	Wed 2-12-26	63
61	Stap 2: Ontwerpen van varianten (batch 3: Maatwerk)	30 days	Thu 22-10-26	Wed 2-12-26	62
62	Stap 3: Beoordeling in MER light (Batch 3: Maatwerk)	10 days	Thu 3-12-26	Wed 16-12-26	67;65;27;63;207;208
63	Stap 3: Keuzemoment voor varianten (Batch 1, 2 en 3)	0 days	Wed 16-12-26	Wed 16-12-26	67;304;64
64	Stap 3: Nadere detaillering ten behoeve van definitieve keuze	20 days	Thu 17-12-26	Wed 27-1-27	65
65	Stap 3: Definitieve afweging voor varianten (Batch 1,2 en 3)	0 days	Wed 27-1-27	Wed 27-1-27	66;67;287;270;304
66	Stap 3: Informeren omgeving gemaakte keuze (gesprek 3, batch 2+ 3: maatwerk	25 days	Thu 28-1-27	Wed 3-3-27	68;167
67	Stap 4 Ontwerpen uitwerken tot VO	80 days	Thu 28-1-27	Wed 26-5-27	) days;179FS-15 days;128FS+25 days
68	Keukentafelgesprekken (gesprek 2: grondeigenaren; gesprek 4:	40 days	Thu 6-5-27	Wed 30-6-27	79
69	**Ontwerpen trajecten zonder varianten**	**100 days**	**Mon 2-11-26**	**Fri 2-4-27**	
70	Stap 2: ontwerpen van deeltrajecten (optioneel eerder starten)	100 days	Mon 2-11-26	Fri 2-4-27	312;84;85;249;198;259;262
71	**Stap 5**	**207 days**	**Thu 3-12-26**	**Fri 5-11-27**	
72	**Opstellen Rapport VO**	**167 days**	**Thu 3-12-26**	**Fri 10-9-27**	
73	Opstellen VO rapport	145 days	Thu 3-12-26	Wed 14-7-27	74;168
74	Interne controle	2 days	Thu 15-7-27	Fri 16-7-27	75
75	Indienen concept	0 days	Fri 16-7-27	Fri 16-7-27	76
76	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 19-7-27	Fri 27-8-27	77;82;83;276
77	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 30-8-27	Fri 10-9-27	78;84
78	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 10-9-27	Fri 10-9-27	84;85;186;79
79	Dijkbijeenkomsten	40 days	Mon 13-9-27	Fri 5-11-27	86
80	**DO-fase**	**312 days**	**Thu 2-9-27**	**Fri 22-12-28**	**170**

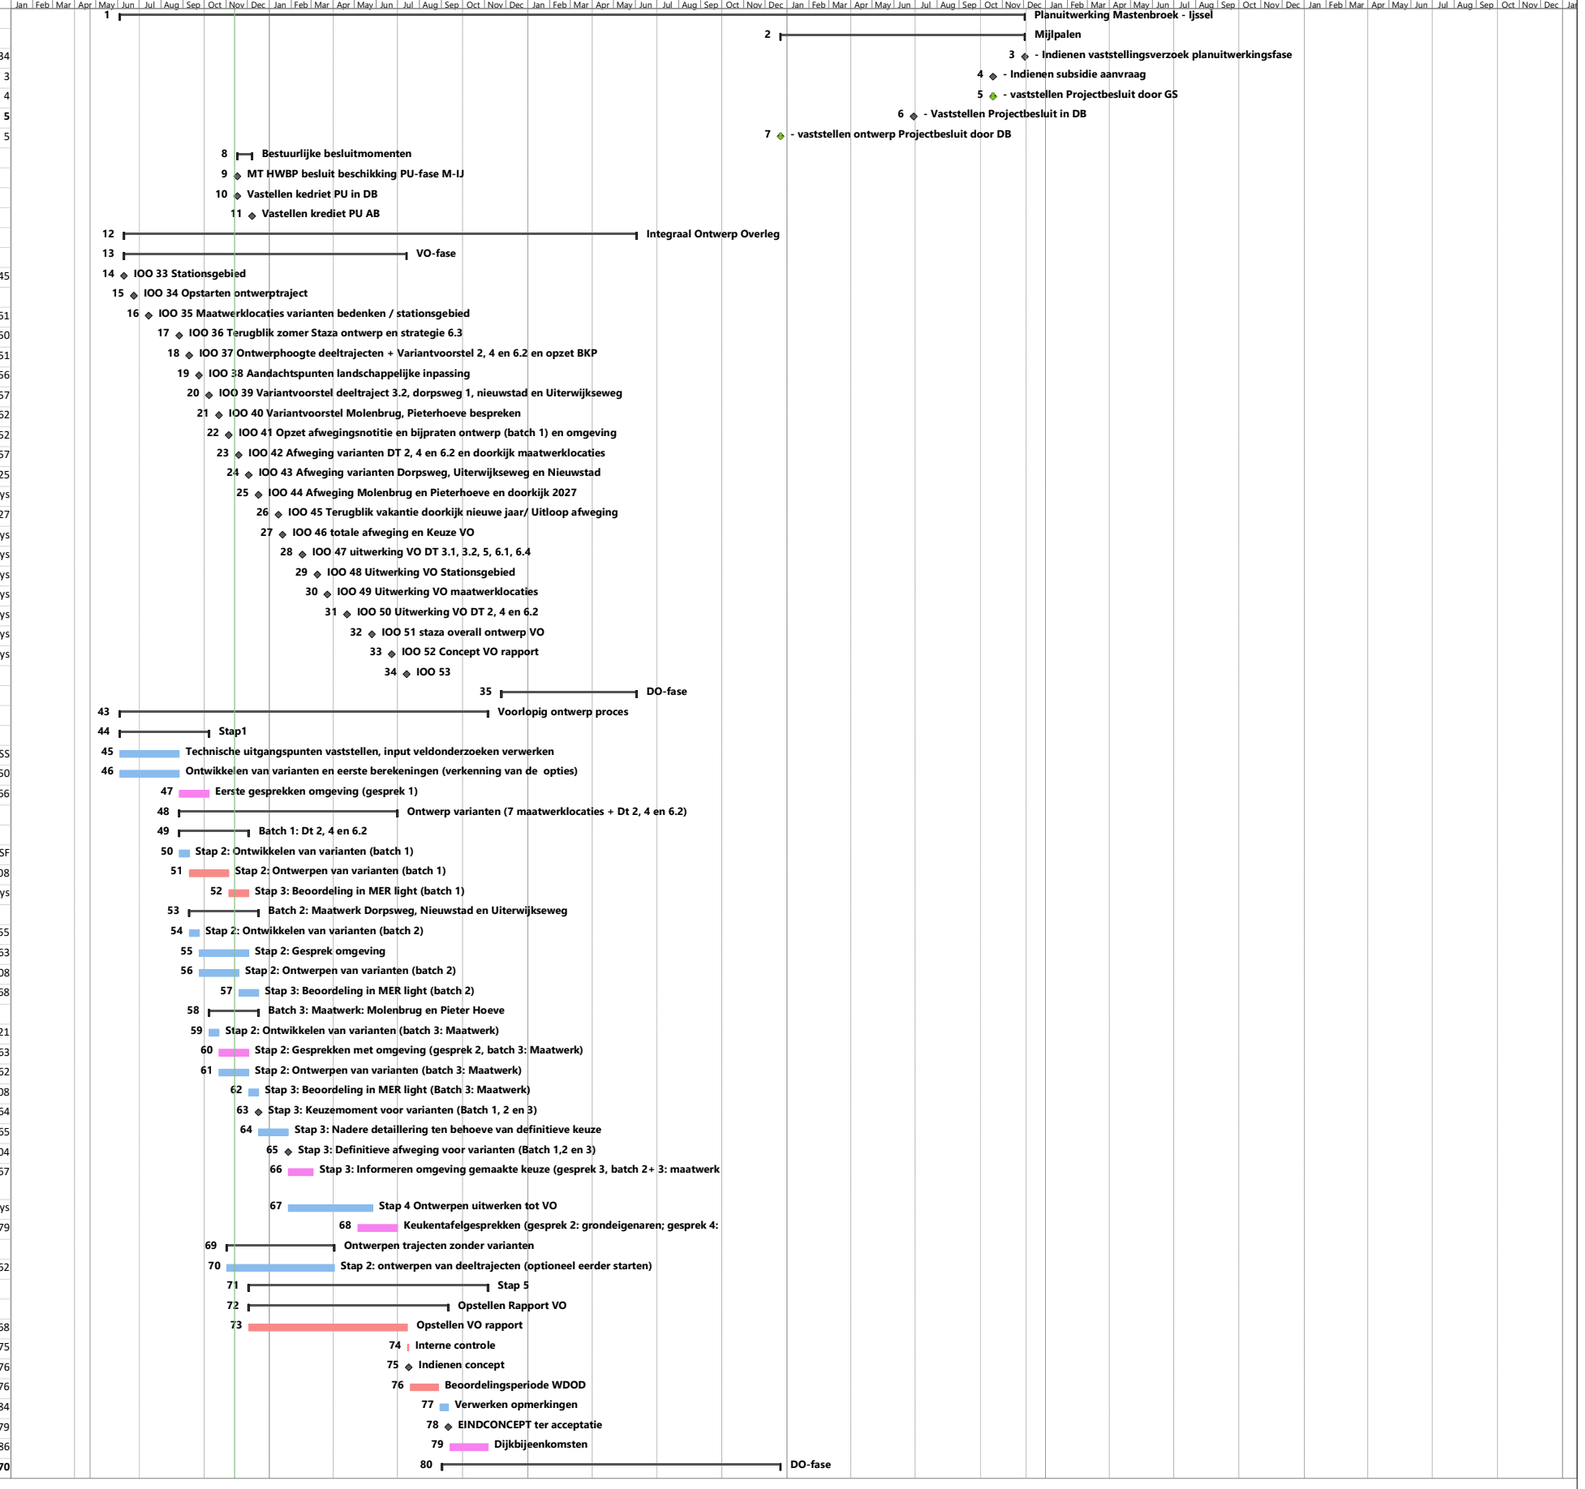

Baseline Milestone | ID | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Deadline | Critical

Planning planuitwerking Mastenbroek - IJssel


ID	Taaknaam	Duration	Start	Finish	Successors
81	**Definitief ontwerpproces**	**147 days**	**Thu 2-9-27**	**Fri 7-4-28**	
82	Opstarten samenwerking met aannemer	60 days	Thu 2-9-27	Wed 24-11-27	FS+20 days;201SS;247SS;153SS;162
83	Voorbereidingen DO	60 days	Thu 2-9-27	Wed 24-11-27	84
84	Opstellen uitvoeringsplan	87 days	Thu 25-11-27	Fri 7-4-28	;320;219SS;357;199;251;193SS;194
85	Optimaliseren VO tot DO overige delen	87 days	Thu 25-11-27	Fri 7-4-28	20;252;357;199;251;88;156;169;180
86	Effectbeoordeling	60 days	Mon 13-3-28	Fri 2-6-28	138;42;183
87	**Ontwerpprojectbesluit**	**152 days**	**Mon 10-4-28**	**Tue 5-12-28**	
88	Opstellen dummy concept ontwerp projectbesluit	40 days	Mon 10-4-28	Fri 2-6-28	89
89	Opstellen concept ontwerp projectbesluit	60 days	Mon 5-6-28	Fri 22-9-28	90
90	Indienen concept ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 22-9-28	Fri 22-9-28	91
91	Beoordelingsperiode WDOD	5 days	Mon 25-9-28	Fri 29-9-28	92
92	Aanpassen essentiele opmerkingen	5 days	Mon 2-10-28	Fri 6-10-28	93
93	ABG warme overdracht	0 days	Fri 6-10-28	Fri 6-10-28	94;95
94	Beoordelingsperiode ABG en AOG	15 days	Mon 9-10-28	Fri 27-10-28	96
95	Juridische toets	15 days	Mon 9-10-28	Fri 27-10-28	96
96	Verwerken opmerkingen	20 days	Mon 30-10-28	Fri 24-11-28	97
97	Vrijgave ontwerpprojectbesluit	1 day	Mon 27-11-28	Mon 27-11-28	98
98	Indienen EINDCONCEPT ontwerpproejctbesluit ter acceptatie door IPM en ABG	0 days	Mon 27-11-28	Mon 27-11-28	99FS+4 days
99	ABG advies vrijgave ontwerpprojectbesluitaan BBG	0 days	Fri 1-12-28	Fri 1-12-28	100;103FS+10 days
100	Vaststelling ontwerpprojectbesluit in IPM	2 days	Mon 4-12-28	Tue 5-12-28	101;133
101	Ontwerpprojectbesluit	0 days	Tue 5-12-28	Tue 5-12-28	104FS+7 days
102	**Bestuurlijke besluitvorming**	**6 days**	**Thu 14-12-28**	**Fri 22-12-28**	
103	BBG advies vrijgave ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 15-12-28	Fri 15-12-28	105FS+5 days
104	PFO: ontwerpprojectbesluit	0 days	Thu 14-12-28	Thu 14-12-28	105FS+5 days
105	DB: ontwerpprojectbesluit	0 days	Fri 22-12-28	Fri 22-12-28	108;109;7;163;195
106	**Procedure en voorbereiding realisatie**	**184 days**	**Mon 8-1-29**	**Thu 18-10-29**	
107	**Reactieperiode**	**70 days**	**Mon 8-1-29**	**Fri 13-4-29**	
108	Ter inzage legging	6 wks	Mon 8-1-29	Fri 16-2-29	110;253;171
109	Commissie mer	9 wks	Mon 8-1-29	Fri 9-3-29	112;171
110	Opstellen reactienota	8 wks	Mon 19-2-29	Fri 13-4-29	112;187
111	**Projectbesluit**	**42 days**	**Mon 16-4-29**	**Tue 12-6-29**	
112	Opstellen projectbesluit	4 wks	Mon 16-4-29	Fri 11-5-29	113
113	Indienen projectbesluit	0 days	Fri 11-5-29	Fri 11-5-29	114
114	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 14-5-29	Fri 25-5-29	115
115	Projectbesluit afronden ter vaststelling in AB	10 days	Mon 28-5-29	Fri 8-6-29	116
116	ABG advies aan BBG	0 days	Fri 8-6-29	Fri 8-6-29	117;119FS+10 days
117	Vaststelling in IPM	2 days	Mon 11-6-29	Tue 12-6-29	120FS+7 days
118	**Bestuurlijke besluitvorming Projectbesluit**	**65 days**	**Thu 21-6-29**	**Thu 18-10-29**	
119	BBG advies vrijgave projectbesluit	0 days	Fri 22-6-29	Fri 22-6-29	121
120	PFO: projectbesluit	0 days	Thu 21-6-29	Thu 21-6-29	121FS+5 days
121	DB: vaststelling projectbesluit	0 days	Thu 28-6-29	Thu 28-6-29	122;6
122	**Goedkeuring in GS**	3 mons	Fri 29-6-29	Thu 18-10-29	5;158FF
123					
124	**Werkpakketten**	**820 days**	**Thu 23-4-26**	**Mon 3-12-29**	
125	**Omgevingsmanagement**	**820 days**	**Thu 23-4-26**	**Mon 3-12-29**	
126	**2.03 Ecologie (VO-fase)**	**797 days**	**Thu 4-6-26**	**Mon 3-12-29**	
127	Onderzoek Roofvogels en uilen	60 days	Thu 4-6-26	Wed 23-9-26	128;130SS+20 days
128	Onderzoek Vlinders, libellen, grote modderkruiper, rugstreeppad, bever	100 days	Thu 1-7-27	Wed 15-12-27	
129	Eerste stikstofdepositieberekening en overleg	20 days	Mon 2-11-26	Fri 27-11-26	74
130	Veldonderzoek kwaliteit en potentie NNN	100 days	Thu 2-7-26	Wed 16-12-26	131;132FS+15 days
131	Toetsing NNN en houtopstanden VO	130 days	Thu 17-12-26	Wed 7-7-27	74
132	Verkennend gesprek compensatieopgave en mogelijkheden Prov O.	15 days	Thu 21-1-27	Wed 10-2-27	
133	Overeenstemming natuurcompensatie voor vergunningverlening	0 days	Tue 5-12-28	Tue 5-12-28	134
134	Compensatie gereed voor start realisatie	0 days	Mon 3-12-29	Mon 3-12-29	
135	**2.04 MER proceudre**	**117 days**	**Mon 10-4-28**	**Tue 17-10-28**	
136	**Opstellen MER**	**117 days**	**Mon 10-4-28**	**Tue 17-10-28**	
137	Eerste opzet MER - hoofdstukindeling en algemene hoofdstukken	40 days	Mon 10-4-28	Fri 2-6-28	138
138	Verwerken resulaten effectbeoordeling	15 days	Mon 5-6-28	Fri 23-6-28	139
139	Afronden MER	15 days	Mon 26-6-28	Fri 14-7-28	140
140	Interne controle	1 day	Mon 17-7-28	Mon 17-7-28	141
141	Indienen concept MER	0 days	Mon 17-7-28	Mon 17-7-28	142
142	Beoordelingsperiode WDOD	5 days	Tue 18-7-28	Mon 24-7-28	143
143	Aanpassen essentiele opmerkingen	5 days	Mon 21-8-28	Fri 25-8-28	144
144	Beoordelingsperiode WDOD en ABG	15 days	Mon 28-8-28	Fri 15-9-28	145
145	Verwerken opmerkingen	15 days	Mon 18-9-28	Fri 6-10-28	146
146	Interne controle	5 days	Mon 9-10-28	Fri 13-10-28	147
147	Indienen Eindconcept MER	0 days	Fri 13-10-28	Fri 13-10-28	148
148	Acceptatie	2 days	Mon 16-10-28	Tue 17-10-28	149
149	MER definitief	0 days	Tue 17-10-28	Tue 17-10-28	98
150	**2.06 Voorbereiden en verkrijgen ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen**	**30 days**	**Thu 27-8-26**	**Wed 7-10-26**	
151	Voorbereiden en verkrijgen	30 days	Thu 27-8-26	Wed 7-10-26	59;264
152	**2.07 Verkrijgen gebruiksrecht grond en vastgoed**	**496 days**	**Thu 2-9-27**	**Thu 18-10-29**	
153	Uitvragen of verwerven rentmeesters	60 days	Thu 2-9-27	Wed 24-11-27	154;155

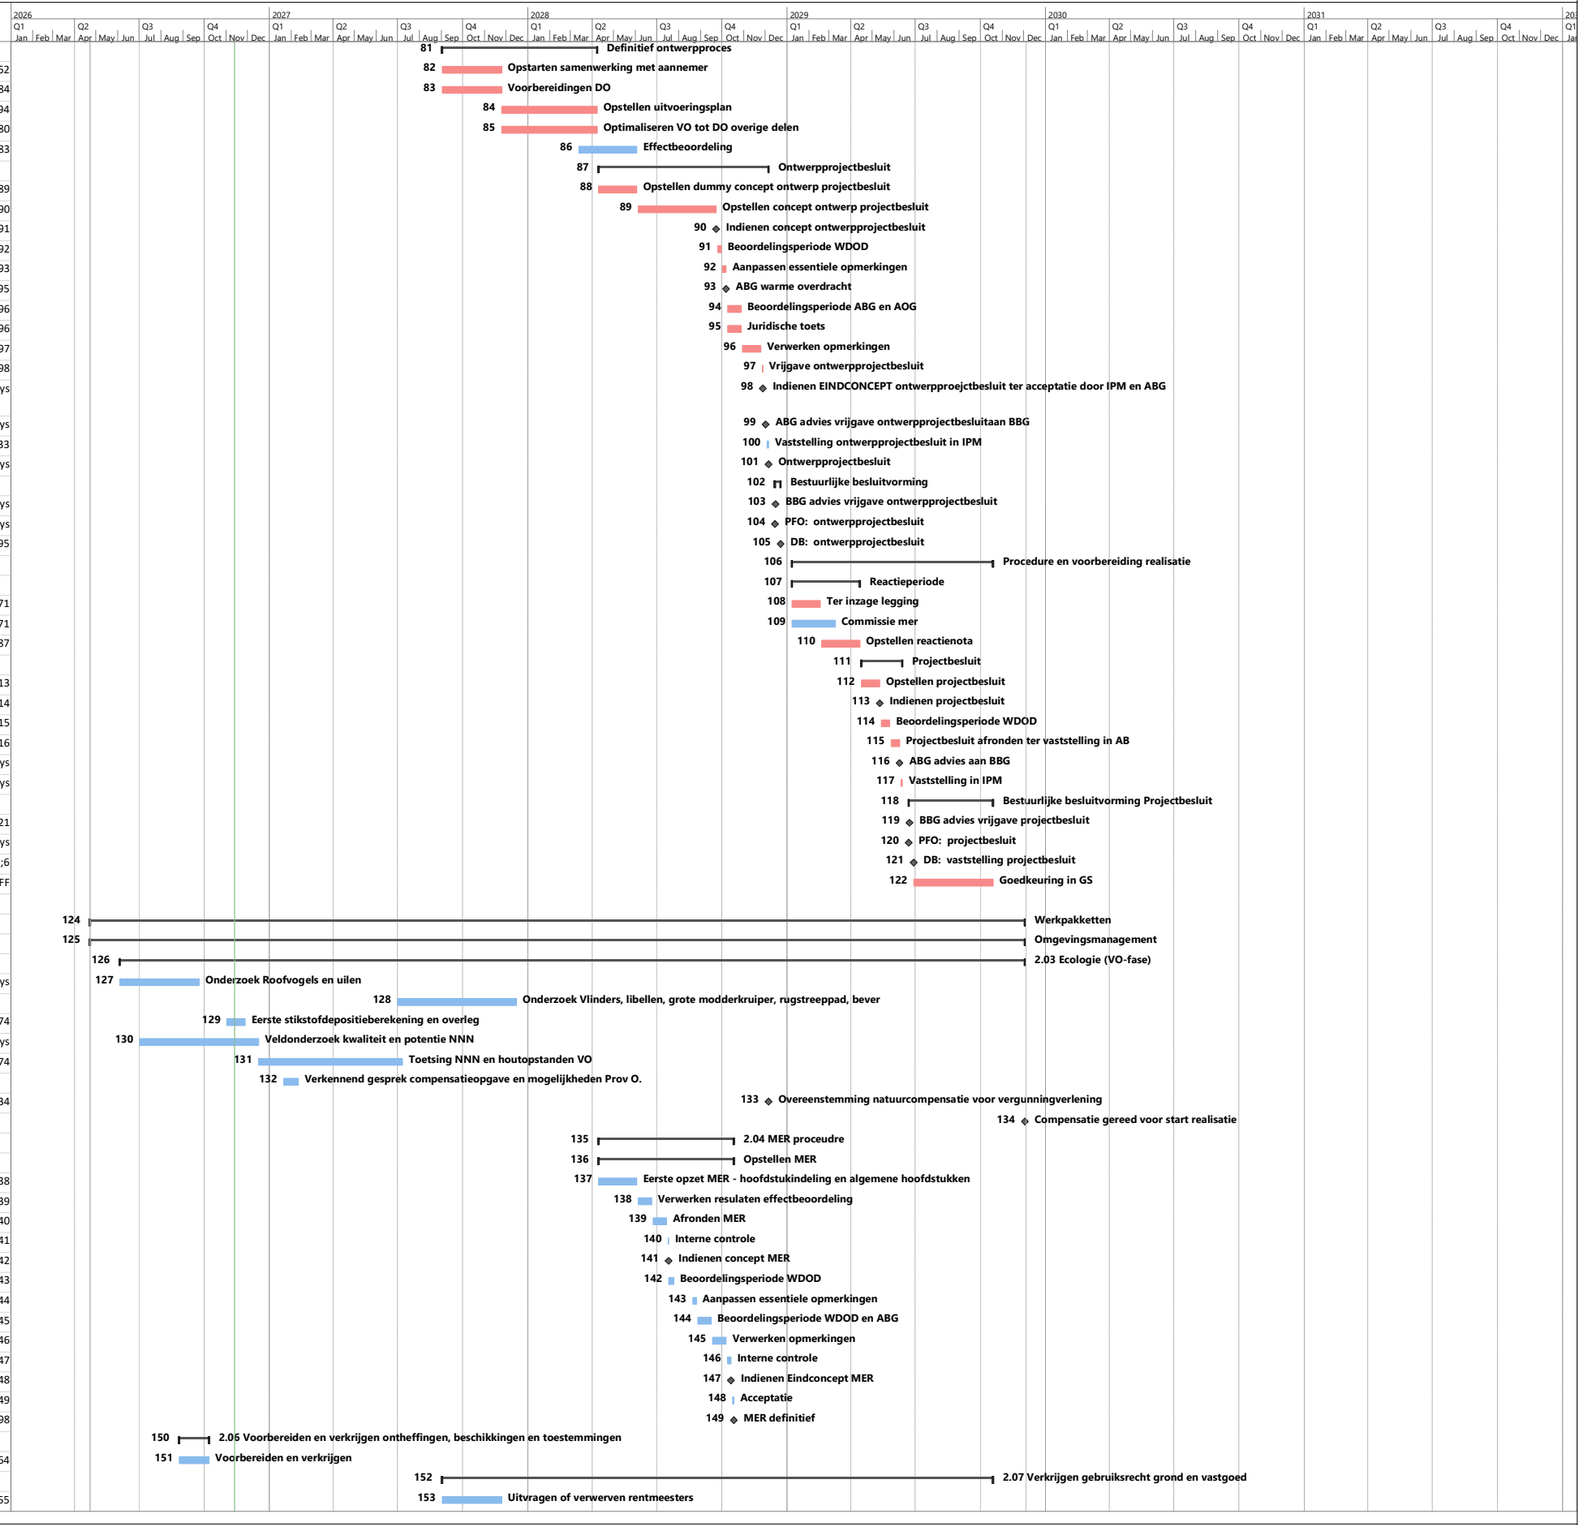

Baseline Milestone ◇ ID Mijlpaal ◆ Samenvatting Projectsamenvatting Deadline Critical

Planning planuitwerking Mastenbroek - IJssel


ID	Taaknaam	Duration	Start	Finish	Successors
154	Opstellen van een referentiestelsel	80 days	Thu 25-11-27	Wed 29-3-28	156
155	Uitgangspuntennotitie grondbeschikbaarheid	80 days	Thu 25-11-27	Wed 29-3-28	156
156	Grondplankaarten	20 days	Mon 10-4-28	Fri 5-5-28	157
157	Eerste gesprekken OM en grondverwering (minnelijk)	30 days	Mon 8-5-28	Fri 16-6-28	158
158	Minnelijk grondverwervingsproces	275 days	Fri 21-7-28	Thu 18-10-29	3
159	**2.08 Organiseren en uitvoeren communicatie**	**592 days**	**Thu 2-7-26**	**Fri 16-2-29**	
160	participatie- en communicatieaanpak PU-fase	55 days	Thu 2-7-26	Wed 14-10-26	21
161	Communicatiekalender (update VO)	30 days	Thu 2-7-26	Wed 9-9-26	162
162	Communicatiekalender (update DO)	30 days	Thu 25-11-27	Wed 19-1-28	163
163	Communicatiekalender (update Projectbesluit)	30 days	Mon 8-1-29	Fri 16-2-29	112
164	**2.10 Organiseren en uitvoeren publieksparticipagie**	**577 days**	**Thu 8-10-26**	**Fri 6-4-29**	
165	**Issueanalyse (update)**	**567 days**	**Thu 8-10-26**	**Fri 23-3-29**	
172	**Participatie en communciatieaanpak (update)**	**567 days**	**Thu 22-10-26**	**Fri 6-4-29**	
179	Notitie participatie en draagvlak VO-fase	60 days	Thu 6-5-27	Wed 25-8-27	80
180	Notitie participatie en draagvlak DO en proceduresefase	170 days	Mon 10-4-28	Fri 12-1-29	110
181	**2.11 Ontwikkelen meekoppelkansen**	**595 days**	**Thu 23-4-26**	**Fri 8-12-28**	
182	Opstellen voorzettingsovereenkomst (VOK) met Kampen	45 days	Thu 23-4-26	Fri 3-7-26	80
183	Opstellen realisatieovereenkomst (ROK) met Kampen	115 days	Mon 5-6-28	Fri 8-12-28	103
184	**2.12 Inventariseren en honoreren eisen en wensen**	**582 days**	**Wed 7-10-26**	**Fri 13-4-29**	
185	Vaststellen KES eind stap 1 (meerdere batches, nu batch 2)	0 days	Wed 7-10-26	Wed 7-10-26	78;203
186	Vaststellen KES start DO	0 days	Fri 10-9-27	Fri 10-9-27	110;204
187	Vastellen KES reactieperiode	0 days	Fri 13-4-29	Fri 13-4-29	3;205
188	**2.13 Inrichten procedure meldingen en schadepreventie en - afhandeling**	**730 days**	**Thu 16-7-26**	**Wed 10-10-29**	
189	Uitvragen offerte opstellen monitoringsplan	90 days	Thu 16-7-26	Wed 16-12-26	190
190	Opstellen monitoringsplan	33 days	Thu 17-12-26	Mon 15-2-27	191
191	Plaaten van monitoringsinstrumenten	20 days	Tue 16-2-27	Mon 15-3-27	192
192	Registratie metingen en opstellen meetrapport	587 days	Tue 16-3-27	Wed 10-10-29	5
193	Opstellen risicocontourplan	100 days	Thu 25-11-27	Wed 26-4-28	
194	Opstellen en vastleggen protocol schade-afhandeling	150 days	Mon 10-4-28	Fri 1-12-28	101
195	Inrichten meldpunt schade	160 days	Mon 8-1-29	Fri 14-9-29	5
196	**Techniek**	**695 days**	**Thu 23-4-26**	**Fri 11-5-29**	
197	**3.01 Managen TM-team en TM-scope**	**602 days**	**Thu 8-10-26**	**Fri 11-5-29**	
198	Notitie sober en doelmatig VO	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	231;82
199	Notitie sober en doelmatig DO	20 days	Mon 10-4-28	Fri 5-5-28	239
200	SE Management plan VO	40 days	Thu 8-10-26	Wed 2-12-26	201;247
201	SE Management plan DO	40 days	Thu 2-9-27	Wed 27-10-27	84;85
202	**Vaststellen SES**	**602 days**	**Thu 8-10-26**	**Fri 11-5-29**	
206	**3.02 informatie bestaande situatie**	**20 days**	**Thu 17-12-26**	**Wed 27-1-27**	
207	DTM-inmeting (in overleg verschoven naar 2027)	20 days	Thu 17-12-26	Wed 27-1-27	
208	NWOx-inventarisatie	20 days	Thu 17-12-26	Wed 27-1-27	
209	**3.03 Randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten specificeren**	**319 days**	**Thu 27-8-26**	**Tue 18-1-28**	
210	**Opstellen TUN VO**	**34 days**	**Thu 27-8-26**	**Tue 13-10-26**	
211	Afronden TUN VO	5 days	Thu 27-8-26	Wed 2-9-26	212
212	Interne controle	2 days	Thu 3-9-26	Fri 4-9-26	213
213	Indienen concept	0 days	Fri 4-9-26	Fri 4-9-26	214
214	Beoordelingsperiode WDOD	15 days	Mon 7-9-26	Fri 25-9-26	215
215	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 28-9-26	Fri 9-10-26	216
216	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 9-10-26	Fri 9-10-26	217;320
217	Acceptatie	2 days	Mon 12-10-26	Tue 13-10-26	229;78
218	**Opstellen TUN DO**	**29 days**	**Thu 25-11-27**	**Tue 18-1-28**	
226	**3.04 Ontwerpen Dijkversterking**	**421 days**	**Mon 14-9-26**	**Mon 26-6-28**	
227	BIM Uitvoeringsplan	25 days	Mon 14-9-26	Fri 16-10-26	229
228	**Ontwerpnota VO**	**174 days**	**Thu 5-11-26**	**Tue 24-8-27**	
229	Opstellen Ontwerpnota VO	150 days	Thu 5-11-26	Wed 23-6-27	230;271SS+110 days
230	Interne controle	2 days	Thu 24-6-27	Fri 25-6-27	231
231	Indienen concept	0 days	Fri 25-6-27	Fri 25-6-27	232
232	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 28-6-27	Fri 9-7-27	233
233	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 12-7-27	Fri 23-7-27	234
234	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 23-7-27	Fri 23-7-27	235
235	Acceptatie	2 days	Mon 23-8-27	Tue 24-8-27	237;78;82
236	**Opstellen Ontwerpnota DO**	**114 days**	**Wed 19-1-28**	**Mon 26-6-28**	
245	**3.06 Innovaties**	**290 days**	**Thu 2-7-26**	**Wed 27-10-27**	
246	Notitie kansrijke innovaties VO	20 days	Thu 2-7-26	Thu 27-8-26	247
247	Notitie kansrijke innovaties DO	40 days	Thu 2-9-27	Wed 27-10-27	84;85
248	**3.07 Kabels en leidingen**	**432 days**	**Thu 27-5-27**	**Fri 13-4-29**	
249	Knelpunt- en raakvlakanalyse VO	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	250
250	Verkennende gesprekken nutsbedrijven	40 days	Thu 24-6-27	Wed 15-9-27	252
251	Knelpunt- en raakvlakanalyse DO	20 days	Mon 10-4-28	Fri 5-5-28	252
252	Indienen VTA's en VTM's bij netbeheerders	20 days	Mon 8-5-28	Fri 2-6-28	253
253	Opstellen POS'en meest maatgevende K&L en bijbehorende activiteiten	40 days	Mon 19-2-29	Fri 13-4-29	
254	**3.08 Conditionerende onderzoeken**	**353 days**	**Thu 23-4-26**	**Wed 24-11-27**	
255	Uitvoeren onderzoeken	240 days	Thu 4-6-26	Wed 23-6-27	275
256	Afronden geotechnisch onderzoek VO	20 days	Thu 4-6-26	Wed 1-7-26	275
257	**OOO**	**240 days**	**Thu 4-6-26**	**Wed 23-6-27**	

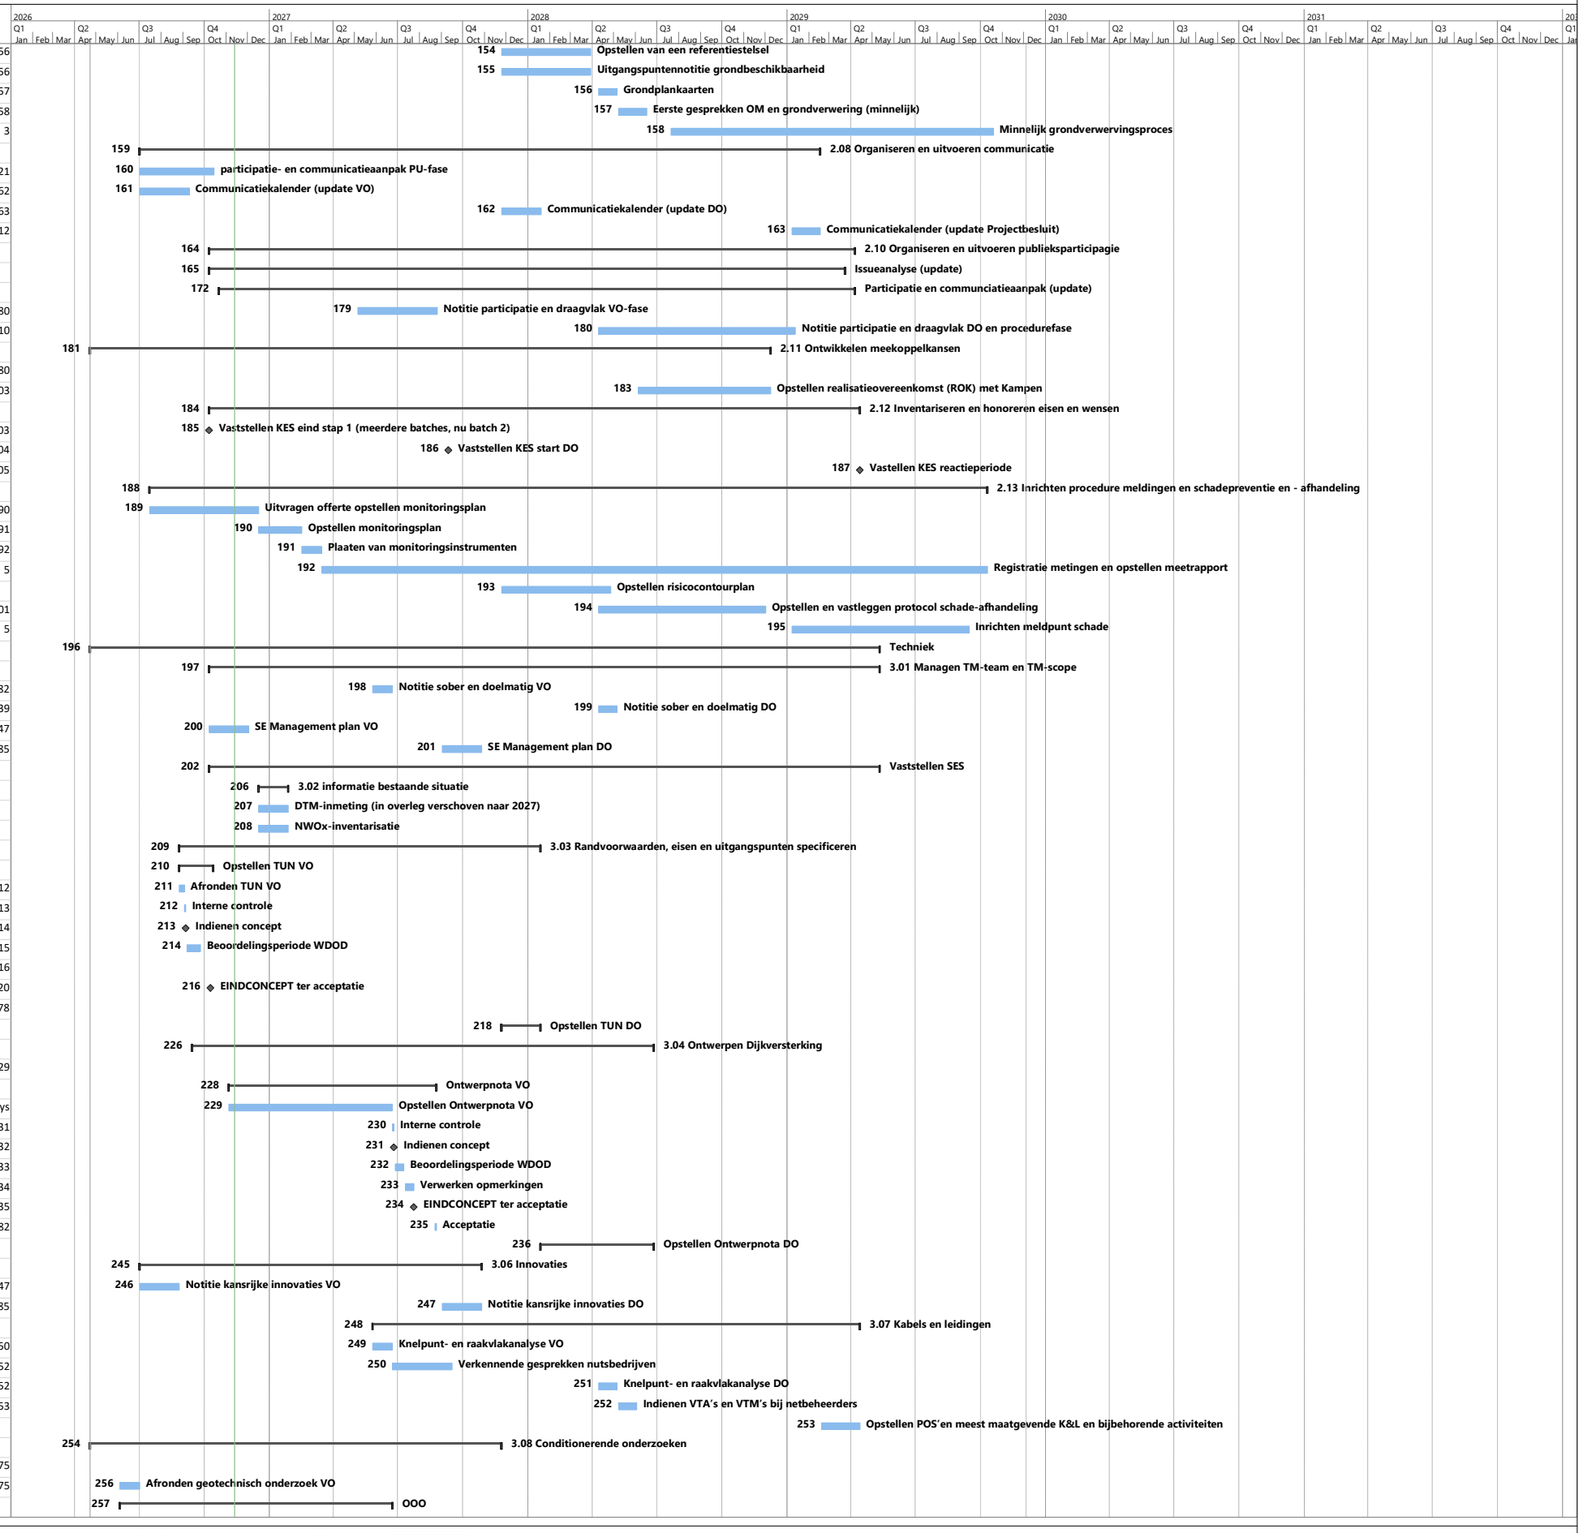

Baseline Milestone ID Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Deadline Critical

Planning planuitwerking Mastenbroek - IJssel

ID	Taaknaam	Duration	Start	Finish	Successors
258	Afronden orienterend onderzoek OOO	20 days	Thu 4-6-26	Wed 1-7-26	259
259	Uitvoeren risico-analyse OOO	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	275
260	**Archeologie**	**240 days**	**Thu 4-6-26**	**Wed 23-6-27**	
261	Afronden opstellen PvA Archeologie	20 days	Thu 4-6-26	Wed 1-7-26	262
262	Herijking PvA Archeologie	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	275
263	**Milieukundig onderzoek**	**170 days**	**Thu 8-10-26**	**Wed 23-6-27**	
264	Indicatief (water)bodemonderzoek	40 days	Thu 8-10-26	Wed 2-12-26	265
265	Vervolgonderzoek	40 days	Thu 22-4-27	Wed 23-6-27	84;85
266	**Water**	**163 days**	**Thu 23-4-26**	**Wed 27-1-27**	
267	Waterhuishoudkundig onderzoek	60 days	Thu 23-4-26	Fri 21-8-26	57
268	*Geohydrologisch onderzoek (NOG TE PLANNEN)*	20 days	Thu 17-12-26	Wed 27-1-27	65
269	**Verhardingsonderzoek**	**40 days**	**Thu 28-1-27**	**Wed 24-3-27**	
270	Indicatief verhardingsonderzoek	40 days	Thu 28-1-27	Wed 24-3-27	315
271	Rivierkundig onderzoek	20 days	Thu 22-4-27	Wed 26-5-27	231
272	Bomeninventarisatie	30 days	Thu 17-9-26	Wed 28-10-26	52;57;62
273	Verkeerskundig onderzoek	20 days	Thu 22-10-26	Wed 18-11-26	57
274	**Vervolgonderzoeken**	**90 days**	**Thu 24-6-27**	**Wed 24-11-27**	
275	Impact bepalen op ontwerp en mogelijk vervolgonderzoeken	20 days	Thu 24-6-27	Wed 21-7-27	276
276	Mogelijke vervolgonderzoeken tbv DO-fase	63 days	Mon 30-8-27	Wed 24-11-27	84;85
277	**3.09 Landschappelijke inpassing**	**471 days**	**Thu 27-8-26**	**Thu 14-9-28**	
278	**Opstellen Beeldkwaliteitsplan**	**99 days**	**Thu 27-8-26**	**Tue 26-1-27**	
279	Opstellen BKP	75 days	Thu 27-8-26	Wed 9-12-26	280
280	Interne controle	2 days	Thu 10-12-26	Fri 11-12-26	281
281	Indienen concept	0 days	Fri 11-12-26	Fri 11-12-26	282
282	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 14-12-26	Fri 8-1-27	283
283	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 11-1-27	Fri 22-1-27	284
284	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 22-1-27	Fri 22-1-27	285;320
285	Acceptatie	2 days	Mon 25-1-27	Tue 26-1-27	287
286	**Opstellen landschapsplan VO**	**129 days**	**Thu 28-1-27**	**Tue 31-8-27**	
287	Opstellen Landschapsplan VO	105 days	Thu 28-1-27	Wed 30-6-27	288
288	Interne controle	2 days	Thu 1-7-27	Fri 2-7-27	289
289	Indienen concept	0 days	Fri 2-7-27	Fri 2-7-27	290
290	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 5-7-27	Fri 16-7-27	291
291	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 19-7-27	Fri 27-8-27	292
292	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 27-8-27	Fri 27-8-27	293;295
293	Acceptatie	2 days	Mon 30-8-27	Tue 31-8-27	295;78
294	**Opstellen landschapsplan DO**	**94 days**	**Mon 10-4-28**	**Thu 14-9-28**	
295	Opstelllen Landschapsplan DO	70 days	Mon 10-4-28	Fri 14-7-28	296
296	Interne controle	2 days	Mon 17-7-28	Tue 18-7-28	297
297	Indienen concept	0 days	Tue 18-7-28	Tue 18-7-28	298
298	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Wed 19-7-28	Tue 29-8-28	299
299	Verwerken opmerkingen	10 days	Wed 30-8-28	Tue 12-9-28	300
300	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Tue 12-9-28	Tue 12-9-28	301
301	Acceptatie	2 days	Wed 13-9-28	Thu 14-9-28	302
302	Landschapsplan Defintief	0 days	Thu 14-9-28	Thu 14-9-28	98
303	**3.10 Voorbereiding realisatie**	**100 days**	**Thu 28-1-27**	**Wed 23-6-27**	
304	Memo uitvoering VO	80 days	Thu 28-1-27	Wed 26-5-27	198;305
305	Update gebiedseigengrond strategie	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	231
306	**3.11 Duurzaamheid VO-fase**	**200 days**	**Wed 15-7-26**	**Tue 8-6-27**	
307	Werksessie Herijking en vaststelling duurzaamheidsdoelen en bijbehorende ontwerpui	0 days	Tue 22-9-26	Tue 22-9-26	308
308	Werksessie Thematische verdieping op het thema circulariteit en materaal	0 days	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26	63
309	Opstellen VO rapportage duurzaamheid	200 days	Wed 15-7-26	Tue 8-6-27	74
310	**3.12 Prijsvorming Realisatiefase**	**261 days**	**Thu 27-5-27**	**Thu 6-7-28**	
311	**Opstellen kostenraming VO**	**44 days**	**Thu 27-5-27**	**Tue 24-8-27**	
312	Opstellen kostenraming VO (LET OP: HOEVEELHEDENBEPALING)	20 days	Thu 27-5-27	Wed 23-6-27	313
313	Interne controle	2 days	Thu 24-6-27	Fri 25-6-27	314
314	Indienen concept	0 days	Fri 25-6-27	Fri 25-6-27	315
315	Beoordelingsperiode WDOD	10 days	Mon 28-6-27	Fri 9-7-27	316
316	Verwerken opmerkingen	10 days	Mon 12-7-27	Fri 23-7-27	317
317	EINDCONCEPT ter acceptatie	0 days	Fri 23-7-27	Fri 23-7-27	318;320
318	Acceptatie	2 days	Mon 23-8-27	Tue 24-8-27	78;82
319	**Opstellen kostenraming DO**	**64 days**	**Mon 10-4-28**	**Thu 6-7-28**	
328	**Contractmanagement**	**722 days**	**Thu 23-4-26**	**Tue 19-6-29**	
329	4.01 Opstellen inkoopplan	50 days	Thu 23-4-26	Fri 10-7-26	330FS-10 days;333SS
330	4.02 Opstellen aanbestedingsdossier	82 days	Thu 2-7-26	Fri 20-11-26	336
331	**4.03 Aanbesteding**	**293 days**	**Thu 23-4-26**	**Wed 1-9-27**	
356	**4.06 Uitwerking tbv prijsvorming en opstellen overeenkomst**	**248 days**	**Fri 26-5-28**	**Tue 19-6-29**	
357	Detaileren DO tbv overeenkomst fase 2	79 days	Fri 26-5-28	Wed 11-10-28	358FS-40 days
358	Grootste (rest)riscio's elimineren tbv overeenkomst fase 2	80 days	Thu 20-7-28	Wed 6-12-28	359
359	Prijsvorming en opstellen overeenkomst fase 2	129 days	Thu 7-12-28	Tue 19-6-29	4;360
360	Realisatieovereenkomst gereed	0 days	Tue 19-6-29	Tue 19-6-29	6

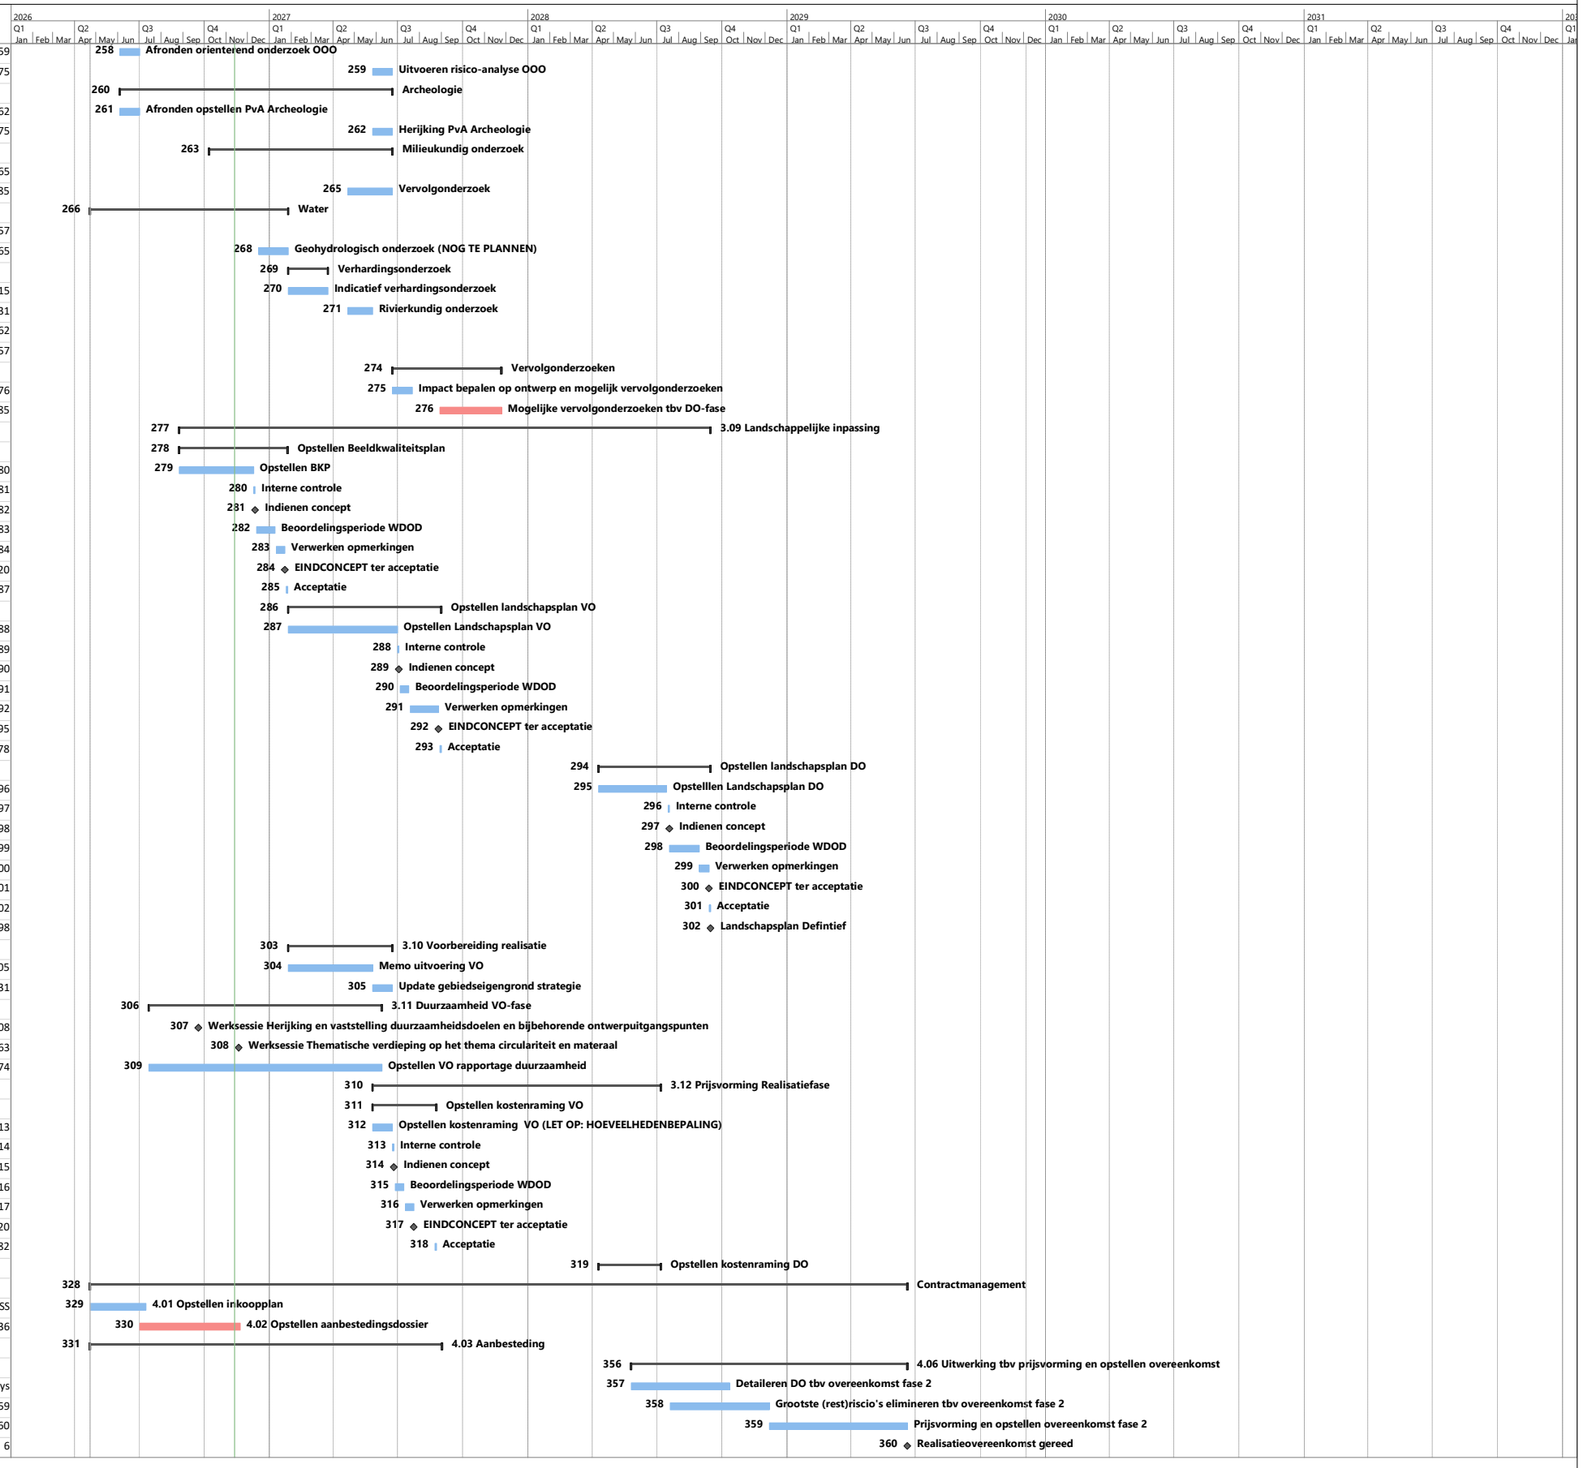

Baseline Milestone ◇ ID Mijlpaal ◆ Samenvatting Projectsamenvatting Deadline Critical
