In de grote Kas:
- 1 Streng ten behoeve van opslag her te gebruiken materialen;
- Schaftlocatie;
- Was- en kleedgelegenheid en toilet;

Looproute richting kas

Speeltuin paddenpoel

Deze zijde van de hekken voorzien van steigerdoek i.v.m. inkijk naar The Innerwork Lab

9

9A

Rijplaten

Kunstwerk buiten bouwterrein kan gehandhaafd blijven.

Looproute 9 en 9A en achterzijde NME gebouw


Rijplaten

Aandachtspunt dichtzetten drangheken brede openingen i.v.m. eventueel doorklimmen kinderen

Gesloten en hekafdraging niveauvrij beschikbaar houden bij evenementen. Drangheken verwijderbaar

Gele deel : Voetgangerspoort met intercom kan gehandhaaft blijven tbv bezoekers NME terrein (gele deel);

Blauwe deel: Wordt bouwhek t.b.v. toegangsweg en dichtgezet na ieder transport zodat bouwterrein afgesloten is voor onbevoegden

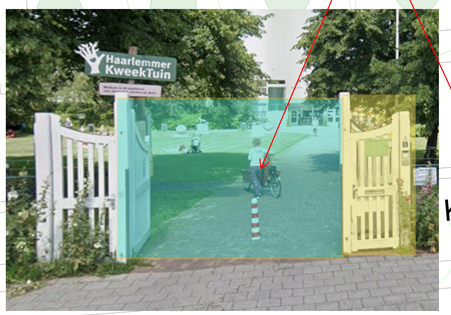

Kle laan

Rijplaten tijdens transporten. Hierna weer terrein ophalen t.b.v. beperking struikelgevaar voetgangers e.d.

Tijdelijke fietsenrekken plaatsen voor bezoekers NME / The Innerwork Lab

RENVOOI

PEIL 0 = +0,65 m NAP

Kadastraal perceelnummer:

- kadastrale perceelgrens
- mogelijke opstelplaats fietsen
- bluswatervoorziening conform geldende regelgeving exacte positie n.t.b.
- ondergrondse afvalcontainer
- O.B. — opstelplaats brandweer
- sleutelbuis / kluis exacte positie n.t.b. i.o.m brandweer
- entreepijl

AANDACHTSPUNTEN:

GOEDE BEWEGWIJZERING NAAR ACHTERZIJDE GEBOUW EN GEBOUWEN 9/9A;

DAAR WAAR NODIG DOEKEN AANBRENGEN OP HEKWERK I.V.M. ZICHT EN DOORKLIMBEVEILIGING;

HULPDIENSTEN EN CALAMITEITEN VIA INGANG TER SPIJTSTRAAT;

COMMUNICATIE MIDDELS BANNERS / BEBORDING. OOK VERWIJZEN NAAR KWEEKCAFE, PADDENPOEL EN INNERWORK LAB;

DRANGHEKKEN EN HEK VOORZIJDE SNEL VERWIJDERBAAR BIJ WEEKENDEN EN EVENEMENTEN;

STOEP VOORZIJDE OOK VOORZIEN VAN RIJPLATEN. KUNSTSTOF IVM VLAKHEID EN GLADHEID. RIJPLATEN WEER HET TERREIN OPTREKKEN NA IEDER TRANSPORT;

HEKWERK VOORZIJDE AFSLUITBAAR VOOR EN NA DE TRANSPORTEN ZODAT NIEMAND BOUWTERREIN OP KAN LOPEN;

jp van eesteren | TBI
J.P. van Eesteren B.V.
Hanzeweg 16
2803 MC Gouda
T: +31 88 823 01 00
www.jpvaneesteren.nl

SCHAAL: 1 : 100	DATUM: 26-01-2026	
FORMAAT: A1	REVISIE: B 16-02-2026	
PROJECT: NME HAARLEM	FASE: UO	STATUS: Definitief
OMSCHRIJVING: Bouwplaatsinrichting sloopfase NME gebouw Haarlem	PROJECTNUMMER: 304533	TEKENINGNUMMER: UO-JPvE-01
